

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 03	
Zhotovitel:	„Společnost: Hrobice“, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 17331099		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 22.08.2025	
Název akce: Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)			
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐
Datum: 22.08.2025			osobně ☐
Předmět změny: SO 101.1 – Silnice II/324 (PVNHČP) Změny v průběhu výstavby			
ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazené změny (doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.): Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.			
Počet připojených listů specifikací:	20		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Stanovisko projektanta stavby: souhlasí Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasí			
Přílohy: - Podpisový list elektronického schvalování ZBV - Přehled dokladů - Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1) - Přehled zařazení změn do Skupin - 1-2025-Staré Hradiště-Hrobice-SO101-fréza - 2-2025-Staré Hradiště-Hrobice-SO101-různé - 3-2025-Staré Hradiště-Hrobice-SO101-vrstvy - 4-2025-Staré Hradiště-Hrobice-SO101-panely-zastávky - ZBV 03_Fotodokumentace - Plná moc Ing. Richard Rakouš - Vyjádření TDI ZBV č.3			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03	
Zhotovitel:		„Společnost: Hrobice“, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ:17331099	
Změnový list vystavil:		Ing. Richard Rakouš	
Datum:		22.08.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/24/23439 tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO 101.1 – Silnice II/324 (PVNHČP) Změny v průběhu výstavby Popis a zdůvodnění změny ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazené změny (doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.): Po dokončení stavebních prací došlo k zaměření skutečně provedeného stavu měřených položek uvedených v soupisu prací, čímž došlo k upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Tato změna se dále eviduje v Evidenčním listu vyhrazené změny. Do Skupiny 1 zařazujeme kladné položky č. 14102 03, 14102 02, 113728 02, 121108 02, 131738, 131838, 17380 02, 17380 01, 17481, 18110 02, 18110 04, 18231, 21452, 45131A 03, 45131A 02, 56213 01, 56213 02, 56213 03, 56333 02, 56333 01, 58300, 9113B1, 91238, 914921, 917224 01, 917224 03, 93543, 93552.R 01, 93552.R 02 a 966158 a záporné položky č. 184A2, 45157 01, 572123 03, 572123 02, 572213 06, 572213 03, 572213 05, 572213 04, 574A44, 574B34 01, 574B34 02, 574B34 03, 574C56, 574C66 02, 574C66 03, 574C66 01, 574E68 03, 574E68 02, 574E68 01, 914131, 915111, 915221 a 91723.			
Počet připojených listů specifikací: 20		Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :		Cena víceprací bez DPH :	
-292 719,62 Kč		1 205 340,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
912 620,38 Kč		Termín dokončení díla se nemění	
Výsledná cena změny s DPH :		Počet stavebních dnů se nemění	
1 104 270,66 Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele díla:		Podpis zmocněnce zhotovitele díla:	
Datum:		Datum:	

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

2020700 - MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1 - PARDUBICKÝ KRAJ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 101.1 - SILNICE II/324 (PVNHČP)

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS

SO 101.1 / 3 - ZBV 03

Číslo ZBV

03

Objednatel: Pardubický kraj

Komenského náměstí 125,, 532 11 Pardubice

IČ: 70892822

Zhotovitel: MI Roads a.s.

Koželužská 2450, 18000 Praha

IČ: 17331099

Finanční rekapitulace ZBV č. 03

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03	-292 719,62	1 205 340,00	912 620,38

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění,

Podpis

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	03
Evidenční číslo a název stavby:	2020700 - MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	1 - PARDUBICKÝ KRAJ
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 101.1 - SILNICE II/324 (PVNHČP)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	1 / 3 - ZBV 03

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1)	2 / 3	
Přehled zařazení změn do Skupin	1 / 5	
1-2025-Staré Hradiště-Hrobice-SO101-fréza	2 / 6	
2-2025-Staré Hradiště-Hrobice-SO101-různé	2 / 8	
3-2025-Staré Hradiště-Hrobice-SO101-vrstvy	2 / 10	
4-2025-Staré Hradiště-Hrobice-SO101-panely-zastávky	2 / 12	
ZBV 03_Fotodokumentace	4 / 14	
Plná moc_Rakouš_konverze	2 / 18	
Vyjádření TDI ZBV č.3	1 / 20	

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 03.1

Evidenční číslo a název stavby: 2020700 - MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP Číslo a název SO/PS: 1 - PARDUBICKÝ KRAJ Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - SILNICE II/324 (PVNHČP)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 3 - ZBV 03					
								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014102.02	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	597,865	611,975	14,110	50,00	29 893,25	0,00	705,50	30 598,75	705,50	2,36
3	014102.03	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	7 345,334	7 562,819	217,485	10,00	73 453,34	0,00	2 174,85	75 628,19	2 174,85	2,96
13	113728.02	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	1 432,346	1 899,924	467,578	484,05	693 327,08	0,00	226 331,13	919 658,21	226 331,13	32,64
16	121108.02	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	21,738	31,483	9,745	93,33	2 028,81	0,00	909,50	2 938,31	909,50	44,83
18	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3 066,869	3 737,400	670,531	166,51	510 664,36	0,00	111 650,12	622 314,48	111 650,12	21,86
19	131838	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	513,028	620,100	107,072	198,56	101 866,84	0,00	21 260,22	123 127,06	21 260,22	20,87
21	17380.01	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	98,950	133,159	34,209	473,45	46 847,88	0,00	16 196,25	63 044,13	16 196,25	34,57
22	17380.02	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	154,751	162,231	7,480	1 136,63	175 894,63	0,00	8 501,99	184 396,62	8 501,99	4,83
23	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	986,436	1 015,400	28,964	193,53	190 904,96	0,00	5 605,40	196 510,36	5 605,40	2,94
26	18110.02	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 282,569	1 580,401	297,832	12,57	16 121,89	0,00	3 743,75	19 865,64	3 743,75	23,22
28	18110.04	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	5 399,603	6 324,700	925,097	12,57	67 873,01	0,00	11 628,47	79 501,48	11 628,47	17,13
34	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	2 641,377	3 255,000	613,623	16,45	43 450,65	0,00	10 094,10	53 544,75	10 094,10	23,23
39	184A2	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	70,000	56,000	-14,000	205,06	14 354,20	-2 870,84	0,00	11 483,36	-2 870,84	-20,00
42	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	513,028	665,800	152,772	410,78	210 741,64	0,00	62 755,68	273 497,32	62 755,68	29,78
47	45131A.02	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	41,879	51,990	10,111	3 543,82	148 411,64	0,00	35 831,56	184 243,20	35 831,56	24,14
48	45131A.03	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	8,514	9,524	1,010	3 543,82	30 172,08	0,00	3 579,26	33 751,34	3 579,26	11,86
50	45157.01	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	48,919	37,189	-11,730	688,69	33 690,03	-8 078,33	0,00	25 611,70	-8 078,33	-23,98
53	56213.01	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM	M2	820,372	829,990	9,618	246,41	202 147,86	0,00	2 369,97	204 517,83	2 369,97	1,17
54	56213.02	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM	M2	4 718,130	4 773,446	55,316	246,41	1 162 594,41	0,00	13 630,42	1 176 224,83	13 630,42	1,17
55	56213.03	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM	M2	2 813,280	2 846,263	32,983	246,41	693 220,32	0,00	8 127,34	701 347,66	8 127,34	1,17
56	56333.01	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 044,216	1 404,043	359,827	130,41	136 176,21	0,00	46 925,04	183 101,25	46 925,04	34,46
57	56333.02	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	5 399,603	7 260,257	1 860,654	130,41	704 162,23	0,00	242 647,89	946 810,12	242 647,89	34,46
63	572123.02	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4 576,586	4 501,562	-75,024	27,38	125 306,92	-2 054,16	0,00	123 252,76	-2 054,16	-1,64
64	572123.03	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 813,280	2 782,300	-30,980	27,38	77 027,61	-848,23	0,00	76 179,38	-848,23	-1,10
67	572213.03	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 417,550	4 258,810	-158,740	13,42	59 283,52	-2 130,29	0,00	57 153,23	-2 130,29	-3,59
68	572213.04	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 317,395	4 163,060	-154,335	13,42	57 939,44	-2 071,18	0,00	55 868,26	-2 071,18	-3,57
69	572213.05	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 813,280	2 782,300	-30,980	13,42	37 754,22	-415,75	0,00	37 338,47	-415,75	-1,10
70	572213.06	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 813,280	2 782,300	-30,980	13,42	37 754,22	-415,75	0,00	37 338,47	-415,75	-1,10

73	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	743,187	709,670	-33,517	224,67	166 971,82	-7 530,26	0,00	159 441,56	-7 530,26	-4,51
74	574B34.01	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	4 274,221	4 081,450	-192,771	287,20	1 227 556,27	-55 363,83	0,00	1 172 192,44	-55 363,83	-4,51
75	574B34.02	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 813,280	2 686,400	-126,880	288,04	810 337,17	-36 546,52	0,00	773 790,65	-36 546,52	-4,51
76	574B34.03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	471,135	449,880	-21,255	318,01	149 825,64	-6 759,30	0,00	143 066,34	-6 759,30	-4,51
77	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	758,277	716,293	-41,984	230,01	174 411,29	-9 656,74	0,00	164 754,55	-9 656,74	-5,54
78	574C66.01	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	4 361,005	4 119,544	-241,461	257,51	1 123 002,40	-62 178,62	0,00	1 060 823,78	-62 178,62	-5,54
79	574C66.02	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	2 813,280	2 657,514	-155,766	262,74	739 161,19	-40 925,96	0,00	698 235,23	-40 925,96	-5,54
80	574C66.03	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	471,135	445,049	-26,086	279,81	131 828,28	-7 299,12	0,00	124 529,16	-7 299,12	-5,54
81	574E68.01	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	775,867	761,218	-14,649	246,77	191 460,70	-3 614,93	0,00	187 845,77	-3 614,93	-1,89
82	574E68.02	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	4 462,171	4 377,920	-84,251	243,73	1 087 564,94	-20 534,50	0,00	1 067 030,44	-20 534,50	-1,89
83	574E68.03	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	2 813,280	2 760,162	-53,118	249,92	703 094,94	-13 275,25	0,00	689 819,69	-13 275,25	-1,89
87	58300	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	21,476	23,400	1,924	30 320,36	651 160,05	0,00	58 336,37	709 496,42	58 336,37	8,96
97	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	479,300	541,730	62,430	1 004,79	481 595,85	0,00	62 729,04	544 324,89	62 729,04	13,03
103	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	20,000	22,000	2,000	321,77	6 435,40	0,00	643,54	7 078,94	643,54	10,00
105	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	53,000	50,000	-3,000	1 647,02	87 292,06	-4 941,06	0,00	82 351,00	-4 941,06	-5,66
107	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	33,000	35,000	2,000	3 203,12	105 702,96	0,00	6 406,24	112 109,20	6 406,24	6,06
108	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	437,250	435,237	-2,013	134,71	58 901,95	-271,17	0,00	58 630,78	-271,17	-0,46
109	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	437,250	435,237	-2,013	321,22	140 453,45	-646,62	0,00	139 806,83	-646,62	-0,46
111	917224.01	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	262,820	263,460	0,640	496,87	130 587,37	0,00	318,00	130 905,37	318,00	0,24
113	917224.03	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	82,344	87,450	5,106	450,44	37 091,03	0,00	2 299,95	39 390,98	2 299,95	6,20
114	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	994,964	988,160	-6,804	630,69	627 513,85	-4 291,21	0,00	623 222,64	-4 291,21	-0,68
120	93543	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	51,200	56,930	5,730	7 825,75	400 678,40	0,00	44 841,55	445 519,95	44 841,55	11,19
121	93552.R.01	ŽLABY OBRUBNÍKOVÉ Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM	M	644,291	661,440	17,149	3 427,12	2 208 062,57	0,00	58 771,68	2 266 834,25	58 771,68	2,66
122	93552.R.02	ŽLABY OBRUBNÍKOVÉ Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM	M	130,981	146,530	15,549	3 182,79	416 885,02	0,00	49 489,20	466 374,22	49 489,20	11,87
125	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	107,777	149,500	41,723	2 081,25	224 310,88	0,00	86 835,99	311 146,87	86 835,99	38,71
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						17 764 948,73	-292 719,62	1 205 340,00	18 677 569,11	912 620,38	5,14

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:		MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP - 2020700		Sledování limitu 50 % od účinnosti novely ZZVZ je ponecháno jen pro nezávaznou informaci		Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15% z Přijaté smluvní částky		do 31.12.2021	od 1.1.2022	od 1.1.2024	a max. 137 366 000 Kč do 31.12.2021	a max. 140 448 000 Kč od 1.1.2022	a max. 135 348 000 Kč od 1.1.2024			
1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	125 803 579,60 Kč	6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a 4	6 405 480,07 Kč	9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	5,26%	12=39	Sledování čerpání limitu	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	133 121 680,05 Kč	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % součet Skupiny 3 a Skupiny 4	5,09%	10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	105,82%	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	37 741 073,88 Kč	11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	62 901 789,80 Kč	14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,00%	0,00%	0,00%	
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,73%	OK v limitu													
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%	OK v limitu													
15 % z Přijaté smluvní částky		18 870 536,94 Kč	OK v limitu													

						Skupiny změn																			
						-1-			-2-			-3-					-4-				-5-				-6-
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) v rámci limitu 30% lze odečíst pouze změny záporné, které se změnami kladnými přímo souvisí					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Suma Změn záporných nesouvisející se Změnami kladnými nezapočítává se do limitu 30 %	Změny kladné	Suma Změn kladných a Změn záporných, které souvisí se Změnami kladnými (hodnota jde do výpočtu limitu 30 %)	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28.a	28.b	29	30=28.a+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(39/1)*100	39= 36 +37	40
			- 395 542,50 Kč	7 713 642,95 Kč	7 318 100,45 Kč	- 292 719,62 Kč	1 205 340,00 Kč	912 620,38 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 102 822,88 Kč	0,00 Kč	6 508 302,95 Kč	6 405 480,07 Kč	6 611 125,83 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	01	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 01 Nebezpečný odpad	- 102 822,88 Kč	4 919 073,00 Kč	4 816 250,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 102 822,88 Kč	0,00 Kč	4 919 073,00 Kč	4 816 250,12 Kč	5 021 895,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	02	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 02 Sanace podloží	0,00 Kč	1 589 229,95 Kč	1 589 229,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 589 229,95 Kč	1 589 229,95 Kč	1 589 229,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	03	PARDUBICKÝ KRAJ / Změny vyhrazené_doměrky	- 292 719,62 Kč	1 205 340,00 Kč	912 620,38 Kč	- 292 719,62 Kč	1 205 340,00 Kč	912 620,38 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení

Vyhodnocení limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky v řádku 7 sloupce W, X, Y jsou orientační. Pro sledování limitů je vždy rozhodující datum schválení daného ZBV a limity platné v roce, kdy bylo ZBV schváleno oprávněnou osobou Objednatele.

Sledování limitu 50 % od účinnosti novely ZZVZ je ponecháno jen pro nezávaznou informaci Objednatele

- Legenda:**
- ZBV s datem schválení do 31.12.2021
 - ZBV s datem schválení od 1.1.2022
 - ZBV s datem schválení od 1.1.2024
 - ZBV bez datu schválení:

Název akce:

**Modernizace silnice II/324
Staré Hradiště – Hrobice (průtah)**

Zaměření frézování vozovky SO101


Geodetický protokol č.: 1/2025
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Zakázkové číslo: 15/2024
Objednatel: MI Roads a.s.
Zpracovatel geodetických prací: A.G.E.S. Engineering CZ s.r.o.
nám. ČS Legií 851
530 02 Pardubice
Geodetické práce provedli: 
Datum měření: srpen 2024


Pr. tloušťka [mm]	Plocha [m ²]	Kubatura [m ³]
258	8181,8	2110,9

V Pardubicích dne 5.6.2025

Technickou zprávu vyhotovil: 

Ověřil: 





Název akce:

**Modernizace silnice II/324
Staré Hradiště – Hrobice (průtah)**

Zaměření vozovkových vrstev SO101

Geodetický protokol č.:	2/2025
Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Zakázkové číslo:	15/2024
Objednatel:	MI Roads a.s.
Zpracovatel geodetických prací:	A.G.E.S. Engineering CZ s.r.o. nám. ČS Legií 851 530 02 Pardubice
Geodetické práce provedli:	
Datum měření:	srpen – listopad 2025


Položka	Kubatura [m ³]
Hloubení jam tř. I	3737,4
Hloubení jam tř. II	620,1
Zásyp jam a rýh	1015,4
Sanační vrstvy z kameniva	665,8
Bourání konstrukcí z betonu	149,5

Položka	Plocha [m ²]
Separační geotextilie	3123,6

V Pardubicích dne 16.6.2025

Technickou zprávu vyhotovil: 

Ověřil: 



Název akce:

Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)

Zaměření vozovkových vrstev SO101

Geodetický protokol č.: 3/2025

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Zakázkové číslo: 15/2024

Objednatel: MI Roads a.s.

Zpracovatel geodetických prací: A.G.E.S. Engineering CZ s.r.o.
nám. ČS Legií 851
530 02 Pardubice


Geodetické práce provedli: 


Datum měření: září 2024 – květen 2025


Vrstva	Plocha [m²]
ACO 11+	7927,4
ACL 16+	7938,4
ACP 22+	7899,3
SC	8449,7
ŠDA	8664,3

V Pardubicích dne 16.6.2025

Technickou zprávu vyhotovil: 

Ověřil: 



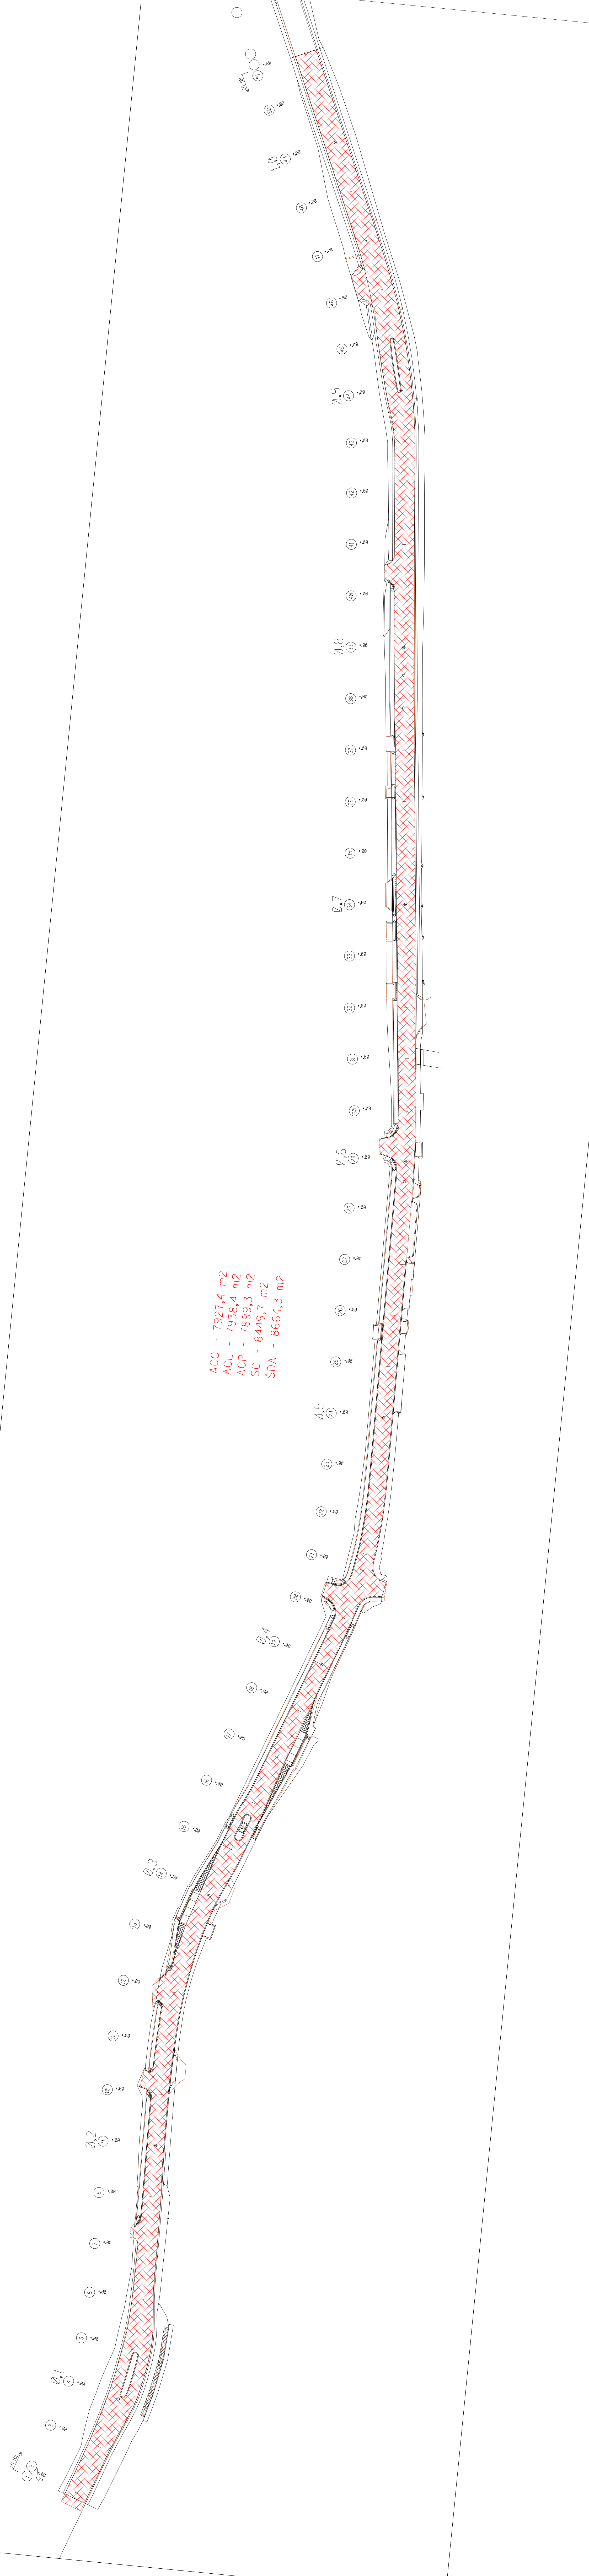

Název akce:

**Modernizace silnice II/324
Staré Hradiště – Hrobice (průtah)**


**Kryt ze silničních dílců (panelů)
kubatura**


Geodetický protokol č.:	4/2025
Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Zakázkové číslo:	15/2024
Objednatel:	MI Roads a.s.
Objekt:	SO101
Zpracovatel geodetických prací:	A.G.E.S. Engineering CZ s.r.o. nám. ČS Legií 851 530 02 Pardubice
Geodetické práce provedli:	
Datum měření:	prosinec 2024
Kubatura – 23,4 m ³	

V Pardubicích dne 25.6.2025

Technickou zprávu vyhotovil: 

Ověřil: 



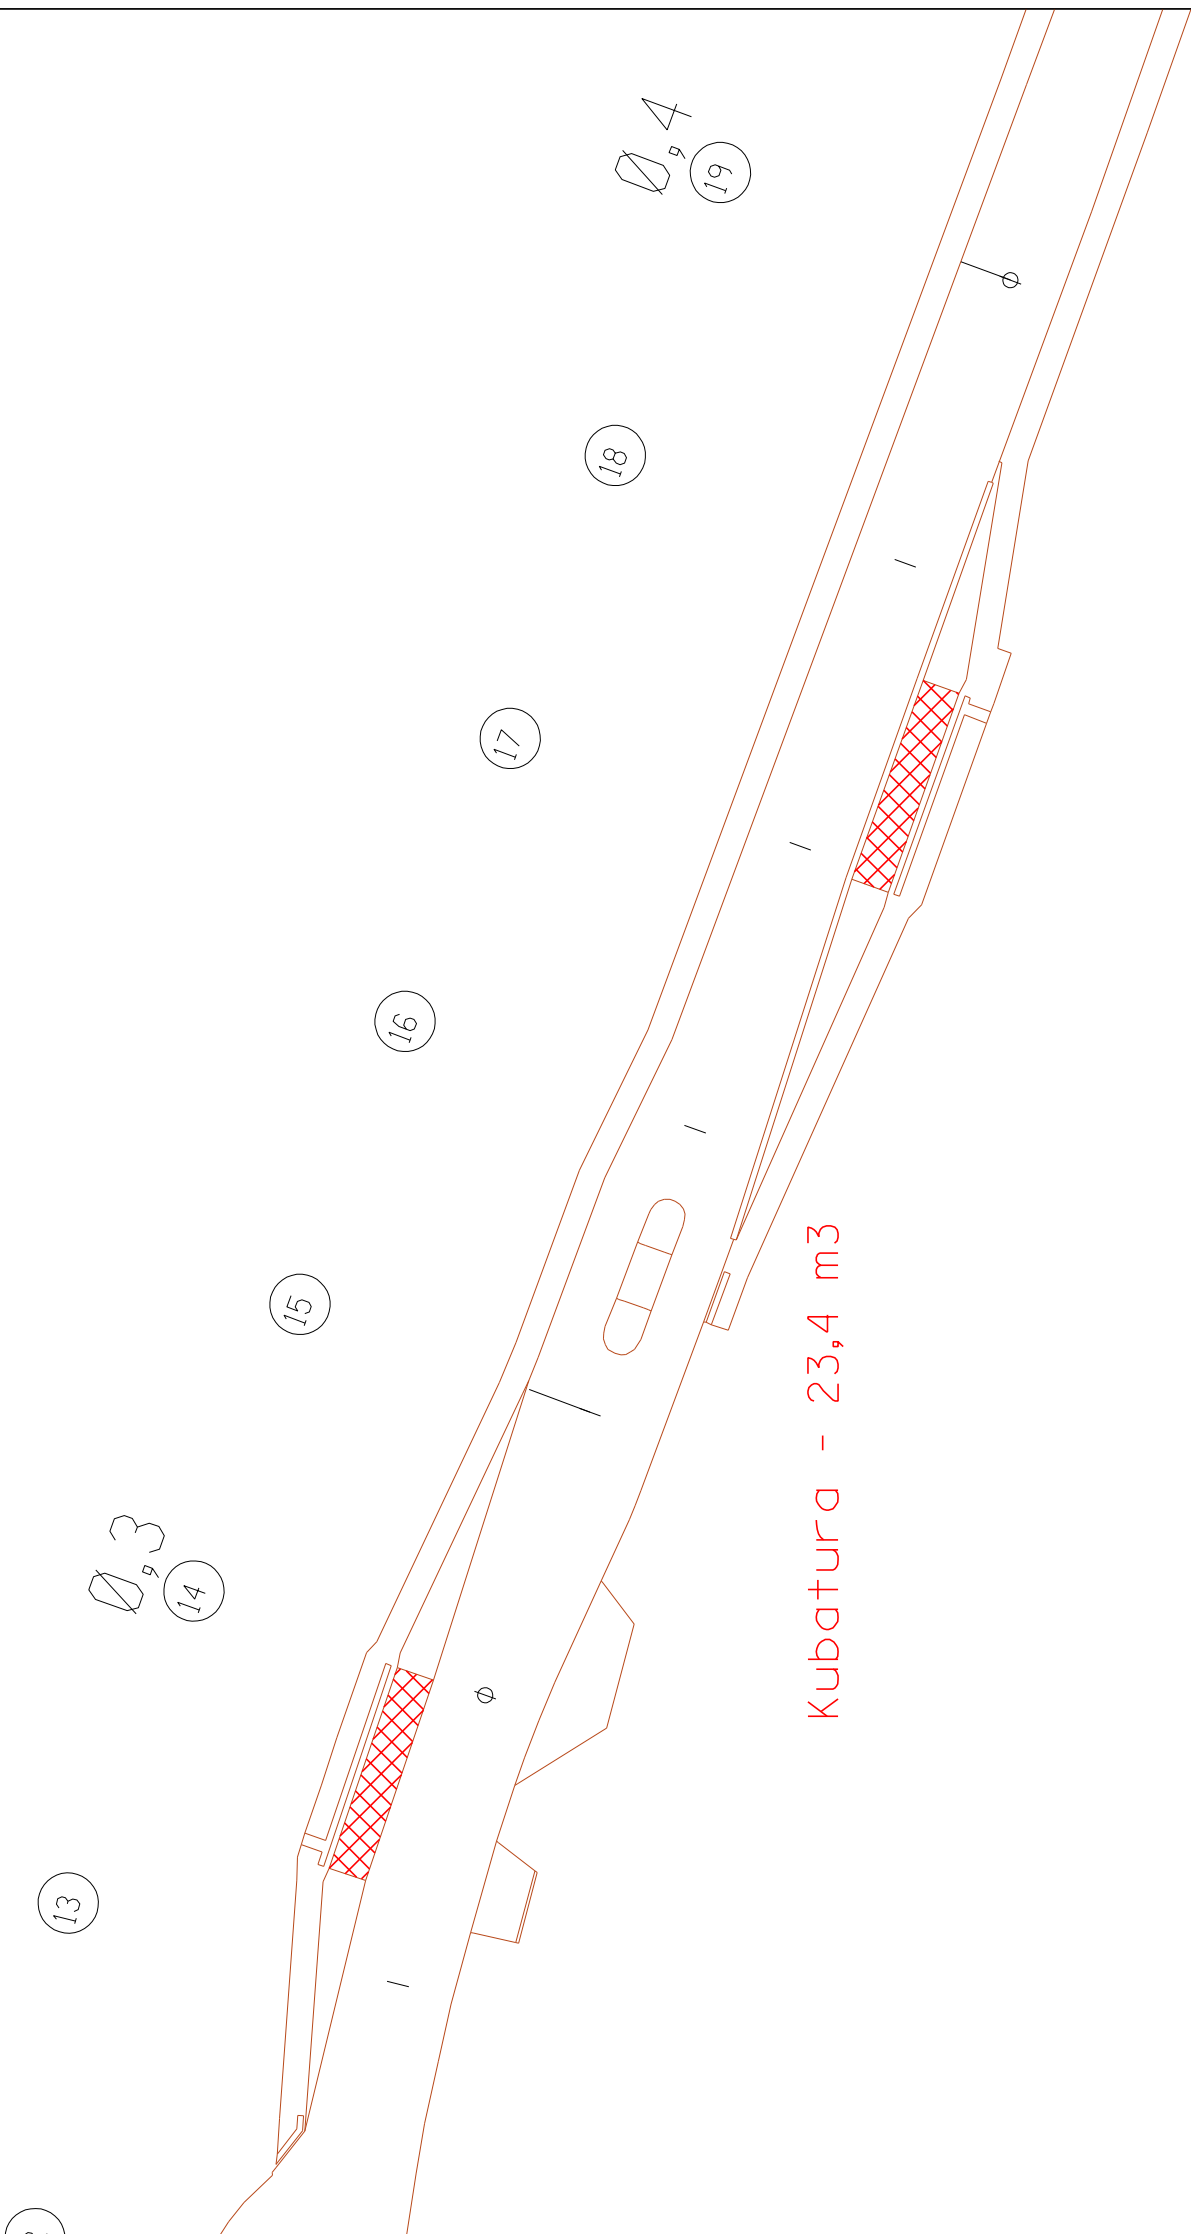









PLNÁ MOC

Společnost **MI Roads a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, identifikační číslo 17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: B 27461 (dále též jen „zmocnitel“), jehož zastupuje správní rada společnosti jednající Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady, a Ing. Markem Steinerem, členem správní rady, tímto **zmocňuje**:


Ing. Richarda Rakouše

zaměstnance zmocnitele, datum narození [REDACTED] 1972, bydliště [REDACTED] Praha8
(dále jen „zmocněnec“)


K jednání za zmocnitele při administraci změn díla u stavby „Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)“ kterou zmocnitel jako zhotovitel provádí pro Pardubický kraj. Zmocněnec je takto za zmocnitele oprávněn projednávat změny díla, podepisovat dokumentaci k těmto změnám se vztahující (zejména tedy změnové listy) a činit další úkony přímo související s administrací změn díla u výše uvedené stavby.

Toto zmocnění souvisí s prováděním výše uvedené stavby a zmocněnec je oprávněn jednat za zmocnitele ve shora uvedeném rozsahu pouze v souvislosti s touto stavbou. Udělené zmocnění zaniká nejpozději 31. 12. 2025.

V Praze dne 01. 10. 2024




Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady
MI Roads a.s.



Ing. Marek Steiner
člen správní rady
MI Roads a.s.

V Srchu dne 01. 10. 2024 zmocnění za zmocněnce přijímám:



Ing. Richard Rakouš
Oblastní ředitel
MI Roads a.s.

MI Roads a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27461

Bankovní spojení – Komerční banka, a.s., účet č. 123-6606630207/0100

IBAN: CZ8001000001236606630207, SWIFT kód (BIC): KOMBCZPP

www.mi-roads.cz

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 169021376-312661-241211094319.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **169021376-312661-241211094319**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Pardubice 19

Datum vyhotovení: **11.12.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



169021376-312661-241211094319

INF/PGP – II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah) – Správce stavby

Společnost: Hrobice

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 Libeň

Zastoupená správcem společnosti:

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 Libeň

Vyřizuje: Ing. Irena Vojnová

**Věc: Vyjádření TDI k předloženému ZBV č. 3 SO 101.1 – Silnice II/324 (PVNHČP)
Vyhrazené změny (doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)**

Vážený pane,

na základě Vašeho předložení ZBV č. 3 Vám z pozice technického dozoru investora (TDI), který zastupuje objednatele – Pardubický kraj, v rámci stavby „Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)“, sdělujeme následující stanovisko:

1. Cenové vyjádření: Ze strany TDI nejsou k předložené cenové kalkulaci žádné připomínky. Jedná se o položky které jsou již obsaženy ve smlouvě o Dílo.
2. Technické vyjádření: Potvrzujeme skutečnosti uvedené ve zdůvodnění ZBV a současně potvrzujeme kontrolu rozsahu odpovídajících prací popsanych v ZBV č. 3 zhotovitele.

V rámci dokladové části jsou doloženy relevantní doklady prokazující provedení prací, případně doměrky byly řešeny přímo při samotné realizaci SO 101.1.

Na základě výše uvedeného doporučujeme z pozice TDI, aby Správce stavby vydal příslušný pokyn v souladu s SoD a smluvními podmínkami .

S pozdravem
Ing. Irena Vojnová
Technický dozor
II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)
INFRAM a.s.

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	„Společnost: Hrobice“, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 17331099		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 04.09.2025	
Název akce: Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)			
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐
Datum: 04.09.2025			osobně ☐
<u>Předmět změny:</u>			
SO 101.2 – SANACE SVAHU V KM 0,113 (PVNHČP)			
Změny v průběhu výstavby			
ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):			
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>			
Změny z nepředvídaných důvodů (dále též „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Podmínky § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti tak byly splněny.			
Počet připojených listů specifikací:	25		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐
jiné okolnosti ☒			
Stanovisko projektanta stavby: souhlasí			
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasí			
Přílohy:			
- Podpisový list elektronického schvalování ZBV - Přehled dokladů - Průvodní list zařazení změny do skupiny (pro ZBV číslo: 04) - Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV) - Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3) - Přehled zařazení změn do Skupin - ZBV 04 - Fotodokumentace - ZBV 04 - Geodetický protokol - Plná moc Ing. Richard Rakouš - Vyjádření TDI ZBV č.4			

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 04
Zhotovitel:	„Společnost: Hrobice“, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 17331099
Změnový list vystavil:	Ing. Richard Rakouš
Datum:	04.09.2025
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/24/23439 tuto změnu rozsahu díla: <u>Předmět změny:</u> SO 101.2 – _SANACE SVAHU V KM 0,113 (PVNHČP) Změny v průběhu výstavby <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> V rámci realizace objektu SO 101.2 – gabionové zdi – bylo nezbytné provést výkop pro základovou spáru zřízením pracovní etáže, která sloužila jako přístupová a manipulační plošina pro stavební mechanizaci. Tato etáž byla klíčová z hlediska dosažitelnosti místa realizace, a to jak pro samotný výkop základové spáry, tak pro následné osazení gabionových košů a jejich zásyp. Bez provedení této etáže by nebylo technicky možné zajistit dostatečný dosah ramene rypadla, manévrovací prostor pro techniku ani bezpečný přístup pracovníků k místu výstavby. S ohledem na charakter území a stísněné podmínky staveniště bylo navíc nutné dbát na bezpečnost práce a stabilitu svahů. Postupné svahování a rozšíření výkopového prostoru byly proto provedeny v souladu s požadavky BOZP. Zároveň bylo nutné umožnit kvalitní realizaci zásypových vrstev za gabionovou zdí, které byly ukládány a hutněny po vrstvách o mocnosti 30 cm. Pro zajištění požadovaného stupně zhutnění bylo nutné zajistit nejen vhodný přístup techniky, ale také dostatečný manipulační prostor podél konstrukce, aby mohly být zásypy prováděny rovnoměrně a s požadovaným efektem. Z výše uvedených důvodů je zvýšený objem výkopových a zásypových prací považován za technologicky nezbytný a plně odůvodněný s ohledem na způsob provádění konstrukce, zajištění bezpečnosti, technologických požadavků a dosažení požadované kvality výsledného díla. Příloha: GEODETICKÝ PROTOKOL č. 12/2025 – Zaměření kubatury sanace svahu KM 0,113 Tato změna se projevila u položek č. 014102, 131738, 17481 a 18110.	
Počet připojených listů specifikací: 25	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0,00 Kč	346 048,09 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
346 048,09 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	<u>Počet stavebních dnů se nemění</u>
418 718,19 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Podpis zmocnění objednatele díla:

Podpis zmocnění zhotovitele díla:

Datum:

Datum:

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

2020700 - MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1 - PARDUBICKÝ KRAJ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 101.2 - SANACE SVAHU V KM 0,113 (PVNHČP)

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS

SO 101.2 / 4 - ZBV 04

Číslo ZBV

04

Objednatel: Pardubický kraj

Komenského náměstí 125,, 532 11 Pardubice

IČ: 70892822

Zhotovitel: MI Roads a.s.

Koželušská 2450, 18000 Praha

IČ: 17331099

Finanční rekapitulace ZBV č. 04

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04	0,00	346 048,09	346 048,09

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění,

Podpis

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	04
Evidenční číslo a název stavby:	2020700 - MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	1 - PARDUBICKÝ KRAJ
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 101.2 - SANACE SVAHU V KM 0,113 (PVNHČP)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	1 / 4 - ZBV 04

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1 / 3	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1 / 4	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)	1 / 5	
Přehled zařazení změn do Skupin	1 / 6	
ZBV 04 - Fotodokumentace	14 / 7	
ZBV 04 - Geodetický protokol	2 / 21	
Plná moc_Rakouš_konverze	2 / 23	
Vyjádření TDI ZBV č.4	1 / 25	

Průvodní list zařazení změny do skupiny**pro ZBV číslo: 04**

Údaje v Kč bez DPH

Věcně příslušný útvar:	Kořenový - útvar
Název stavby:	MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	1 / 4 - ZBV 04
Název SO/PS:	PARDUBICKÝ KRAJ
Číslo podobjektu/rozpočtu:	SO 101.2
Název podobjektu/rozpočtu:	SANACE SVAHU V KM 0,113 (PVNHČP)

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	125 803 579,60 Kč		
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	124 158 993,38 Kč		
Orient. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč	0,00%	z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orient. cena navrhovaných Změn kladných:	346 048,09 Kč	0,28%	z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	133 467 728,14 Kč	106,09%	z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny

Popis původního řešení (např. dle PDPS).

Popis návrhu Změny.

Porovnání původního řešení s navrhovaným.

Posouzení možnosti vzniku řetězení Změn.

Popis možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:**ANO / NE****(NEHODÍ SE ŠKTRNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)****ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny** (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):

Cena navrhovaných Změn záporných: 0,00 Kč

Cena navrhovaných Změn kladných: 346 048,09 Kč

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných: 346 048,09 Kč

Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Změny z nepředvídaných důvodů (dále též „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Podmínky § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti tak byly splněny

Kód položky	Název	Množství rozdílu	MJ	Rozdíl (Kč)	Rozdíl %
1	014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU	1 727,739	T	17 277,39	231,48%
4	131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	959,855	M3	159 825,46	232,22%
5	17481 ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	870,101	M3	168 390,65	277,34%
6	18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	44,120	M2	554,59	63,03%

Zpracovatel:

Jméno, funkce: ,

Podpis:

Datum:

Schvalovatel - ředitel věcně příslušného útvaru:

Jméno:

Podpis:

Datum:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro celou ZBV číslo: 04

Název stavby:

MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

1 / 4 - ZBV 04

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1 - PARDUBICKÝ KRAJ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 101.2 - SANACE SVAHU V KM 0,113 (PVNHČP)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
124 158 993,38

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-395 542,50	7 713 642,95	131 477 093,83	7 318 100,45

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	346 048,09	8 059 691,04	6,49

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-395 542,50	131 823 141,92	7 664 148,54	6,17

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Projektant (autorský dozor)

Stavební dozor:

Správce stavby:

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 04.3

Evidenční číslo a název stavby: 2020700 - MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP Číslo a název SO/PS: 1 - PARDUBICKÝ KRAJ Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - SANACE SVAHU V KM 0,113 (PVNHČP)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 4 - ZBV 04					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	746,380	2 474,119	1 727,739	10,00	7 463,80	0,00	17 277,39	24 741,19	17 277,39	231,48
4	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	413,345	1 373,200	959,855	166,51	68 826,08	0,00	159 825,46	228 651,54	159 825,46	232,22
5	17481	ZÁSYV JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	313,729	1 183,830	870,101	193,53	60 715,97	0,00	168 390,65	229 106,62	168 390,65	277,34
6	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	70,000	114,120	44,120	12,57	879,90	0,00	554,59	1 434,49	554,59	63,03
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						137 885,75	0,00	346 048,09	483 933,84	346 048,09	250,97

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:		MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP - 2020700				Sledování limitu 50 % od účinnosti novely ZZVZ je ponecháno jen pro nezávaznou informaci				Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15% z Přijaté smluvní částky		do 31.12.2021	od 1.1.2022	od 1.1.2024	a max. 137 366 000 Kč do 31.12.2021	a max. 140 448 000 Kč od 1.1.2022	a max. 135 348 000 Kč od 1.1.2024		
1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	125 803 579,60 Kč	6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a 4	6 751 528,16 Kč	bez ABS	9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	5,53%	ABS	12=39	Sledování čerpání limitu	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	133 467 728,14 Kč	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % součet Skupiny 3 a Skupiny 4	5,37%		10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS	13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	ABS
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	106,09%	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	37 741 073,88 Kč		11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	62 901 789,80 Kč		14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky				0,00%	0,00%	0,00%	ABS
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,73%																	
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%																	
15 % z Přijaté smluvní částky		18 870 536,94 Kč														OK v limitu	OK v limitu	OK v limitu	

						Skupiny změn																			
						-1-			-2-			-3-					-4-				-5-				-6-
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) v rámci limitu 30% lze odečíst pouze změny záporné, které se změnami kladnými přímo souvisí					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Suma Změn záporných nesouvisející se Změnami kladnými nezapočítává se do limitu 30 %	Změny kladné	Suma Změn kladných a Změn záporných, které souvisí se Změnami kladnými (hodnota jde do výpočtu limitu 30 %)	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28.a	28.b	29	30=28.a+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=[39/1]+100	39= 36 +37	40
			- 395 542,50 Kč	8 059 691,04 Kč	7 664 148,54 Kč	- 292 719,62 Kč	1 205 340,00 Kč	912 620,38 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 102 822,88 Kč	0,00 Kč	6 854 351,04 Kč	6 751 528,16 Kč	6 957 173,92 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	01	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 01 Nebezpečný odpad	- 102 822,88 Kč	4 919 073,00 Kč	4 816 250,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 102 822,88 Kč	0,00 Kč	4 919 073,00 Kč	4 816 250,12 Kč	5 021 895,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	02	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 02 Sanace podloží	0,00 Kč	1 589 229,95 Kč	1 589 229,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 589 229,95 Kč	1 589 229,95 Kč	1 589 229,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	03	PARDUBICKÝ KRAJ / Změny vyhrazené_doměrky	- 292 719,62 Kč	1 205 340,00 Kč	912 620,38 Kč	- 292 719,62 Kč	1 205 340,00 Kč	912 620,38 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	04	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny	0,00 Kč	346 048,09 Kč	346 048,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	346 048,09 Kč	346 048,09 Kč	346 048,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení

Vyhodnocení limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky v řádku 7 sloupce W, X, Y jsou orientační. Pro sledování limitů je vždy rozhodující datum schválení daného ZBV a limity platné v roce, kdy bylo ZBV schváleno oprávněnou osobou Objednatele.

Sledování limitu 50 % od účinnosti novely ZZVZ je ponecháno jen pro nezávaznou informaci Objednatele

Legenda:

ZBV s datem schválení do 31.12.2021

ZBV s datem schválení od 1.1.2022

ZBV s datem schválení od 1.1.2024

ZBV bez datu schválení:






























Název akce:

**Modernizace silnice II/324
Staré Hradiště – Hrobice (průtah)**


Zaměření kubatury sanace svahu KM 0,113


Geodetický protokol č.:	12/2025
Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Zakázkové číslo:	15/2024
Objednatel:	MI Roads a.s.
Zpracovatel geodetických prací:	A.G.E.S. Engineering CZ s.r.o. nám. ČS Legií 851 530 02 Pardubice
Geodetické práce provedli:	
Datum měření:	říjen 2024
Kubatura – 1373,2 m ³	

V Pardubicích dne 22.7.2025

Technickou zprávu vyhotovil: 

Ověřil: 





Kubatura: 1373.2 m³



PLNÁ MOC

Společnost **MI Roads a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, identifikační číslo 17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: B 27461 (dále též jen „zmocnitel“), jehož zastupuje správní rada společnosti jednající Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady, a Ing. Markem Steinerem, členem správní rady, tímto **zmocňuje**:


Ing. Richarda Rakouše

zaměstnance zmocnitele, datum narození [REDACTED] 1972, bydliště [REDACTED] Praha8
(dále jen „zmocněnec“)


K jednání za zmocnitele při administraci změn díla u stavby „Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)“ kterou zmocnitel jako zhotovitel provádí pro Pardubický kraj. Zmocněnec je takto za zmocnitele oprávněn projednávat změny díla, podepisovat dokumentaci k těmto změnám se vztahující (zejména tedy změnové listy) a činit další úkony přímo související s administrací změn díla u výše uvedené stavby.

Toto zmocnění souvisí s prováděním výše uvedené stavby a zmocněnec je oprávněn jednat za zmocnitele ve shora uvedeném rozsahu pouze v souvislosti s touto stavbou. Udělené zmocnění zaniká nejpozději 31. 12. 2025.

V Praze dne 01. 10. 2024




Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady
MI Roads a.s.



Ing. Marek Steiner
člen správní rady
MI Roads a.s.

V Srchu dne 01. 10. 2024 zmocnění za zmocněnce přijímám:



Ing. Richard Rakouš
Oblastní ředitel
MI Roads a.s.

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 169021376-312661-241211094319.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **169021376-312661-241211094319**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Pardubice 19

Datum vyhotovení: **11.12.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



169021376-312661-241211094319

INF/PGP – II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah) – Správce stavby

Společnost: Hrobice

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 Libeň

Zastoupená správcem společnosti:

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 Libeň

Vyřizuje: Ing. Irena Vojnová

Věc: Vyjádření TDI k předloženému ZBV č. 4 SO 101.2 - SANACE SVAHU V KM 0,113 (PVNHČP)

Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):

Vážený pane,

na základě Vašeho předložení ZBV č. 4 Vám z pozice technického dozoru investora (TDI), který zastupuje objednatele – Pardubický kraj, v rámci stavby „Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)“, sdělujeme následující stanovisko:

1. Cenové vyjádření: Ze strany TDI nejsou k předložené cenové kalkulaci žádné připomínky. Jedná se o položky, které jsou již obsaženy ve smlouvě o Dílo.
2. Technické vyjádření: Potvrzujeme skutečnosti uvedené ve zdůvodnění ZBV a současně potvrzujeme kontrolu rozsahu odpovídajících prací popsanych v ZBV č. 4 zhotovitele.

V rámci dokladové části jsou doloženy relevantní doklady prokazující provedení prací dle předloženého soupisu prací

Na základě výše uvedeného doporučujeme z pozice TDI, aby Správce stavby vydal příslušný pokyn v souladu s SoD a smluvními podmínkami.

S pozdravem

Ing. Irena Vojnová

Technický dozor

II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)

INFRAM a.s.



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 05	
Zhotovitel:	„Společnost: Hrobice“, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 17331099		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 06.08.2025	
Název akce: Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)			
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐
Datum: 06.08.2025			osobně ☐
<u>Předmět změny:</u> SO 101.6 – NOVÁ TRASA METROPOLITNÍ SÍTĚ (PVNHČP) Změny v průběhu výstavby ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazené změny (doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.): <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.			
Počet připojených listů specifikací:	7		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Stanovisko projektanta stavby: souhlasí Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasí Přílohy: - Podpisový list elektronického schvalování ZBV - Přehled dokladů - Průvodní list zařazení změny do skupiny (pro ZBV číslo: 05) - Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV) - Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1) - Přehled zařazení změn do Skupin - Plná moc Ing. Richard Rakouš - Vyjádření TDI ZBV č.5			

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 05
Zhotovitel:	„Společnost: Hrobice“, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 17331099
Změnový list vystavil:	Ing. Richard Rakouš
Datum:	06.08.2025
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/24/23439 tuto změnu rozsahu díla: <u>Předmět změny:</u> SO 101.6 – NOVÁ TRASA METROPOLITNÍ SÍTĚ (PVNHČP) Změny v průběhu výstavby ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazené změny (doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.): <u>Popis a zdůvodnění změny</u> Po dokončení stavebních prací došlo k zaměření skutečně provedeného stavu měřených položek uvedených v soupisu prací, čímž došlo k upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Tato změna se dále eviduje v Evidenčním listu vyhrazené změny. Do Skupiny 1 zařazujeme kladné položky č. 02, 08, 09, 11, 13, 26, 27, 33 a 34, záporné položky č. 03, 04 a 12.	
Počet připojených listů specifikací: 7	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
- 1 901,85 Kč	119 410,86 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
117 509,01 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	<u>Počet stavebních dnů se nemění</u>
142 185,90 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum:

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

2020700 - MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1 - PARDUBICKÝ KRAJ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 101.6 - NOVÁ TRASA METROPOLITNÍ SÍTĚ (PVNHČP)

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS

SO 101.6 / 5 - ZBV 05

Číslo ZBV

05

Objednatel: Pardubický kraj

Komenského náměstí 125,, 532 11 Pardubice

IČ: 70892822

Zhotovitel: MI Roads a.s.

Koželušská 2450, 18000 Praha

IČ: 17331099

Finanční rekapitulace ZBV č. 05

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05	-1 901,85	119 410,86	117 509,01

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění,

Podpis

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	05
Evidenční číslo a název stavby:	2020700 - MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	1 - PARDUBICKÝ KRAJ
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 101.6 - NOVÁ TRASA METROPOLITNÍ SÍTĚ (PVNHČP)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	1 / 5 - ZBV 05

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1)	1 / 3	
Přehled zařazení změn do Skupin	1 / 4	
Plná moc_Rakouš_konverze	2 / 5	
Vyjádření TDI ZBV č.5	1 / 7	

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 05.1

Evidenční číslo a název stavby: 2020700 - MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP Číslo a název SO/PS: 1 - PARDUBICKÝ KRAJ Číslo a název rozpočtu: SO 101.6 - NOVÁ TRASA METROPOLITNÍ SÍTĚ (PVNHČP)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 5 - ZBV 05					
								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	02	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4	M	145,000	148,920	3,920	235,60	34 162,00	0,00	923,55	35 085,55	923,55	2,70
3	03	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir. 70cm hlub.,zem.tř.4	M	832,000	827,420	-4,580	142,34	118 426,88	-651,92	0,00	117 774,96	-651,92	-0,55
4	04	Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.8cm,	M	832,000	827,420	-4,580	179,65	149 468,80	-822,80	0,00	148 646,00	-822,80	-0,55
8	08	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	M3	18,000	18,764	0,764	2 886,11	51 949,98	0,00	2 204,99	54 154,97	2 204,99	4,24
9	09	Doprava betonu na stavbu	M3	18,000	18,764	0,764	441,75	7 951,50	0,00	337,50	8 289,00	337,50	4,24
11	11	Ruční zához kabelové rýhy 35cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4	M	145,000	148,920	3,920	154,12	22 347,40	0,00	604,15	22 951,55	604,15	2,70
12	12	Ruční zához kabelové rýhy 35cm šir.,70cm hlub.,zem.tř.4	M	832,000	827,420	-4,580	93,26	77 592,32	-427,13	0,00	77 165,19	-427,13	-0,55
13	13	Doprava písku na stavbu	M3	59,000	70,332	11,332	245,42	14 479,78	0,00	2 781,10	17 260,88	2 781,10	19,21
26	26	Trubka HDPE do pr. 75mm volně uložená, montáž + dodávka	M	1 680,000	1 952,680	272,680	171,79	288 607,20	0,00	46 843,70	335 450,90	46 843,70	16,23
27	27	Svazek mikrotrubiček 4 x 12/10 mm	M	840,000	976,340	136,340	57,92	48 652,80	0,00	7 896,81	56 549,61	7 896,81	16,23
33	33	Tlakování trubky HDPE do pr. 75mm	M	5 040,000	5 858,040	818,040	63,81	321 602,40	0,00	52 199,13	373 801,53	52 199,13	16,23
34	34	Kalibrace trubky HDPE do pr. 75mm	M	5 040,000	5 858,040	818,040	6,87	34 624,80	0,00	5 619,93	40 244,73	5 619,93	16,23
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						1 169 865,86	-1 901,85	119 410,86	1 287 374,87	117 509,01	10,04

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:		MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP - 2020700				Sledování limitu 50 % od účinnosti novely ZZVZ je ponecháno jen pro nezávaznou informaci				Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15% z Přijaté smluvní částky		do 31.12.2021	od 1.1.2022	od 1.1.2024	a max. 137 366 000 Kč do 31.12.2021	a max. 140 448 000 Kč od 1.1.2022	a max. 135 348 000 Kč od 1.1.2024	
1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	125 803 579,60 Kč	6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a 4	6 751 528,16 Kč	9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	5,53%	12=39	Sledování čerpání limitu	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	133 585 237,15 Kč	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % součet Skupiny 3 a Skupiny 4	5,37%	10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč		
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	106,19%	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	37 741 073,88 Kč	11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	62 901 789,80 Kč	14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky				0,00%	0,00%	0,00%		
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,82%															OK v limitu	OK v limitu
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%															OK v limitu	OK v limitu
15 % z Přijaté smluvní částky		18 870 536,94 Kč																

						Skupiny změn																			
						-1-			-2-			-3-					-4-				-5-				-6-
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) v rámci limitu 30% lze odečíst pouze změny záporné, které se změnami kladnými přímo souvisí					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Suma Změn záporných nesouvisející se Změnami kladnými nezapočítává se do limitu 30 %	Změny kladné	Suma Změn kladných a Změn záporných, které souvisí se Změnami kladnými (hodnota jde do výpočtu limitu 30 %)	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28.a	28.b	29	30=28.a+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(39/1)*100	39= 36 +37	40
			- 397 444,35 Kč	8 179 101,90 Kč	7 781 657,55 Kč	- 294 621,47 Kč	1 324 750,86 Kč	1 030 129,39 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 102 822,88 Kč	0,00 Kč	6 854 351,04 Kč	6 751 528,16 Kč	6 957 173,92 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	01	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 01 Nebezpečný odpad	- 102 822,88 Kč	4 919 073,00 Kč	4 816 250,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 102 822,88 Kč	0,00 Kč	4 919 073,00 Kč	4 816 250,12 Kč	5 021 895,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	02	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 02 Sanace podloží	0,00 Kč	1 589 229,95 Kč	1 589 229,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 589 229,95 Kč	1 589 229,95 Kč	1 589 229,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	03	PARDUBICKÝ KRAJ / Změny vyhrazené_doměrky	- 292 719,62 Kč	1 205 340,00 Kč	912 620,38 Kč	- 292 719,62 Kč	1 205 340,00 Kč	912 620,38 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	04	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny	0,00 Kč	346 048,09 Kč	346 048,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	346 048,09 Kč	346 048,09 Kč	346 048,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	05	PARDUBICKÝ KRAJ / Změny vyhrazené_doměrky	- 1 901,85 Kč	119 410,86 Kč	117 509,01 Kč	- 1 901,85 Kč	119 410,86 Kč	117 509,01 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení

Vyhodnocení limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky v řádku 7 sloupce W, X, Y jsou orientační. Pro sledování limitů je vždy rozhodující datum schválení daného ZBV a limity platné v roce, kdy bylo ZBV schváleno oprávněnou osobou Objednatele.

Sledování limitu 50 % od účinnosti novely ZZVZ je ponecháno jen pro nezávaznou informaci Objednatele

- Legenda:**
- ZBV s datemem schválení do 31.12.2021
- ZBV s datemem schválení od 1.1.2022
- ZBV s datemem schválení od 1.1.2024
- ZBV bez datumu schválení:

PLNÁ MOC

Společnost **MI Roads a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, identifikační číslo 17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: B 27461 (dále též jen „zmocnitel“), jehož zastupuje správní rada společnosti jednající Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady, a Ing. Markem Steinerem, členem správní rady, tímto **zmocňuje**:

Ing. Richarda Rakouše

zaměstnance zmocnitele, datum narození [REDACTED] 1972, bydliště [REDACTED] Praha8
(dále jen „zmocněnec“)

K jednání za zmocnitele při administraci změn díla u stavby „Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)“ kterou zmocnitel jako zhotovitel provádí pro Pardubický kraj. Zmocněnec je takto za zmocnitele oprávněn projednávat změny díla, podepisovat dokumentaci k těmto změnám se vztahující (zejména tedy změnové listy) a činit další úkony přímo související s administrací změn díla u výše uvedené stavby.

Toto zmocnění souvisí s prováděním výše uvedené stavby a zmocněnec je oprávněn jednat za zmocnitele ve shora uvedeném rozsahu pouze v souvislosti s touto stavbou. Udělené zmocnění zaniká nejpozději 31. 12. 2025.

V Praze dne 01. 10. 2024

[REDACTED]
Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady
MI Roads a.s.

[REDACTED]
Ing. Marek Steiner
člen správní rady
MI Roads a.s.

V Srchu dne 01. 10. 2024 zmocnění za zmocněnce přijímám:

[REDACTED]
Ing. Richard Rakouš
Oblastní ředitel
MI Roads a.s.

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 169021376-312661-241211094319.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **169021376-312661-241211094319**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Pardubice 19

Datum vyhotovení: **11.12.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



169021376-312661-241211094319

INF/PGP – II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah) – Správce stavby

Společnost: Hrobice

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 Libeň

Zastoupená správcem společnosti:

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 Libeň

Vyřizuje: Ing. Irena Vojnová

Věc: Vyjádření TDI k předloženému ZBV č. 5 SO 101.6 - NOVÁ TRASA METROPOLITNÍ SÍTĚ (PVNHČP)

Vyhrazené změny (doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)

Vážený pane,

na základě Vašeho předložení ZBV č. 5 Vám z pozice technického dozoru investora (TDI), který zastupuje objednatele – Pardubický kraj, v rámci stavby „*Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)*“, sdělujeme následující stanovisko:

1. Cenové vyjádření: Ze strany TDI nejsou k předložené cenové kalkulaci žádné připomínky. Jedná se o položky, které jsou již obsaženy ve smlouvě o Dílo.
2. Technické vyjádření: Potvrzujeme skutečnosti uvedené ve zdůvodnění ZBV a současně potvrzujeme kontrolu rozsahu odpovídajících prací popsanych v ZBV č. 5 zhotovitele.

V rámci dokladové části jsou doloženy relevantní doklady prokazující provedení prací dle předloženého soupisu prací.

Na základě výše uvedeného doporučujeme z pozice TDI, aby Správce stavby vydal příslušný pokyn v souladu s SoD a smluvními podmínkami.

S pozdravem

Ing. Irena Vojnová

Technický dozor

II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)

INFRAM a.s.

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 06	
Zhotovitel:	„Společnost: Hrobice“, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 17331099		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 03.09.2025	
Název akce: Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)			
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐
Datum: 03.09.2025			osobně ☐
Předmět změny: SO 102.1 – Silnice II/324 (PVNHČP) Změny v průběhu výstavby			
ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazené změny (doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.): Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.			
Počet připojených listů specifikací:	13		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Stanovisko projektanta stavby: souhlasí Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasí			
Přílohy: - Podpisový list elektronického schvalování ZBV - Přehled dokladů - Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1) - Přehled zařazení změn do Skupin - Geodetický protokol č.6_2025 - Geodetický protokol č.7_2025 - Geodetický protokol č.9_2025 - Plná moc Ing. Richard Rakouš - Vyjádření TDI ZBV č.6			

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 06		
Zhotovitel:	„Společnost: Hrobice“, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ:17331099		
Změnový list vystavil:	Ing. Richard Rakouš		
Datum:	03.09.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/24/23439 tuto změnu rozsahu díla: <u>Předmět změny:</u> SO 102.1 – Silnice II/324 (PVNHČP) Změny v průběhu výstavby <u>Popis a zdůvodnění změny</u> ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazené změny (doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.): Po dokončení stavebních prací došlo k zaměření skutečně provedeného stavu měřených položek uvedených v soupisu prací, čímž došlo k upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Tato změna se dále eviduje v Evidenčním listu vyhrazené změny. Do Skupiny 1 zařazujeme kladné položky č. 014102 03, 113728 01, 113728 02, 121108 02, 131738, 131838, 17380 02, 18110 01, 18110 02, 21452, 21461H, 56213, 56333, 572123, 574E68, 91228 01 a 914921 a záporné položky č. 121108 01, 125738, 18215, 18231, 18241, 18247, 572213 04, 572213 01, 572213 02, 572213 03, 574A44 01, 574A44 02, 574C56 01, 574C56 02.			
Počet připojených listů specifikací: 13		Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :		Cena víceprací bez DPH :	
-155 177,66 Kč		351 946,27 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
196 768,61 Kč		<u>Termín dokončení díla se nemění</u>	
Výsledná cena změny s DPH :		<u>Počet stavebních dnů se nemění</u>	
238 090,01 Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele díla:		Podpis zmocněnce zhotovitele díla:	
Datum:		Datum:	

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

2020700 - MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1 - PARDUBICKÝ KRAJ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 102.1 - SILNICE II/324 (PVNHČP)

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS

SO 102.1 / 6

Číslo ZBV

06

Objednatel: Pardubický kraj

Komenského náměstí 125,, 532 11 Pardubice

IČ: 70892822

Zhotovitel: MI Roads a.s.

Koželužská 2450, 18000 Praha

IČ: 17331099

Finanční rekapitulace ZBV č. 06

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
06	-155 177,66	351 946,27	196 768,61

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění,

Podpis

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	06
Evidenční číslo a název stavby:	2020700 - MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	1 - PARDUBICKÝ KRAJ
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 102.1 - SILNICE II/324 (PVNHČP)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	1 / 6

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1)	2 / 3	
Přehled zařazení změn do Skupin	1 / 5	
Geodetický protokol č.6_2025	1 / 6	
Geodetický protokol č.7_2025	2 / 7	
Geodetický protokol č.9_2025	2 / 9	
Plná moc_Rakouš_konverze	2 / 11	
Vyjádření TDI ZBV č.6	1 / 13	

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 06.1

Evidenční číslo a název stavby: 2020700 - MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP Číslo a název SO/PS: 1 - PARDUBICKÝ KRAJ Číslo a název rozpočtu: SO 102.1 - SILNICE II/324 (PVNHČP)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 6 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	014102.03	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	11 452,454	11 611,508	159,054	10,00	114 524,54	0,00	1 590,54	116 115,08	1 590,54	1,39
6	113728.01	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	548,411	552,300	3,889	484,05	265 458,34	0,00	1 882,47	267 340,81	1 882,47	0,71
7	113728.02	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	927,610	966,800	39,190	484,05	449 009,62	0,00	18 969,92	467 979,54	18 969,92	4,22
9	121108.01	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	744,343	734,173	-10,170	93,33	69 469,53	-949,17	0,00	68 520,36	-949,17	-1,37
10	121108.02	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	332,222	342,392	10,170	93,33	31 006,28	0,00	949,17	31 955,45	949,17	3,06
11	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	744,343	734,173	-10,170	193,40	143 955,94	-1 966,88	0,00	141 989,06	-1 966,88	-1,37
12	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	4 726,260	4 934,000	207,740	166,51	786 969,55	0,00	34 590,79	821 560,34	34 590,79	4,40
13	131838	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	667,745	755,600	87,855	198,56	132 587,45	0,00	17 444,49	150 031,94	17 444,49	13,16
15	17380.02	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	337,298	368,354	31,056	1 136,63	383 383,03	0,00	35 299,18	418 682,21	35 299,18	9,21
17	18110.01	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 669,362	1 842,755	173,393	12,57	20 983,88	0,00	2 179,55	23 163,43	2 179,55	10,39
18	18110.02	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	8 346,810	9 213,776	866,966	12,57	104 919,40	0,00	10 897,76	115 817,16	10 897,76	10,39
19	18215	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2	7 443,432	7 341,732	-101,700	16,30	121 327,94	-1 657,71	0,00	119 670,23	-1 657,71	-1,37
20	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	7 443,432	7 341,732	-101,700	16,45	122 444,46	-1 672,97	0,00	120 771,49	-1 672,97	-1,37
21	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	7 443,432	7 341,732	-101,700	18,46	137 405,75	-1 877,38	0,00	135 528,37	-1 877,38	-1,37
22	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	7 443,432	7 341,732	-101,700	2,56	19 055,19	-260,35	0,00	18 794,84	-260,35	-1,37
26	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	667,745	750,100	82,355	410,78	274 296,29	0,00	33 829,79	308 126,08	33 829,79	12,33
27	21461H	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 1000G/M2	M2	1 669,362	1 855,200	185,838	59,44	99 226,88	0,00	11 046,21	110 273,09	11 046,21	11,13
29	56213	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM	M2	5 986,261	6 157,900	171,639	246,41	1 475 074,57	0,00	42 293,57	1 517 368,14	42 293,57	2,87
30	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	7 595,726	8 512,200	916,474	130,41	990 558,63	0,00	119 517,37	1 110 076,00	119 517,37	12,07
31	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	5 664,367	5 716,600	52,233	27,38	155 090,37	0,00	1 430,14	156 520,51	1 430,14	0,92
32	572213.01	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 342,474	5 186,753	-155,721	13,42	71 696,00	-2 089,78	0,00	69 606,22	-2 089,78	-2,91
33	572213.02	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 127,879	4 983,351	-144,528	13,42	68 816,14	-1 939,57	0,00	66 876,57	-1 939,57	-2,82
34	572213.03	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 816,485	5 646,947	-169,538	13,42	78 057,23	-2 275,20	0,00	75 782,03	-2 275,20	-2,91
35	572213.04	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 816,485	5 652,549	-163,936	13,42	78 057,23	-2 200,02	0,00	75 857,21	-2 200,02	-2,82
36	574A44.01	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	5 127,879	4 983,351	-144,528	213,04	1 092 443,34	-30 790,25	0,00	1 061 653,09	-30 790,25	-2,82
37	574A44.02	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	5 816,485	5 652,549	-163,936	214,81	1 249 439,14	-35 215,09	0,00	1 214 224,05	-35 215,09	-2,82
38	574C56.01	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	5 342,474	5 186,753	-155,721	223,14	1 192 119,65	-34 747,58	0,00	1 157 372,07	-34 747,58	-2,91
39	574C56.02	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	5 816,485	5 646,947	-169,538	221,40	1 287 769,78	-37 535,71	0,00	1 250 234,07	-37 535,71	-2,91
40	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	5 664,367	5 716,600	52,233	245,66	1 391 508,40	0,00	12 831,56	1 404 339,96	12 831,56	0,92
46	91228.01	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	49,000	51,000	2,000	393,76	19 294,24	0,00	787,52	20 081,76	787,52	4,08

53	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	25,000	27,000	2,000	3 203,12	80 078,00	0,00	6 406,24	86 484,24	6 406,24	8,00
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						12 506 026,79	-155 177,66	351 946,27	12 702 795,40	196 768,61	1,57

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:		MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP - 2020700		Sledování limitu 50 % od účinnosti novely ZZVZ je ponecháno jen pro nezávaznou informaci		Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15% z Přijaté smluvní částky		do 31.12.2021	od 1.1.2022	od 1.1.2024	a max. 137 366 000 Kč do 31.12.2021	a max. 140 448 000 Kč od 1.1.2022	a max. 135 348 000 Kč od 1.1.2024			
1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	125 803 579,60 Kč	6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a 4	6 751 528,16 Kč	9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	5,53%	12=39	Sledování čerpání limitu	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	133 664 496,75 Kč	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % součet Skupiny 3 a Skupiny 4	5,37%	10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	106,25%	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	37 741 073,88 Kč	11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	62 901 789,80 Kč	14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,00%	0,00%	0,00%	
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,88%														
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%														
15 % z Přijaté smluvní částky		18 870 536,94 Kč														
												OK v limitu	OK v limitu	OK v limitu		

						Skupiny změn																			
						-1-			-2-			-3-					-4-				-5-				-6-
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) v rámci limitu 30% lze odečíst pouze změny záporné, které se změnami kladnými přímo souvisí					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Suma Změn záporných nesouvisející se Změnami kladnými nezapočítává se do limitu 30 %	Změny kladné	Suma Změn kladných a Změn záporných, které souvisí se Změnami kladnými (hodnota jde do výpočtu limitu 30 %)	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28.a	28.b	29	30=28.a+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(39/1)*100	39= 36 +37	40
			- 550 720,16 Kč	8 411 637,31 Kč	7 860 917,15 Kč	- 447 897,28 Kč	1 557 286,27 Kč	1 109 388,99 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 102 822,88 Kč	0,00 Kč	6 854 351,04 Kč	6 751 528,16 Kč	6 957 173,92 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	01	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 01 Nebezpečný odpad	- 102 822,88 Kč	4 919 073,00 Kč	4 816 250,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 102 822,88 Kč	0,00 Kč	4 919 073,00 Kč	4 816 250,12 Kč	5 021 895,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	02	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 02 Sanace podloží	0,00 Kč	1 589 229,95 Kč	1 589 229,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 589 229,95 Kč	1 589 229,95 Kč	1 589 229,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	03	PARDUBICKÝ KRAJ / Změny vyhrazené_doměrky	- 292 719,62 Kč	1 205 340,00 Kč	912 620,38 Kč	- 292 719,62 Kč	1 205 340,00 Kč	912 620,38 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	04	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny	0,00 Kč	346 048,09 Kč	346 048,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	346 048,09 Kč	346 048,09 Kč	346 048,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	06	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 06 Změny vyhrazené_doměrky	- 155 177,66 Kč	351 946,27 Kč	196 768,61 Kč	- 155 177,66 Kč	351 946,27 Kč	196 768,61 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení

Vyhodnocení limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky v řádku 7 sloupce W, X, Y jsou orientační. Pro sledování limitů je vždy rozhodující datum schválení daného ZBV a limity platné v roce, kdy bylo ZBV schváleno oprávněnou osobou Objednatele.

Sledování limitu 50 % od účinnosti novely ZZVZ je ponecháno jen pro nezávaznou informaci Objednatele

- Legenda:**
- ZBV s datemem schválení do 31.12.2021
- ZBV s datemem schválení od 1.1.2022
- ZBV s datemem schválení od 1.1.2024
- ZBV bez datumu schválení:

Název akce:

Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)

Zaměření ploch a kubatur SO102

Geodetický protokol č.: 6/2025
 Souřadnicový systém: S-JTSK
 Výškový systém: Bpv
 Zakázkové číslo: 15/2024
 Objednatel: MI Roads a.s.
 Zpracovatel geodetických prací: A.G.E.S. Engineering CZ s.r.o.
 nám. ČS Legií 851
 530 02 Pardubice

Geodetické práce provedli:



Datum měření:

srpen 2024 – květen 2025

Položka	Kubatura [m³]
Hloubení jam tř. I	4934,0
Hloubení jam tř. II	755,6
Zásyp jam a rýh	3251,5
Sanační vrstvy z kameniva	750,1


Položka	Plocha [m²]
Separační geotextilie	1855,2

V Pardubicích dne 25.6.2025

Technickou zprávu vyhotovil:



Ověřil:



Název akce:

Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)

Zaměření frézování vozovky SO102


Geodetický protokol č.:	7/2025
Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Zakázkové číslo:	15/2024
Objednatel:	MI Roads a.s.
Zpracovatel geodetických prací:	A.G.E.S. Engineering CZ s.r.o. nám. ČS Legií 851 530 02 Pardubice
Geodetické práce provedli:	
Datum měření:	srpen 2024


Pr. tloušťka [mm]	Plocha [m ²]	Kubatura [m ³]
109	5067,3	552,3
235	4114,0	966,8

V Pardubicích dne 25.6.2025

Technickou zprávu vyhotovil: [redacted]

Ověřil: [redacted]





Název akce:

Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)

Zaměření vozovkových vrstev SO102


Geodetický protokol č.:	9/2025
Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Zakázkové číslo:	15/2024
Objednatel:	MI Roads a.s.
Zpracovatel geodetických prací:	A.G.E.S. Engineering CZ s.r.o. nám. ČS Legií 851 530 02 Pardubice
Geodetické práce provedli:	
Datum měření:	září 2024 – květen 2025

Vrstva	Plocha [m ²]
ACO 11+	10635,9
ACL 16+	10833,7
ACP 22+	5716,6
SC	6157,9
ŠDA	8512,2

V Pardubicích dne 25.6.2025

Technickou zprávu vyhotovil: [redacted]

Ověřil: [redacted]



PLNÁ MOC

Společnost **MI Roads a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, identifikační číslo 17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: B 27461 (dále též jen „zmocnitel“), jehož zastupuje správní rada společnosti jednající Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady, a Ing. Markem Steinerem, členem správní rady, tímto **zmocňuje**:


Ing. Richarda Rakouše

zaměstnance zmocnitele, datum narození [REDACTED] 1972, bydliště [REDACTED] Praha8
(dále jen „zmocněnec“)

K jednání za zmocnitele při administraci změn díla u stavby „Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)“ kterou zmocnitel jako zhotovitel provádí pro Pardubický kraj. Zmocněnec je takto za zmocnitele oprávněn projednávat změny díla, podepisovat dokumentaci k těmto změnám se vztahující (zejména tedy změnové listy) a činit další úkony přímo související s administrací změn díla u výše uvedené stavby.

Toto zmocnění souvisí s prováděním výše uvedené stavby a zmocněnec je oprávněn jednat za zmocnitele ve shora uvedeném rozsahu pouze v souvislosti s touto stavbou. Udělené zmocnění zaniká nejpozději 31. 12. 2025.

V Praze dne 01. 10. 2024




Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady
MI Roads a.s.



Ing. Marek Steiner
člen správní rady
MI Roads a.s.

V Srchu dne 01. 10. 2024 zmocnění za zmocněnce přijímám:



Ing. Richard Rakouš
Oblastní ředitel
MI Roads a.s.

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 169021376-312661-241211094319.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **169021376-312661-241211094319**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Pardubice 19

Datum vyhotovení: **11.12.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



169021376-312661-241211094319

INF/PGP – II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah) – Správce stavby

Společnost: Hrobice

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 Libeň

Zastoupená správcem společnosti:

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 Libeň

Vyřizuje: Ing. Irena Vojnová

Věc: Vyjádření TDI k předloženému ZBV č. 6 SO 102.1 – Silnice II/324 (PVNHČP)

Vyhrazené změny (doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)

Vážený pane,

na základě Vašeho předložení ZBV č. 5 Vám z pozice technického dozoru investora (TDI), který zastupuje objednatele – Pardubický kraj, v rámci stavby „Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)“, sdělujeme následující stanovisko:

1. Cenové vyjádření: Ze strany TDI nejsou k předložené cenové kalkulaci žádné připomínky. Jedná se o položky, které jsou již obsaženy ve smlouvě o Dílo.
2. Technické vyjádření: Potvrzujeme skutečnosti uvedené ve zdůvodnění ZBV a současně potvrzujeme kontrolu rozsahu odpovídajících prací popsaných v ZBV č. 6 zhotovitele.

V rámci dokladové části jsou doloženy relevantní doklady prokazující provedení prací dle předloženého soupisu prací

Na základě výše uvedeného doporučujeme z pozice TDI, aby Správce stavby vydal příslušný pokyn v souladu s SoD a smluvními podmínkami.

S pozdravem

Ing. Irena Vojnová

Technický dozor

II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)

INFRAM a.s.



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 07	
Zhotovitel:	„Společnost: Hrobice“, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 17331099		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 02.09.2025	
Název akce: Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)			
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐
Datum: 02.09.2025			osobně ☐
Předmět změny:			
SO 102.1 – Silnice II/324 (PVNHČP)			
Změny v průběhu výstavby			
ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změny z nepředvídaných důvodů (dále též „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Podmínky § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti tak byly splněny.			
Počet připojených listů specifikací:	26		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Stanovisko projektanta stavby: souhlasí			
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasí			
Přílohy:			
- Podpisový list elektronického schvalování ZBV - Přehled dokladů - Průvodní list zařazení změny do skupiny (pro ZBV číslo: 03) - Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV) - Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3) - Přehled nových položek - Přehled zařazení změn do Skupin - 250131_Vyjadreni geotechnika SO 102 - 3-2025-Staré Hradiště-Hrobice-kubatura násypu KM1.120-1.300 - Plná moc Ing. Richard Rakouš - Vyjádření TDI ZBV č.7 - ZBV 07 - foto_propustek KM 1,124 - ZBV 07 - foto_svodidla - ZBV 07 - foto zásypy KM 1,1-1,3			

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 07
Zhotovitel:	„Společnost: Hrobice“, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 17331099
Změnový list vystavil:	Ing. Richard Rakouš
Datum:	02.09.2025
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/24/23439 tuto změnu rozsahu díla: <u>Předmět změny:</u> SO 102.1 – Silnice II/324 (PVNHČP) Změny v průběhu výstavby <u>Popis a zdůvodnění změny</u> V průběhu realizace díla „Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)“ došlo v úseku km 1,100–1,300 v prostoru narovnání oblouku k zastižení podloží s nevyhovujícími fyzikálně-mechanickými parametry, které neumožňovalo provedení násypu dle předpokladů projektové dokumentace. Vlivem převlhlčení zemní pláně a výskytu málo únosných jemnozrnných zemin došlo k degradaci konstrukční funkce podloží. Tato skutečnost byla posouzena jako nepředvídatelné fyzické podmínky ve smyslu čl. 4.12 Smluvních podmínek FIDIC a vyžádala si okamžitá opatření směřující k zajištění stability a únosnosti konstrukčních vrstev. Na základě odborného vyjádření nezávislého geotechnika bylo navrženo provést sanaci podloží uložením separační geotextilie a vrstvy kameniva frakce 0/125 mm v minimální tloušťce 0,5 m. Tento materiál byl zvolen z důvodu vysoké únosnosti, schopnosti rovnoměrně rozložit zatížení od nadloží, příznivých drenážních vlastností a schopnosti zajistit dlouhodobou stabilitu i v podmínkách zvýšené vlhkosti. Současně bylo s ohledem na malou tloušťku projektovaného násypu a očekávané zatížení komunikace intenzivním provozem v oblouku rozhodnuto využít stejný materiál, tedy kamenivo frakce 0/125, také pro výstavbu tělesa násypu. Tím bude dosaženo homogenního a dostatečně únosného zemního tělesa bez rizika nerovnoměrného sedání mezi sanovaným podložím a samotným násypem. Změna oproti původní projektové dokumentaci tedy spočívá v náhradě uvažované zeminy vhodné do násypu kamenivem frakce 0/125. Tato úprava je nezbytná k dosažení požadované únosnosti, stability a dlouhodobé životnosti konstrukce. Ponechání původně uvažovaných zemin by znamenalo vysoké riziko poruch v podobě nerovnoměrného sedání, vzniku trhlin a předčasného poškození krytových vrstev, což by v budoucnu vedlo k ohrožení bezpečnosti dopravy a ke znehodnocení celé stavby. Zvolený materiál je dostupný v dostatečném množství, je certifikovaný a splňuje veškeré požadavky příslušných technických norem ČSN pro použití do konstrukčních vrstev násypů. Řešení bylo projednáno se Správcem stavby a opírá se o nezávislý odborný posudek, který potvrzuje jeho technickou správnost a nezbytnost. Tato změna nemá negativní dopad na kvalitu ani životnost stavby, naopak zajišťuje její bezpečné a hospodárné provedení v souladu s požadavky Objednatele. Výše uvedené změny mají dopad na položku č. 17481 a vyvolali potřebu nové položky č. 21450 dle OTSKP. V PDPS byla nedostatečná délka svodidel před překážkami u směrově nerozdělených komunikací dle TP203, TP 114, PPK-SVO a TPV. V rámci úpravy propustku v km 1,124 vlevo a změny šikmého čela na čelo kolmé došlo k doplnění jednostranných ocelových svodidel JSA-AM-4/H1 vlevo v km 1,05796 – 1,19221 včetně dvou dlouhých náběhů délky 2x12,305 m, dále z korekce délky u svodidel VARIOGUARD. Uvedené změny mají dopad na položky č. 9113B1, 91228 02 a 91238. Z důvodu znalosti konkrétního výrobku a minimální délky rozebíratelných svodidel VARIOGUARD H2 (min. délka 29,33 m dle TPV 2/2019) došlo na základě šířky navržených sjezdů ke změně svodidel	

VARIOGUARD H2 za svodidla VARIOGUARD H1. Rozebíratelná svodidla VARIOGUARD H1 se oproti VARIOGUARD H2 nekotví do podkladu a dle TPV nemají předepsanou minimální délku. Minimální délku ovšem předepisují TP 114, které ukládají minimální délku svodidla 28,0 m, pokud na toto svodidlo před a za navazuje další svodidlo. Na základě TP 114 tedy došlo k úpravě navržené délky svodidel VARIOGUARD H1 na 28,0 m. Tato změna má vliv na položku č. 911AC1 a vyvolala potřebu nové položky č. 911AB1 dle OTSKP.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nezbytnou.

Počet připojených listů specifikací: 26	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
-1 182 024,76 Kč	3 768 009,22 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
2 585 984,46 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	<u>Počet stavebních dnů se nemění</u>
3 129 041,19 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum:

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

2020700 - MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1 - PARDUBICKÝ KRAJ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 102.1 - SILNICE II/324 (PVNHČP)

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS

SO 102.1 / 7

Číslo ZBV

07

Objednatel: Pardubický kraj

Komenského náměstí 125,, 532 11 Pardubice

IČ: 70892822

Zhotovitel: MI Roads a.s.

Koželužská 2450, 18000 Praha

IČ: 17331099

Finanční rekapitulace ZBV č. 07

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
07	-1 182 024,76	3 768 009,22	2 585 984,46

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění,

Podpis

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	07
Evidenční číslo a název stavby:	2020700 - MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	1 - PARDUBICKÝ KRAJ
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 102.1 - SILNICE II/324 (PVNHČP)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	1 / 7

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	2 / 3	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1 / 5	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)	1 / 6	
Přehled nových položek	1 / 7	
Přehled zařazení změn do Skupin	1 / 8	
250131_Vyjádření geotechnika SO 102	2 / 9	
3-2025-Staré Hradiště-Hrobice-kubatura násypu KM1.120-1.300	2 / 11	
Plná moc_Rakouš_konverze	2 / 13	
Vyjádření TDI ZBV č.7	1 / 15	
ZBV 07 - foto_propustek KM 1,124	3 / 16	
ZBV 07 - foto_svodidla	4 / 19	
ZBV 07 - foto_zásypy KM 1,1-1,3	7 / 23	
