

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 14	
Zhotovitel:	„Společnost: Hrobice“, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 17331099		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 06.10.2025	
Název akce: Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)			
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐
Datum: 06.10.2025			osobně ☐
Předmět změny: SO 103.1 – Silnice II/324 (PVNHČP) Změny v průběhu výstavby			
ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazené změny (doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.): Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.			
Počet připojených listů specifikací:	12		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Stanovisko projektanta stavby: souhlasí Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasí			
Přílohy: - Podpisový list elektronického schvalování ZBV - Přehled dokladů - Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1) - Přehled zařazení změn do Skupin - 5-2025-Staré Hradiště-Hrobice-SO103-vrstvy - 6-2025-Staré Hradiště-Hrobice-SO103-různé - 7-2025-Staré Hradiště-Hrobice-SO103-fréza - Plná moc Ing. Richard Rakouš - Vyjádření TDI ZBV č.14			

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 14		
Zhotovitel:	„Společnost: Hrobice“, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ:17331099		
Změnový list vystavil:	Ing. Richard Rakouš		
Datum:	06.10.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/24/23439 tuto změnu rozsahu díla: <u>Předmět změny:</u> SO 103.1 – Silnice II/324 (PVNHČP) Změny v průběhu výstavby <u>Popis a zdůvodnění změny</u> ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazené změny (doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.): Po dokončení stavebních prací došlo k zaměření skutečně provedeného stavu měřených položek uvedených v soupisu prací, čímž došlo k upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Tato změna se dále eviduje v Evidenčním listu vyhrazené změny. Do Skupiny 1 zařazujeme kladné položky č. 113728, 131738, 131838, 21452, 21461H, 56213, 56333, 572123 a 572213 02 a záporné položky č. 574A44, 574C56 a 574E68.			
Počet připojených listů specifikací: 20		Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :		Cena víceprací bez DPH :	
-99 537,48 Kč		102 888,81 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3 351,33 Kč		Termín dokončení díla se nemění	
Výsledná cena změny s DPH :		Počet stavebních dnů se nemění	
4 055,16 Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele díla:		Podpis zmocněnce zhotovitele díla:	
Datum:		Datum:	

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

2020700 - MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1 - PARDUBICKÝ KRAJ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 103.1 - SILNICE II/324 (PVNHČP)

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS

SO 103.1 / 14

Číslo ZBV

14

Objednatel:Pardubický kraj
Komenského náměstí 125,, 532 11 Pardubice
IČ: 70892822**Zhotovitel:**MI Roads a.s.
Koželužská 2450, 18000 Praha
IČ: 17331099

Finanční rekapitulace ZBV č. 14

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14	-99 537,48	102 888,81	3 351,33

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Správce stavby:Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění,
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	14
Evidenční číslo a název stavby:	2020700 - MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	1 - PARDUBICKÝ KRAJ
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 103.1 - SILNICE II/324 (PVNHČP)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	1 / 14

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1)	1 / 3	
Přehled zařazení změn do Skupin	1 / 4	
5-2025-Staré Hradiště-Hrobice-SO103-vrstvy	2 / 5	
6-2025-Staré Hradiště-Hrobice-SO103-různé	1 / 7	
7-2025-Staré Hradiště-Hrobice-SO103-fréza	2 / 8	
Plná moc_Rakouš_konverze	2 / 10	
Vyjádření TDI ZBV č.14	1 / 12	

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 14.1

Evidenční číslo a název stavby: 2020700 - MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP Číslo a název SO/PS: 1 - PARDUBICKÝ KRAJ Číslo a název rozpočtu: SO 103.1 - SILNICE II/324 (PVNHČP)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 14					
								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	1 924,904	2 063,300	138,396	484,05	931 749,78	0,00	66 990,58	998 740,36	66 990,58	7,19
10	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	4 077,858	4 110,200	32,342	166,51	679 004,14	0,00	5 385,27	684 389,41	5 385,27	0,79
11	131838	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	691,741	705,600	13,859	198,56	137 352,09	0,00	2 751,84	140 103,93	2 751,84	2,00
21	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	691,741	705,600	13,859	410,78	284 153,37	0,00	5 693,00	289 846,37	5 693,00	2,00
22	21461H	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 1000G/M2	M2	1 729,352	1 788,500	59,148	59,44	102 792,68	0,00	3 515,76	106 308,44	3 515,76	3,42
24	56213	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM	M2	7 205,635	7 223,300	17,665	246,41	1 775 540,52	0,00	4 352,83	1 779 893,35	4 352,83	0,25
25	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	8 646,762	8 738,200	91,438	130,41	1 127 624,23	0,00	11 924,43	1 139 548,66	11 924,43	1,06
26	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	7 002,567	7 068,384	65,817	27,38	191 730,28	0,00	1 802,07	193 532,35	1 802,07	0,94
28	572213.02	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 583,330	6 618,578	35,248	13,42	88 348,29	0,00	473,03	88 821,32	473,03	0,54
29	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	6 550,577	6 389,400	-161,177	212,56	1 392 390,65	-34 259,78	0,00	1 358 130,87	-34 259,78	-2,46
30	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	6 688,139	6 460,100	-228,039	221,74	1 483 027,94	-50 565,37	0,00	1 432 462,57	-50 565,37	-3,41
31	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	6 819,151	6 759,000	-60,151	244,59	1 667 896,14	-14 712,33	0,00	1 653 183,81	-14 712,33	-0,88
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						9 861 610,11	-99 537,48	102 888,81	9 864 961,44	3 351,33	0,03

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:		MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP - 2020700		Sledování limitu 50 % od účinnosti novely ZZVZ je ponecháno jen pro nezávaznou informaci		Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15% z Přijaté smluvní částky		do 31.12.2021	od 1.1.2022	od 1.1.2024	a max. 137 366 000 Kč do 31.12.2021	a max. 140 448 000 Kč od 1.1.2022	a max. 135 348 000 Kč od 1.1.2024			
1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	125 803 579,60 Kč	6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a 4	18 081 906,89 Kč	9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	23,80%	12=39	Sledování čerpání limitu	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	145 242 276,12 Kč	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % součet Skupiny 3 a Skupiny 4	14,37%	10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	115,45%	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	37 741 073,88 Kč	11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	62 901 789,80 Kč	14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky		0,00%	0,00%	0,00%		
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	1,08%														
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%														
15 % z Přijaté smluvní částky		18 870 536,94 Kč														
												OK v limitu	OK v limitu	OK v limitu		

						Skupiny změn																			
						-1-			-2-			-3-					-4-				-5-				-6-
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) v rámci limitu 30% lze odečíst pouze změny záporné, které se změnami kladnými přímo souvisí					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Suma Změn záporných nesouvisející se Změnami kladnými nezapočítává se do limitu 30 %	Změny kladné	Suma Změn kladných, které souvisí se Změnami kladnými (hodnota jde do výpočtu limitu 30 %)	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28.a	28.b	29	30=28.a+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(39/1)*100	39= 36 +37	40
			- 6 500 198,06 Kč	25 938 894,58 Kč	19 438 696,52 Kč	- 569 931,91 Kč	1 926 721,54 Kč	1 356 789,63 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 5 930 266,15 Kč	0,00 Kč	24 012 173,04 Kč	18 081 906,89 Kč	29 942 439,19 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	01	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 01 Nebezpečný odpad	- 102 822,88 Kč	4 919 073,00 Kč	4 816 250,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 102 822,88 Kč	0,00 Kč	4 919 073,00 Kč	4 816 250,12 Kč	5 021 895,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	02	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 02 Sanace podloží	0,00 Kč	1 589 229,95 Kč	1 589 229,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 589 229,95 Kč	1 589 229,95 Kč	1 589 229,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	03	PARDUBICKÝ KRAJ / Změny vyhrazené_doměrky	- 292 719,62 Kč	1 205 340,00 Kč	912 620,38 Kč	- 292 719,62 Kč	1 205 340,00 Kč	912 620,38 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	04	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny	0,00 Kč	346 048,09 Kč	346 048,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	346 048,09 Kč	346 048,09 Kč	346 048,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	05	PARDUBICKÝ KRAJ / Změny vyhrazené_doměrky	- 1 901,85 Kč	119 410,86 Kč	117 509,01 Kč	- 1 901,85 Kč	119 410,86 Kč	117 509,01 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	06	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 06 Změny vyhrazené_doměrky	- 155 177,66 Kč	351 946,27 Kč	196 768,61 Kč	- 155 177,66 Kč	351 946,27 Kč	196 768,61 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	07	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 07 Nepředvídané změny - dle RDS	- 1 182 024,76 Kč	3 768 009,22 Kč	2 585 984,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 1 182 024,76 Kč	0,00 Kč	3 768 009,22 Kč	2 585 984,46 Kč	4 950 033,98 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	08	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny - dle RDS	- 365 925,32 Kč	851 447,03 Kč	485 521,71 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 365 925,32 Kč	0,00 Kč	851 447,03 Kč	485 521,71 Kč	1 217 372,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	10	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny	- 68 913,18 Kč	563 359,28 Kč	494 446,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 68 913,18 Kč	0,00 Kč	563 359,28 Kč	494 446,10 Kč	632 272,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	11	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny	- 4 210 246,36 Kč	11 611 116,78 Kč	7 400 870,42 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 4 210 246,36 Kč	0,00 Kč	11 611 116,78 Kč	7 400 870,42 Kč	15 821 363,14 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	12	PARDUBICKÝ KRAJ / Změny vyhrazené_doměrky	- 20 595,30 Kč	147 135,60 Kč	126 540,30 Kč	- 20 595,30 Kč	147 135,60 Kč	126 540,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	13	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny	- 333,65 Kč	363 889,69 Kč	363 556,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 333,65 Kč	0,00 Kč	363 889,69 Kč	363 556,04 Kč	364 223,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	14	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 14 Změny vyhrazené_doměrky	- 99 537,48 Kč	102 888,81 Kč	3 351,33 Kč	- 99 537,48 Kč	102 888,81 Kč	3 351,33 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení

Vyhodnocení limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky v řádku 7 sloupce W, X, Y jsou orientační. Pro sledování limitů je vždy rozhodující datum schválení daného ZBV a limity platné v roce, kdy bylo ZBV schváleno oprávněnou osobou Objednatele.

Sledování limitu 50 % od účinnosti novely ZZVZ je ponecháno jen pro nezávaznou informaci Objednatele

Legenda:

ZBV s datem schválení do 31.12.2021

ZBV s datem schválení od 1.1.2022

ZBV s datem schválení od 1.1.2024

ZBV bez datu schválení:

Název akce:

Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)

Zaměření vozovkových vrstev SO103


Geodetický protokol č.:	5/2025
Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Zakázkové číslo:	15/2024
Objednatel:	MI Roads a.s.
Zpracovatel geodetických prací:	A.G.E.S. Engineering CZ s.r.o. nám. ČS Legií 851 530 02 Pardubice
Geodetické práce provedli:	
Datum měření:	září 2024 – květen 2025

Vrstva	Plocha [m ²]
ACO 11+	6389,4
ACL 16+	6460,1
ACP 22+	6759,0
SC	7223,3
ŠDA	8738,2

V Pardubicích dne 25.6.2025

Technickou zprávu vyhotovil:

Ověřil:



ACO - 6389,4 m2
 ACL - 6460,1 m2
 ACP - 6759,0 m2
 SC - 7223,3 m2
 ŠDA - 8738,2 m2

Název akce:

Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)

Zaměření ploch a kubatur SO103

Geodetický protokol č.: 6/2025

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Zakázkové číslo: 15/2024

Objednatel: MI Roads a.s.

Zpracovatel geodetických prací: A.G.E.S. Engineering CZ s.r.o.
nám. ČS Legií 851
530 02 Pardubice

Geodetické práce provedli: 


Datum měření: srpen 2024 – květen 2025


Položka	Kubatura [m³]
Hloubení jam tř. I	4110,2
Hloubení jam tř. II	705,6
Sanační vrstvy z kameniva	705,6

Položka	Plocha [m²]
Separáční geotextilie	1788,5

V Pardubicích dne 25.6.2025

Technickou zprávu vyhotovil: 

Ověřil: 



Název akce:

Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)

Zaměření frézování vozovky SO103


Geodetický protokol č.:	7/2025
Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Zakázkové číslo:	15/2024
Objednatel:	MI Roads a.s.
Zpracovatel geodetických prací:	A.G.E.S. Engineering CZ s.r.o. nám. ČS Legií 851 530 02 Pardubice
Geodetické práce provedli:	
Datum měření:	srpen 2024


Pr. tloušťka [mm]	Plocha [m ²]	Kubatura [m ³]
335	6159,0	2063,3

V Pardubicích dne 25.6.2025

Technickou zprávu vyhotovil:

Ověřil:





Frézo - 34 cm - 6159,0 m2 - 2063,3 m3

PLNÁ MOC

Společnost **MI Roads a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, identifikační číslo 17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27461 (dále též jen „zmocnitel“), jehož zastupuje správní rada společnosti jednající Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady, a Ing. Markem Steinerem, členem správní rady, tímto **zmocňuje**:


Ing. Richarda Rakouše

zaměstnance zmocnitele, datum narození [REDACTED] 1972, bydliště [REDACTED] Praha 8
(dále jen „zmocněnec“)


K jednání za zmocnitele při administraci změn díla u stavby „Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)“ kterou zmocnitel jako zhotovitel provádí pro Pardubický kraj. Zmocněnec je takto za zmocnitele oprávněn projednávat změny díla, podepisovat dokumentaci k těmto změnám se vztahující (zejména tedy změnové listy) a činit další úkony přímo související s administrací změn díla u výše uvedené stavby.

Toto zmocnění souvisí s prováděním výše uvedené stavby a zmocněnec je oprávněn jednat za zmocnitele ve shora uvedeném rozsahu pouze v souvislosti s touto stavbou. Udělené zmocnění zaniká nejpozději 31. 12. 2025.

V Praze dne 01. 10. 2024




Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady
MI Roads a.s.



Ing. Marek Steiner
člen správní rady
MI Roads a.s.

V Srchu dne 01. 10. 2024 zmocnění za zmocněnce přijímám:



Ing. Richard Rakouš
Oblastní ředitel
MI Roads a.s.

MI Roads a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27461

Bankovní spojení – Komerční banka, a.s., účet č. 123-6606630207/0100

IBAN: CZ8001000001236606630207, SWIFT kód (BIC): KOMBCZPP

www.mi-roads.cz

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 169021376-312661-241211094319.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **169021376-312661-241211094319**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Pardubice 19

Datum vyhotovení: **11.12.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



169021376-312661-241211094319

INF/PGP – II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah) – Správce stavby

Společnost: Hrobice

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 Libeň

Zastoupená správcem společnosti:

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 Libeň

Vyřizuje: Ing. Irena Vojnová

Věc: Vyjádření TDI k předloženému ZBV č. 14 SO 103.1 – Silnice II/324 (PVNHČP)

Vyhrazené změny (doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.):

Vážený pane,

na základě Vašeho předložení ZBV č. 14 Vám z pozice technického dozoru investora (TDI), který zastupuje objednatele – Pardubický kraj, v rámci stavby „*Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)*“, sdělujeme následující stanovisko:

1. Cenové vyjádření: Ze strany TDI nejsou k předložené cenové kalkulaci žádné připomínky.
2. Technické vyjádření: Potvrzujeme skutečnosti uvedené ve zdůvodnění ZBV a současně potvrzujeme kontrolu rozsahu odpovídajících prací popsaných v ZBV č. 14 zhotovitele.

V rámci dokladové části jsou doloženy relevantní doklady prokazující provedení prací dle předloženého soupisu prací.

Na základě výše uvedeného doporučujeme z pozice TDI, aby Správce stavby vydal příslušný pokyn v souladu s SoD a smluvními podmínkami.

S pozdravem

Ing. Irena Vojnová

Technický dozor

II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)

INFRAM a.s.



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 15	
Zhotovitel:	„Společnost: Hrobice“, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 17331099		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 07.10.2025	
Název akce: Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)			
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐
Datum: 07.10.2025			osobně ☐
Předmět změny:			
SO 103.1 – Silnice II/324 (PVNHČP)			
Změny v průběhu výstavby			
ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změny z nepředvídaných důvodů (dále též „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Podmínky § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti tak byly splněny.			
Počet připojených listů specifikací: 20			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐
		jiné okolnosti ☒	
Stanovisko projektanta stavby: souhlasí			
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasí			
Přílohy:			
- Podpisový list elektronického schvalování ZBV - Přehled dokladů - Průvodní list zařazení změny do skupiny (pro ZBV číslo: 15) - Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV) - Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3) - Přehled nových položek - Přehled zařazení změn do Skupin - ZBV 15_fotodokumentace - Plná moc Ing. Richard Rakouš - Vyjádření TDI ZBV č.15 - Vyjádření TDI ZBV č.15 Cena			

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 15
Zhotovitel:	„Společnost: Hrobice“, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ:17331099
Změnový list vystavil:	Ing. Richard Rakouš
Datum:	07.10.2025
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/24/23439 tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO 103.1 – Silnice II/324 (PVNHČP) Změny v průběhu výstavby ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Z důvodu zjištěného nízkého krytí stávající tlakové kanalizace bylo nezbytné provést výkopové sondy v rámci objektu SO 103.1. Celkem bylo realizováno 9 sond o rozměrech 2,0 × 2,0 m a hloubce 1,5 m. Současně byla provedena liniová sonda v délce 160 m, šířce 2,5 m a hloubce 1,5 m. Všechny sondy byly hloubeny kombinací strojního a ručního způsobu. Tyto práce nebyly součástí položkového výkazu ani projektové dokumentace PDPS. Jedná se o nezbytné vícepráce, jejichž provedení bylo nutné z důvodu zajištění bezpečné realizace stavby, vyloučení rizika poškození stávajících inženýrských sítí a ověření skutečného prostorového vedení tlakové kanalizace. Tato skutečnost si vyžádala potřebu nové položky dle OTSKP 2024, kód položky 133733 – Hloubení šachet zapažených i nezapažených, třída I, s odvozem do 3 km.	
Počet připojených listů specifikací: 20	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0,00 Kč	572 603,16 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
572 603,16 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	<u>Počet stavebních dnů se nemění</u>
692 849,80 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum:

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

2020700 - MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1 - PARDUBICKÝ KRAJ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 103.1 - SILNICE II/324 (PVNHČP)

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS

SO 103.1 / 15

Číslo ZBV

15

Objednatel:Pardubický kraj
Komenského náměstí 125,, 532 11 Pardubice
IČ: 70892822**Zhotovitel:**MI Roads a.s.
Koželušská 2450, 18000 Praha
IČ: 17331099

Finanční rekapitulace ZBV č. 15

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15	0,00	572 603,16	572 603,16

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Správce stavby:Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění,
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	15
Evidenční číslo a název stavby:	2020700 - MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	1 - PARDUBICKÝ KRAJ
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 103.1 - SILNICE II/324 (PVNHČP)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	1 / 15

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1 / 3	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1 / 4	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)	1 / 5	
Přehled nových položek	1 / 6	
Přehled zařazení změn do Skupin	1 / 7	
ZBV 15_fotodokumentace	9 / 8	
Plná moc_Rakouš_konverze	2 / 17	
Vyjádření TDI ZBV č.15	1 / 19	
Vyjádření TDI ZBV č.15_Cena	1 / 20	

Průvodní list zařazení změny do skupiny**pro ZBV číslo: 15**

Údaje v Kč bez DPH

Věcně příslušný útvar:	Kořenový - útvar
Název stavby:	MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	1 / 15
Název SO/PS:	PARDUBICKÝ KRAJ
Číslo podobjektu/rozpočtu:	SO 103.1
Název podobjektu/rozpočtu:	SILNICE II/324 (PVNHČP)

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	125 803 579,60 Kč		
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	124 158 993,38 Kč		
Orient. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč	0,00%	z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orient. cena navrhovaných Změn kladných:	572 603,16 Kč	0,46%	z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	146 712 138,16 Kč	116,62%	z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny

Popis původního řešení (např. dle PDPS).

Popis návrhu Změny.

Porovnání původního řešení s navrhovaným.

Posouzení možnosti vzniku řetězení Změn.

Popis možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:**ANO / NE****(NEHODÍ SE ŠKTRNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)****ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny** (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):

Cena navrhovaných Změn záporných: 0,00 Kč

Cena navrhovaných Změn kladných: 572 603,16 Kč

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných: 572 603,16 Kč

Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Změny z nepředvídaných důvodů (dále též „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Podmínky § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti tak byly splněny.

Nové položky

Kód položky	Název	Množství rozdílu	MJ	Rozdíl (Kč)	Rozdíl %
195	133733 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM	654,000	M3	572 603,16	100,00%

Zpracovatel:

Jméno, funkce: ,

Podpis:

Datum:

Schvalovatel - ředitel věcně příslušného útvaru:

Jméno:

Podpis:

Datum:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro celou ZBV číslo: 15

Název stavby:

MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

1 / 15

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1 - PARDUBICKÝ KRAJ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 103.1 - SILNICE II/324 (PVNHČP)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
124 158 993,38

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-102 822,88	4 919 073,00	128 975 243,50	4 816 250,12

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	572 603,16	5 491 676,16	4,42

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-102 822,88	129 547 846,66	5 388 853,28	4,34

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Projektant (autorský dozor)

Stavební dozor:

Správce stavby:

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 15.3

Evidenční číslo a název stavby: 2020700 - MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP Číslo a název SO/PS: 1 - PARDUBICKÝ KRAJ Číslo a název rozpočtu: SO 103.1 - SILNICE II/324 (PVNHČP)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 15					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou											0,00
Nové položky													
195	133733	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM	M3	0,000	654,000	654,000	875,54	0,00	0,00	572 603,16	572 603,16	572 603,16	100,00
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	572 603,16	572 603,16	572 603,16	100,00
		Celkem za všechny změněné položky						0,00	0,00	572 603,16	572 603,16	572 603,16	100,00

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	15
Název a evidenční číslo stavby:	MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP - 2020700
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	PARDUBICKÝ KRAJ
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	1/15

Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena Celkem	Původ jednotkové ceny
133733	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM	M3	654,000	875,54	572 603,16	OTSKP 2024

Za Zhotovitele

Datum:

Za Objednatele

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:		MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP - 2020700				Sledování limitu 50 % od účinnosti novely ZZVZ je ponecháno jen pro nezávaznou informaci				Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15% z Přijaté smluvní částky		do 31.12.2021		od 1.1.2022		od 1.1.2024		a max. 137 366 000 Kč do 31.12.2021		a max. 140 448 000 Kč od 1.1.2022		a max. 135 348 000 Kč od 1.1.2024	
1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	125 803 579,60 Kč	6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a 4	19 555 120,26 Kč	bez ABS	9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	25,08%	ABS	12=39	Sledování čerpání limitu	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ABS				
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	146 712 138,16 Kč	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % součet Skupiny 3 a Skupiny 4	15,54%		10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS	13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	ABS				
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	116,62%	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	37 741 073,88 Kč		11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	62 901 789,80 Kč		14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky				0,00%	0,00%	0,00%	ABS				
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	1,08%	OK v limitu																				
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%	OK v limitu																				
15 % z Přijaté smluvní částky		18 870 536,94 Kč	OK v limitu																				

						Skupiny změn																			
						-1-			-2-			-3-					-4-				-5-				-6-
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) v rámci limitu 30% lze odečíst pouze změny záporné, které se změnami kladnými přímo souvisí					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Suma Změn záporných nesouvisející se Změnami kladnými nezapočítává se do limitu 30 %	Změny kladné	Suma Změn kladných a Změn záporných, které souvisí se Změnami kladnými (hodnota jde do výpočtu limitu 30 %)	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28.a	28.b	29	30=28.a+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(39/1)+100	39= 36 +37	40
			- 6 469 511,96 Kč	27 378 070,52 Kč	20 908 558,56 Kč	- 470 394,43 Kč	1 823 832,73 Kč	1 353 438,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 5 999 117,53 Kč	0,00 Kč	25 554 237,79 Kč	19 555 120,26 Kč	31 553 355,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	01	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 01 Nebezpečný odpad	- 102 822,88 Kč	4 919 073,00 Kč	4 816 250,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 102 822,88 Kč	0,00 Kč	4 919 073,00 Kč	4 816 250,12 Kč	5 021 895,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	02	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 02 Sanace podloží	0,00 Kč	1 589 229,95 Kč	1 589 229,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 589 229,95 Kč	1 589 229,95 Kč	1 589 229,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	03	PARDUBICKÝ KRAJ / Změny vyhrazené_doměrky	- 292 719,62 Kč	1 205 340,00 Kč	912 620,38 Kč	- 292 719,62 Kč	1 205 340,00 Kč	912 620,38 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	04	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny	0,00 Kč	346 048,09 Kč	346 048,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	346 048,09 Kč	346 048,09 Kč	346 048,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	05	PARDUBICKÝ KRAJ / Změny vyhrazené_doměrky	- 1 901,85 Kč	119 410,86 Kč	117 509,01 Kč	- 1 901,85 Kč	119 410,86 Kč	117 509,01 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	06	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 06 Změny vyhrazené_doměrky	- 155 177,66 Kč	351 946,27 Kč	196 768,61 Kč	- 155 177,66 Kč	351 946,27 Kč	196 768,61 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	07	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 07 Nepředvídané změny - dle RDS	- 1 182 024,76 Kč	3 768 009,22 Kč	2 585 984,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 1 182 024,76 Kč	0,00 Kč	3 768 009,22 Kč	2 585 984,46 Kč	4 950 033,98 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	08	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny - dle RDS	- 365 925,32 Kč	851 447,03 Kč	485 521,71 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 365 925,32 Kč	0,00 Kč	851 447,03 Kč	485 521,71 Kč	1 217 372,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	09	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny - změna provedení propustku KM 1,124	- 68 851,38 Kč	969 461,59 Kč	900 610,21 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 68 851,38 Kč	0,00 Kč	969 461,59 Kč	900 610,21 Kč	1 038 312,97 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	10	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny	- 68 913,18 Kč	563 359,28 Kč	494 446,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 68 913,18 Kč	0,00 Kč	563 359,28 Kč	494 446,10 Kč	632 272,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	11	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny	- 4 210 246,36 Kč	11 611 116,78 Kč	7 400 870,42 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 4 210 246,36 Kč	0,00 Kč	11 611 116,78 Kč	7 400 870,42 Kč	15 821 363,14 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	12	PARDUBICKÝ KRAJ / Změny vyhrazené_doměrky	- 20 595,30 Kč	147 135,60 Kč	126 540,30 Kč	- 20 595,30 Kč	147 135,60 Kč	126 540,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	13	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny	- 333,65 Kč	363 889,69 Kč	363 556,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 333,65 Kč	0,00 Kč	363 889,69 Kč	363 556,04 Kč	364 223,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	15	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 15 Nepředvídané změny	0,00 Kč	572 603,16 Kč	572 603,16 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	572 603,16 Kč	572 603,16 Kč	572 603,16 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení

Vyhodnocení limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky v řádku 7 sloupce W, X, Y jsou orientační. Pro sledování limitů je vždy rozhodující datum schválení daného ZBV a limity platné v roce, kdy bylo ZBV schváleno oprávněnou osobou Objednatele.

Sledování limitu 50 % od účinnosti novely ZZVZ je ponecháno jen pro nezávaznou informaci Objednatatele

- Legenda:
- ZBV s datem schválení do 31.12.2021
- ZBV s datem schválení od 1.1.2022
- ZBV s datem schválení od 1.1.2024
- ZBV bez datumu schválení:
















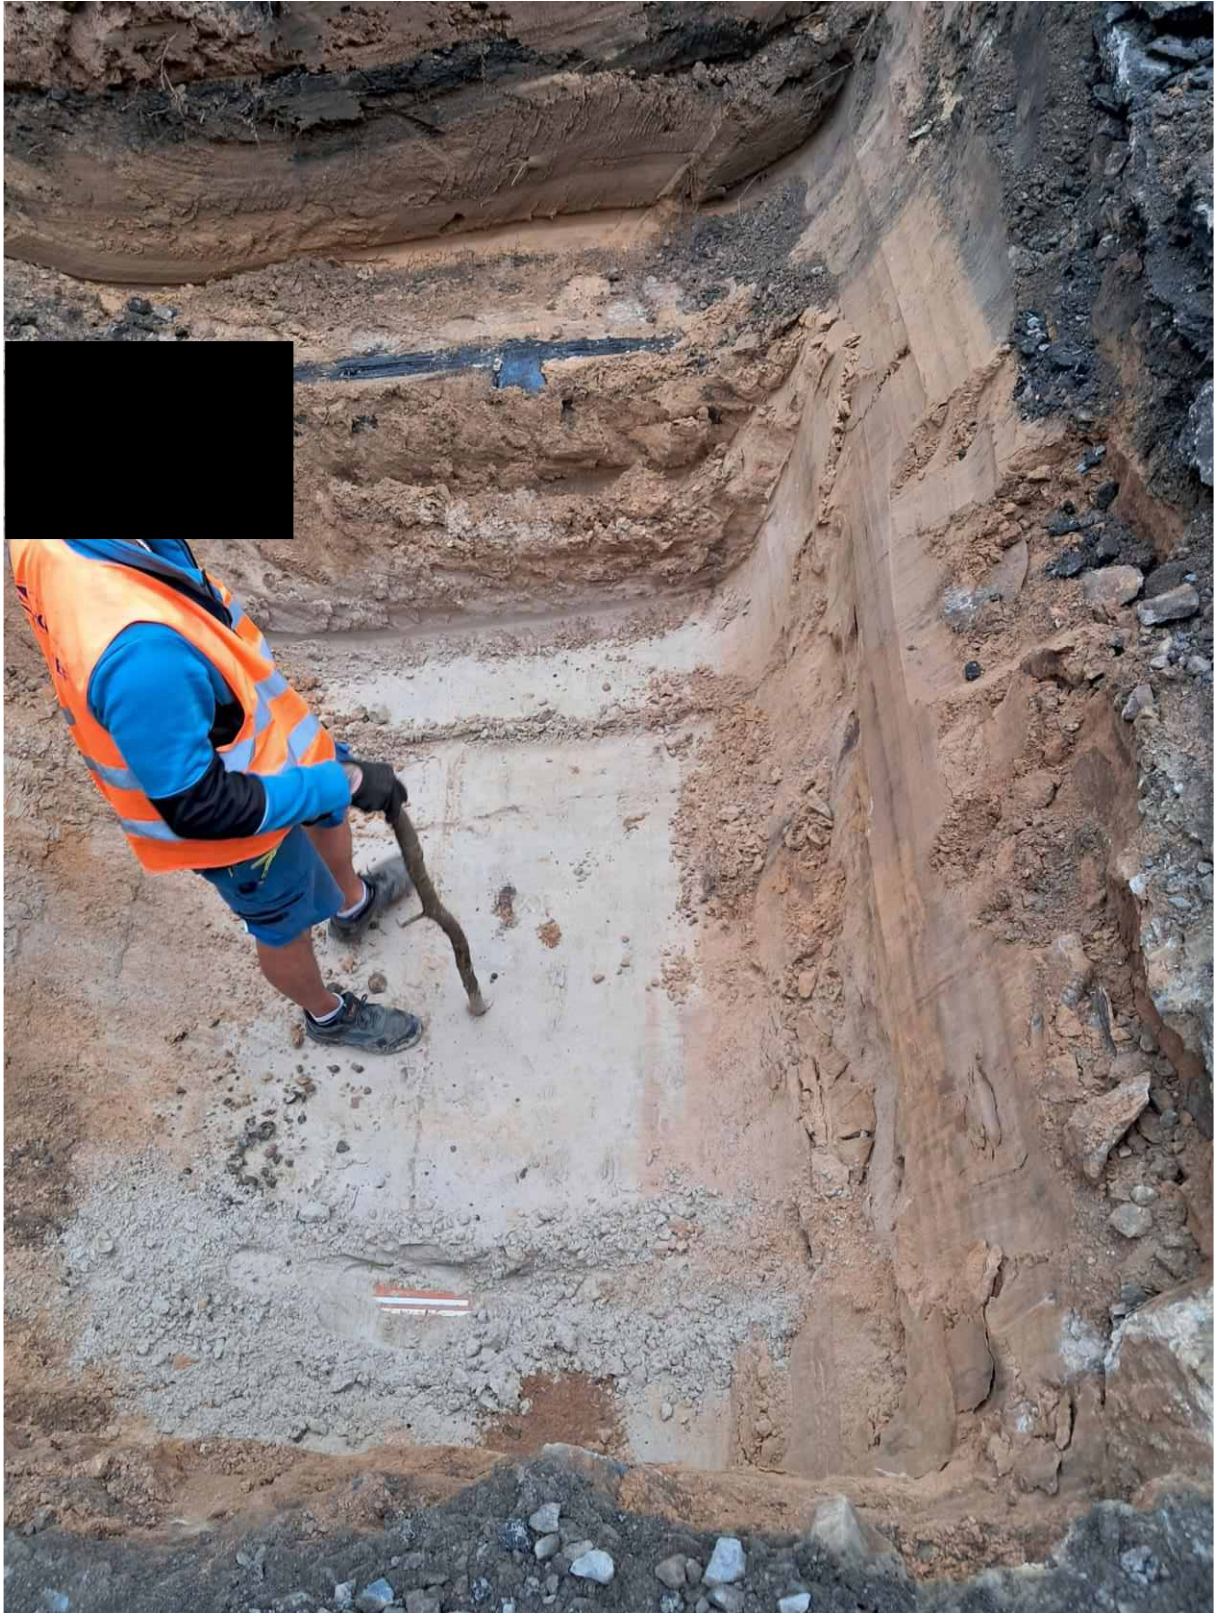



PLNÁ MOC

Společnost **MI Roads a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, identifikační číslo 17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27461 (dále též jen „zmocnitel“), jehož zastupuje správní rada společnosti jednající Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady, a Ing. Markem Steinerem, členem správní rady, tímto **zmocňuje**:

Ing. Richarda Rakouše

zaměstnance zmocnitele, datum narození [REDACTED] 1972, bydliště [REDACTED] Praha8
(dále jen „zmocněnec“)


K jednání za zmocnitele při administraci změn díla u stavby „Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)“ kterou zmocnitel jako zhotovitel provádí pro Pardubický kraj. Zmocněnec je takto za zmocnitele oprávněn projednávat změny díla, podepisovat dokumentaci k těmto změnám se vztahující (zejména tedy změnové listy) a činit další úkony přímo související s administrací změn díla u výše uvedené stavby.

Toto zmocnění souvisí s prováděním výše uvedené stavby a zmocněnec je oprávněn jednat za zmocnitele ve shora uvedeném rozsahu pouze v souvislosti s touto stavbou. Udělené zmocnění zaniká nejpozději 31. 12. 2025.

V Praze dne 01. 10. 2024




Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady
MI Roads a.s.



Ing. Marek Steiner
člen správní rady
MI Roads a.s.

V Srchu dne 01. 10. 2024 zmocnění za zmocněnce přijímám:



Ing. Richard Rakouš
Oblastní ředitel
MI Roads a.s.

MI Roads a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27461

Bankovní spojení – Komerční banka, a.s., účet č. 123-6606630207/0100

IBAN: CZ8001000001236606630207, SWIFT kód (BIC): KOMBCZPP

www.mi-roads.cz

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 169021376-312661-241211094319.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **169021376-312661-241211094319**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Pardubice 19

Datum vyhotovení: **11.12.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



169021376-312661-241211094319

INF/PGP – II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah) – Správce stavby

Společnost: Hrobice

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 Libeň

Zastoupená správcem společnosti:

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 Libeň

Vyřizuje: Ing. Irena Vojnová

Věc: Vyjádření TDI k předloženému ZBV č. 15 SO 103.1 – Silnice II/324 (PVNHČP)

Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):

Vážený pane,

na základě Vašeho předložení ZBV č. 15 Vám z pozice technického dozoru investora (TDI), který zastupuje objednatele – Pardubický kraj, v rámci stavby „*Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)*“, sdělujeme následující stanovisko:

1. Cenové vyjádření: Ze strany TDI nejsou k předložené cenové kalkulaci žádné připomínky. Nové položky jsou řešeny dle Smluvních podmínek – ceník OTSKP
2. Technické vyjádření: Potvrzujeme skutečnosti uvedené ve zdůvodnění ZBV a současně potvrzujeme kontrolu rozsahu odpovídajících prací popsaných v ZBV č. 15 zhotovitele.

V rámci dokladové části jsou doloženy relevantní doklady prokazující provedení prací dle předloženého soupisu prací.

Na základě výše uvedeného doporučujeme z pozice TDI, aby Správce stavby vydal příslušný pokyn v souladu s SoD a smluvními podmínkami.

S pozdravem

Ing. Irena Vojnová

Technický dozor

II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)

INFRAM a.s.

Společnost: Hrobice

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 Libeň

Zastoupená správcem společnosti:

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 Libeň

Vyřizuje: Ing. Leoš Buřval

Věc: Vyjádření TDI – Claim manager k předloženému ZBV č. 15

Vážený pane,

na základě Vašeho předložení ZBV č. 15 Vám z pozice technického dozoru investora (TDI) – Claim managera, který zastupuje objednatele, tj. Pardubický kraj, v rámci stavby „Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)“, sdělujeme následující stanovisko:

Cenové vyjádření:

Ze strany TDI byla provedena kontrola využití nové položky z výskytu OTSKP 133733 – **HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3 KM.**

- Položka byla využita v souladu se Smlouvou o dílo (SOD) a Smluvními podmínkami.
- Nebylo možné využít položky ze soupisu prací, který byl součástí zadávacího řízení, neboť charakter stavebních prací jim neodpovídal.
- Jedná se o ruční odkopy a sondáž tlakové kanalizace, tedy práce, při nichž nelze plně využít strojní vybavení (pouze pro hrubé práce). Tyto práce byly prováděny po dobu delší než dva pracovní týdny.
- Tlaková kanalizace byla v celé kolizní délce ručně odkryta a sondována.

Z pozice technického dozoru investora (TDI) – Claim managera souhlasím s využitím položky OTSKP 133733 **HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3 KM**, přičemž její cenová úroveň odpovídá cenám obvyklým v daném čase a místě.

S pozdravem

Ing. Leoš Buřval DiS.

Technický dozor

II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)

INFRAM a.s.

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 16	
Zhotovitel:	„Společnost: Hrobice“, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 17331099		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 07.10.2025	
Název akce: Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)			
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐
Datum: 07.10.2025			osobně ☐
<u>Předmět změny:</u> SO 102.6 – NOVÁ TRASA METROPOLITNÍ SÍTĚ (PVNHČP) Změny v průběhu výstavby ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazené změny (doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.): <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.			
Počet připojených listů specifikací:	7		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Stanovisko projektanta stavby: souhlasí Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasí Přílohy: - Podpisový list elektronického schvalování ZBV - Přehled dokladů - Průvodní list zařazení změny do skupiny (pro ZBV číslo: 16) - Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV) - Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1) - Přehled zařazení změn do Skupin - Plná moc Ing. Richard Rakouš - Vyjádření TDI ZBV č.16			

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 16
Zhotovitel:	„Společnost: Hrobice“, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 17331099
Změnový list vystavil:	Ing. Richard Rakouš
Datum:	07.10.2025
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/24/23439 tuto změnu rozsahu díla: <u>Předmět změny:</u> SO 102.6 – NOVÁ TRASA METROPOLITNÍ SÍTĚ (PVNHČP) Změny v průběhu výstavby ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazené změny (doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.): <u>Popis a zdůvodnění změny</u> Po dokončení stavebních prací došlo k zaměření skutečně provedeného stavu měřených položek uvedených v soupisu prací, čímž došlo k upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Tato změna se dále eviduje v Evidenčním listu vyhrazené změny. Do Skupiny 1 zařazujeme kladné položky č. 03, 04, 12, 22, 26, 27, 33 a 34, záporné položky č. 02 a 11.	
Počet připojených listů specifikací: 7	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
- 3 117,76 Kč	34 702,76 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
31 585,00 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	<u>Počet stavebních dnů se nemění</u>
38 217,85 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum:

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

2020700 - MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1 - PARDUBICKÝ KRAJ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 102.6 - NOVÁ TRASA METROPOLITNÍ SÍTĚ (PVNHČP)

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS

SO 102.6 / 16-ZBV 16

Číslo ZBV

16

Objednatel: Pardubický kraj

Komenského náměstí 125,, 532 11 Pardubice

IČ: 70892822

Zhotovitel: MI Roads a.s.

Koželužská 2450, 18000 Praha

IČ: 17331099

Finanční rekapitulace ZBV č. 16

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16	-3 117,76	34 702,76	31 585,00

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění,

Podpis

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	16
Evidenční číslo a název stavby:	2020700 - MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	1 - PARDUBICKÝ KRAJ
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 102.6 - NOVÁ TRASA METROPOLITNÍ SÍTĚ (PVNHČP)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	1 / 16-ZBV 16

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1)	1 / 3	
Přehled zařazení změn do Skupin	1 / 4	
Plná moc_Rakouš_konverze	2 / 5	
Vyjádření TDI ZBV č.16	1 / 7	

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 16.1

Evidenční číslo a název stavby: 2020700 - MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP Číslo a název SO/PS: 1 - PARDUBICKÝ KRAJ Číslo a název rozpočtu: SO 102.6 - NOVÁ TRASA METROPOLITNÍ SÍTĚ (PVNHČP)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 16-ZBV 16					
								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	02	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4	M	45,000	37,000	-8,000	235,60	10 602,00	-1 884,80	0,00	8 717,20	-1 884,80	-17,78
3	03	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir. 70cm hlub.,zem.tř.4	M	1 161,000	1 169,000	8,000	142,34	165 256,74	0,00	1 138,72	166 395,46	1 138,72	0,69
4	04	Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.8cm,	M	1 161,000	1 169,000	8,000	179,65	208 573,65	0,00	1 437,20	210 010,85	1 437,20	0,69
11	11	Ruční zához kabelové rýhy 35cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4	M	45,000	37,000	-8,000	154,12	6 935,40	-1 232,96	0,00	5 702,44	-1 232,96	-17,78
12	12	Ruční zához kabelové rýhy 35cm šir.,70cm hlub.,zem.tř.4	M	1 161,000	1 169,000	8,000	93,26	108 274,86	0,00	746,08	109 020,94	746,08	0,69
22	22	Geodetické zaměření	KM	1,000	1,206	0,206	4 050,00	4 050,00	0,00	834,30	4 884,30	834,30	20,60
26	26	Trubka HDPE do pr. 75mm volně uložená, montáž + dodávka	M	2 338,000	2 412,000	74,000	171,79	401 645,02	0,00	12 712,46	414 357,48	12 712,46	3,17
27	27	Svazek mikrotrubiček 4 x 12/10 mm	M	1 169,000	1 206,000	37,000	57,92	67 708,48	0,00	2 143,04	69 851,52	2 143,04	3,17
33	33	Tlakování trubky HDPE do pr. 75mm	M	7 014,000	7 236,000	222,000	63,81	447 563,34	0,00	14 165,82	461 729,16	14 165,82	3,17
34	34	Kalibrace trubky HDPE do pr. 75mm	M	7 014,000	7 236,000	222,000	6,87	48 186,18	0,00	1 525,14	49 711,32	1 525,14	3,17
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						1 468 795,67	-3 117,76	34 702,76	1 500 380,67	31 585,00	2,15

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:		MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP - 2020700			Sledování limitu 50 % od účinnosti novely ZZVZ je ponecháno jen pro nezávaznou informaci			Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15% z Přijaté smluvní částky		do 31.12.2021	od 1.1.2022	od 1.1.2024	a max. 137 366 000 Kč do 31.12.2021	a max. 140 448 000 Kč od 1.1.2022	a max. 135 348 000 Kč od 1.1.2024	
1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	125 803 579,60 Kč	6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a 4	18 654 510,05 Kč	9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	24,26%	12=39	Sledování čerpání limitu	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	145 847 830,46 Kč	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % součet Skupiny 3 a Skupiny 4	14,83%	10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	115,93%	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	37 741 073,88 Kč	11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	62 901 789,80 Kč	14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,00%	0,00%	0,00%	
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	1,10%														
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%														
15 % z Přijaté smluvní částky		18 870 536,94 Kč														
													OK v limitu	OK v limitu	OK v limitu	

						Skupiny změn																			
						-1-			-2-			-3-					-4-				-5-				-6-
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) v rámci limitu 30% lze odečíst pouze změny záporné, které se změnami kladnými přímo souvisí					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Suma Změn záporných a Změn kladných, které souvisí se Změnami kladnými (hodnota jde do výpočtu limitu 30 %)	Změny kladné	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné	
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28.a	28.b	29	30=28.a+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(39/1)*100	39= 36 +37	40
			- 6 403 778,34 Kč	26 448 029,20 Kč	20 044 250,86 Kč	- 473 512,19 Kč	1 863 253,00 Kč	1 389 740,81 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 5 930 266,15 Kč	0,00 Kč	24 584 776,20 Kč	18 654 510,05 Kč	30 515 042,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	01	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 01 Nebezpečný odpad	- 102 822,88 Kč	4 919 073,00 Kč	4 816 250,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 102 822,88 Kč	0,00 Kč	4 919 073,00 Kč	4 816 250,12 Kč	5 021 895,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	02	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 02 Sanace podloží	0,00 Kč	1 589 229,95 Kč	1 589 229,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 589 229,95 Kč	1 589 229,95 Kč	1 589 229,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	03	PARDUBICKÝ KRAJ / Změny vyhrazené_doměrky	- 292 719,62 Kč	1 205 340,00 Kč	912 620,38 Kč	- 292 719,62 Kč	1 205 340,00 Kč	912 620,38 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	04	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny	0,00 Kč	346 048,09 Kč	346 048,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	346 048,09 Kč	346 048,09 Kč	346 048,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	05	PARDUBICKÝ KRAJ / Změny vyhrazené_doměrky	- 1 901,85 Kč	119 410,86 Kč	117 509,01 Kč	- 1 901,85 Kč	119 410,86 Kč	117 509,01 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	06	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 06 Změny vyhrazené_doměrky	- 155 177,66 Kč	351 946,27 Kč	196 768,61 Kč	- 155 177,66 Kč	351 946,27 Kč	196 768,61 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	07	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 07 Nepředvídané změny - dle RDS	- 1 182 024,76 Kč	3 768 009,22 Kč	2 585 984,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 1 182 024,76 Kč	0,00 Kč	3 768 009,22 Kč	2 585 984,46 Kč	4 950 033,98 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	08	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny - dle RDS	- 365 925,32 Kč	851 447,03 Kč	485 521,71 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 365 925,32 Kč	0,00 Kč	851 447,03 Kč	485 521,71 Kč	1 217 372,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	10	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny	- 68 913,18 Kč	563 359,28 Kč	494 446,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 68 913,18 Kč	0,00 Kč	563 359,28 Kč	494 446,10 Kč	632 272,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	11	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny	- 4 210 246,36 Kč	11 611 116,78 Kč	7 400 870,42 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 4 210 246,36 Kč	0,00 Kč	11 611 116,78 Kč	7 400 870,42 Kč	15 821 363,14 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	12	PARDUBICKÝ KRAJ / Změny vyhrazené_doměrky	- 20 595,30 Kč	147 135,60 Kč	126 540,30 Kč	- 20 595,30 Kč	147 135,60 Kč	126 540,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	13	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny	- 333,65 Kč	363 889,69 Kč	363 556,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 333,65 Kč	0,00 Kč	363 889,69 Kč	363 556,04 Kč	364 223,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	15	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 15 Nepředvídané změny	0,00 Kč	572 603,16 Kč	572 603,16 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	572 603,16 Kč	572 603,16 Kč	572 603,16 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	16	PARDUBICKÝ KRAJ / Změny RDS, doměrky	0,00 Kč	4 717,51 Kč	4 717,51 Kč	0,00 Kč	4 717,51 Kč	4 717,51 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	16	PARDUBICKÝ KRAJ / Změny vyhrazené_doměrky	- 3 117,76 Kč	34 702,76 Kč	31 585,00 Kč	- 3 117,76 Kč	34 702,76 Kč	31 585,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení

Vyhodnocení limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky v řádku 7 sloupce W, X, Y jsou orientační. Pro sledování limitů je vždy rozhodující datum schválení daného ZBV a limity platné v roce, kdy bylo ZBV schváleno oprávněnou osobou Objednatele.

Sledování limitu 50 % od účinnosti novely ZZVZ je ponecháno jen pro nezávaznou informaci Objednatele

- Legenda:**
- ZBV s datem schválení do 31.12.2021
- ZBV s datem schválení od 1.1.2022
- ZBV s datem schválení od 1.1.2024
- ZBV bez datu schválení:

PLNÁ MOC

Společnost **MI Roads a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, identifikační číslo 17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27461 (dále též jen „zmocnitel“), jehož zastupuje správní rada společnosti jednající Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady, a Ing. Markem Steinerem, členem správní rady, tímto **zmocňuje**:

Ing. Richarda Rakouše

zaměstnance zmocnitele, datum narození [REDACTED] 1972, bydliště [REDACTED] Praha 8
(dále jen „zmocněnec“)

K jednání za zmocnitele při administraci změn díla u stavby „Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)“ kterou zmocnitel jako zhotovitel provádí pro Pardubický kraj. Zmocněnec je takto za zmocnitele oprávněn projednávat změny díla, podepisovat dokumentaci k těmto změnám se vztahující (zejména tedy změnové listy) a činit další úkony přímo související s administrací změn díla u výše uvedené stavby.

Toto zmocnění souvisí s prováděním výše uvedené stavby a zmocněnec je oprávněn jednat za zmocnitele ve shora uvedeném rozsahu pouze v souvislosti s touto stavbou. Udělené zmocnění zaniká nejpozději 31. 12. 2025.

V Praze dne 01. 10. 2024



Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady
MI Roads a.s.



Ing. Marek Steiner
člen správní rady
MI Roads a.s.

V Srchu dne 01. 10. 2024 zmocnění za zmocněnce přijímám:



Ing. Richard Rakouš
Oblastní ředitel
MI Roads a.s.

MI Roads a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27461

Bankovní spojení – Komerční banka, a.s., účet č. 123-6606630207/0100

IBAN: CZ8001000001236606630207, SWIFT kód (BIC): KOMBCZPP

www.mi-roads.cz

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 169021376-312661-241211094319.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **169021376-312661-241211094319**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Pardubice 19

Datum vyhotovení: **11.12.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



169021376-312661-241211094319

INF/PGP – II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah) – Správce stavby

Společnost: Hrobice

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 Libeň

Zastoupená správcem společnosti:

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 Libeň

Vyřizuje: Ing. Irena Vojnová

Věc: Vyjádření TDI k předloženému ZBV č. 16 SO 102.6 – NOVÁ TRASA METROPOLITNÍ SÍTĚ (PVNHČP)

Vyhrazené změny (doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)

Vážený pane,

na základě Vašeho předložení ZBV č. 16 Vám z pozice technického dozoru investora (TDI), který zastupuje objednatele – Pardubický kraj, v rámci stavby „*Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)*“, sdělujeme následující stanovisko:

1. Cenové vyjádření: Ze strany TDI nejsou k předložené cenové kalkulaci žádné připomínky.
2. Technické vyjádření: Potvrzujeme skutečnosti uvedené ve zdůvodnění ZBV a současně potvrzujeme kontrolu rozsahu odpovídajících prací popsanych v ZBV č. 16 zhotovitele.

V rámci dokladové části jsou doloženy relevantní doklady prokazující provedení prací dle předloženého soupisu prací.

Na základě výše uvedeného doporučujeme z pozice TDI, aby Správce stavby vydal příslušný pokyn v souladu s SoD a smluvními podmínkami.

S pozdravem

Ing. Irena Vojnová

Technický dozor

II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)

INFRAM a.s.



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 17		
Zhotovitel:	„Společnost: Hrobice“, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 17331099			
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 07.10.2025		
Název akce: Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)				
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Datum: 07.10.2025				
<u>Předmět změny:</u>				
SO 102.6 – NOVÁ TRASA METROPOLITNÍ SÍTĚ (PVNHČP)				
Změny v průběhu výstavby				
ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):				
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>				
Změny z nepředvídaných důvodů (dále též „Nepředvídané změny“) jsou změny které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Podmínky § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti tak byly splněny.				
Počet připojených listů specifikací:	14			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☒
Stanovisko projektanta stavby: souhlasí Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasí				
Přílohy: - Podpisový list elektronického schvalování ZBV - Přehled dokladů - Průvodní list zařazení změny do skupiny (pro ZBV číslo: 17) - Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV) - Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3) - Přehled nových položek - Přehled zařazení změn do Skupin - Plná moc Ing. Richard Rakouš - Vyjádření TDI ZBV č.17 - Indiv. kalkulace položky č. 06R.R - CN Eurospoj - CN Telmont - Vyjádření TDI ZBV č.10 a 17 Cena				

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 17
Zhotovitel:	„Společnost: Hrobice“, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 17331099
Změnový list vystavil:	Ing. Richard Rakouš
Datum:	07.10.2025
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/24/23439 tuto změnu rozsahu díla: <u>Předmět změny:</u> SO 102.6 – NOVÁ TRASA METROPOLITNÍ SÍTĚ (PVNHČP) Změny v průběhu výstavby ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): <u>Popis a zdůvodnění změny</u> Na základě pokynu Správce sítě došlo ke změně výrobku kabelových komor metropolitní sítě. Kabelová komora bude typu KOR 173024 s HDPE víkem, rozměry komory: šířka 553/420 mm, délka 845/740 mm, výška 610/600 mm. S ohledem na průběh stávajících inženýrských sítí došlo v místech souběžného vedení metropolitní sítě k uložení této sítě do chrániček PE průměru D=110 mm. Tato změna má dopad na položku č. 10 a potřebu nové položky č. 17581. Z Přílohy č.7 – NOVÁ TRASA METROPOLITNÍ SÍTĚ vyplívá povinnost v místech komunikací a sjezdů uložení do dělení chráničky PE o průměru 160/136. Tento požadavek na vliv na potřebu nové položky č. 87734. <u>Zdůvodnění ceny:</u> bylo poptáno 5 dodavatelů. Celkem zhotovitel obdržel 2 cenové nabídky, z nichž vybral tu s výhodnější cenou, viz. příloha Individuální Kalkulace položky č. 06R.R a cenové nabídky dodavatelů.	
Počet připojených listů specifikací: 14	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
- 32 542,29 Kč	99 457,44 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
66 915,15 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	<u>Počet stavebních dnů se nemění</u>
80 967,30 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum:

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

2020700 - MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1 - PARDUBICKÝ KRAJ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 102.6 - NOVÁ TRASA METROPOLITNÍ SÍTĚ (PVNHČP)

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS

SO 102.6 / 17-ZBV 17

Číslo ZBV

17

Objednatel:Pardubický kraj
Komenského náměstí 125,, 532 11 Pardubice
IČ: 70892822**Zhotovitel:**MI Roads a.s.
Koželušská 2450, 18000 Praha
IČ: 17331099

Finanční rekapitulace ZBV č. 17

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
17	-32 542,29	99 457,44	66 915,15

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Správce stavby:Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění,
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	17
Evidenční číslo a název stavby:	2020700 - MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	1 - PARDUBICKÝ KRAJ
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 102.6 - NOVÁ TRASA METROPOLITNÍ SÍTĚ (PVNHČP)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	1 / 17-ZBV 17

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1 / 3	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1 / 4	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)	1 / 5	
Přehled nových položek	1 / 6	
Přehled zařazení změn do Skupin	1 / 7	
Plná moc_Rakouš_konverze	2 / 8	
Vyjádření TDI ZBV č.17	1 / 10	
Indiv. kalkulace položky č. 06R.R	1 / 11	
CN Eurospoj	1 / 12	
CN Telmont	1 / 13	
Vyjádření TDI ZBV č.10 a 17_Cena	1 / 14	

Průvodní list zařazení změny do skupiny**pro ZBV číslo: 17**

Údaje v Kč bez DPH

Věcně příslušný útvar:	Kořenový - útvar
Název stavby:	MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	1 / 17-ZBV 17
Název SO/PS:	PARDUBICKÝ KRAJ
Číslo podobjektu/rozpočtu:	SO 102.6
Název podobjektu/rozpočtu:	NOVÁ TRASA METROPOLITNÍ SÍTĚ (PVNHČP)

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	125 803 579,60 Kč		
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	124 158 993,38 Kč		
Orient. cena navrhovaných Změn záporných:	-32 542,29 Kč	-0,03%	z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orient. cena navrhovaných Změn kladných:	99 457,44 Kč	0,08%	z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	146 813 989,64 Kč	116,70%	z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny

Popis původního řešení (např. dle PDPS).

Popis návrhu Změny.

Porovnání původního řešení s navrhovaným.

Posouzení možnosti vzniku řetězení Změn.

Popis možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:**ANO / NE****(NEHODÍ SE ŠKTRNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)****ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny** (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):

Cena navrhovaných Změn záporných:

-32 542,29 Kč

Cena navrhovaných Změn kladných:

99 457,44 Kč

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných:

66 915,15 Kč

Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Změny z nepředvídaných důvodů (dále též „Nepředvídané změny“) jsou změny které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Podmínky § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti tak byly splněny.

Kód položky	Název	Množství rozdílu	MJ	Rozdíl (Kč)	Rozdíl %
6	06 Kabelová komora OKOS (1000x800x300)	-2,000	KUS	-15 314,04	-100,00%
10	10 Kabelový prostup z PE rour dělených, o 110	-45,000	M	-17 228,25	-100,00%

Nové položky

Kód položky	Název	Množství rozdílu	MJ	Rozdíl (Kč)	Rozdíl %
196	17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	49,098	M3	54 137,91	100,00%
197	87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM	37,000	M	22 861,93	100,00%
198	06R.R KABELOVÁ KOMORA KOR 173024 S HDPE VÍKEM Š.553xD.845xV.610 mm	2,000		22 457,60	100,00%

Zpracovatel:

Jméno, funkce: ,

Podpis:

Datum:

Schvalovatel - ředitel věcně příslušného útvaru:

Jméno:

Podpis:

Datum:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro celou ZBV číslo: 17

Název stavby:

MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

1 / 17-ZBV 17

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1 - PARDUBICKÝ KRAJ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 102.6 - NOVÁ TRASA METROPOLITNÍ SÍTĚ (PVNHČP)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
124 158 993,38

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-3 117,76	34 702,76	124 190 578,38	31 585,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-32 542,29	99 457,44	134 160,20	0,11

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-35 660,05	124 257 493,53	98 500,15	0,08

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Projektant (autorský dozor)

Stavební dozor:

Správce stavby:

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 17.3

Evidenční číslo a název stavby: 2020700 - MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP Číslo a název SO/PS: 1 - PARDUBICKÝ KRAJ Číslo a název rozpočtu: SO 102.6 - NOVÁ TRASA METROPOLITNÍ SÍTĚ (PVNHČP)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 17-ZBV 17 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	06	Kabelová komora OKOS (1000x800x300)	KUS	2,000	0,000	-2,000	7 657,02	15 314,04	-15 314,04	0,00	0,00	-15 314,04	-100,00
10	10	Kabelový prostup z PE rour dělených, o 110	M	45,000	0,000	-45,000	382,85	17 228,25	-17 228,25	0,00	0,00	-17 228,25	-100,00
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						32 542,29	-32 542,29	0,00	0,00	-32 542,29	-100,00
Nové položky													
196	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	49,098	49,098	1 102,65	0,00	0,00	54 137,91	54 137,91	54 137,91	100,00
197	87734	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	0,000	37,000	37,000	617,89	0,00	0,00	22 861,93	22 861,93	22 861,93	100,00
198	06R.R	KABELOVÁ KOMORA KOR 173024 S HDPE VÍKEM Š.553xD.845xV.610 mm		0,000	2,000	2,000	11 228,80	0,00	0,00	22 457,60	22 457,60	22 457,60	100,00
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	99 457,44	99 457,44	99 457,44	100,00
		Celkem za všechny změněné položky						32 542,29	-32 542,29	99 457,44	99 457,44	66 915,15	205,63

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	17
Název a evidenční číslo stavby:	MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP - 2020700
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	PARDUBICKÝ KRAJ
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	1/17-ZBV 17

Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena Celkem	Původ jednotkové ceny
06R.R	KABELOVÁ KOMORA KOR 173024 S HDPE VÍKEM Š.553xD.845xV.610 mm		2,000	11 228,80	22 457,60	
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	49,098	1 102,65	54 137,91	OTSKP 2024
87734	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	37,000	617,89	22 861,93	OTSKP 2024

Za Zhotovitele

Datum:

Za Objednatele

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:		MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP - 2020700			Sledování limitu 50 % od účinnosti novely ZZVZ je ponecháno jen pro nezávaznou informaci			Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15% z Přijaté smluvní částky		do 31.12.2021	od 1.1.2022	od 1.1.2024	a max. 137 366 000 Kč do 31.12.2021	a max. 140 448 000 Kč od 1.1.2022	a max. 135 348 000 Kč od 1.1.2024			
1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	125 803 579,60 Kč	6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a 4	19 622 035,41 Kč	9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	25,19%	12=39	Sledování čerpání limitu	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	146 813 989,64 Kč	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % součet Skupiny 3 a Skupiny 4	15,60%	10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč		
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	116,70%	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	37 741 073,88 Kč	11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	62 901 789,80 Kč	14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,00%	0,00%	0,00%			
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	1,10%														OK v limitu	OK v limitu	OK v limitu
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%																
15 % z Přijaté smluvní částky		18 870 536,94 Kč																

						Skupiny změn																			
						-1-			-2-			-3-					-4-				-5-				-6-
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) v rámci limitu 30% lze odečíst pouze změny záporné, které se změnami kladnými přímo souvisí					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Suma Změn záporných nesouvisející se Změnami kladnými nezapočítává se do limitu 30 %	Změny kladné	Suma Změn kladných a Změn záporných, které souvisí se Změnami kladnými (hodnota jde do výpočtu limitu 30 %)	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné		
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28.a	28.b	29	30=28.a+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(39/1)*100	39= 36 +37	40
			- 6 604 709,49 Kč	27 615 119,53 Kč	21 010 410,04 Kč	- 573 049,67 Kč	1 961 424,30 Kč	1 388 374,63 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 6 031 659,82 Kč	0,00 Kč	25 653 695,23 Kč	19 622 035,41 Kč	31 685 355,05 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	01	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 01 Nebezpečný odpad	- 102 822,88 Kč	4 919 073,00 Kč	4 816 250,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 102 822,88 Kč	0,00 Kč	4 919 073,00 Kč	4 816 250,12 Kč	5 021 895,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	02	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 02 Sanace podloží	0,00 Kč	1 589 229,95 Kč	1 589 229,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 589 229,95 Kč	1 589 229,95 Kč	1 589 229,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	03	PARDUBICKÝ KRAJ / Změny vyhrazené_doměrky	- 292 719,62 Kč	1 205 340,00 Kč	912 620,38 Kč	- 292 719,62 Kč	1 205 340,00 Kč	912 620,38 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	04	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny	0,00 Kč	346 048,09 Kč	346 048,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	346 048,09 Kč	346 048,09 Kč	346 048,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	05	PARDUBICKÝ KRAJ / Změny vyhrazené_doměrky	- 1 901,85 Kč	119 410,86 Kč	117 509,01 Kč	- 1 901,85 Kč	119 410,86 Kč	117 509,01 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	06	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 06 Změny vyhrazené_doměrky	- 155 177,66 Kč	351 946,27 Kč	196 768,61 Kč	- 155 177,66 Kč	351 946,27 Kč	196 768,61 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	07	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 07 Nepředvídané změny - dle RDS	- 1 182 024,76 Kč	3 768 009,22 Kč	2 585 984,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 1 182 024,76 Kč	0,00 Kč	3 768 009,22 Kč	2 585 984,46 Kč	4 950 033,98 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	08	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny - dle RDS	- 365 925,32 Kč	851 447,03 Kč	485 521,71 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 365 925,32 Kč	0,00 Kč	851 447,03 Kč	485 521,71 Kč	1 217 372,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	09	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny - změna provedení propustku KM 1,124	- 68 851,38 Kč	969 461,59 Kč	900 610,21 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 68 851,38 Kč	0,00 Kč	969 461,59 Kč	900 610,21 Kč	1 038 312,97 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	10	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny	- 68 913,18 Kč	563 359,28 Kč	494 446,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 68 913,18 Kč	0,00 Kč	563 359,28 Kč	494 446,10 Kč	632 272,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	11	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny	- 4 210 246,36 Kč	11 611 116,78 Kč	7 400 870,42 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 4 210 246,36 Kč	0,00 Kč	11 611 116,78 Kč	7 400 870,42 Kč	15 821 363,14 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	12	PARDUBICKÝ KRAJ / Změny vyhrazené_doměrky	- 20 595,30 Kč	147 135,60 Kč	126 540,30 Kč	- 20 595,30 Kč	147 135,60 Kč	126 540,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	13	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny	- 333,65 Kč	363 889,69 Kč	363 556,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 333,65 Kč	0,00 Kč	363 889,69 Kč	363 556,04 Kč	364 223,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	14	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 14 Změny vyhrazené_doměrky	- 99 537,48 Kč	102 888,81 Kč	3 351,33 Kč	- 99 537,48 Kč	102 888,81 Kč	3 351,33 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	15	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 15 Nepředvídané změny	0,00 Kč	572 603,16 Kč	572 603,16 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	572 603,16 Kč	572 603,16 Kč	572 603,16 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	16	PARDUBICKÝ KRAJ / Změny vyhrazené_doměrky	- 3 117,76 Kč	34 702,76 Kč	31 585,00 Kč	- 3 117,76 Kč	34 702,76 Kč	31 585,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	17	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny	- 32 542,29 Kč	99 457,44 Kč	66 915,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 32 542,29 Kč	0,00 Kč	99 457,44 Kč	66 915,15 Kč	131 999,73 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení
Vyhodnocení limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky v řádku 7 sloupce W, X, Y jsou orientační. Pro sledování limitů je vždy rozhodující datum schválení daného ZBV a limity platné v roce, kdy bylo ZBV schváleno oprávněnou osobou Objednatele.
Sledování limitu 50 % od účinnosti novely ZZVZ je ponecháno jen pro nezávaznou informaci Objednatele

Legenda:
 ZBV s datem schválení do 31.12.2021
 ZBV s datem schválení od 1.1.2022
 ZBV s datem schválení od 1.1.2024
 ZBV bez datu schválení:

PLNÁ MOC

Společnost **MI Roads a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, identifikační číslo 17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27461 (dále též jen „zmocnitel“), jehož zastupuje správní rada společnosti jednající Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady, a Ing. Markem Steinerem, členem správní rady, tímto **zmocňuje**:

Ing. Richarda Rakouše

zaměstnance zmocnitele, datum narození [REDACTED] 1972, bydliště [REDACTED] Praha 8
(dále jen „zmocněnec“)

K jednání za zmocnitele při administraci změn díla u stavby „Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)“ kterou zmocnitel jako zhotovitel provádí pro Pardubický kraj. Zmocněnec je takto za zmocnitele oprávněn projednávat změny díla, podepisovat dokumentaci k těmto změnám se vztahující (zejména tedy změnové listy) a činit další úkony přímo související s administrací změn díla u výše uvedené stavby.

Toto zmocnění souvisí s prováděním výše uvedené stavby a zmocněnec je oprávněn jednat za zmocnitele ve shora uvedeném rozsahu pouze v souvislosti s touto stavbou. Udělené zmocnění zaniká nejpozději 31. 12. 2025.

V Praze dne 01. 10. 2024

[REDACTED]
Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady
MI Roads a.s.

[REDACTED]
Ing. Marek Steiner
člen správní rady
MI Roads a.s.

V Srchu dne 01. 10. 2024 zmocnění za zmocněnce přijímám:

[REDACTED]
Ing. Richard Rakouš
Oblastní ředitel
MI Roads a.s.

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 169021376-312661-241211094319.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **169021376-312661-241211094319**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Pardubice 19

Datum vyhotovení: **11.12.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



169021376-312661-241211094319

INF/PGP – II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah) – Správce stavby

Společnost: Hrobice

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 Libeň

Zastoupená správcem společnosti:

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 Libeň

Vyřizuje: Ing. Irena Vojnová

Věc: Vyjádření TDI k předloženému ZBV č. 17 SO 102.6 – NOVÁ TRASA METROPOLITNÍ SÍTĚ (PVNHČP)

Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):

Vážený pane,

na základě Vašeho předložení ZBV č. 17 Vám z pozice technického dozoru investora (TDI), který zastupuje objednatele – Pardubický kraj, v rámci stavby „*Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)*“, sdělujeme následující stanovisko:

1. Cenové vyjádření: Ze strany TDI nejsou k předložené cenové kalkulaci žádné připomínky. Nové položky jsou řešeny dle Smluvních podmínek – ceník OTSKP
2. Technické vyjádření: Potvrzujeme skutečnosti uvedené ve zdůvodnění ZBV a současně potvrzujeme kontrolu rozsahu odpovídajících prací popsaných v ZBV č. 17 zhotovitele.

V rámci dokladové části jsou doloženy relevantní doklady prokazující provedení prací dle předloženého soupisu prací.

Na základě výše uvedeného doporučujeme z pozice TDI, aby Správce stavby vydal příslušný pokyn v souladu s SoD a smluvními podmínkami.

S pozdravem

Ing. Irena Vojnová

Technický dozor

II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)

INFRAM a.s.

Stavba: „Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)“					Datum: 06.08.2025		
SO:	P.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	JC	Odbytová cena
101.6		06R.R	KABELOVÁ KOMORA KOR 173024 S HDPE VÍKEM Š.553xD.845xV.610 mm	KUS	1,00	11 228,80 Kč	11 228,80 Kč
- dodávka kabelové komory na stavbu							

detailní kalkulace položky s rozpisem na jednotlivé kalkulované potřeby:

Typ potřeby	popis potřeby	mj	množství /mj pol	JC potřeby	cena potřeby
HMOTY					9 764,17 Kč
	KABELOVÁ KOMORA KOR 173024 S HDPE VÍKEM Š.553xD.845xV.610 mm	KUS	1,000	9 764,17 Kč	9 764,17 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
MZDY					0,00 Kč
	odvody z mezd (33,8 %)			33,80%	0,00 Kč
		Nh			0,00 Kč
		Nh			0,00 Kč
		Nh			0,00 Kč
					0,00 Kč
STROJE					0,00 Kč
		Sh			0,00 Kč
		Sh			0,00 Kč
		Sh			0,00 Kč
		Sh			0,00 Kč
		Sh			0,00 Kč
		Sh			0,00 Kč
					0,00 Kč
OSTATNÍ					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
SUBDODÁVKY					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
Nákladová cena (bez DPH)					9 764,17 Kč
Výrobní režie				5,00%	488,21 Kč
Správní režie				5,00%	488,21 Kč
Zisk				5,00%	488,21 Kč
Odbytová cena (bez DPH)					11 228,80 Kč

Příloha:	Cenové nabídky TELMOT s.r.o., EUROSPOJ s.r.o.
----------	---

DODAVATEL

Eurospoj, s.r.o.

Průmyslová 387, 53003 Pardubice

IČ: 47473991

DIČ: CZ47473991

Telefon: 466 616 101

Mobil: [REDACTED]

ODBĚRATEL

Banka: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 183838200/0300

Variabilní symbol: 1126

Způsob platby: bankovním převodem

NÁZEV	MNOŽSTVÍ	CENA	Montáž	CENA CELKEM
Kabelová komora OKOS (1000x800x300) náhrada KOR 173024 s HDPE víkem	1	9 957,00 Kč	- Kč	9 957,00 Kč

CENA CELKEM 9 957,00

DPH 2 090,97

Celkem k platbě 12 047,97

Razítko a podpis:

13.8.2024

Stavba:		2020700 MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - FIN				
Objekt:		1 PARDUBICKÝ KRAJ				
Rozpočet:		NOVÁ TRASA METROPOLITNÍ SÍTĚ (PVNHČP)				
CN kabelové komory						
Poř. číslo	Kód položky	Varianťa	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena
1	2	3	4	5	6	JednotkováCelkem
						910
1Zemní práce				KUS	1,000	9 764,17
			Kabelová komora OKOS (1000x800x300) náhrada KOR 173024 s HDPE víkem			9 764,17

Vypracoval: ŠÍDLO Svatopluk
 Telmont s.r.o.
 Topol 13
 Chrudim 537 01

16-08-2024

Společnost: Hrobice

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 Libeň

Zastoupená správcem společnosti:

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 Libeň

Vyřizuje: Ing. Leoš Buřval

Věc: Vyjádření TDI – Claim manager k předloženému ZBV č. 10 a č. 17

Vážený pane, na základě Vašeho předložení ZBV č. 10 a č. 17 Vám z pozice technického dozoru investora (TDI) – Claim managera, který zastupuje objednatele, tj. Pardubický kraj, v rámci stavby „Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)“, sdělujeme následující stanovisko:

Cenové vyjádření:

Ze strany TDI byla provedena kontrola využití nové položky z kalkulace

06R.R KABELOVÁ KOMORA KOR 173024 S HDPE VÍKEM Š.553xD.845xV.610 mm

Položka byla využita v souladu se Smlouvou o dílo (SOD) a Smluvními podmínkami.

- Nebylo možné využít položky ze soupisu prací, který byl součástí zadávacího řízení, neboť charakter stavebních prací jim neodpovídal.
- Nebylo možné využít odpovídající položku z ceníku OTSKP
- Jedná se o specifický výrobek, který je v rámci inženýrských sítí nutné řešit dodavatelským způsobem (poptávkou u výrobců těchto prvků). Zhotovitel v rámci poptávání dokládá dvě nabídky a využívá ekonomicky výhodnější variantu. Tento způsob určení jednotkové ceny odpovídá SoD a smluvním podmínkám.

Z pozice technického dozoru investora (TDI) – Claim managera souhlasím s využitím položky **06R.R KABELOVÁ KOMORA KOR 173024 S HDPE VÍKEM Š.553xD.845xV.610 mm**, přičemž její cenová úroveň odpovídá cenám obvyklým v daném čase a místě.

S pozdravem

Ing. Leoš Buřval DiS.

Technický dozor

II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)

INFRAM a.s.

Souhlas Správce stavby

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 18	
Zhotovitel:	„Společnost: Hrobice“, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 17331099		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 10.10.2025	
Název akce: Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)			
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐
Datum: 10.10.2025			osobně ☐
Předmět změny:			
SO 102.3 – PROPUSTEK V KM 1,939 (PVNHČP)			
Změny v průběhu výstavby			
ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změny z nepředvídaných důvodů (dále též „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Podmínky § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti tak byly splněny.			
Počet připojených listů specifikací:	28		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Stanovisko projektanta stavby: souhlasí			
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasí			
Přílohy:			
- Podpisový list elektronického schvalování ZBV - Přehled dokladů - Průvodní list zařazení změny do skupiny (pro ZBV číslo: 18) - Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV) - Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3) - Přehled nových položek - Přehled zařazení změn do Skupin - SO_102_09_1_PROP_KM_1_939_ZMENA_a - SO_102_09_2_PROP_KM_1_939_DETAILY_ZMENA_a - ZBV 18 - Fotodokumentace - Plná moc Ing. Richard Rakouš - Vyjádření TDI ZBV č.18			

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 18
Zhotovitel:	„Společnost: Hrobice“, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 17331099
Změnový list vystavil:	Ing. Richard Rakouš
Datum:	10.10.2025
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/24/23439 tuto změnu rozsahu díla: <u>Předmět změny:</u> SO 102.3 – PROPUSTEK V KM 1,939 (PVNHČP) Změny v průběhu výstavby <u>Popis a zdůvodnění změny</u> Název změny: Úprava čelní zdi propustku a související konstrukce z důvodu kolize s tlakovou kanalizací VAK Důvod změny: Při realizaci došlo ke zjištění kolize se stávající tlakovou kanalizací VAK u výtoku propustku v km 1,939. Pro zajištění dostatečných prostorových poměrů a koordinaci s vedením metropolitní sítě bylo nutné upravit polohu a konstrukční řešení propustku. Popis změny: • Čelní zeď propustku byla posunuta o 0,50 m směrem k ose vozovky. • Z důvodu koordinace se svodidlem a metropolitní sítí byla změněna šířka odvodňovací tvárnice. • Tlaková kanalizace VAK bude v místě propustku uložena do izolované chráničky. • Délka kolmé čelní zdi byla upravena na 7,50 m, včetně železobetonového základu, římsy a zábradlí. Dopad do výkazu výměr: • Kladné změny: 014102 1, 131738, 17581, 317325, 451365, 711311 1, 711311 2, 899574 • Záporné změny: 18110 1, 272324, 327324, 348171, 451312, 451324, 451366 1, 451366 2, 45152, 711311 3, 82484 Nové položky dle OTSKP 2024: 91355, 78381, 21461F, 87734	
Počet připojených listů specifikací: 26	Počet připojených výkresů: 2
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
-54 541,62 Kč	105 756,68 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
51 215,06 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	

61 970,20 Kč

Počet stavebních dnů se nemění

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele díla:

Podpis zmocněnce zhotovitele díla:

Datum:

Datum:

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

2020700 - MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1 - PARDUBICKÝ KRAJ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 102.3 - PROPUSTEK V KM 1,939 (PVNHČP)

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS

SO 102.3 / 18-ZBV 18

Číslo ZBV

18

Objednatel: Pardubický kraj

Komenského náměstí 125,, 532 11 Pardubice

IČ: 70892822

Zhotovitel: MI Roads a.s.

Koželužská 2450, 18000 Praha

IČ: 17331099

Finanční rekapitulace ZBV č. 18

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18	-54 541,62	105 756,68	51 215,06

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění,

Podpis

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	18
Evidenční číslo a název stavby:	2020700 - MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	1 - PARDUBICKÝ KRAJ
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 102.3 - PROPUSTEK V KM 1,939 (PVNHČP)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	1 / 18-ZBV 18

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	2 / 3	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1 / 5	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)	1 / 6	
Přehled nových položek	1 / 7	
Přehled zařazení změn do Skupin	1 / 8	
SO_102_09_1_PROP_KM_1_939_ZMENA_a	1 / 9	
SO_102_09_2_PROP_KM_1_939_DETAILY_ZMENA_a	1 / 10	
ZBV 18 - Fotodokumentace	15 / 11	
Plná moc_Rakouš_konverze	2 / 26	
Vyjádření TDI ZBV č.18	1 / 28	

Průvodní list zařazení změny do skupiny**pro ZBV číslo: 18**

Údaje v Kč bez DPH

Věcně příslušný útvar:	Kořenový - útvar
Název stavby:	MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	1 / 18-ZBV 18
Název SO/PS:	PARDUBICKÝ KRAJ
Číslo podobjektu/rozpočtu:	SO 102.3
Název podobjektu/rozpočtu:	PROPUSTEK V KM 1,939 (PVNHČP)

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	125 803 579,60 Kč		
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	124 158 993,38 Kč		
Orient. cena navrhovaných Změn záporných:	-54 541,62 Kč	-0,04%	z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orient. cena navrhovaných Změn kladných:	105 756,68 Kč	0,09%	z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	145 965 960,67 Kč	116,03%	z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny

Popis původního řešení (např. dle PDPS).

Popis návrhu Změny.

Porovnání původního řešení s navrhovaným.

Posouzení možnosti vzniku řetězení Změn.

Popis možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:**ANO / NE****(NEHODÍ SE ŠKTRNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)****ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny** (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):

Cena navrhovaných Změn záporných: -54 541,62 Kč

Cena navrhovaných Změn kladných: 105 756,68 Kč

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných: 51 215,06 Kč

Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Změny z nepředvídaných důvodů (dále též „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Podmínky § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti tak byly splněny

Kód položky	Název	Množství rozdílu	MJ	Rozdíl (Kč)	Rozdíl %
1	014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU	81,841	T	818,41	18,76%
6	131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	40,921	M3	6 813,76	18,76%
7	17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	2,092	M3	1 988,59	1,20%
8	18110.1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	-4,139	M2	-52,03	-6,07%
10	272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	-0,585	M3	-3 235,03	-6,25%
11	317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	0,085	M3	2 097,82	8,17%
12	327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30	-0,406	M3	-3 365,07	-2,97%
13	348171 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM	-6,791	KG	-1 848,17	-5,80%
14	451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	-0,256	M3	-1 025,77	-12,65%
16	451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30	-0,399	M3	-1 805,97	-3,48%
17	451365 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI 10505, B500B	0,126	T	3 848,14	153,66%
18	451366.1 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	-0,435	T	-13 285,25	-24,03%
19	451366.2 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	-0,217	T	-6 627,36	-24,11%
20	45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	-1,261	M3	-1 394,04	-5,41%
27	711311.1 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	13,326	M2	4 069,89	13,18%
28	711311.2 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	107,441	M2	32 813,56	348,60%

Průvodní list zařazení změny do skupiny**pro ZBV číslo: 18**

Údaje v Kč bez DPH

Věcně příslušný útvar:	Kořenový - útvar
Název stavby:	MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	1 / 18-ZBV 18
Název SO/PS:	PARDUBICKÝ KRAJ
Číslo podobjektu/rozpočtu:	SO 102.3
Název podobjektu/rozpočtu:	PROPUSTEK V KM 1,939 (PVNHČP)

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	125 803 579,60 Kč		
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	124 158 993,38 Kč		
Orient. cena navrhovaných Změn záporných:	-54 541,62 Kč	-0,04%	z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orient. cena navrhovaných Změn kladných:	105 756,68 Kč	0,09%	z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	145 965 960,67 Kč	116,03%	z Přijaté smluvní částky

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):

Cena navrhovaných Změn záporných: -54 541,62 Kč

Cena navrhovaných Změn kladných: 105 756,68 Kč

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných: 51 215,06 Kč

Kód položky	Název	Množství rozdílu	MJ	Rozdíl (Kč)	Rozdíl %
29	711311.3 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	-31,500	M2	-9 620,42	-11,02%
30	82484 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETON DN DO 1600MM	-0,483	M	-12 282,51	-3,16%
31	899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ŽE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE	2,556	M3	17 259,75	8,63%

Nové položky

Kód položky	Název	Množství rozdílu	MJ	Rozdíl (Kč)	Rozdíl %
199	91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	1,000	KUS	1 443,98	100,00%
200	78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	24,032	M2	9 718,06	100,00%
201	21461F SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2	168,978	M2	19 016,78	100,00%
202	87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM	9,500	M	5 869,95	100,00%

Zpracovatel:

Jméno, funkce: ,

Podpis:

Datum:

Schvalovatel - ředitel věcně příslušného útvaru:

Jméno:

Podpis:

Datum:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro celou ZBV číslo: 18

Název stavby:

MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

1 / 18-ZBV 18

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1 - PARDUBICKÝ KRAJ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 102.3 - PROPUSTEK V KM 1,939 (PVNHČP)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
124 158 993,38

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-6 436 320,63	26 547 486,64	144 270 159,39	20 111 166,01

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-54 541,62	105 756,68	26 653 243,32	21,47

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-6 490 862,25	144 321 374,45	20 162 381,07	16,24

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Projektant (autorský dozor)

Stavební dozor:

Správce stavby:

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 18.3

Evidenční číslo a název stavby: 2020700 - MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 18-ZBV 18					
Číslo a název SO/PS: 1 - PARDUBICKÝ KRAJ Číslo a název rozpočtu: SO 102.3 - PROPUSTEK V KM 1,939 (PVNHČP)								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102. 1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	436,269	518,110	81,841	10,00	4 362,69	0,00	818,41	5 181,10	818,41	18,76
6	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	218,134	259,055	40,921	166,51	36 321,49	0,00	6 813,76	43 135,25	6 813,76	18,76
7	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	175,028	177,120	2,092	950,57	166 376,37	0,00	1 988,59	168 364,96	1 988,59	1,20
8	18110.1	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	68,150	64,011	-4,139	12,57	856,65	-52,03	0,00	804,62	-52,03	-6,07
10	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	9,360	8,775	-0,585	5 529,96	51 760,43	-3 235,03	0,00	48 525,40	-3 235,03	-6,25
11	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	1,040	1,125	0,085	24 680,25	25 667,46	0,00	2 097,82	27 765,28	2 097,82	8,17
12	327324	ZDI OPĚRNÉ, ŽÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30	M3	13,693	13,287	-0,406	8 288,34	113 492,24	-3 365,07	0,00	110 127,17	-3 365,07	-2,97
13	348171	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM	KG	117,133	110,342	-6,791	272,15	31 877,75	-1 848,17	0,00	30 029,58	-1 848,17	-5,80
14	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	2,024	1,768	-0,256	4 006,91	8 109,99	-1 025,77	0,00	7 084,22	-1 025,77	-12,65
16	451324	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30	M3	11,471	11,072	-0,399	4 526,25	51 920,61	-1 805,97	0,00	50 114,64	-1 805,97	-3,48
17	451365	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI 10505, B500B	T	0,082	0,208	0,126	30 540,81	2 504,35	0,00	3 848,14	6 352,49	3 848,14	153,66
18	451366. 1	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	1,810	1,375	-0,435	30 540,81	55 278,87	-13 285,25	0,00	41 993,62	-13 285,25	-24,03
19	451366. 2	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	0,900	0,683	-0,217	30 540,81	27 486,73	-6 627,36	0,00	20 859,37	-6 627,36	-24,11
20	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	23,296	22,035	-1,261	1 105,50	25 753,73	-1 394,04	0,00	24 359,69	-1 394,04	-5,41
27	711311. 1	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	101,079	114,405	13,326	305,41	30 870,54	0,00	4 069,89	34 940,43	4 069,89	13,18
28	711311. 2	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	30,821	138,262	107,441	305,41	9 413,04	0,00	32 813,56	42 226,60	32 813,56	348,60
29	711311. 3	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	285,766	254,266	-31,500	305,41	87 275,79	-9 620,42	0,00	77 655,37	-9 620,42	-11,02
30	82484	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETON DN DO 1600MM	M	15,283	14,800	-0,483	25 429,62	388 640,88	-12 282,51	0,00	376 358,37	-12 282,51	-3,16
31	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	29,622	32,178	2,556	6 751,85	200 003,30	0,00	17 257,73	217 261,03	17 257,73	8,63
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						1 317 972,91	-54 541,62	69 707,90	1 333 139,19	15 166,28	1,15
Nové položky													
199	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	0,000	1,000	1,000	1 443,98	0,00	0,00	1 443,98	1 443,98	1 443,98	100,00
200	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	0,000	24,032	24,032	404,38	0,00	0,00	9 718,06	9 718,06	9 718,06	100,00
201	21461F	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 600G/M2	M2	0,000	168,978	168,978	112,54	0,00	0,00	19 016,78	19 016,78	19 016,78	100,00
202	87734	CHRÁNICÍKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	0,000	9,500	9,500	617,89	0,00	0,00	5 869,96	5 869,96	5 869,96	100,00
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	36 048,78	36 048,78	36 048,78	100,00
		Celkem za všechny změněné položky						1 317 972,91	-54 541,62	105 756,68	1 369 187,97	51 215,06	3,89

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	18
Název a evidenční číslo stavby:	MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP - 2020700
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	PARDUBICKÝ KRAJ
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	1/18-ZBV 18

Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena Celkem	Původ jednotkové ceny
21461F	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2	M2	168,978	112,54	19 016,78	OTSKP 2024
78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	24,032	404,38	9 718,06	OTSKP 2024
87734	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	9,500	617,89	5 869,95	OTSKP 2024
91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	1,000	1 443,98	1 443,98	OTSKP 2024

Za Zhotovitele

Datum:

Za Objednatele

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:		MODERNIZACE SILNICE II/324 STARÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH) - PDPS - SP - 2020700		Sledování limitu 50 % od účinnosti novely ZZVZ je ponecháno jen pro nezávaznou informaci		Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15% z Přijaté smluvní částky		do 31.12.2021	od 1.1.2022	od 1.1.2024	a max. 137 366 000 Kč do 31.12.2021	a max. 140 448 000 Kč od 1.1.2022	a max. 135 348 000 Kč od 1.1.2024			
1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	125 803 579,60 Kč	6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a 4	18 772 640,26 Kč	9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	24,49%	12=39	Sledování čerpání limitu	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	145 965 960,67 Kč	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % součet Skupiny 3 a Skupiny 4	14,92%	10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč	18 870 536,94 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	116,03%	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	37 741 073,88 Kč	11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	62 901 789,80 Kč	14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky	0,00%	0,00%	0,00%			
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	1,10%	OK v limitu													
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%	OK v limitu													
15 % z Přijaté smluvní částky		18 870 536,94 Kč	OK v limitu													

						Skupiny změn																			
						-1-			-2-			-3-					-4-				-5-				-6-
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) v rámci limitu 30% lze odečíst pouze změny záporné, které se změnami kladnými přímo souvisí					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Suma Změn záporných nesouvisející se Změnami kladnými nezapočítává se do limitu 30 %	Změny kladné	Suma Změn kladných a Změn záporných, které souvisí se Změnami kladnými (hodnota jde do výpočtu limitu 30 %)	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28.a	28.b	29	30=28.a+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(39/1)*100	39= 36 +37	40
			- 6 490 862,25 Kč	26 653 243,32 Kč	20 162 381,07 Kč	- 473 512,19 Kč	1 863 253,00 Kč	1 389 740,81 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 6 017 350,06 Kč	0,00 Kč	24 789 990,32 Kč	18 772 640,26 Kč	30 807 340,38 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	01	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 01 Nebezpečný odpad	- 102 822,88 Kč	4 919 073,00 Kč	4 816 250,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 102 822,88 Kč	0,00 Kč	4 919 073,00 Kč	4 816 250,12 Kč	5 021 895,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	02	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 02 Sanace podloží	0,00 Kč	1 589 229,95 Kč	1 589 229,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 589 229,95 Kč	1 589 229,95 Kč	1 589 229,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	03	PARDUBICKÝ KRAJ / Změny vyhrazené_doměrky	- 292 719,62 Kč	1 205 340,00 Kč	912 620,38 Kč	- 292 719,62 Kč	1 205 340,00 Kč	912 620,38 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	04	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny	0,00 Kč	346 048,09 Kč	346 048,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	346 048,09 Kč	346 048,09 Kč	346 048,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	05	PARDUBICKÝ KRAJ / Změny vyhrazené_doměrky	- 1 901,85 Kč	119 410,86 Kč	117 509,01 Kč	- 1 901,85 Kč	119 410,86 Kč	117 509,01 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	06	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 06 Změny vyhrazené_doměrky	- 155 177,66 Kč	351 946,27 Kč	196 768,61 Kč	- 155 177,66 Kč	351 946,27 Kč	196 768,61 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	07	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 07 Nepředvídané změny - dle RDS	- 1 182 024,76 Kč	3 768 009,22 Kč	2 585 984,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 1 182 024,76 Kč	0,00 Kč	3 768 009,22 Kč	2 585 984,46 Kč	4 950 033,98 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	08	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny - dle RDS	- 365 925,32 Kč	851 447,03 Kč	485 521,71 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 365 925,32 Kč	0,00 Kč	851 447,03 Kč	485 521,71 Kč	1 217 372,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	10	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny	- 68 913,18 Kč	563 359,28 Kč	494 446,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 68 913,18 Kč	0,00 Kč	563 359,28 Kč	494 446,10 Kč	632 272,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	11	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny	- 4 210 246,36 Kč	11 611 116,78 Kč	7 400 870,42 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 4 210 246,36 Kč	0,00 Kč	11 611 116,78 Kč	7 400 870,42 Kč	15 821 363,14 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	12	PARDUBICKÝ KRAJ / Změny vyhrazené_doměrky	- 20 595,30 Kč	147 135,60 Kč	126 540,30 Kč	- 20 595,30 Kč	147 135,60 Kč	126 540,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	13	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny	- 333,65 Kč	363 889,69 Kč	363 556,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 333,65 Kč	0,00 Kč	363 889,69 Kč	363 556,04 Kč	364 223,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	15	PARDUBICKÝ KRAJ / ZBV 15 Nepředvídané změny	0,00 Kč	572 603,16 Kč	572 603,16 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	572 603,16 Kč	572 603,16 Kč	572 603,16 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	16	PARDUBICKÝ KRAJ / Změny vyhrazené_doměrky	- 3 117,76 Kč	34 702,76 Kč	31 585,00 Kč	- 3 117,76 Kč	34 702,76 Kč	31 585,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	16	PARDUBICKÝ KRAJ / Změny RDS, doměrky	0,00 Kč	4 717,51 Kč	4 717,51 Kč	0,00 Kč	4 717,51 Kč	4 717,51 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	17	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny	- 32 542,29 Kč	99 457,44 Kč	66 915,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 32 542,29 Kč	0,00 Kč	99 457,44 Kč	66 915,15 Kč	131 999,73 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	18	PARDUBICKÝ KRAJ / Nepředvídané změny - dle RDS	- 54 541,62 Kč	105 756,68 Kč	51 215,06 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 54 541,62 Kč	0,00 Kč	105 756,68 Kč	51 215,06 Kč	160 298,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení
Vyhodnocení limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky v řádku 7 sloupce W, X, Y jsou orientační. Pro sledování limitů je vždy rozhodující datum schválení daného ZBV a limity platné v roce, kdy bylo ZBV schváleno oprávněnou osobou Objednatele.
Sledování limitu 50 % od účinnosti novely ZZVZ je ponecháno jen pro nezávaznou informaci Objednatele

Legenda:

ZBV s datem schválení do 31.12.2021


ZBV s datem schválení od 1.1.2022

ZBV s datem schválení od 1.1.2024


ZBV bez datu schválení:

PROPUSTEK V KM 1,939 M 1:50


PŮDORYS

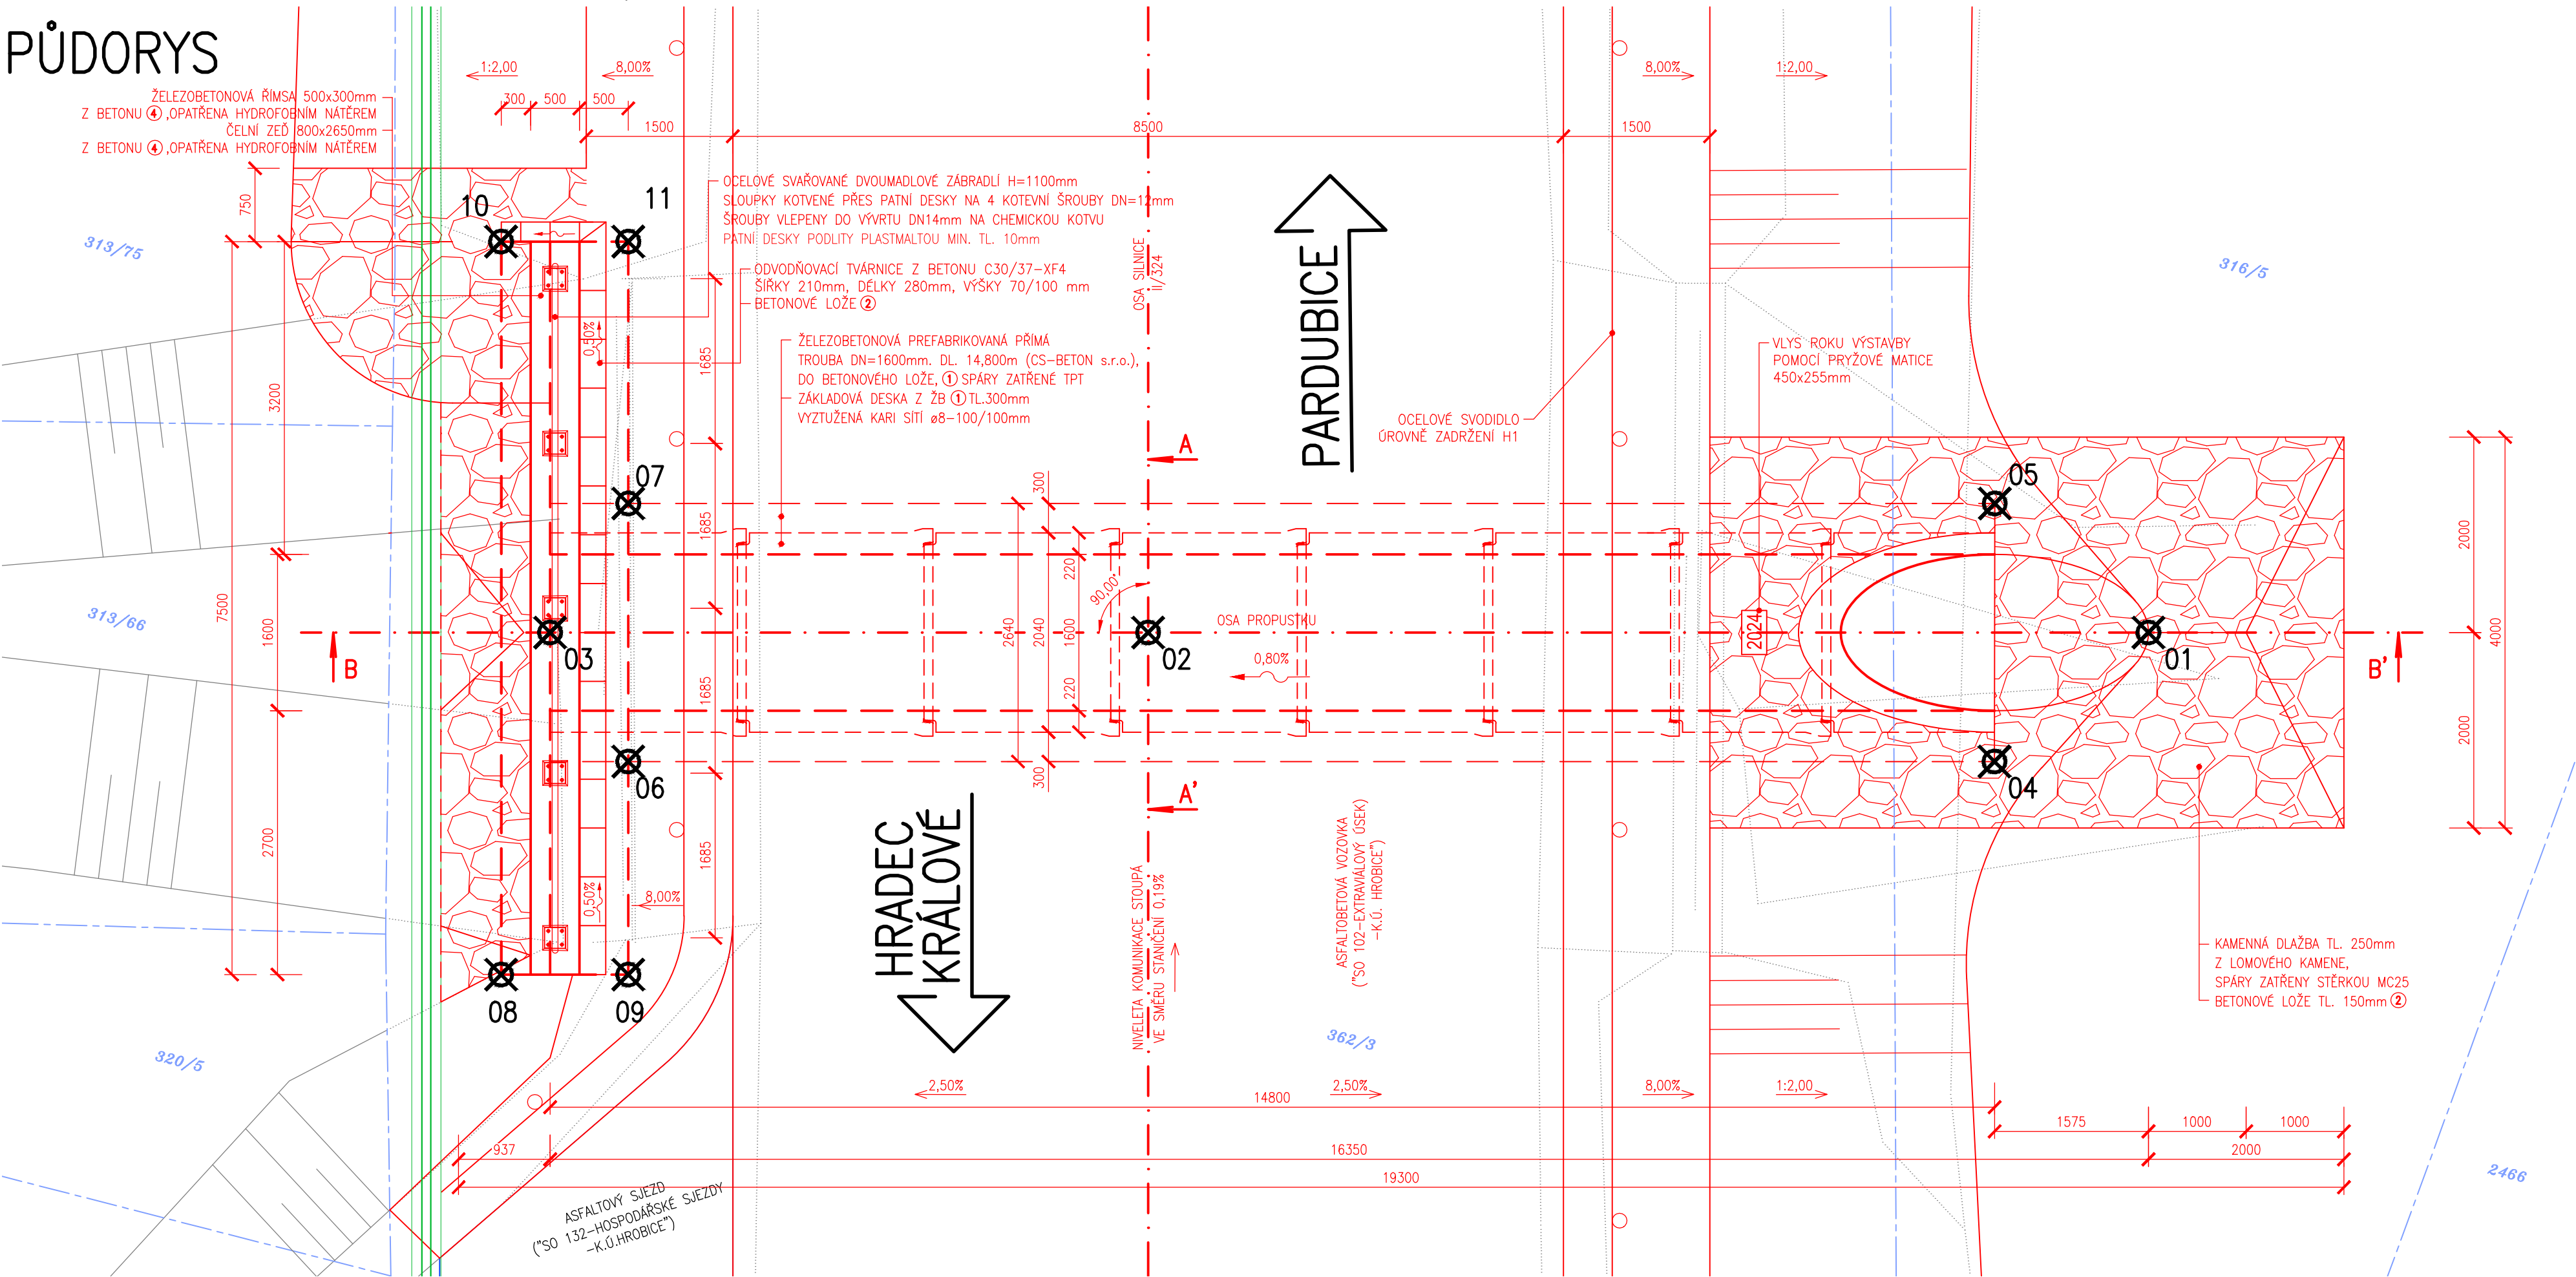

PŘÍČNÝ ŘEZ (ŘEZ: B–B’)

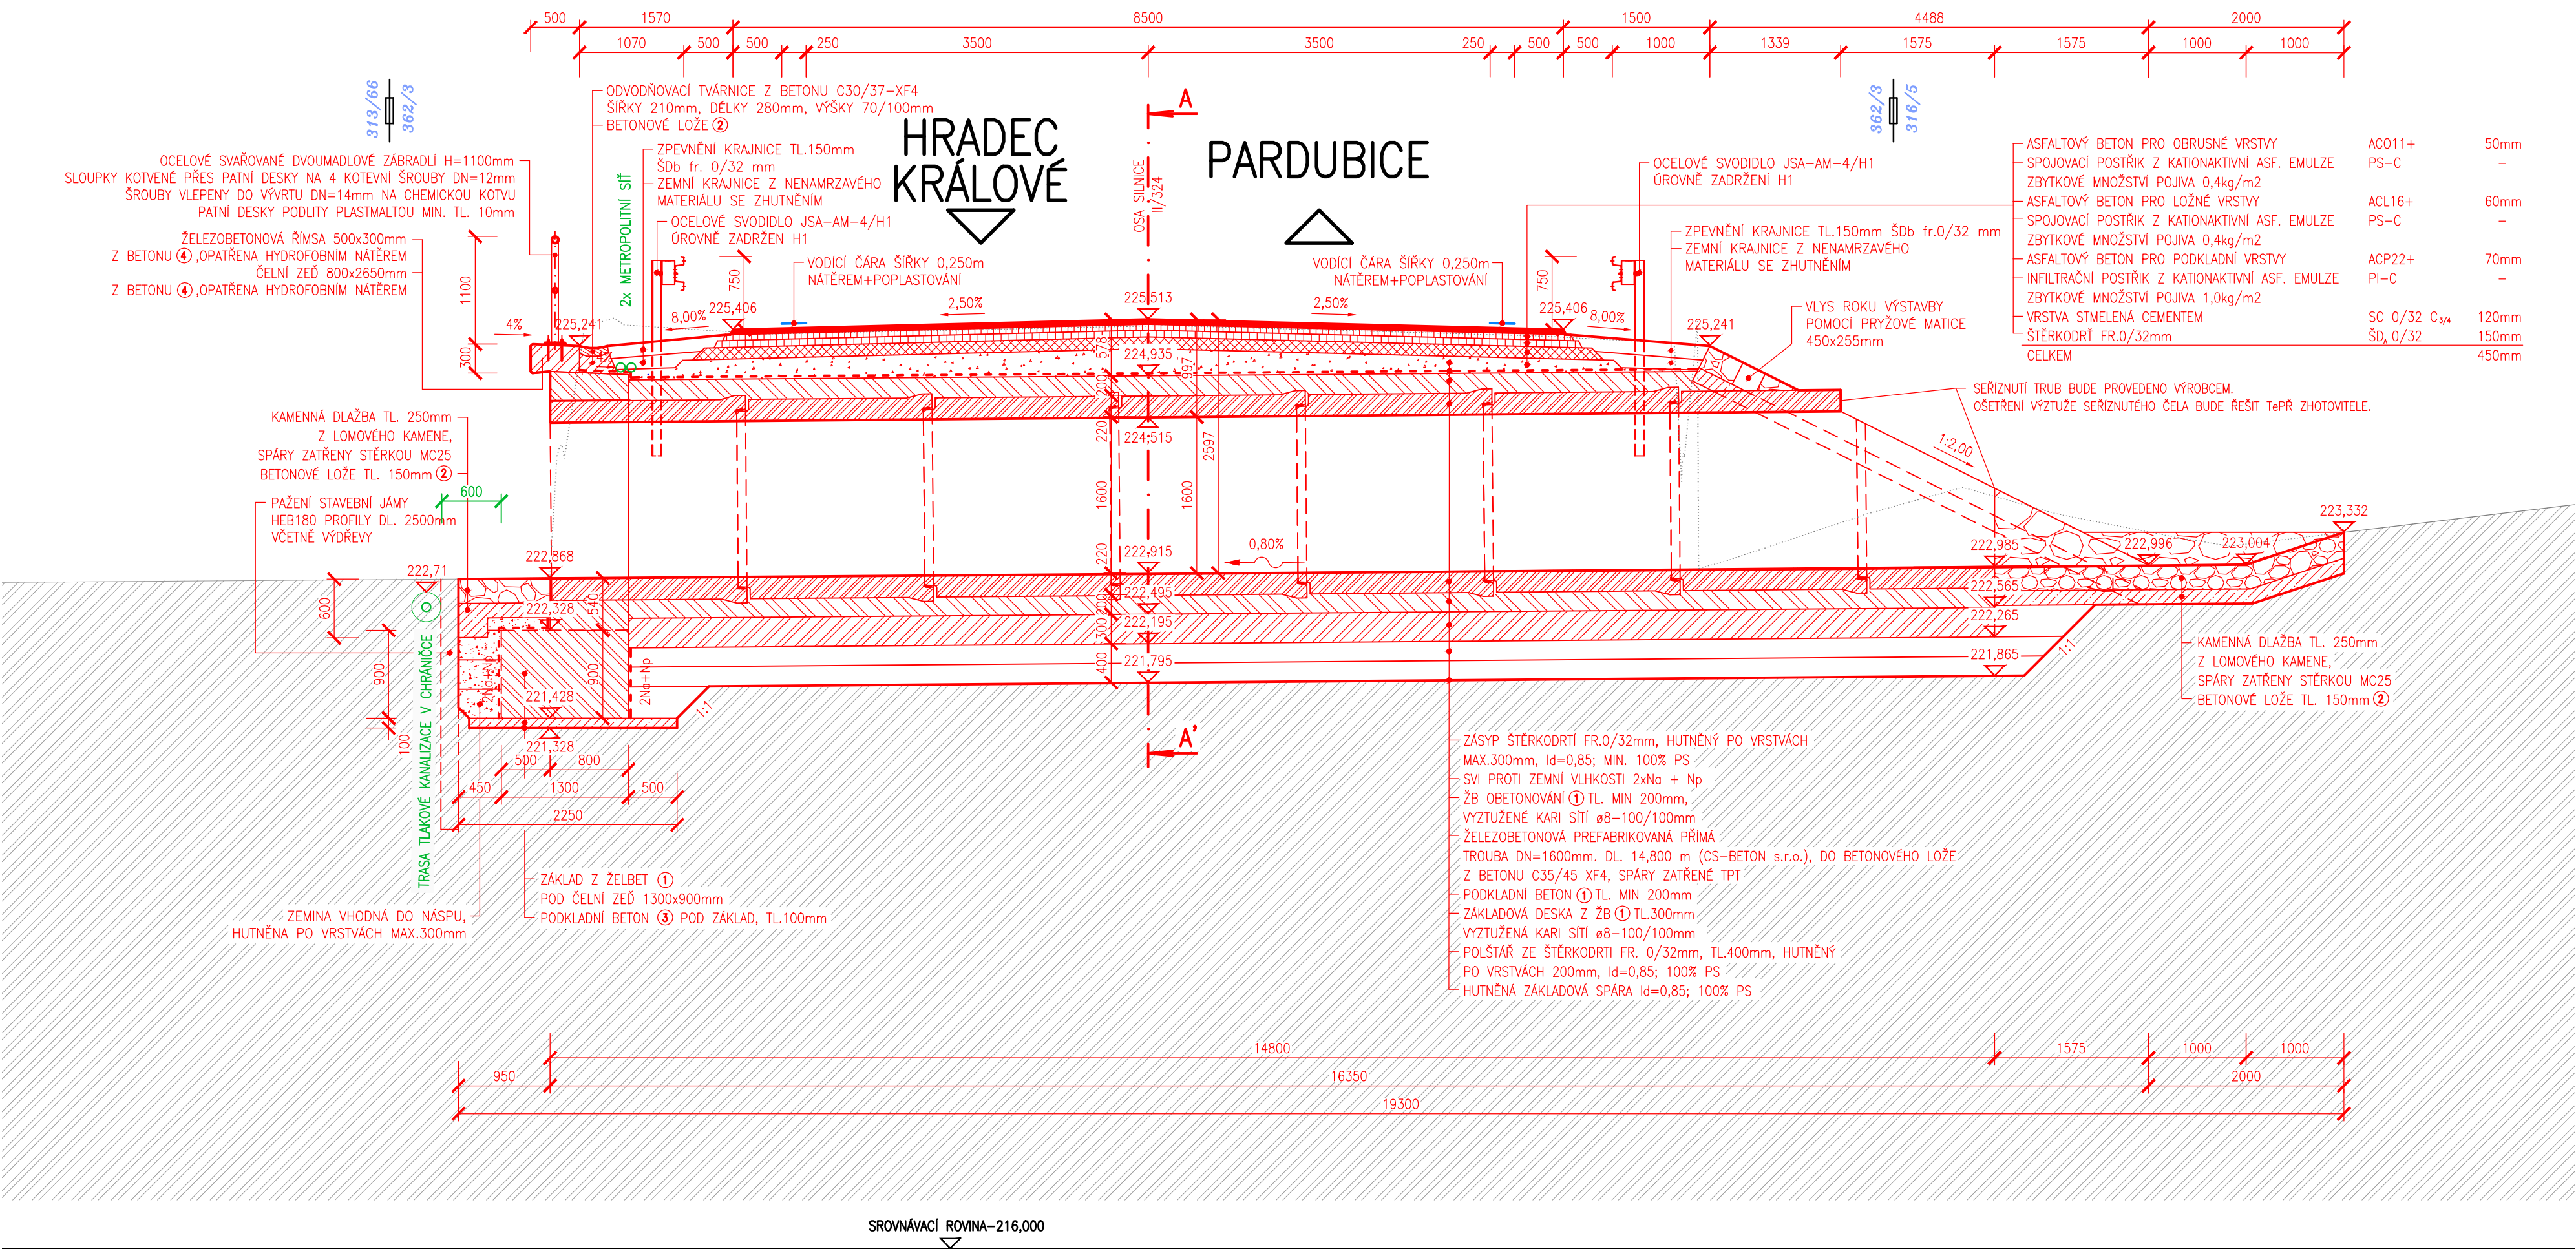

PODÉLNÝ ŘEZ (ŘEZ: A–A’)

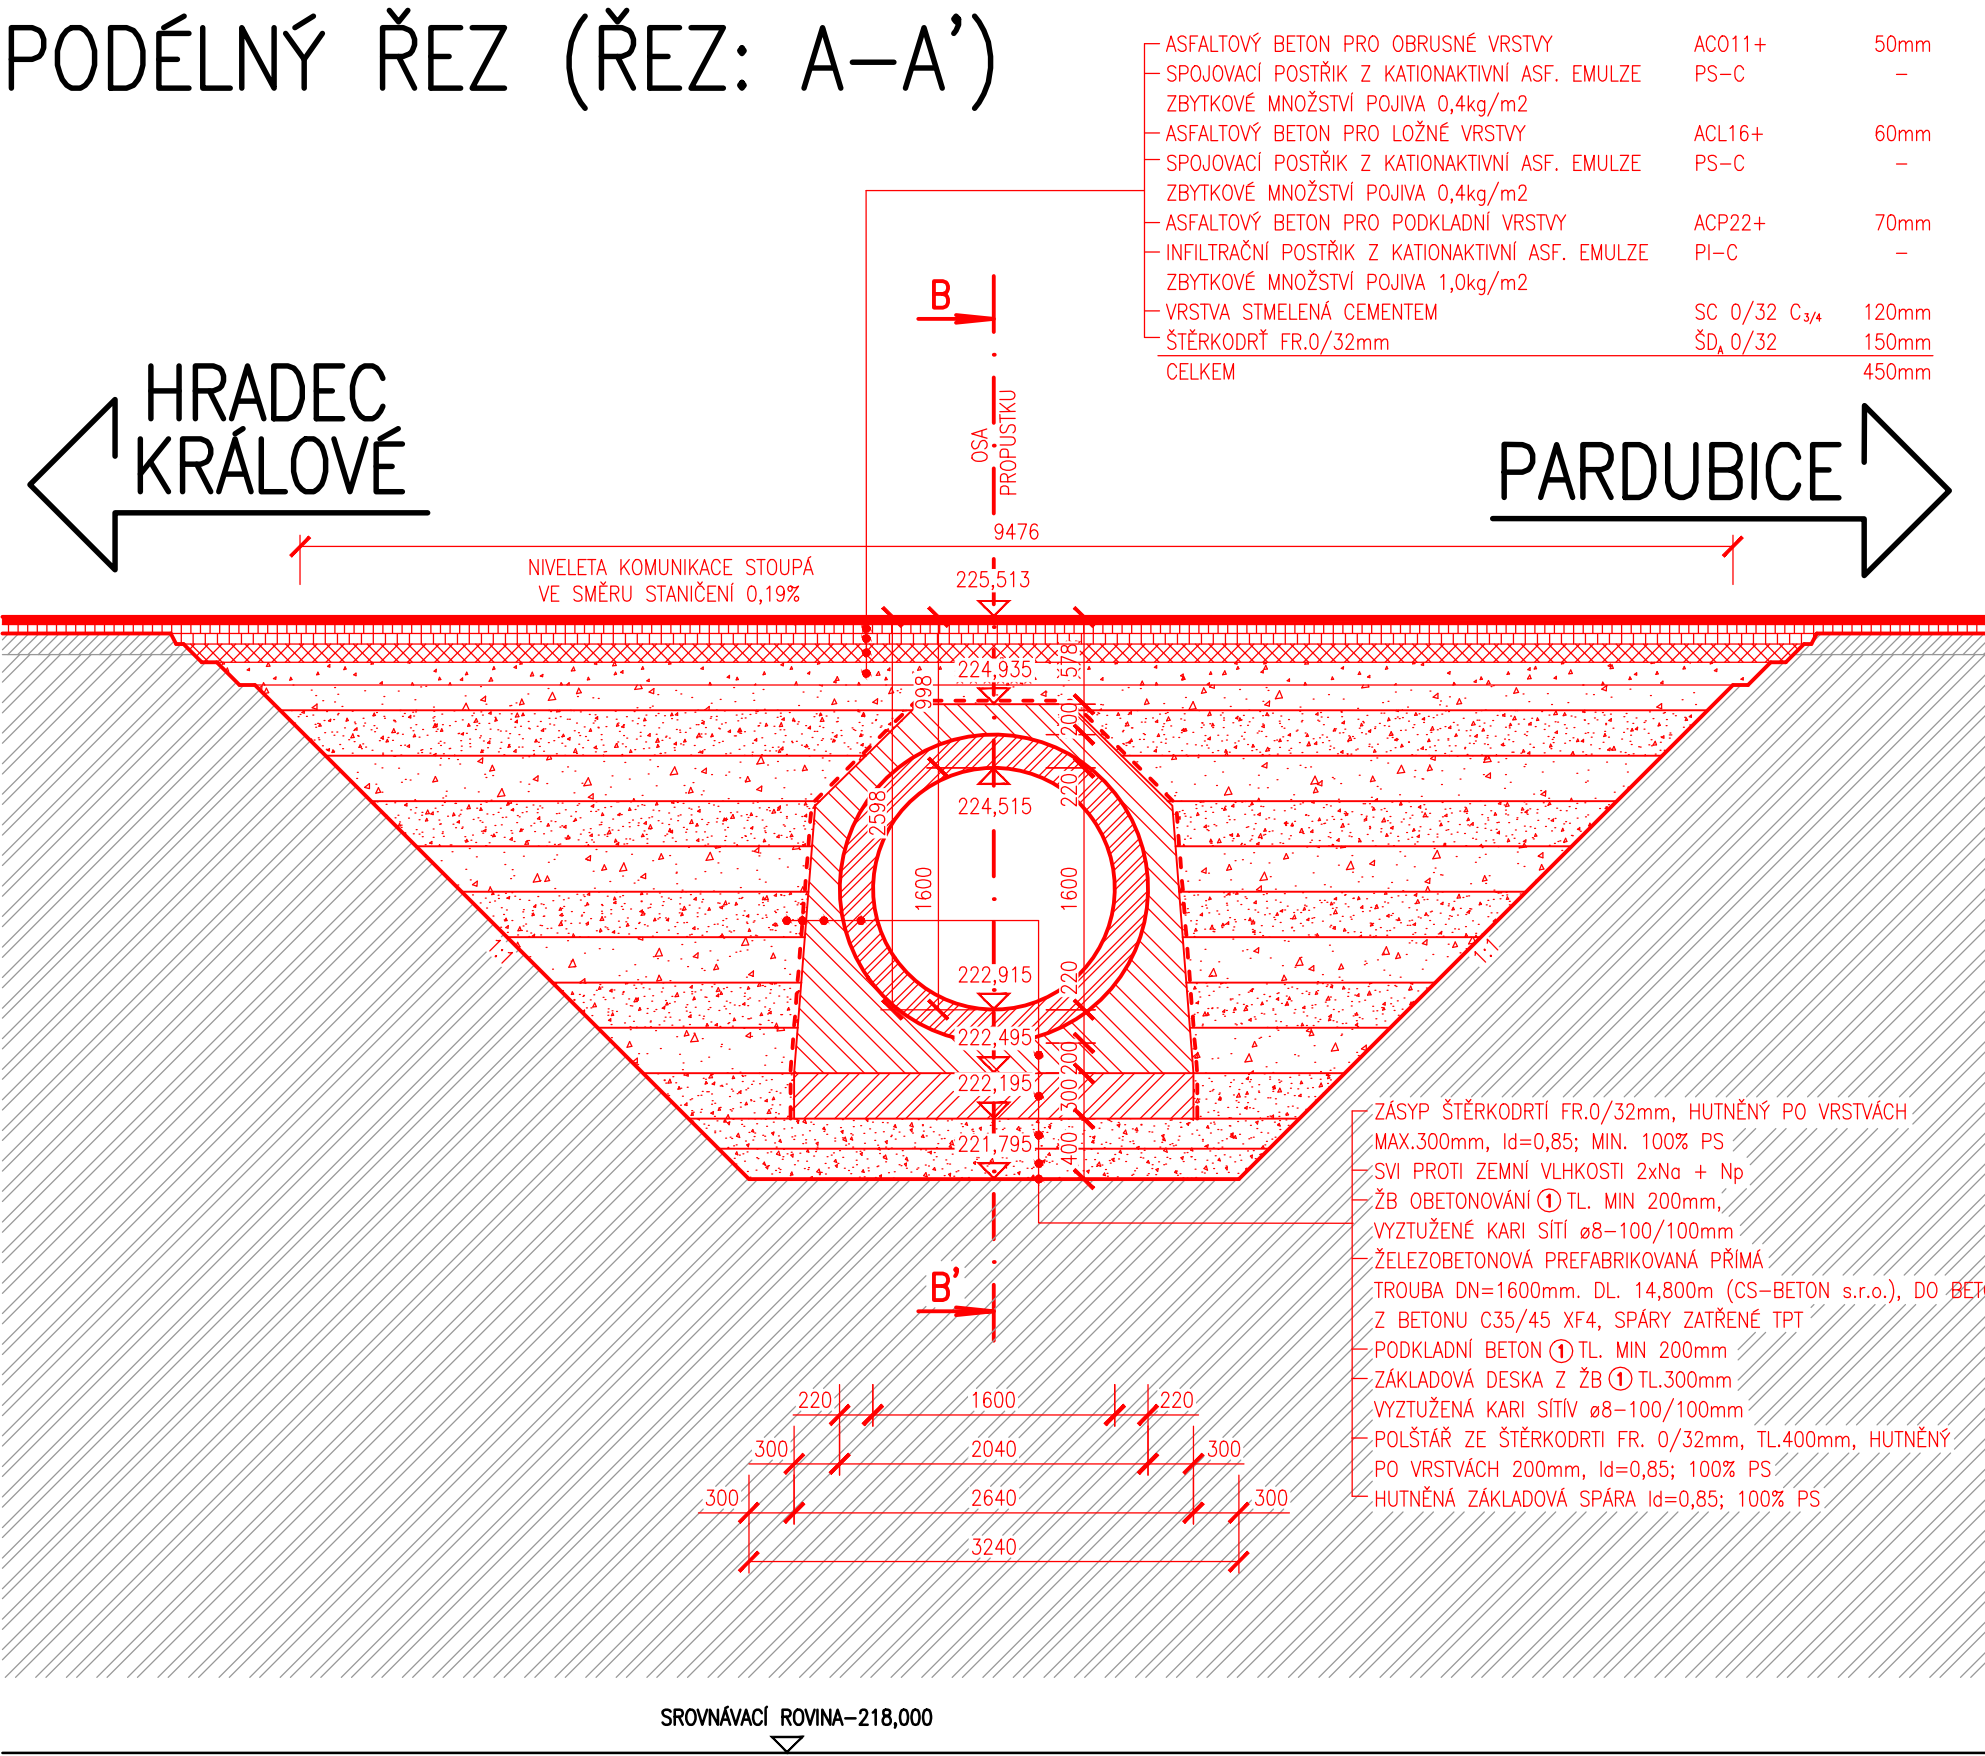

DRUHY POUŽITÝCH BETONŮ:

- ① BETON ČSN EN 206+A1–C25/30–XF3+XA2 (CZ)–CI 0,4–Dmax 22–S4 ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA, OBETONOVÁNÍ, ZÁKLAD
- ② BETON ČSN EN 206+A1–C25/30–XF3 (CZ)–CI 1,0–Dmax 16–S2 LOŽE KAMENNÉ DLAŽBY
- ③ BETON ČSN EN 206+A1–C12/15–X0 (CZ)–CI 1,0–Dmax 16–S3 PODKLADNÍ BETON
- ④ BETON ČSN EN 206+A1–C30/37–XF4+XD3+XC4 (CZ)–CI 0,4–Dmax 16–S4 ŽB ŘÍMSA, ČELNÍ ZEĎ

POZNÁMKY:

- ① PRO ZPŘEHLEDNĚNÍ NEJSOU NA VÝKRESE ZOBRAZENY A ZAKÓŠOVÁNY NĚKTERÉ VIDITELNÉ HRANY.
- ② POKUD NENÍ VE VÝKRESU STANOVENO JINAK, VŠECHNY HRANY ZKOŠIT 20x20mm.
- ③ VŠECHNY PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU OPATŘENY SPOJOVACÍM MŮSTKEM NA CEMENTOVÉ BÁZI.

LEGENDA KATASTRU:

- H RANICE POZEMKU KN
- 1441 PARCELNÍ ČÍSLO KN

VYTYČOVANÉ BODY:

01	Y=645855,708	X=1054821,436	Z = 222,996	OSA PROPUSTKU – NÁVODNÍ STRANA
02	Y=645847,338	X=1054827,330	Z = 222,915	OSA SILNICE / OSA TROUBY
03	Y=645842,334	X=1054830,854	Z = 222,868	OSA PROPUSTKU – POVODNÍ STRANA
04	Y=645853,661	X=1054821,263	Z = 222,264	SPODNÍ VNĚJŠÍ HRANA ŽB ŽAKL. DESKY
05	Y=645855,181	X=1054823,422	Z = 222,264	SPODNÍ VNĚJŠÍ HRANA ŽB ŽAKL. DESKY
06	Y=645842,228	X=1054829,314	Z = 222,149	SPODNÍ VNĚJŠÍ HRANA ŽB ŽAKL. DESKY
07	Y=645843,748	X=1054831,473	Z = 222,149	SPODNÍ VNĚJŠÍ HRANA ŽB ŽAKL. DESKY
08	Y=645839,910	X=1054828,280	Z = 221,431	HRANA ZÁKLADU OPĚRNÉ ZIDKY NA VÝTOKU
09	Y=645840,973	X=1054827,532	Z = 221,431	HRANA ZÁKLADU OPĚRNÉ ZIDKY NA VÝTOKU
10	Y=645844,228	X=1054834,413	Z = 221,431	HRANA ZÁKLADU OPĚRNÉ ZIDKY NA VÝTOKU
11	Y=645845,291	X=1054833,664	Z = 221,431	HRANA ZÁKLADU OPĚRNÉ ZIDKY NA VÝTOKU

POZNÁMKY:

- POUKROVÁ GRANA BETONŮ BUDE SPLŮVAT POŽADAVKY TKP KAP.18
- VŠEKÉ RUBOVÉ PLOCHY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU OPATŘENY IZOLAČNÍM NÁTEREM ALP+2ALN (BETONOVÉ PLOCHY, KTERÉ PŘÍCHÁZEJÍ DO STYKU SE ZEMLINOU)

POZNÁMKY:

- VYTÝČENÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ BUDE PROVEDENO S PŘESNOSTÍ DLE ČSN 730420–2 A TECHNICKÝCH KVALITATIVNÍCH PODMÍNEK STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, KAPITOLY 1, PŘÍLOHY 9. DÁLE DLE TKP KAPITOLA 18 A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ.

GEOMETRICKÁ PŘESNOST:

- PODLE TKP PK KAP.1, PŘÍL.9 A TKP PK KAP.18
- TRŮDY PŘESNOSTI PODLE TAB.3:
- PRO ZÁKLADY 12
- PRO PROPUSK 10

TOLERANCE ROVINATOSTI:

- PODLE TKP PK KAP.1, PŘÍL.9 TAB.4

ODCHYLKY SVISLOSTI:

- PODLE TKP PK KAP.1, PŘÍL.9 TAB.5

Mezní vytyčovací odchylky podrobného vytyčení			
Body podrobného vytyčení	mezní vytyčovací odchylka δX _{vy}		
	podélná	příčná	výšková
zemní práce	± 100	± 100	± 50
zemní konstrukce	± 70	± 50	± 30
propustek	± 50	± 50	± 10

Mezi mezní vytyčovací odchylkou δX_m a směrodatnou odchylkou σ platí vztah δX_m = uσ, kde u = 2.

vytyčení bude provedeno s přesností dle ČSN 73 0420-2 a Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, kap. 1, příl. 9.

Ověřil UOZI:

č.č.:

Dne:

Náležitosti a přesnosti odpovídá právní předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatel

ČISTOPIS

Souladnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

c		
b		
a	Změny s ohledem na kolizi s IS	15.11.2024
č.	Text změny – odůvodnění	Datum

Název stavby: Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště - Hrobice (průtah)

Objednatel stavby: Pardubický kraj
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Razítko:

Kontroloval:

Datum:

Zhotovitel stavby: „Společnost: Hrobice“

MI Roads a.s.
Koželuzská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Doprastav, a.s.
Dřevňová 27, 826 56 Bratislava

Kontroloval:

Datum:

Koordinator RDS: M4 Road Design s.r.o.
Koželuzská 2246/5, 180 00 Praha 8
Datová schránka: v02p02
E-mail: info@m4rd.cz

Hlavní inženýr projektu (hlavní projektant):

Zástupci hlavního projektanta:

Kontroloval:

Datum:

Zhotovitel RDS: BORA projekt s.r.o.
Veletržní 47, 170 00 Praha 7
Datová schránka: x02b04f
E-mail:

Vypracoval:

Zodpovědný projektant:

Zkontroloval:

Ústředí / SO: SO 102 - EXTRAVILÁNOVÝ ÚSEK V K.Ú. HROBICE

ZMĚNA a - ZMĚNĚ S OHLEDEM NA KOLIZI S IS

Název přílohy: PROPUSTEK V KM 1,939

Čís. zakázky: 24-020

Stupeň PD: RDS


Datum: 11/2024

Mřítko: 1:50


Formát: 10xA4

Čís. paré: 9.1


PŮDORYS

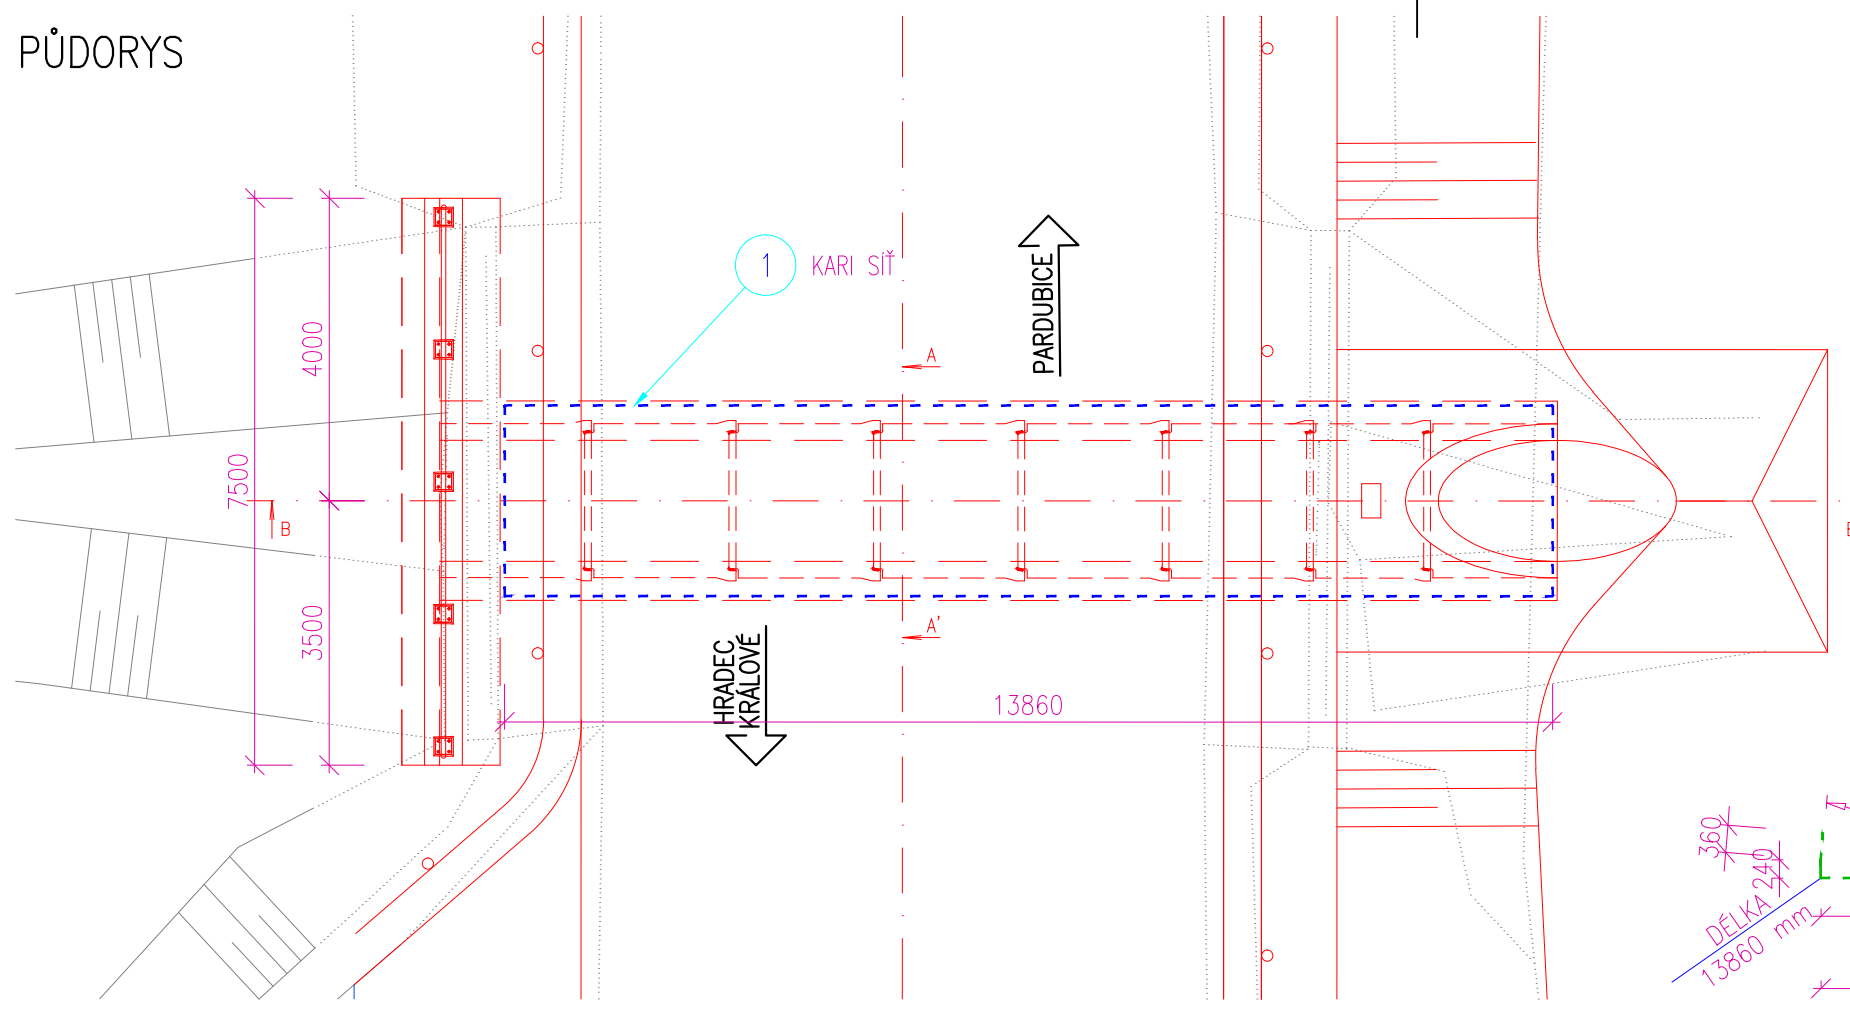


PODÉLNÝ ŘEZ (ŘEZ: A-A')

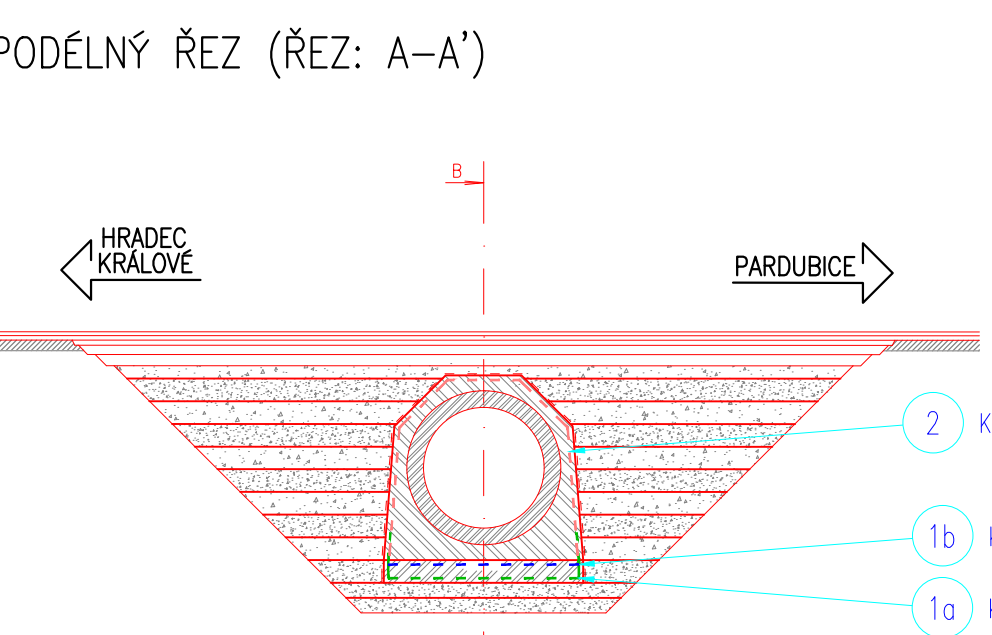


PŘÍČNÝ ŘEZ ČELEM

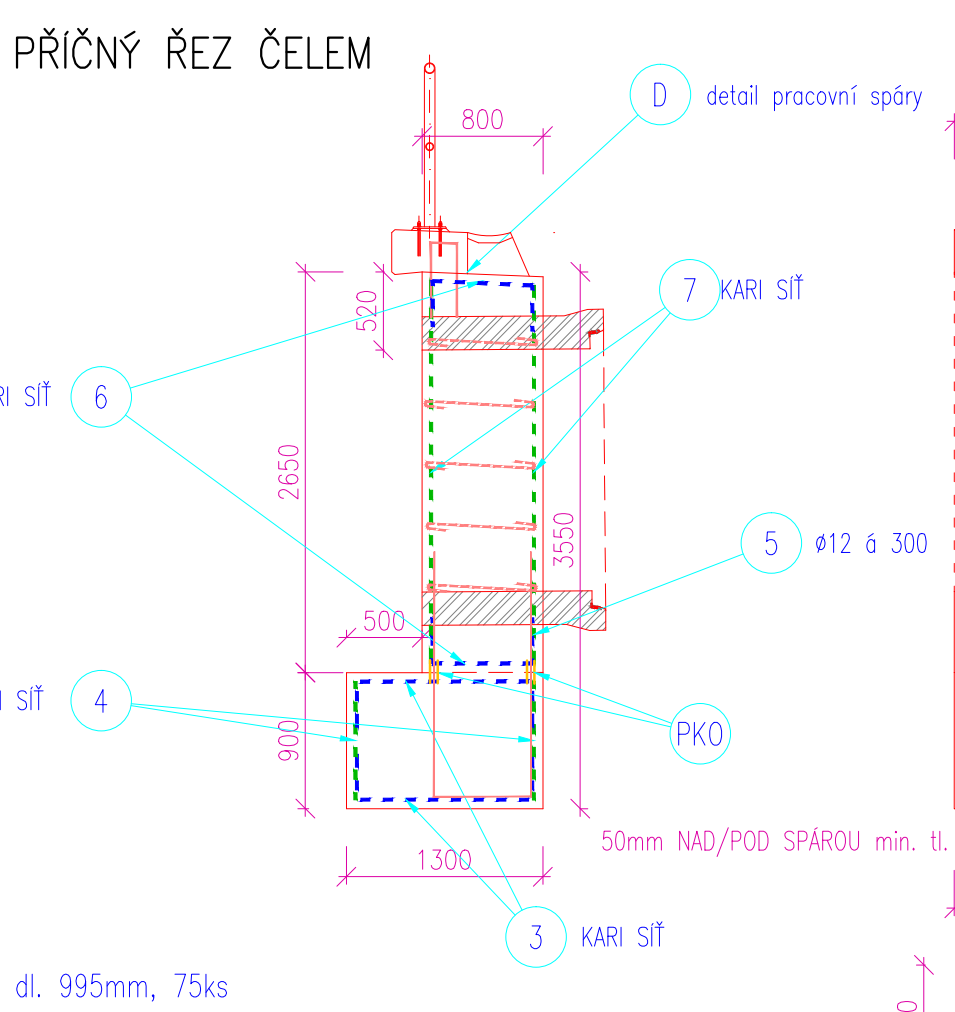


PODÉLNÝ ŘEZ ČELEM

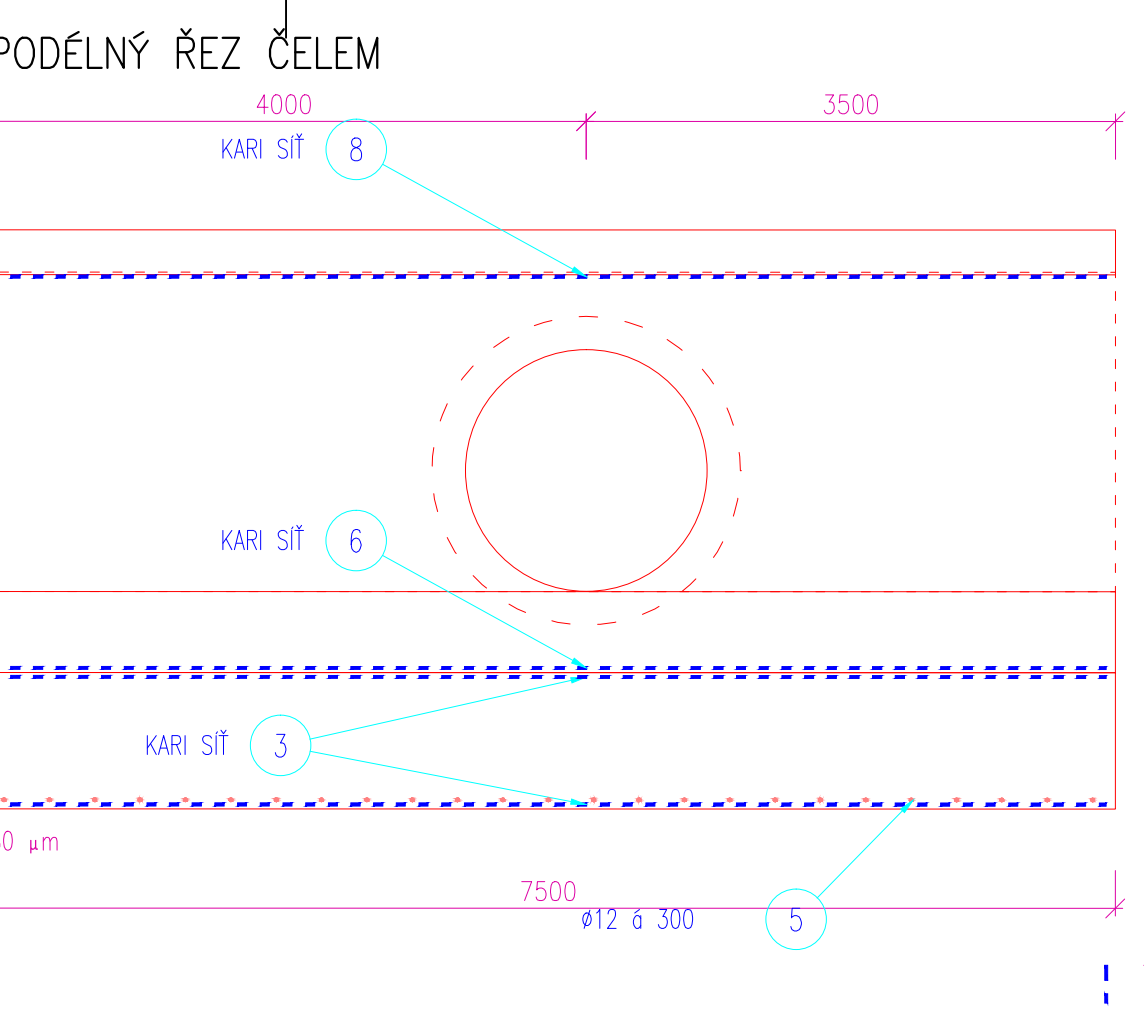


PŮDORYS DŘÍKEM

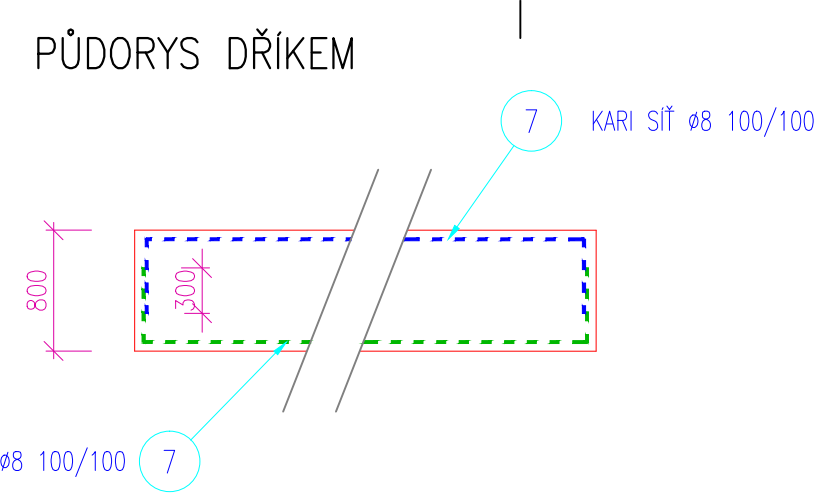


PŮDORYS ZÁKLADEM

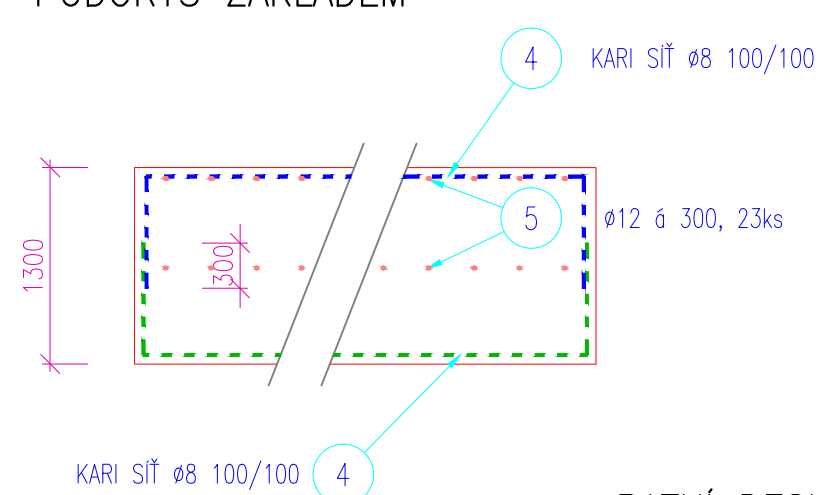


PATNÍ DESKA

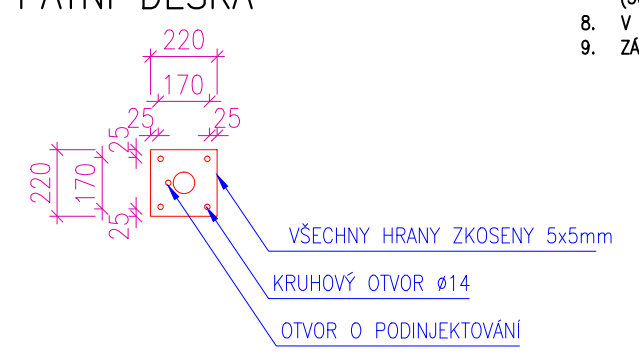


DETAIL ZÁBRADLÍ

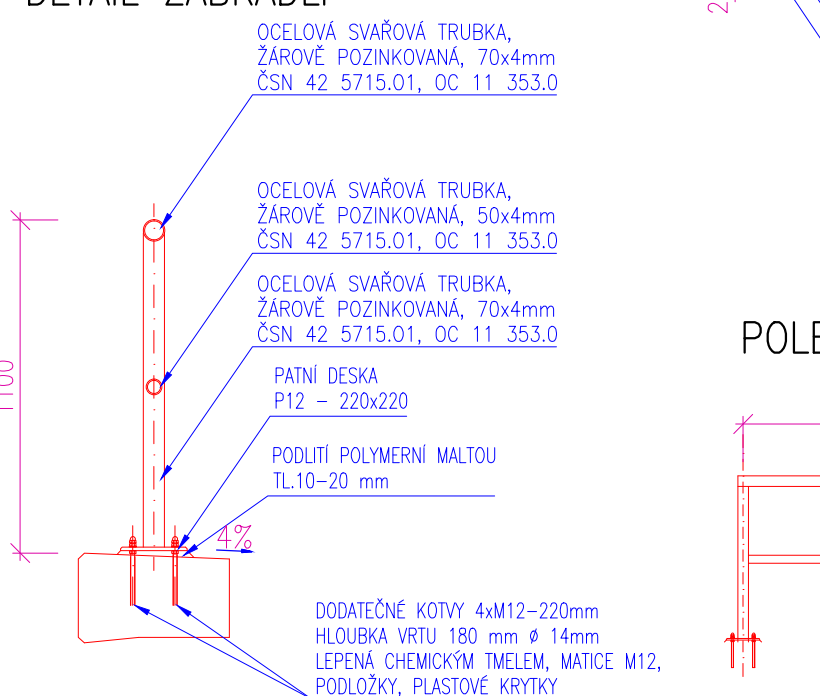


POLE 1

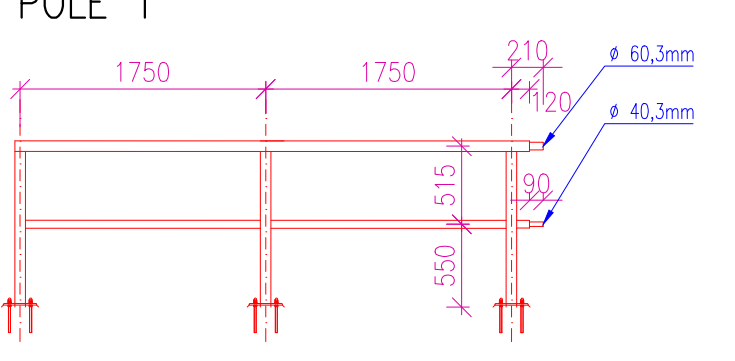


POLE 2

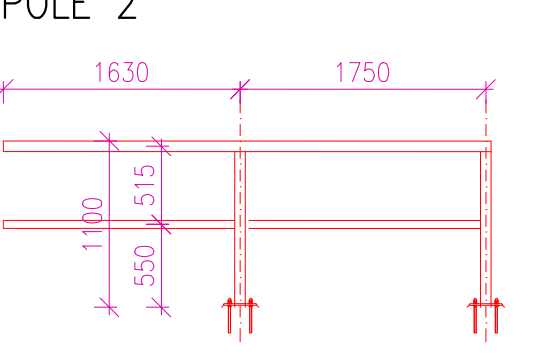


PŘÍČNÝ ŘEZ (ŘEZ: B-B')

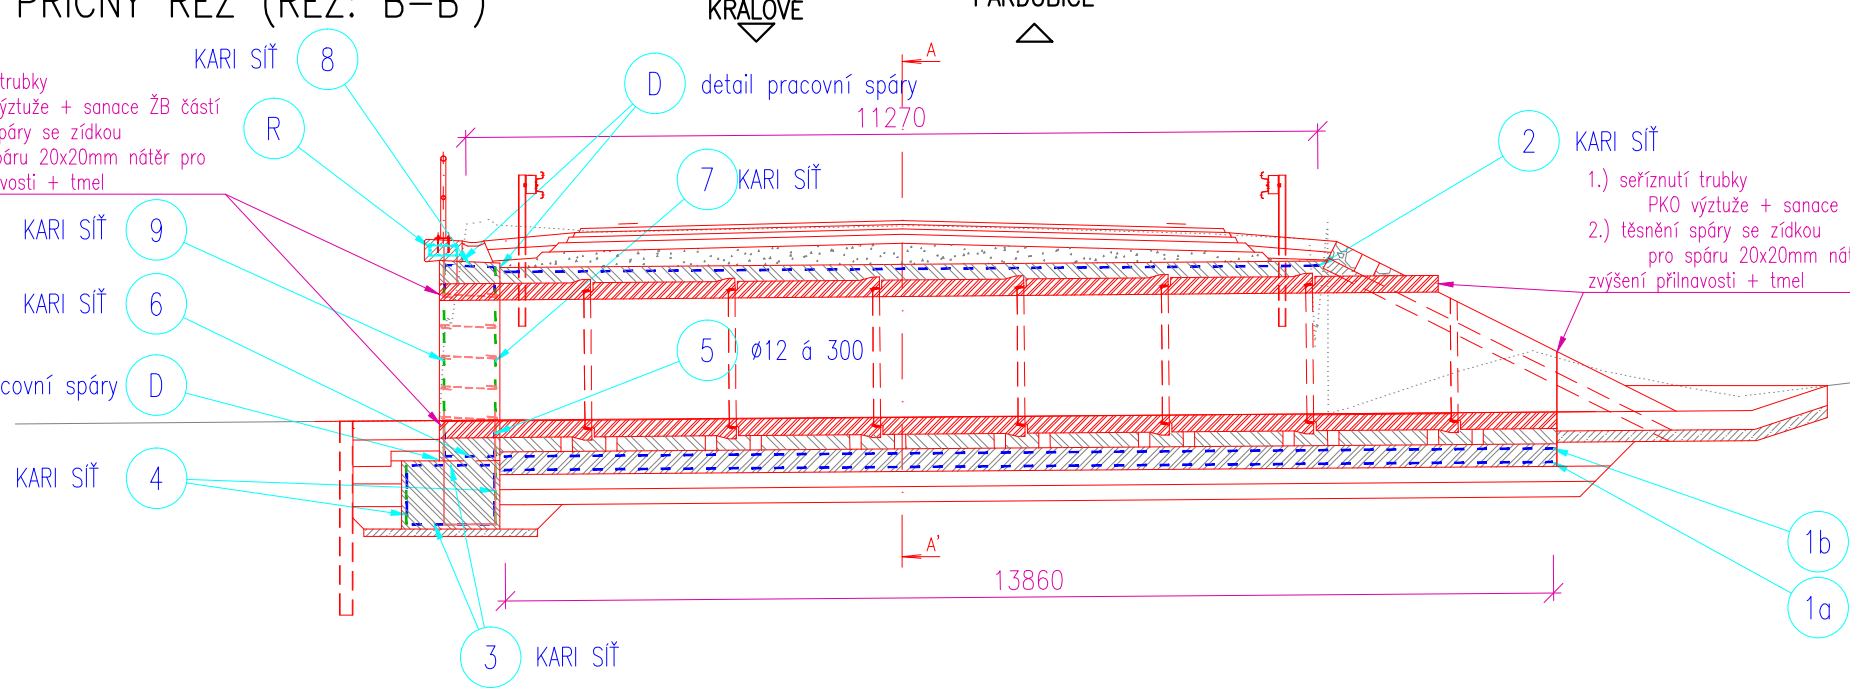


D PRACOVNÍ SPÁRA ZÁKLAD-DŘÍK; DŘÍK - ŘÍMSA

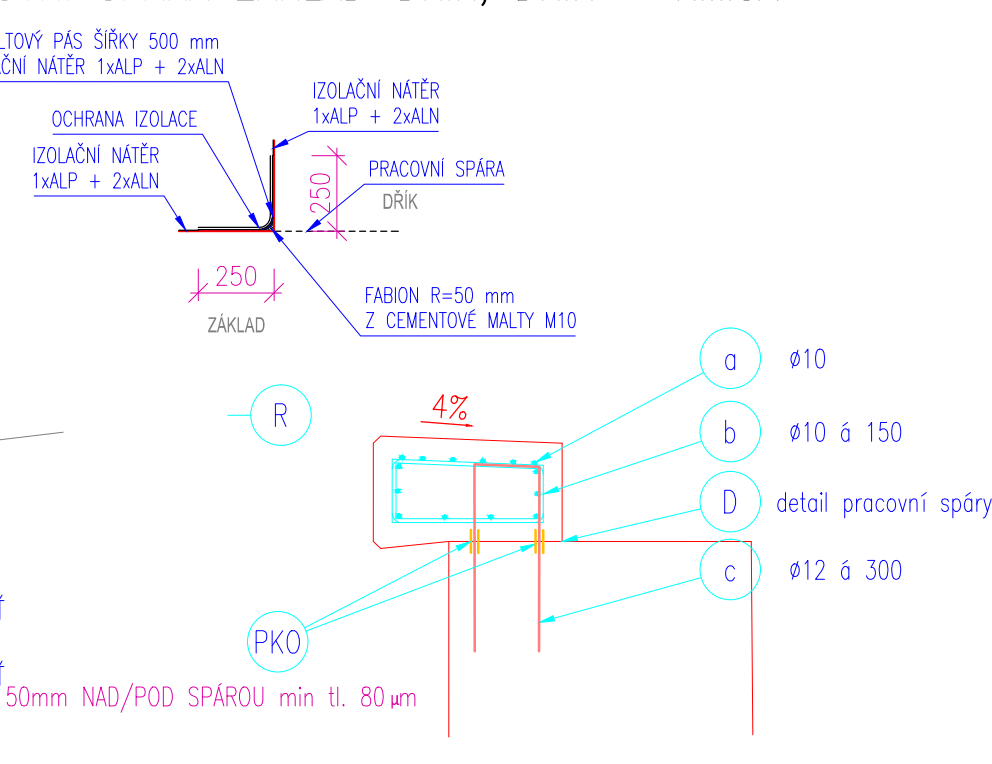


a Ø10

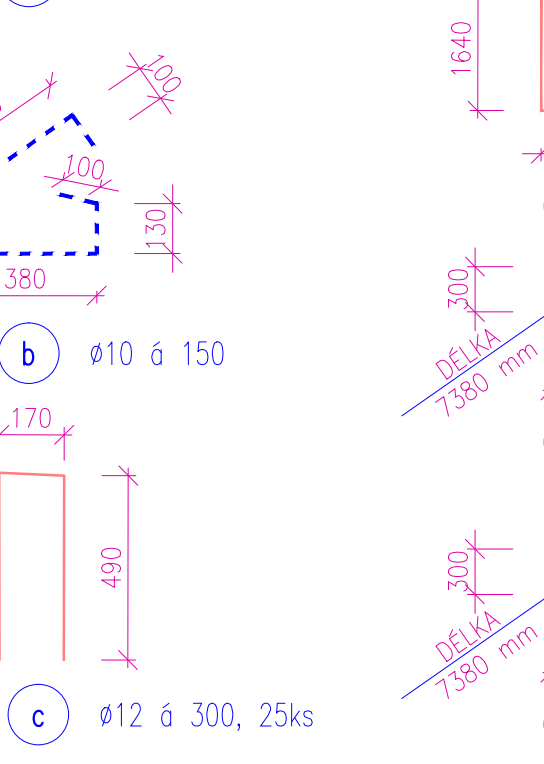

b Ø10 a 150

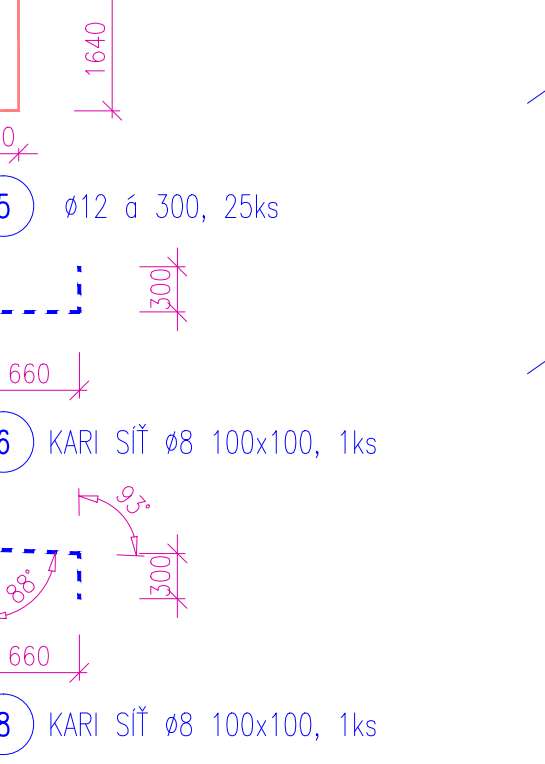

c Ø12 a 300, 25ks

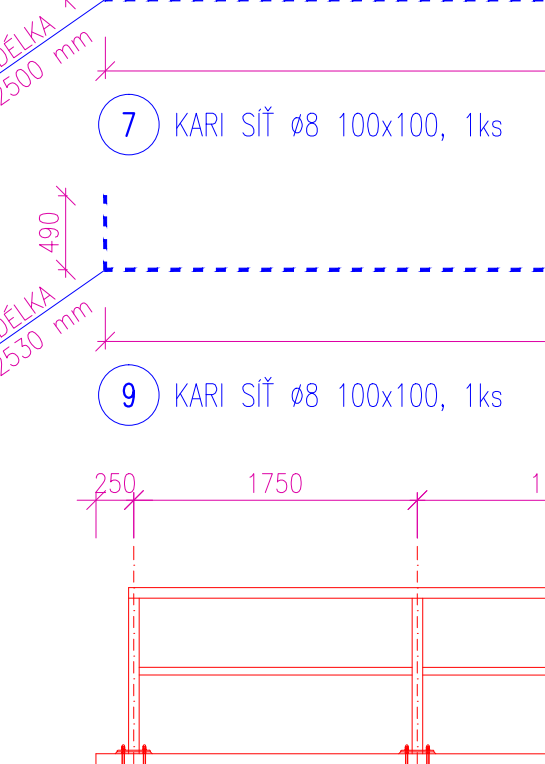

VÝKAZ MATERIÁLŮ

Výkaz KARI sítí										
Polozka	Číslo	Ocel	Profil	Rozměr	Šířka	Delka	Jedn. hm.	Počet	Hmotnost *	Hmotnost
1a	85008	8	100/100	2520	13860	7,90	1			407,32
1b	85008	8	100/100	2520	13860	7,90	1			275,92
2a	85008	8	100/100	2580	11900	7,90	2			485,09
2b	85008	8	100/100	950	10770	7,90	1			80,83
3	85008	8	100/100	1760	7380	7,90	2			205,22
4	85008	9	100/100	8860	780	7,90	2			129,19
6	85008	10	100/100	1260	7380	7,90	1			73,46
7	85008	11	100/100	2500	8360	7,90	1			136,20
8	85008	10	100/100	1360	7380	7,90	2			146,92
9	85008	11	100/100	2530	8360	7,90	1			138,18
Hmotnost celkem										2058,33

Výkaz vázané výztuže

Polozka	Číslo	Ocel	Profil	Delka	Počet	8	10	12	14	16
a	85008	10	7380	14						
b	85008	10	2340	52						
c	85008	10	1155	25						
5	85008	12	3920	25						
s	85008	8	995	25						
Celková délka dle profilu						(m)	74,625	196,675	98,000	0,000
Hmotnost pro 1 bm						(kg/bm)	0,395	0,617	0,888	1,208
Hmotnost dle profilu						(kg)	29,446	121,258	87,006	0,000
Hmotnost celkem						(kg)				206,26

POZNÁMKY

- VŠECHNY HRANY ZKOSENY 20x20 mm
- HORNÍ PLOCHY UHLAZEN DŘEVĚNÝM HLADÍTKEM
- OHYBNÉ KARI SÍŤ JE MOŽNO NAHRADIT ROVNÝMI S DOPLNĚNÍM TRÁMKŮ TVARU L (300 + 300 mm) Z PROFILU Ø 8 mm a 200 mm
- VEŠKERÉ RUBOVÉ PLOCHY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU OPATŘENY PENETRAČNÍM NÁTĚREM+ASFALT, NÁTĚREM ALP+2xALN A OCHRANOU Z NETKANÉ GEOTEXTILIE 600g/m2 (BET. PLOCHY, KTERÉ PŘÍCHÁZEJÍ DO STYKU SE ZEMINOU)
- OZNAČENÍ LETOPŮČŮ VÝSTAVBY BUDE REALIZOVÁNO V DLAŽBĚ NA NAVODNÍ STRANĚ PROPUSTKU POMOCÍ PREFABRIKOVANÉHO BLOKU Z PROSTÉHO BETONU O ROZMĚRECH 400x255mm S OZNAČENÍM LETOPŮČŮ VÝSTAVBY POMOCÍ PRÝŽOVÉ MATRICE
- VÝZTUŽ DŘÍKU PROVAZAT SPONÝ Ø 8 mm V RASTRU 400x400mm
- BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ OPATŘENA PROTIKOROZNÍ OCHRANOU – EPOXIDOVÝ NÁTĚR (50mm NAD / POD PRACOVNÍ SPÁROU, tl. 80 µm).
- V MÍSTĚ TROUBY BUDE VÝZTUŽ (KARI SÍŤ) VÝSŘHNUTA
- ZABRADLÍ

- MATERIÁL DLE ČSN 42 5715
- SVARENÉ KOUTOVÝMI SVARÝ Δ 3 mm
- OPATŘENO PROTIKOROZNÍ OCHRANOU – DLE TP 84 PRO VYSOKOU ŽIVOTNOST "v" (15 let) A PRO AGRESIVITU PROSTŘEDÍ ("C4")
- ŽÁROVĚ POZINKOVANO
- NÁTĚR AKRYLÁTOVÝMI BARVAMI – 1. ZÁKLADNÍ PŘED MONTÁŽÍ, PO MONTÁŽI 2. VRCHNÍ VENKOVNÍ, VRCHNÍ NÁTĚR DLE POŽADAVKU INVESTITORA
- PROVEDENÍ DLE TP 186
- VÝKRES SLOŽÍ PRO ZPRACOVÁNÍ VID ZABRADLÍ
- VDT ZABRADLÍ BUDE PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOV RDS KE KONTROLE
- DELENÍ NA DÍLC JE MOŽNÉ SE SOUHLASEM PROJEKTANTA RDS UPRAVIT
- SLOUPKY A VÝPLŇ ZABRADLÍ JE SVISLÁ, HORNÍ A DOLNÍ MADLO KORUPUJE PODEBNÝ SKLON
- PKO ZABRADLÍ MUSÍ ODPOVÍDAT TKP 198

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

ČISTOPIS

c		
b		
a	Změny s ohledem na kolizi s IS	15.11.2024
č.	Text změny - odůvodnění	Datum

Název stavby: Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště - Hrobice (průtah)

Objednatel stavby:	Razítko:
 Pardubický kraj Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice	
Kontroloval:	Podpis:
Datum:	

Zhotovitel stavby:	Razítko:
 „Společnost: Hrobice“ MI Roads a.s. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	
Kontroloval:	Podpis:
Datum:	

Koordinátor RDS:	Razítko:
 M4 Road Design s.r.o. Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 Datová schránka: v2rbczj E-mail: info@m4rd.cz	
Hlavní inženýr projektu (hlavní projektant):	
Zástupci hlavního projektanta:	
Kontroloval:	Podpis:
Datum:	

Zhotovitel RDS:	Razítko:
 BORA projekt s.r.o. Veletřní 47, 170 00 Praha 7 Datová schránka: xcbbk4f E-mail:	
Kontroloval:	Podpis:
Datum:	

Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Zkontroloval:
		
Část / SO:	Čís. zakázky:	Čís. paré:
SO 102 - EXTRAVILÁNOVÝ ÚSEK V K.Ú. HROBICE	24-020	
ZMĚNA a - ZMĚNY S OHLEDEM NA KOLIZI S IS	Stupeň PD:	RDS
	Datum:	11/2024
Název přílohy:	Měřítko:	1:100, 50, 25, 10
PROPUSTEK V KM 1,939 - DETAILS	Formát:	6x44
		9.2































PLNÁ MOC

Společnost **MI Roads a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, identifikační číslo 17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27461 (dále též jen „zmocnitel“), jehož zastupuje správní rada společnosti jednající Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady, a Ing. Markem Steinerem, členem správní rady, tímto **zmocňuje**:

Ing. Richarda Rakouše

zaměstnance zmocnitele, datum narození [REDACTED] 1972, bydliště [REDACTED] Praha 8
(dále jen „zmocněnec“)

K jednání za zmocnitele při administraci změn díla u stavby „Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)“ kterou zmocnitel jako zhotovitel provádí pro Pardubický kraj. Zmocněnec je takto za zmocnitele oprávněn projednávat změny díla, podepisovat dokumentaci k těmto změnám se vztahující (zejména tedy změnové listy) a činit další úkony přímo související s administrací změn díla u výše uvedené stavby.

Toto zmocnění souvisí s prováděním výše uvedené stavby a zmocněnec je oprávněn jednat za zmocnitele ve shora uvedeném rozsahu pouze v souvislosti s touto stavbou. Udělené zmocnění zaniká nejpozději 31. 12. 2025.

V Praze dne 01. 10. 2024

[REDACTED]
Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady
MI Roads a.s.

[REDACTED]
Ing. Marek Steiner
člen správní rady
MI Roads a.s.

V Srchu dne 01. 10. 2024 zmocnění za zmocněnce přijímám:

[REDACTED]
Ing. Richard Rakouš
Oblastní ředitel
MI Roads a.s.

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 169021376-312661-241211094319.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **169021376-312661-241211094319**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Pardubice 19

Datum vyhotovení: **11.12.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla [REDACTED]

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



169021376-312661-241211094319

INF/PGP – II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah) – Správce stavby

Společnost: Hrobice

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 Libeň

Zastoupená správcem společnosti:

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 Libeň

Vyřizuje: Ing. Irena Vojnová

Věc: Vyjádření TDI k předloženému ZBV č. 18 SO 102.3 – PROPUSTEK V KM 1,939 (PVNHČP)

Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):

Vážený pane,

na základě Vašeho předložení ZBV č. 18 Vám z pozice technického dozoru investora (TDI), který zastupuje objednatele – Pardubický kraj, v rámci stavby „*Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)*“, sdělujeme následující stanovisko:

1. Cenové vyjádření: Ze strany TDI nejsou k předložené cenové kalkulaci žádné připomínky. Nové položky jsou řešeny dle Smluvních podmínek – ceník OTSKP
2. Technické vyjádření: Potvrzujeme skutečnosti uvedené ve zdůvodnění ZBV a současně potvrzujeme kontrolu rozsahu odpovídajících prací popsaných v ZBV č. 18 zhotovitele.

V rámci dokladové části jsou doloženy relevantní doklady prokazující provedení prací dle předloženého soupisu prací.

Na základě výše uvedeného doporučujeme z pozice TDI, aby Správce stavby vydal příslušný pokyn v souladu s SoD a smluvními podmínkami.

S pozdravem

Ing. Irena Vojnová

Technický dozor

II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)

INFRAM a.s.
