

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vegetační úpravy

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 801 / 001

Číslo ZBV:

9

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Strabag a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 9 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.3	-364 579,55	363 801,80	-777,75

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9	-364 579,55	363 801,80	-777,75

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list																																		
Název a evidenční číslo Stavby: II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vegetační úpravy	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 801 / 001	Číslo ZBV: 9.3																																
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3236/00066001/2022 a zhotovitel č: 841/TC/FA/2022/030/FAFY na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 5.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Strabag a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5																																		
<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table><tr><td>1. Krycí list</td><td></td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>Sk. 3</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td></td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>Sk. 3</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td></td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dokladů</td><td></td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td></td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td></td><td>29</td><td>počet listů</td></tr></table>	1. Krycí list		1	počet listů	2. Změnový list	Sk. 3	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací		1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	Sk. 3	2	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin		1	počet listů	6. Přehled dokladů		1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách		2	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů		29	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor	
1. Krycí list		1	počet listů																															
2. Změnový list	Sk. 3	2	počet listů																															
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací		1	počet listů																															
4. Rozpis ocenění Změn položek	Sk. 3	2	počet listů																															
5. Přehled zařazení změn do skupin		1	počet listů																															
6. Přehled dokladů		1	počet listů																															
7. Soupis prací SO po všech změnách		2	počet listů																															
Další doklady dle přehledu dokladů		29	počet listů																															
Iniciátor změny: Zhotovitel Předmět Změny: Úprava technického řešení																																		
Úprava řešení OK: Na základě požadavku města Benátky nad Jizerou dochází k vegetačním úpravám řešení okružní křižovatky. Dochází tak k doplnění alejové a skupinové výsadbě stromů a reprezentativnější úpravě kruhového prostoru okružní křižovatky. Důvodem je napojení na reprezentativní vjezd do města v prostoru u prodejny LIDL. Tímto muselo dojít ke korekci původního návrhu, který uvažoval s násypem se šikmými boky zemního prstence a výškou cca 180 cm v centrální části, která neodpovídá návrhu trvalkové výsadby, která je určena do vodorovné plochy. Výsadba byla realizována společností LESÁČEK s.r.o., která je schváleným poddodavatelem na zajištění sadových úprav v rámci celé stavby a cenová nabídka této společnosti sloužila také k ocenění prací na zajištění sadových úprav v rámci předložené Nabídky Zhotovitele v průběhu výběrového řízení. Z toho důvodu byla cena za nové položky týkající se změny výsadby stanovena na základě pouze jediné cenové nabídky tohoto odsouhlaseného poddodavatele. TDI dne 13. 3. 2025 se změnou návrhu souhlasil za podmínky, že nebude překročena smluvní cena a nedojde k prodloužení doby výstavby. Autorský dozor s výše uvedenou úpravou dne 21. 3. 2025 souhlasil. Týká se položek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 42, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008. Hodnota změny je - 777,75 Kč bez DPH. Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou, která vznikla v průběhu realizace zakázky z důvodu požadavků třetích osob, které jsou k tomu oprávněny.																																		

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-364 579,55	363 801,80	-777,75	728 381,35

Technická pomoc Objednatele:

jméno

Ing. Lubomír Smetana

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.

jméno

Tomáš Svoboda

podpis

Projektant (autorský dozor):
APIS s.r.o.

jméno

Ing. Jan Adamů

podpis

Stavební dozor: SGS-IBHTDI

jméno

Ing. Václav Marvan

podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS SK

jméno

Martin Voříšek

podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání Změny:

jméno

Ing. Jaroslava Jurková

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):

jméno

Ing. Jan Fidler, DiS.

podpis

Zhotovitel:

jméno

Ing. Petr Ballek
Ing. Petra Kroupová

podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 9**

Název Stavby:	II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	801/ 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Vegetační úpravy

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 063 101,53

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 063 101,53	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-364 579,55	363 801,80	363 801,80	17,63%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-364 579,55	2 062 323,78	-777,75	-0,04%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212 Číslo a název SO/PS: SO 801 - Vegetační úpravy Číslo a název rozpočtu: SO 801 - Vegetační úpravy								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 801 / 001					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Vegetační úpravy						614 908,53	-364 579,55	66 796,67	317 125,65	-297 782,88	-48,43%
1	Pol20	Chemické odplevelení před založením kultury včetně dodávky	m2	327,000	184,000	-143,000	3,600	1 177,20	-514,80	0,00	662,40	-514,80	-43,73%
2	Pol21	Obdělání půdy nakopáním, frézováním a rytím v rovině a svahu	m2	327,000	184,000	-143,000	14,380	4 702,26	-2 056,34	0,00	2 645,92	-2 056,34	-43,73%
3	Pol22	Zřízení a rozměření záhonů pro trvalkové skupiny v rovině a svahu	m2	207,000	184,000	-23,000	46,740	9 675,18	-1 075,02	0,00	8 600,16	-1 075,02	-11,11%
4	Pol23	Rozprostření nebo promíchání výsadbového substrátu pro trvalky do 5 cm	m2	207,000	184,000	-23,000	50,330	10 418,31	-1 157,59	0,00	9 260,72	-1 157,59	-11,11%
5	Pol24	Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do záhonů a výsadbových jam	m2	327,000	184,000	-143,000	14,380	4 702,26	-2 056,34	0,00	2 645,92	-2 056,34	-43,73%
6	Pol25	Hloubení jamek do 0,125 m3 bez výměny půdy	ks	5,000	0,000	-5,000	143,800	719,00	-719,00	0,00	0,00	-719,00	-100,00%
7	Pol26	Hloubení jam do 0,4 m3 bez výměny půdy	ks	8,000	15,000	7,000	473,350	3 786,80	0,00	3 313,45	7 100,25	3 313,45	87,50%
9	Pol28	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 30 cm	ks	5,000	0,000	-5,000	117,440	587,20	-587,20	0,00	0,00	-587,20	-100,00%
10	Pol29	Výsadba dřeviny s balem, v rovině a svahu, při průměru balu do 60 cm	ks	8,000	15,000	7,000	413,430	3 307,44	0,00	2 894,01	6 201,45	2 894,01	87,50%
12	Pol31	Hloubení jamek a výsadba trvalek a okrasných trav	ks	1 863,000	0,000	-1 863,000	46,740	87 076,62	-87 076,62	0,00	0,00	-87 076,62	-100,00%
13	Pol32	Hloubení jamek a výsadba cibulovin	ks	3 312,000	0,000	-3 312,000	15,580	51 600,96	-51 600,96	0,00	0,00	-51 600,96	-100,00%
17	Pol36	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	ks	120,000	866,000	746,000	21,570	2 588,40	0,00	16 091,22	18 679,62	16 091,22	621,67%
18	Pol37	Namulčování borkou záhony keřů a solitery vrstva 10-15 cm	m2	120,000	306,000	186,000	81,490	9 778,80	0,00	15 157,14	24 935,94	15 157,14	155,00%
19	Pol38	Mulčování záhonů štěrkodrtí 4/8 nebo 0/4mmmm křemitý písek vrstva 5 cm	m2	207,000	0,000	-207,000	93,470	19 348,29	-19 348,29	0,00	0,00	-19 348,29	-100,00%
		Další práce											
21	Pol40	Zaliti vysazených dřevin po výsadbě s dovozem a dodávkou vody 3x	m3	36,000	42,000	6,000	1 174,380	42 277,68	0,00	7 046,28	49 323,96	7 046,28	16,67%
22	Pol41	Ošetření dřevin soliterních po výsadbě včetně výchovného řezu	ks	115,000	122,000	7,000	275,620	31 696,30	0,00	1 929,34	33 625,64	1 929,34	6,09%
23	Pol42	Ošetření a vypleťtí rostlin ve skupinách 2x	m2	212,000	184,000	-28,000	76,690	16 258,28	-2 147,32	0,00	14 110,96	-2 147,32	-13,21%
		Ostatní materiály											
30	Pol49	Totální herbicid	lt	0,300	0,400	0,100	826,860	248,06	0,00	82,69	330,75	82,69	33,33%
31	Pol50	Tabletové pomalurozpustné hnojivo	kg	12,000	49,500	37,500	173,760	2 085,12	0,00	6 516,00	8 601,12	6 516,00	312,50%
32	Pol51	Půdní kondicionér	kg	33,000	41,000	8,000	772,930	25 506,69	0,00	6 183,44	31 690,13	6 183,44	24,24%
33	Pol52	Substrát pro výsadbu trvalek	m3	10,000	0,000	-10,000	1 533,880	15 338,80	-15 338,80	0,00	0,00	-15 338,80	-100,00%
37	Pol56	Borka mulčovací hrubá	m3	12,000	15,500	3,500	1 174,380	14 092,56	0,00	4 110,33	18 202,89	4 110,33	29,17%
38	Pol57	Kůly frézované tlakově impregnované prům.7cm, 2,5 m	ks	345,000	359,000	14,000	173,760	59 947,20	0,00	2 432,64	62 379,84	2 432,64	4,06%
42	Pol61	Úvazky ke stromům	ks	115,000	122,000	7,000	148,590	17 087,85	0,00	1 040,13	18 127,98	1 040,13	6,09%
	D10	Rostliny - velikost a kvalita dle PD											
	D13	Keře vzústné											
58	Pol75	Amelanchier alnifolia (muchovník) - KTS	ks	5,000	0,000	-5,000	3 571,070	17 855,35	-17 855,35	0,00	0,00	-17 855,35	-100,00%
	R14	Směšený záhon - kruhový objezd											
	D15	Soliterní											
59	Pol76	Agastache ´Blue Fortune´	ks	37,000	0,000	-37,000	55,120	2 039,44	-2 039,44	0,00	0,00	-2 039,44	-100,00%
60	Pol77	Aster lateriflorus Lady in Black	ks	56,000	0,000	-56,000	55,120	3 086,72	-3 086,72	0,00	0,00	-3 086,72	-100,00%
61	Pol78	Echinacea purpurea ´Magnus´	ks	75,000	0,000	-75,000	55,120	4 134,00	-4 134,00	0,00	0,00	-4 134,00	-100,00%
62	Pol79	Liatris spicata	ks	75,000	0,000	-75,000	55,120	4 134,00	-4 134,00	0,00	0,00	-4 134,00	-100,00%
63	Pol80	Panicum virgatum ´Rotstrahlbusch	ks	37,000	0,000	-37,000	55,120	2 039,44	-2 039,44	0,00	0,00	-2 039,44	-100,00%
	D16	Skupinové											
64	Pol81	Aster dumosus ´Jeny´	ks	93,000	0,000	-93,000	50,330	4 680,69	-4 680,69	0,00	0,00	-4 680,69	-100,00%
65	Pol82	Euphorbia polychroma	ks	93,000	0,000	-93,000	50,330	4 680,69	-4 680,69	0,00	0,00	-4 680,69	-100,00%
66	Pol83	Lavandula angustifolia	ks	93,000	0,000	-93,000	50,330	4 680,69	-4 680,69	0,00	0,00	-4 680,69	-100,00%
67	Pol84	Pennisetum alopecuroides ´Hameln´	ks	75,000	0,000	-75,000	50,330	3 774,75	-3 774,75	0,00	0,00	-3 774,75	-100,00%
68	Pol85	Penstemon ´Mystica	ks	75,000	0,000	-75,000	50,330	3 774,75	-3 774,75	0,00	0,00	-3 774,75	-100,00%
69	Pol86	Salvia officinalis ´Berggarten´	ks	75,000	0,000	-75,000	50,330	3 774,75	-3 774,75	0,00	0,00	-3 774,75	-100,00%
70	Pol87	Salvia verticillata ´Purple Rain´	ks	56,000	0,000	-56,000	50,330	2 818,48	-2 818,48	0,00	0,00	-2 818,48	-100,00%
71	Pol88	Sedum ´Matrona	ks	112,000	0,000	-112,000	50,330	5 636,96	-5 636,96	0,00	0,00	-5 636,96	-100,00%
72	Pol89	Veronica spicata	ks	93,000	0,000	-93,000	50,330	4 680,69	-4 680,69	0,00	0,00	-4 680,69	-100,00%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212 Číslo a název SO/PS: SO 801 - Vegetační úpravy Číslo a název rozpočtu: SO 801 - Vegetační úpravy								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 801 / 001					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	Pol90	Veronica teucrium ‘Knallbau’	ks	73,000	0,000	-73,000	50,330	3 674,09	-3 674,09	0,00	0,00	-3 674,09	-100,00%
	D17	Pokryvné											
74	Pol91	Campanula poscharskyana ‘Glandore	ks	75,000	0,000	-75,000	46,740	3 505,50	-3 505,50	0,00	0,00	-3 505,50	-100,00%
75	Pol92	Geranium x cantabrigiense ‘Biokovo’	ks	149,000	0,000	-149,000	46,740	6 964,26	-6 964,26	0,00	0,00	-6 964,26	-100,00%
76	Pol93	Gypsophila ‘Rosenschleier’	ks	93,000	0,000	-93,000	46,740	4 346,82	-4 346,82	0,00	0,00	-4 346,82	-100,00%
77	Pol94	Stachys byzantina ‘Silver Carpet	ks	56,000	0,000	-56,000	46,740	2 617,44	-2 617,44	0,00	0,00	-2 617,44	-100,00%
78	Pol95	Teucrium chamaedrys ‘Nanum	ks	93,000	0,000	-93,000	46,740	4 346,82	-4 346,82	0,00	0,00	-4 346,82	-100,00%
79	Pol96	Thymus serpyllum	ks	149,000	0,000	-149,000	46,740	6 964,26	-6 964,26	0,00	0,00	-6 964,26	-100,00%
	D18	Vtroušené											
80	Pol97	Gaura Lindheimeri	ks	37,000	0,000	-37,000	67,110	2 483,07	-2 483,07	0,00	0,00	-2 483,07	-100,00%
81	Pol98	Lychnis chalcedonia ‘Alba ’	ks	93,000	0,000	-93,000	67,110	6 241,23	-6 241,23	0,00	0,00	-6 241,23	-100,00%
	D19	Cibulnaté a hlíznaté											
82	Pol99	Allium aflatunense ‘Purple Sensation’	ks	414,000	0,000	-414,000	50,330	20 836,62	-20 836,62	0,00	0,00	-20 836,62	-100,00%
83	Pol100	Muscari armeniacum	ks	828,000	0,000	-828,000	14,380	11 906,64	-11 906,64	0,00	0,00	-11 906,64	-100,00%
84	Pol101	Crocus chrysanthus ‘Blue Pearl ’	ks	621,000	0,000	-621,000	14,380	8 929,98	-8 929,98	0,00	0,00	-8 929,98	-100,00%
85	Pol102	Narcissus cyclamineus	ks	621,000	0,000	-621,000	16,780	10 420,38	-10 420,38	0,00	0,00	-10 420,38	-100,00%
86	Pol103	Tulipa batalinii ‘Bright Gemi ’	ks	828,000	0,000	-828,000	19,170	15 872,76	-15 872,76	0,00	0,00	-15 872,76	-100,00%
		Nové položky - JC stanovena individuální kalkulací						0,00	0,00	297 005,13	297 005,13	297 005,13	100,00%
1001		Hloubení jamek do 0,05 m3 bez výměny půdy ve svahu	ks	0,000	744,000	744,000	51,750	0,00	0,00	38 502,00	38 502,00	38 502,00	100,00%
1002		Výsadba dřeviny s balem, ve svahu, při průměru balu do 20 cm	ks	0,000	744,000	744,000	46,000	0,00	0,00	34 224,00	34 224,00	34 224,00	100,00%
1003		Kotvení dřeviny 2 kůly	ks	0,000	7,000	7,000	125,350	0,00	0,00	877,45	877,45	877,45	100,00%
1004		Substrát pro výsadbu růží	m3	0,000	9,000	9,000	1 462,076	0,00	0,00	13 158,68	13 158,68	13 158,68	100,00%
1005		Borka mulčovací jemná	m3	0,000	18,000	18,000	1 489,250	0,00	0,00	26 806,50	26 806,50	26 806,50	100,00%
1006		Prunus fruticosa Globosa - polokmen různé výšky 100-200cm, Zb	ks	0,000	7,000	7,000	6 037,500	0,00	0,00	42 262,50	42 262,50	42 262,50	100,00%
1007		Rosa The Fairy Kt	ks	0,000	372,000	372,000	189,750	0,00	0,00	70 587,00	70 587,00	70 587,00	100,00%
1008		Rosa Fairy red Kt	ks	0,000	372,000	372,000	189,750	0,00	0,00	70 587,00	70 587,00	70 587,00	100,00%
		CELKEM						614 908,53	-364 579,55	363 801,80	614 130,78	-777,75	-0,13%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Tomáš Svoboda

Za Objednatele: Ing. Václav Marvan

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	76 925 171,56
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	78 163 130,59
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	94 577 388,01
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,61%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-9,10%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 333 680,81
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,73%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	23 077 551,47

12=(39)	Sledování limitu 15 %	11 538 775,73
13=ABS(37)+38	Sledování limitu v %	375 174,60
14=140448000-37	Hodnota skupiny 5	139 726,41

		- 1 -	- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -								
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)						
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=(ABS(37)+38)/1
		II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212	- 6 998 698,13	8 236 657,16	1 237 959,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 763 249,94	7 987 308,55	1 224 058,61	0,00	109 622,20	109 622,20	- 235 448,19	139 726,41	375 174,60
101	1	Přeložka silnice III/27212 / Úprava technického řešení	- 3 410 762,82	5 955 463,15	2 544 700,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 410 762,82	5 955 463,15	2 544 700,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	2	Trubní propustky / Úprava technického řešení	- 219 915,97	621 521,13	401 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 219 915,97	621 521,13	401 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	3	Přeložka závlahového potrubí / Úprava technického řešení	- 27 175,89	188 937,00	161 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 27 175,89	188 937,00	161 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	4	Přeložka silnice III/27212 / Úprava technického řešení	- 235 448,19	139 726,41	- 95 721,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 235 448,19	139 726,41	375 174,60
110	5	Trubní propustky / Úprava technického řešení	- 1 234 393,50	631 148,74	- 603 244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 234 393,50	631 148,74	-603 244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	6	Přeložka silnice III/27212 / Úprava technického řešení	- 1 438 509,55	158 578,39	- 1 279 931,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 438 509,55	158 578,39	-1 279 931,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	7	Přeložka silnice III/27212 / Úprava technického řešení	0,00	109 622,20	109 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 622,20	109 622,20	0,00	0,00	0,00
301	8	Přeložka závlahového potrubí / Úprava technického řešení	- 67 912,66	67 858,34	- 54,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 67 912,66	67 858,34	-54,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	9	Vegetační úpravy / Úprava technického řešení	- 364 579,55	363 801,80	- 777,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 364 579,55	363 801,80	-777,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	9
Název a evidenční číslo stavby:	II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vegetační úpravy
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	801/ 001

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
08 Oznámení Zhotovitele ze dne 13. 6. 2024	3	
09 Vyjádření KSÚS pro Středočeský kraj	2	
10 Přehled nových položek včetně příloh	10	
11 Situace vegetačních úprav - Úprava OK	1	
12 Vyjádření TDI ze dne 13. 3. 2025	2	
13 Vyjádření AD ze dne 21. 3. 2025	2	
14 Souhlas se změnou TDS	1	
15 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů	8	
Počet listů celkem	29	

Soupis prací SO po všech změnách														
Název stavby: II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212 Číslo a název SO/PS: SO 801 - Vegetační úpravy Číslo a název rozpočtu: SO 801 - Vegetační úpravy								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
								SO 801/001						
								celkem po všech změnách						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	D1	Výsadby stromů, keřů a smíšených záhonů												
	D2	Založení												
1	Pol20	Chemické odplevelení před založením kultury včetně dodávky	m2		184,000			1 177,20	-514,80	0,00	662,40	-514,80	-43,73%	
	ZBV č. 9			184,000										
2	Pol21	Obdělání půdy nakopáním, frézováním a rytím v rovině a svahu	m2		184,000		14,38	4 702,26	-2 056,34	0,00	2 645,92	-2 056,34	-43,73%	
	ZBV č. 9			184,000										
3	Pol22	Zřízení a rozměření záhonů pro trvalkové skupiny v rovině a svahu	m2		207,000		46,74	9 675,18	-1 075,02	0,00	8 600,16	-1 075,02	-11,11%	
	ZBV č. 9			184,000										
4	Pol23	Rozprostření nebo promíchání výsadbového substrátu pro trvalky do 5 cm	m2		207,000		50,33	10 418,31	-1 157,59	0,00	9 260,72	-1 157,59	-11,11%	
	ZBV č. 9			184,000										
5	Pol24	Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do záhonů a výsadbových jam	m2		327,000		14,38	4 702,26	-2 056,34	0,00	2 645,92	-2 056,34	-43,73%	
	ZBV č. 9			184,000										
6	Pol25	Hloubení jamek do 0,125 m3 bez výměny půdy	ks		5,000	0,000	143,80	719,00	-719,00	0,00	0,00	-719,00	-100,00%	
	ZBV č. 9			0,000										
7	Pol26	Hloubení jam do 0,4 m3 bez výměny půdy	ks		8,000	15,000	7,000	3 786,80	0,00	3 313,45	7 100,25	3 313,45	87,50%	
	ZBV č. 9			15,000										
8	Pol27	Hloubení jam do 1 m3 bez výměny půdy	ks		107,000	107,000	0,000	832,85	89 114,95	0,00	89 114,95	0,00	0,00%	
9	Pol28	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 30 cm	ks		5,000	0,000	117,44	587,20	-587,20	0,00	0,00	-587,20	-100,00%	
	ZBV č. 9			0,000										
10	Pol29	Výsadba dřeviny s balem, v rovině a svahu, při průměru balu do 60 cm	ks		8,000	15,000	7,000	413,43	3 307,44	0,00	2 894,01	2 894,01	87,50%	
	ZBV č. 9			15,000										
11	Pol30	Výsadba dřeviny s balem, v rovině a svahu, při průměru balu do 80 cm	ks		107,000	107,000	0,000	766,94	82 062,58	0,00	82 062,58	0,00	0,00%	
12	Pol31	Hloubení jamek a výsadba trvalek a okrasných trav	ks		1 863,000	0,000	-1863,000	46,74	87 076,62	-87 076,62	0,00	-87 076,62	-100,00%	
	ZBV č. 9			0,000										
13	Pol32	Hloubení jamek a výsadba cibulovin	ks		3 312,000	0,000	-3312,000	15,58	51 600,96	-51 600,96	0,00	-51 600,96	-100,00%	
	ZBV č. 9			0,000										
14	Pol33	Ochranný nátěr kmene Arbolflex	ks		107,000	107,000	0,000	257,64	27 567,48	0,00	27 567,48	0,00	0,00%	
15	Pol34	Instalace PE chráničky proti okusu	ks		107,000	107,000	0,000	82,69	8 847,83	0,00	8 847,83	0,00	0,00%	
16	Pol35	Kotvení dřeviny konstrukcí ze 3 kůlů	ks		115,000	115,000	0,000	413,43	47 544,45	0,00	47 544,45	0,00	0,00%	
17	Pol36	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	ks		120,000	866,000	746,000	21,57	2 588,40	0,00	16 091,22	18 679,62	621,67%	
	ZBV č. 9			866,000										
18	Pol37	Namučování borkou záhony keřů a solitery vrstva 10-15 cm	m2		120,000	306,000	186,000	81,49	9 778,80	0,00	15 157,14	24 935,94	155,00%	
	ZBV č. 9			306,000										
19	Pol38	Mulčování záhonů šterkodrtí 4/8 nebo 0/4mmmm křemitý písek vrstva 5 cm	m2		207,000	0,000	-207,000	93,47	19 348,29	-19 348,29	0,00	-19 348,29	-100,00%	
20	Pol39	Zřízení zahluobeného valounového prstence včetně separační geotextilie, vrstva 10 cm	m2		290,000	290,000	0,000	257,64	74 715,60	0,00	74 715,60	0,00	0,00%	
	D3	Další práce												
21	Pol40	Zaliti vysazených dřevin po výsadbě s dovozem a dodávkou vody 3x	m3		36,000	42,000	6,000	1 174,38	42 277,68	0,00	7 046,28	49 323,96	7 046,28	16,67%
	ZBV č. 9			42,000										
22	Pol41	Ošetření dřevin soliterních po výsadbě včetně výchovného řezu	ks		115,000	122,000	7,000	275,62	31 696,30	0,00	1 929,34	33 625,64	1 929,34	6,09%
	ZBV č. 9			122,000										
23	Pol42	Ošetření a vyplětí rostlin ve skupinách 2x	m2		212,000	184,000	-28,000	76,69	16 258,28	-2 147,32	0,00	14 110,96	-2 147,32	-13,21%
	ZBV č. 9			184,000										
24	Pol43	Přesun hmot pro SÚ	t		82,000	82,000	0,000	898,76	73 698,32	0,00	73 698,32	0,00	0,00%	
87	Pol43.1	Odborné arboristické ošetření senescentního stromu Tilia cordata (Obvodová redukce 20% a zdravotní řez) včetně likvidace biomoty	kus		1,000	1,000	0,000	14 380,15	14 380,15	0,00	14 380,15	0,00	0,00%	
	D5	Ostatní materiály												
30	Pol49	Totální herbicid	lt		0,300	0,400	0,100	826,86	248,06	0,00	82,69	330,75	82,69	33,33%
	ZBV č. 9			0,400										
31	Pol50	Tabletové pomalurozpustné hnojivo	kg		12,000	49,500	37,500	173,76	2 085,12	0,00	6 516,00	8 601,12	6 516,00	312,50%
	ZBV č. 9			49,500										
32	Pol51	Půdní kondicionér	kg		33,000	41,000	8,000	772,93	25 506,69	0,00	6 183,44	31 690,13	6 183,44	24,24%
	ZBV č. 9			41,000										
33	Pol52	Substrát pro výsadbu trvalek	m3		10,000	0,000	-10,000	1 533,88	15 338,80	-15 338,80	0,00	-15 338,80	-100,00%	
	ZBV č. 9			0,000										
34	Pol53	Ochranný nátěr kmene Arbolflex	ks		107,000	107,000	0,000	227,69	24 362,83	0,00	24 362,83	0,00	0,00%	
35	Pol54	PR chránička proti okusu, výška 100 cm	ks		107,000	107,000	0,000	116,24	12 437,68	0,00	12 437,68	0,00	0,00%	
36	Pol55	Dodávka drcený kačírek mulčovací 4/8	m3		11,000	11,000	0,000	1 162,40	12 786,40	0,00	12 786,40	0,00	0,00%	
37	Pol56	Borka mulčovací hrubá	m3		12,000	15,500	3,500	1 174,38	14 092,56	0,00	4 110,33	18 202,89	4 110,33	29,17%
	ZBV č. 9			29,500										
38	Pol57	Kůly frézované tlakově impregnované prům.7cm, 2,5 m	ks		345,000	359,000	14,000	173,76	59 947,20	0,00	2 432,64	62 379,84	2 432,64	4,06%
	ZBV č. 9			360,000										
39	Pol58	Příčky půlené tlakově impregnované	ks		345,000	345,000	0,000	46,74	16 125,30	0,00	16 125,30	0,00	0,00%	
40	Pol59	Kačírek praný 32/63 mm	m3		29,000	29,000	0,000	1 174,38	34 057,02	0,00	34 057,02	0,00	0,00%	
41	Pol60	Geofiltex G300	m2		305,000	305,000	0,000	100,66	30 701,30	0,00	30 701,30	0,00	0,00%	
42	Pol61	Úvazky ke stromům	ks		115,000	122,000	7,000	148,59	17 087,85	0,00	1 040,13	18 127,98	1 040,13	6,09%
	ZBV č. 9			122,000										
	D6	Rozvojová a dokončovací péče o výsadby 3 roky												
	D7	1.Rok												
43	Pol62	Jednotlivé stromy	ks		115,000	115,000	0,000	419,42	48 233,30	0,00	48 233,30	0,00	0,00%	
44	Pol63	Skupiny keřů a trvalé v zápoji	m2		212,000	212,000	0,000	95,87	20 324,44	0,00	20 324,44	0,00	0,00%	
	D8	2.Rok												
46	Pol63	Skupiny keřů a trvalé v zápoji	m2		212,000	212,000	0,000	299,59	63 513,08	0,00	63 513,08	0,00	0,00%	
45	Pol64	Jednotlivé stromy	ks		115,000	115,000	0,000	71,90	8 268,50	0,00	8 268,50	0,00	0,00%	
	D9	3.Rok												
48	Pol63	Skupiny keřů a trvalé v zápoji	m2		212,000	212,000	0,000	239,67	50 810,04	0,00	50 810,04	0,00	0,00%	
47	Pol65	Jednotlivé stromy	ks		115,000	115,000	0,000	71,90	8 268,50	0,00	8 268,50	0,00	0,00%	
	D10	Rostliny - velikost a kvalita dle PD												
	D11	Stromy listnaté alejové a soliterní												
49	Pol66	Acer campestre (javor babyka) VK, Zb	ks		8,000	8,000	0,000	5 931,81	47 454,48	0,00	47 454,48	0,00	0,00%	
50	Pol67	Acer campestre "Elegant" (javor babyka) VK, Zb	ks		17,000	17,000	0,000	6 231,40	105 933,80	0,00	105 933,80	0,00	0,00%	
51	Pol68	Acer platanoides "Columnare" (javor mléč) VK, Zb	ks		8,000	8,000	0,000	6 111,56	48 892,48	0,00	48 892,48	0,00	0,00%	
52	Pol69	Acer platanoides "Olmsted" (javor mléč) VK, Zb	ks		40,000	40,000	0,000	6 231,40	249 256,00	0,00	249 256,00	0,00	0,00%	
53	Pol70	Betula pendula (bříza bělkorá) VK, Zb												

66	Poi83	Lavandula angustifolia	ks	93,000	0,000	-93,000	50,33	4 680,69	-4 680,69	0,00	0,00	-4 680,69	-100,00%
67	Poi84	Pennisetum alopecuroides 'Hamein'	ks	75,000	0,000	-75,000	50,33	3 774,75	-3 774,75	0,00	0,00	-3 774,75	-100,00%
68	Poi85	Penstemon 'Mystica'	ks	75,000	0,000	-75,000	50,33	3 774,75	-3 774,75	0,00	0,00	-3 774,75	-100,00%
69	Poi86	Salvia officinalis 'Berggarten'	ks	75,000	0,000	-75,000	50,33	3 774,75	-3 774,75	0,00	0,00	-3 774,75	-100,00%
70	Poi87	Salvia verticillata 'Purple Rain'	ks	56,000	0,000	-56,000	50,33	2 818,48	-2 818,48	0,00	0,00	-2 818,48	-100,00%
71	Poi88	Sedum 'Matrona'	ks	112,000	0,000	-112,000	50,33	5 636,96	-5 636,96	0,00	0,00	-5 636,96	-100,00%
72	Poi89	Veronica spicata	ks	93,000	0,000	-93,000	50,33	4 680,69	-4 680,69	0,00	0,00	-4 680,69	-100,00%
73	Poi90	Veronica teurcium 'Knalbau'	ks	73,000	0,000	-73,000	50,33	3 674,09	-3 674,09	0,00	0,00	-3 674,09	-100,00%
	D17	Pokryvné											
74	Poi91	Campanula poscharskyana 'Glandore'	ks	75,000	0,000	-75,000	46,74	3 505,50	-3 505,50	0,00	0,00	-3 505,50	-100,00%
75	Poi92	Geranium x cantabrigiense 'Blokovo'	ks	149,000	0,000	-149,000	46,74	6 964,26	-6 964,26	0,00	0,00	-6 964,26	-100,00%
76	Poi93	Gypsophila 'Rosenschleier'	ks	93,000	0,000	-93,000	46,74	4 346,82	-4 346,82	0,00	0,00	-4 346,82	-100,00%
77	Poi94	Stachys byzantina 'Silver Carpet'	ks	56,000	0,000	-56,000	46,74	2 617,44	-2 617,44	0,00	0,00	-2 617,44	-100,00%
78	Poi95	Teucrium chamaedrys 'Nanum'	ks	93,000	0,000	-93,000	46,74	4 346,82	-4 346,82	0,00	0,00	-4 346,82	-100,00%
79	Poi96	Thymus serpyllum	ks	149,000	0,000	-149,000	46,74	6 964,26	-6 964,26	0,00	0,00	-6 964,26	-100,00%
	D18	Vitroušené											
80	Poi97	Gaura Lindheimeri	ks	37,000	0,000	-37,000	67,11	2 483,07	-2 483,07	0,00	0,00	-2 483,07	-100,00%
81	Poi98	Lychnis chalcedonia 'Alba'	ks	93,000	0,000	-93,000	67,11	6 241,23	-6 241,23	0,00	0,00	-6 241,23	-100,00%
	D19	Cibulnaté a hlíznaté											
82	Poi99	Allium aflatumense 'Purple Sensation'	ks	414,000	0,000	-414,000	50,33	20 836,62	-20 836,62	0,00	0,00	-20 836,62	-100,00%
83	Poi100	Muscari armeniacum	ks	828,000	0,000	-828,000	14,38	11 906,64	-11 906,64	0,00	0,00	-11 906,64	-100,00%
84	Poi101	Crocus chrysanthus 'Blue Pearl'	ks	621,000	0,000	-621,000	14,38	8 929,98	-8 929,98	0,00	0,00	-8 929,98	-100,00%
85	Poi102	Narcissus cyclamineus	ks	621,000	0,000	-621,000	16,78	10 420,38	-10 420,38	0,00	0,00	-10 420,38	-100,00%
86	Poi103	Tulipa batalinii 'Bright Gem'	ks	828,000	0,000	-828,000	19,17	15 872,76	-15 872,76	0,00	0,00	-15 872,76	-100,00%
		Nové položky											
1001		Hloubení jamek do 0,05 m3 bez výměny půdy ve svahu	ks	0,000	744,000	744,000	51,75	0,00	0,00	38 502,00	38 502,00	38 502,00	100,00%
	ZBV č. 9			744,000			JC dle individuální kalkulace						
1002		Výsadba dřeviny s balem, ve svahu, při průměru balu do 20 cm	ks	0,000	744,000	744,000	46,000	0,00	0,00	34 224,00	34 224,00	34 224,00	100,00%
	ZBV č. 9			744,000			JC dle individuální kalkulace						
1003		Kotvení dřeviny 2 kůly	ks	0,000	7,000	7,000	125,35	0,00	0,00	877,45	877,45	877,45	100,00%
	ZBV č. 9			7,000			JC dle individuální kalkulace						
1004		Substrát pro výsadbu růží	m3	0,000	9,000	9,000	1 462,076	0,00	0,00	13 158,68	13 158,68	13 158,68	100,00%
	ZBV č. 9			9,000			JC dle individuální kalkulace						
1005		Borka mulčovací jemná	m3	0,000	18,000	18,000	1 489,250	0,00	0,00	26 806,50	26 806,50	26 806,50	100,00%
	ZBV č. 9			18,000			JC dle individuální kalkulace						
1006		Prunus fruticosa Globosa - polokmen různé výšky 100-200cm, Zb	ks	0,000	7,000	7,000	6 037,500	0,00	0,00	42 262,50	42 262,50	42 262,50	100,00%
	ZBV č. 9			7,000			JC dle individuální kalkulace						
1007		Rosa The Fairy Kt	ks	0,000	372,000	372,000	189,750	0,00	0,00	70 587,00	70 587,00	70 587,00	100,00%
	ZBV č. 9			372,000			JC dle individuální kalkulace						
1008		Rosa Fairy red Kt	ks	0,000	372,000	372,000	189,750	0,00	0,00	70 587,00	70 587,00	70 587,00	100,00%
	ZBV č. 9			372,000			JC dle individuální kalkulace						
		Celkem						2 063 101,53	- 364 579,55	363 801,80	2 062 323,78	- 777,75	-0,04%

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice
Odštěpný závod Praha



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov**

Vyřizuje:
Ing. Jan Dušek
Tel. +420 739 381 301
jan.dusek@strabag.com

Naše značka: FA/147/JD

Dne 13.6.2024

Věc: Oznámení zhotovitele, vegetační úpravy v OK

Název stavby: II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212

Číslo smlouvy objednatele: S-3236/00066001/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/FA/2022/030/FAFY

Vážený Objednateli,


V souladu s Pod-čl. 7.8 Smlouvy o dílo č. S-3236/00066001/2022 ze dne 5.12.2022 Vám zasílám Oznámení o použití nepřilíš vhodného způsobu osázení vnitřního prostoru okružní křižovatky z pohledu dlouhodobé údržby a udržitelnosti zeleně.

Po prozkoumání návrhu osázení vnitřního prostoru OK (okružní křižovatky) ze strany města Benátky nad Jizerou jakožto budoucí správce zeleně a nositele následné péče o zeleň v prostoru námi budované stavby jsme dospěli k závěru, že navrhovaný záhon skládající se z 1863 trvalek a okrasných trav v kombinaci s 3312 vysazených cibulovin, bude až příliš náročný na údržbu vzhledem k frekventovanosti křižovatky uvnitř níž není kde zastavit a plochu obsloužit. Navíc je celý záhon navržen ve svahu a prostor by tak byl ohrožen erozními vlivy. Rostliny navržené v PD nejsou příliš vhodné pro zvládání erozních vlivů a celé koncepci by nejspíš nevyhovovali.

Zástupci města jakožto budoucí nositele povinnosti následné péče proto ve spolupráci s projektanty a dodavateli vypracovali pozměňovací návrh na úpravu vnitřního prostoru okružní křižovatky, který tak bude předmětem samostatného ZBV.



Původní návrh

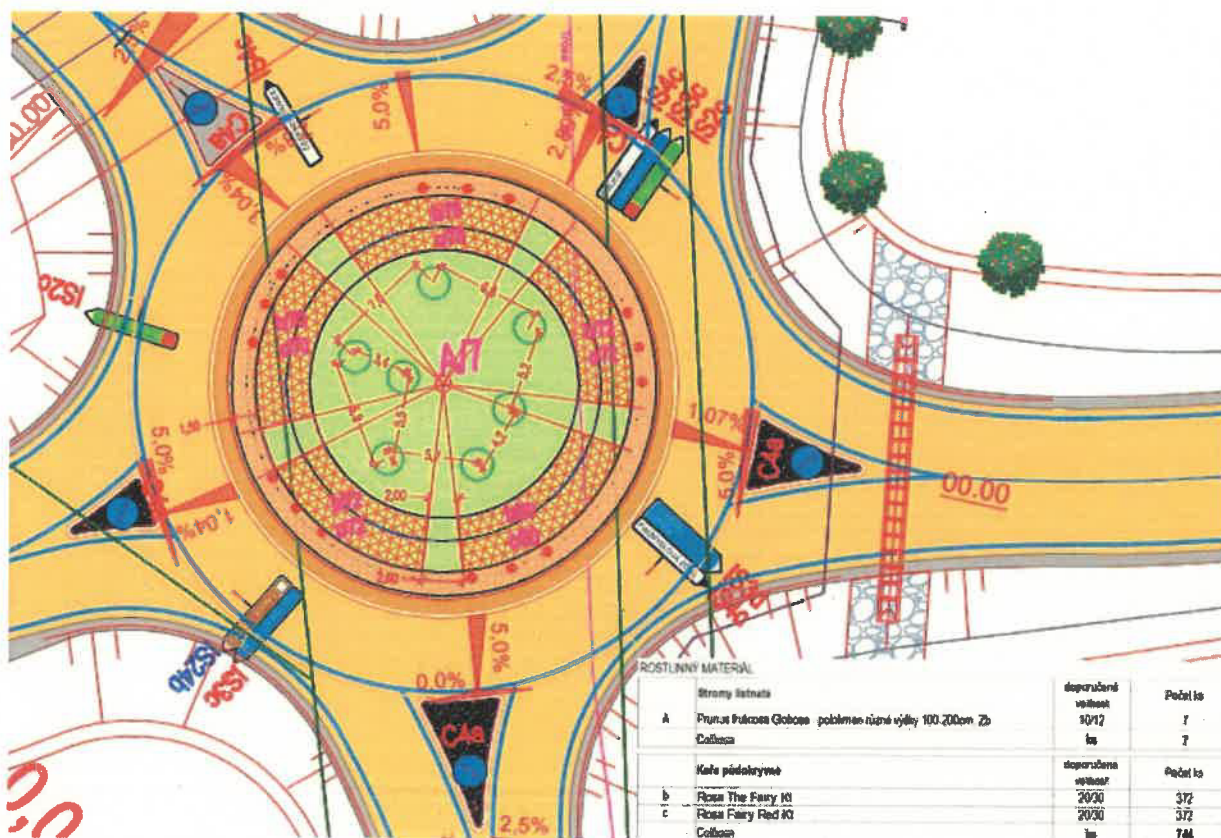

Nový návrh úpravy reflektující přístup pro následnou péči a respektující erozní vlivy.

Materiál, který navrhujeme nově použít uvnitř OK, je odolnější a co se týká následné péče i výrazně méně náročný. Nově se v návrhu řeší i opatření spojená s odoláváním erozním vlivům a lepší přístup pro pracovníky údržby.

Celkový předpokládaný cenový dopad dle tohoto návrhu činí **0,00 Kč**.

Za Zhotovitele: STRABAG a.s.

Ing. Jan Dušek


STRABAG
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(263)

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Projekt: II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212

Číslo smlouvy objednatele: S-3236/00066001/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/FA/2022/030/FAFY

Věc: Oznámení zhotovitele o zjištěných skutečnostech, vyjádření KSÚS k ohlášení změny stavby.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „**II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212**“ po dohodě a se souhlasem AD a TDI stavby bere na vědomí ohlášení změn, jejímž předmětem jsou skutečnosti zjištěné v průběhu stavebních prací. KSÚS tímto žádá o předložení zpracovaných změnových listů.

Rozsah změn:

1. Oznámení zhotovitele ze dne 25.5.2024:

Provádění zemních prací – kolize s realizovanou přeložkou nadzemního vedení VN a podzemního kabelu NN. Vzhledem k časovému posunu realizace přeložek vedení sítě ČEZ Distribuce v místě budoucí okružní křižovatky, došlo v průběhu realizace stavby k nedostatku násypového materiálu, bylo nutné otevření dvou zemníků v dalších prostorech stavby.

2. Oznámení zhotovitele ze dne 13.6.2024:

Vegetační úpravy v OK – v průběhu realizace stavby vznesli zástupci města Benátky nad Jizerou požadavek na změnu osázení vnitřní části OK, i z důvodu budoucí údržby, kterou bude dle dohody provádět město. Při dodržení podmínek, že nedojde k navýšení ceny díla a vlivu na dobu výstavby, byla na základě tohoto požadavku změna provedena.

3. Oznámení zhotovitele ze dne 9.9.2024:

Provádění zemních prací – v průběhu stavby III. etapy byly zastiženy nepředvídatelné geotechnické podmínky, dále v původní trase komunikace III/27212 byl zastižen starý nefunkční kabel, zasypaný nevhodným materiálem, dále musely být lokálně provedeny sanace podloží, vše na základě provedených nevyhovujících SSZ. V dotčených místech byly provedeny sanace formou prohloubení a nutné stavební úpravy pro vyhovující technický stav.

4. Oznámení zhotovitele ze dne 19.9.2024:

Realizace vodovodu závlahy dle požadavků provozovatele – při provádění přeložek a úprav závlahového vodovodu spol. Předměřická a.s. zástupci provozovatele vodovodu upřesnili své požadavky na technické provedení přeložek. Za podmínek, že nebude překročena nabídková cena úprav závlahového vodovodu z nabídky zhotovitele a že úpravy nebudou mít vliv na dobu výstavby byly změny provedeny.

5. Oznámení zhotovitele ze dne 18.10.2024:

Výměna uložení žulové dlažby v ostrůvcích u OK – po provedení žulové dlažby v rozdělovacích ostrůvcích u nové OK a jejím uvedení do předčasného užívání došlo ke zjištění, že vlivem projíždějících nákladních vozidel přes okružní křižovatku dochází k rozjíždění a vytrhávání žulové dlažby na těchto ostrůvcích. Tato skutečnost nešla předvídat, neboť k ní dochází vlivem nekázně projíždějících řidičů, kteří nepřizpůsobují rychlost daným podmínkám a ostrůvky přejíždějí. Vzhledem k zjištěné situaci po uvedení do provozu, kdy v budoucnu by docházelo opakovaně k nutným opravám bylo rozhodnuto a provedena úprava formou vhodnějšího a pevnějšího technického řešení.

Změny budou řešeny formou ZBV. Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných změn. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení, včetně finančního navýšení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

Martin Voříšek

Projektový manažer



Tel.: 702 266 228

E-mail: martin.vorisek@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

Kancelář: Praha

www.ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Zborovská 11
IČO: 00066001

150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001

M. Voříšek

TABULKA NOVÝCH POLOŽEK

Stavba: - II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212

Objekt: SO 801 - Vegetační úpravy

Rozpočet: SO 801 - Vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	Poznámky	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
1001		N	Hloubení jamek do 0,05 m3 bez výměny půdy ve svahu	Jednotková cena stanovena dle individuální cenové kalkulace	KUS	744,000	51,75	38 502,00
1002		N	Výsadba dřeviny s balem, ve svahu, při průměru balu do 20 cm	Jednotková cena stanovena dle individuální cenové kalkulace	KUS	744,000	46,00	34 224,00
1003		N	Kotvení dřeviny 1 kůlem	Jednotková cena stanovena dle individuální cenové kalkulace	KUS	7,000	125,35	877,45
1004		N	Substrát pro výsadbu růží	Jednotková cena stanovena dle individuální cenové kalkulace	M3	9,000	1 462,08	13 158,68
1005		N	Borka mulčovací jemná	Jednotková cena stanovena dle individuální cenové kalkulace	M3	18,000	1 489,25	26 806,50
1006		N	Prunus fruticosa Globosa - polokmen různé výšky 100-200cm, Zb	Jednotková cena stanovena dle individuální cenové kalkulace	KUS	7,000	6 037,50	42 262,50
1007		N	Rosa The Fairy Kt	Jednotková cena stanovena dle individuální cenové kalkulace	KUS	372,000	189,75	70 587,00
1008		N	Rosa Fairy red Kt	Jednotková cena stanovena dle individuální cenové kalkulace	KUS	372,000	189,75	70 587,00

Název stavby dle SoD: II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212

Číslo a název SO/PS: SO 801 - Vegetační úpravy

Číslo a název rozpočtu: SO 801 - Vegetační úpravy

	Název položky	m.j.	Množství	JC	Cena celkem
1	Hloubení jamek do 0,05 m3 bez výměny půdy ve svahu	ks	744,000	45,000	33 480,000
2	Výsadba dřeviny s balem, ve svahu, při průměru balu do 20 cm	ks	744,000	40,000	29 760,000
3	Kotvení dřeviny 2 kůly	ks	7,000	109,000	763,000
4	Substrát pro výsadbu růží	m ³	9,000	1 271,370	11 442,330
5	Borka mulčovací jemná	m ³	18,000	1 295,000	23 310,000
6	Prunus fruticosa Globosa - polokmen různé výšky 100-200cm, Zb	ks	7,000	5 250,000	36 750,000
7	Rosa The Fairy Kt	ks	372,000	165,000	61 380,000
8	Rosa Fairy red Kt	ks	372,000	165,000	61 380,000

CELKEM

258 265,330

LESÁČEK s.r.o.

Světlá 6/1114
100 00 Praha 10

IČO: 25768042 DIČ: CZ25768042



Kalkulace ceny položky č. 1001

Hloubení jamek do 0,05 m3 bez výměny půdy ve svahu

TOV

000

TOV 000

MJ

KS

1	Přímý materiál		0,00
2	Mzdy- osobní náklady		0,00
3	Odvody		0,00
4	Stroje		0,00
5	Doprava		0,00
6	Ostatní		45,00
7	Příme zpracovací náklady [2] až [6]		45,00
8	Nekalkulované náklady dle preambule 8%		0,00
Přímé + nekalkulované náklady [1] + [7] + [8]			45,00
9	režie výrobní	5,0 % z [6]	2,25
10	režie správní	5,0 % z [6]	2,25
Nepřímé náklady [9] + [10]			4,50
Náklady celkem + nekalkulované [1] + [7] + [8] + [9] + [10]			49,50
11	Zisk	5 % z [6]	2,25
Celkem [1] + [7] až [11]			51,75
Jednotková cena			51,75

Hmotnost	0,00
Normohodiny	0,00

P.Č.	Typ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
Ostatní							
			Cenová nabídka od Lesáček s.r.o.	KS	744,000	45,00	33 480,00
Ostatní							33 480,00

Kalkulace ceny položky č. 1002

Výsadba dřeviny s balem, ve svahu, při průměru balu do 20 cm

TOV

000

TOV 000

MJ KS

1	Přímý materiál		0,00
2	Mzdy- osobní náklady		0,00
3	Odvody		0,00
4	Stroje		0,00
5	Doprava		0,00
6	Ostatní		40,00
7	Příme zpracovací náklady [2] až [6]		40,00
8	Nekalkulované náklady dle preambule 8%		0,00
Přímé + nekalkulované náklady [1] + [7] + [8]			40,00
9	režie výrobní	5,0 % z [6]	2,00
10	režie správní	5,0 % z [6]	2,00
Nepřímé náklady [9] + [10]			4,00
Náklady celkem + nekalkulované [1] + [7] + [8] + [9] + [10]			44,00
11	Zisk	5 % z [6]	2,00
Celkem [1] + [7] až [11]			46,00
Jednotková cena			46,00

Hmotnost	0,00
Normohodiny	0,00

P.Č.	Typ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
Ostatní							
			Cenová nabídka od Lesáček s.r.o.	KS	744,000	40,00	29 760,00
Ostatní							29 760,00

Kalkulace ceny položky č. 1003

Kotvení dřeviny 2 kůly

TOV

000

TOV 000

MJ

KS

1	Přímý materiál		0,00
2	Mzdy- osobní náklady		0,00
3	Odvody		0,00
4	Stroje		0,00
5	Doprava		0,00
6	Ostatní		109,00
7	Příme zpracovací náklady [2] až [6]		109,00
8	Nekalkulované náklady dle preambule 8%		0,00
Přímé + nekalkulované náklady [1] + [7] + [8]			109,00
9	režie výrobní	5,0 % z [6]	5,45
10	režie správní	5,0 % z [6]	5,45
Nepřímé náklady [9] + [10]			10,90
Náklady celkem + nekalkulované [1] + [7] + [8] + [9] + [10]			119,90
11	Zisk	5 % z [6]	5,45
Celkem [1] + [7] až [11]			125,35
Jednotková cena			125,35

Hmotnost	0,00
Normohodiny	0,00

P.Č.	Typ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
Ostatní							
			Cenová nabídka od Lesáček s.r.o.	KS	7,000	109,00	763,00
Ostatní							763,00

Kalkulace ceny položky č. 1004

Substrát pro výsadbu růží

TOV

000

TOV 000

MJ

M3

1	Přímý materiál		0,00
2	Mzdy- osobní náklady		0,00
3	Odvody		0,00
4	Stroje		0,00
5	Doprava		0,00
6	Ostatní		1 271,37
7	Příme zpracovací náklady [2] až [6]		1 271,37
8	Nekalkulované náklady dle preambule 8%		0,00
Přímé + nekalkulované náklady [1] + [7] + [8]			1 271,37
9	režie výrobní	5,0 % z [6]	63,57
10	režie správní	5,0 % z [6]	63,57
Nepřímé náklady [9] + [10]			127,14
Náklady celkem + nekalkulované [1] + [7] + [8] + [9] + [10]			1 398,51
11	Zisk	5 % z [6]	63,57
Celkem [1] + [7] až [11]			1 462,08
Jednotková cena			1 462,08

Hmotnost	0,00
Normohodiny	0,00

P.Č.	Typ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
Ostatní							
			Cenová nabídka od Lesáček s.r.o.	KS	9,000	1 271,37	11 442,33
Ostatní							11 442,33

Kalkulace ceny položky č. 1005

Borka mulčovací jemná

TOV

000

TOV 000

MJ M3

1	Přímý materiál		0,00
2	Mzdy- osobní náklady		0,00
3	Odvody		0,00
4	Stroje		0,00
5	Doprava		0,00
6	Ostatní		1 295,00
7	Příme zpracovací náklady [2] až [6]		1 295,00
8	Nekalkulované náklady dle preambule 8%		0,00
Přímé + nekalkulované náklady [1] + [7] + [8]			1 295,00
9	režie výrobní	5,0 % z [6]	64,75
10	režie správní	5,0 % z [6]	64,75
Nepřímé náklady [9] + [10]			129,50
Náklady celkem + nekalkulované [1] + [7] + [8] + [9] + [10]			1 424,50
11	Zisk	5 % z [6]	64,75
Celkem [1] + [7] až [11]			1 489,25
Jednotková cena			1 489,25

Hmotnost	0,00
Normohodiny	0,00

P.Č.	Typ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
Ostatní							
			Cenová nabídka od Lesáček s.r.o.	KS	18,000	1 295,00	23 310,00
Ostatní							23 310,00

Kalkulace ceny položky č. 1006

Prunus fruticosa Globosa - polokmen různé výšky 100-200cm, Zb

TOV

000

TOV 000

MJ

KS

1	Přímý materiál		0,00
2	Mzdy- osobní náklady		0,00
3	Odvody		0,00
4	Stroje		0,00
5	Doprava		0,00
6	Ostatní		5 250,00
7	Příme zpracovací náklady [2] až [6]		5 250,00
8	Nekalkulované náklady dle preambule 8%		0,00
Přímé + nekalkulované náklady [1] + [7] + [8]			5 250,00
9	režie výrobní	5,0 % z [6]	262,50
10	režie správní	5,0 % z [6]	262,50
Nepřímé náklady [9] + [10]			525,00
Náklady celkem + nekalkulované [1] + [7] + [8] + [9] + [10]			5 775,00
11	Zisk	5 % z [6]	262,50
Celkem [1] + [7] až [11]			6 037,50
Jednotková cena			6 037,50

Hmotnost	0,00
Normohodiny	0,00

P.Č.	Typ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
Ostatní							
			Cenová nabídka od Lesáček s.r.o.	KS	7,000	5 250,00	36 750,00
Ostatní							36 750,00

Kalkulace ceny položky č. 1007

Rosa The Fairy Kt

TOV

000

TOV 000

MJ

KS

1	Přímý materiál		0,00
2	Mzdy- osobní náklady		0,00
3	Odvody		0,00
4	Stroje		0,00
5	Doprava		0,00
6	Ostatní		165,00
7	Příme zpracovací náklady [2] až [6]		165,00
8	Nekalkulované náklady dle preambule 8%		0,00
Přímé + nekalkulované náklady [1] + [7] + [8]			165,00
9	režie výrobní	5,0 % z [6]	8,25
10	režie správní	5,0 % z [6]	8,25
Nepřímé náklady [9] + [10]			16,50
Náklady celkem + nekalkulované [1] + [7] + [8] + [9] + [10]			181,50
11	Zisk	5 % z [6]	8,25
Celkem [1] + [7] až [11]			189,75
Jednotková cena			189,75

Hmotnost	0,00
Normohodiny	0,00

P.Č.	Typ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
Ostatní							
			Cenová nabídka od Lesáček s.r.o.	KS	372,000	165,00	61 380,00
Ostatní							61 380,00

Kalkulace ceny položky č. 1008

Rosa Fairy red Kt

TOV

000

TOV 000


MJ

KS

1	Přímý materiál		0,00
2	Mzdy- osobní náklady		0,00
3	Odvody		0,00
4	Stroje		0,00
5	Doprava		0,00
6	Ostatní		165,00
7	Příme zpracovací náklady [2] až [6]		165,00
8	Nekalkulované náklady dle preambule 8%		0,00
Přímé + nekalkulované náklady [1] + [7] + [8]			165,00
9	režie výrobní	5,0 % z [6]	8,25
10	režie správní	5,0 % z [6]	8,25
Nepřímé náklady [9] + [10]			16,50
Náklady celkem + nekalkulované [1] + [7] + [8] + [9] + [10]			181,50
11	Zisk	5 % z [6]	8,25
Celkem [1] + [7] až [11]			189,75
Jednotková cena			189,75

Hmotnost	0,00
Normohodiny	0,00

P.Č.	Typ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
Ostatní							
			Cenová nabídka od Lesáček s.r.o.	KS	372,000	165,00	61 380,00
Ostatní							61 380,00

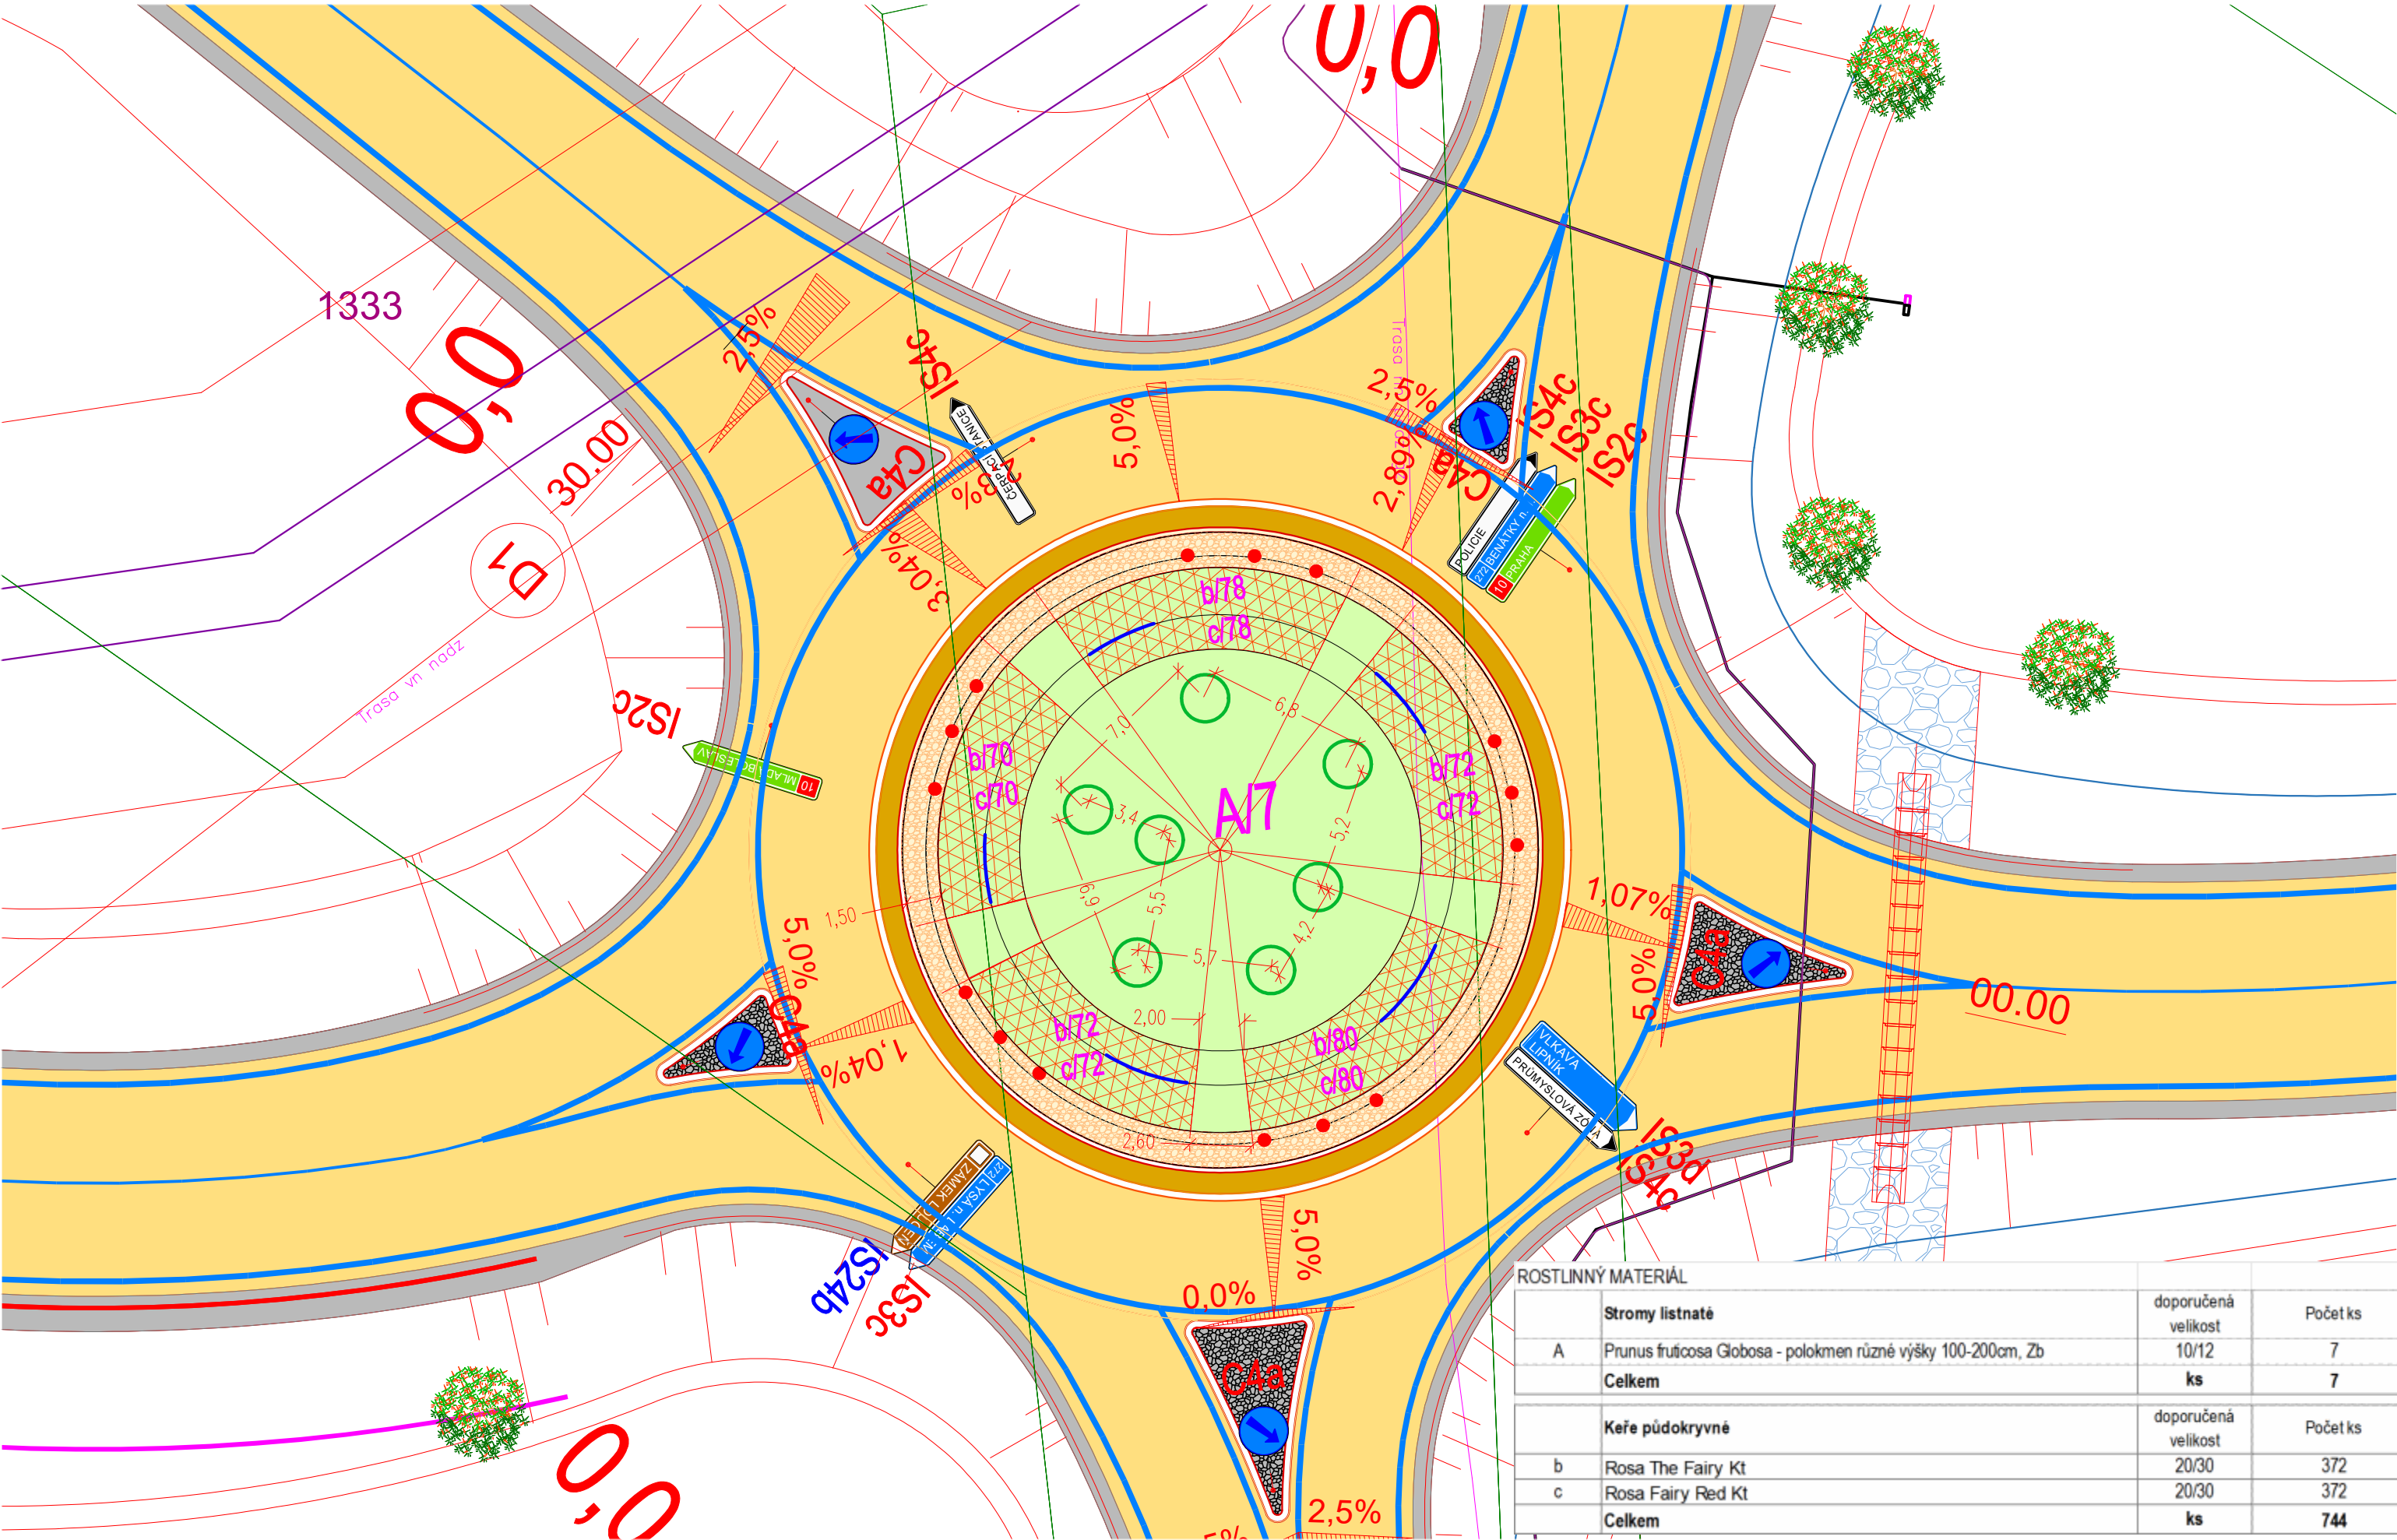

LEGENDA NAVRHOVANÝCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ

- Stromy listnaté alejové a solitérní navazující aleje 107ks
- Stromy solitérní v OK 7ks
- Trávník do sucha bylinotravní 452m2
- Záhony půdokryvných růží OK 184m2
- Valounové pole OK 290m2
- Doplnkové artefakty OK 5ks

a	Změna vegetačních úprav OK	6/2024	
č		datum	podpis

Investor stavby:

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
STŘEDOČESKÉHO KRAJE, PŘÍSP. ORG.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Razítko, datum, podpis:

Projektant stavby :	ATELIER PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB, s.r.o. Ohradní 24b 140 00 Praha 4	vedoucí projektu :	Ing. Karel Nejedlý
		HIP :	Ing. Jindřich Jirák
		zakázkové číslo	3175/08

Zpracovatel dokumentace objektu:	Odpovědný projektant	Výpracoval	Kontroloval
Ing. Ivan Marek Martinov 279 277 13 Kostelec nad Labem tel.fax. +420 326 905120 e-mail: zahrarch@zahrarch.cz www.zahrarch.cz	Ing. Barbora Nosková	Bc. Nina Jakušová, DiS.	Ing. Ivan Marek
	Zakázkové číslo zpracovatele objektu: 3175/08		

stavba

II/272 BENÁTKY NAD JIZEROU,
PŘIPOJENÍ NA SILNICI III/27212

obsah:

SITUACE VEGETAČNÍCH ÚPRAV
ÚPRAVA OK

stupeň rozpracovanosti přílohy:

ČISTOPIS

počet formátů	měřítko		
14 x A4	1:500		
datum vydání verze 00 :	číslo paré :		
12.2020			
datum vydání nové verze:			
06.2024			
název souboru :			
stupeň PD:	SO číslo:	číslo přílohy:	verze:
DSP	801	02	01

VAŠE ZNAČKA: Viz. níže
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA: 25-155-20250312-O

VYŘIZUJE: Ing. Pavel Šindelář
TEL.: +420 601 380 714
E-MAIL: sindelar@komovia.cz
IDDS: zhx8ezy

MÍSTO / DATUM: Praha 13. 3. 2025

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Pan Martin Voříšek, Projektový manažer
Pověřená osoba Objednavatele
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Stavba: "II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212"
Číslo smluv: Objednatele: S-3236/00066001/2022 Zhotovitele: 841/TC/FA/2022/030/FAFY
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel: STRABAG a.s.

Věc: Vyjádření TDI ke zhotovitelem zasláným Oznámením:

- A) Provádění zemních prací, zn. Zhot.: FA/146/JD ze dne 25.5.2024
- B) Vegetační úpravy v OK, zn. Zhot.: FA/147/JD ze dne 13.6.2024
- C) Provádění zemních prací, zn. Zhot.: FA/148/JD ze dne 9.9.2024
- D) Realizace vodovodu závlahy dle požadavků provozovatele, zn. Zhot.: FA/149/JD ze dne 19.9.2024
- E) Výměna uložení žulové dlažby v ostrůvcích u OK, zn. Zhot.: FA/150/JD ze dne 18.10.2024

A) Provádění zemních prací

Postup realizace stavby musel Zhotovitel upravit v souvislosti s realizovanou přeložkou dvou nadzemních vedení VN a jednoho podzemního kabelu NN. Přeložky nadzemních vedení VN byly dokončeny až v 04/2024. Přes tuto překážku v realizaci OK zhotovitel na začátku stavební sezóny staveniště s překážkami převzal a v roce 2023 realizoval „Větev „B“. V roce 2024 pak Zhotovitel realizoval OK a její napojení na okolní komunikace a dále T křižovatku komunikací III/27212 s ulicí „Mladská“. Výše uvedený postup prací, který si vynutily při zahájení stavby neprovedené přeložky vedení ČEZ Distribuce, vyvolaly v průběhu realizace stavby nedostatek násypového materiálu, který byl Zhotovitelem za souhlasu TDI a Zástupce Objednatele vyřešen otevřením dvou zemníků v prostoru stavby.

B) Vegetační úpravy v OK

Zástupce města Benátky n/J v průběhu realizace stavby vznesli požadavek na změnu osázení vnitřní části OK. TDI a Zástupce Objednatele předběžně neměli námitek za podmínky, že nedojde k navýšení ceny a vlivu na dobu výstavby. Oceněný rozdílový výkaz osázení bude součástí návrhu ZBV Zhotovitele.

C) Provádění zemních prací

Při provádění III. etapy stavby byly zastiženy v projektové dokumentaci (PDPS/RDS) nepředvídatelné geotechnické podmínky, viz provedené nevyhovující SZZ. Dále v trase původní komunikace III/27212 byl zastižen starý kabel, zasypaný nevhodným materiálem, na kterém byla položena betonová vrstva v původním bouraném souvrství komunikace. Dále lokálně musely být sanace podloží dále upravovány dle zastižených GT podmínek při realizaci větví G a B v rámci III. etapy stavby, viz nevyhovující statické zátěžové zkoušky (SZZ). V dotčených místech byly sanace prohloubeny. Provedena fotodokumentace. Řešení zastižených podmínek a návrhy řešení Zhotovitele byly projednávány na místě Z, GT-Z, GT-O a TDI a odpovídají tomu, co Zhotovitel uvádí v Oznámení zn. Zhot.: FA/148/JD ze dne 9.9.2024 .

D) Realizace vodovodu závlahy dle požadavků provozovatele

Při provádění dvou přeložek a úprav závlahového vodovodu společnosti Předměřická a.s. Zástupci majitele a provozovatele závlahového vodovodu Předměřická a.s. upřesnili své požadavky na provedení dvou přeložek a úprav na závlahovém vodovodu. Zástupce Objednatele a TDI na jednáních předběžně souhlasili s požadavky Zástupců společnosti

Předměřická a.s., za podmíněk, že nebude překročena nabídková cena úprav závlahového vodovodu z nabídky Zhotovitele, a že změny nebudou mít vliv na dobu výstavby.


E) Výměna uložení žulové dlažby v ostrůvcích u OK

Po provedení žulové dlažby do lože z DK a vyplněním spár DK v rozdělovacích ostrůvcích u OK, a po uvedení OK do předčasného užívání, bylo zjištěno, že nákladní vozidla projíždějící OK zadními nápravami přejíždí ostrůvky a vlivem pevného spojení zadních náprav tyto zvlňují žulovou dlažbu uloženou a vyspárovanou DK. Po zvlnění následovalo rozjíždění a vytrhávání žulové dlažby provedené do DK a vyspárované DK. Na příslušném KD bylo všemi odsouhlaseno řešení provést žulovou dlažbu rozdělovacích ostrůvků u OK do betonu min XF3 a vyspárovat žulovou dlažbu betonovou cementovou maltou XF4.

Závěr: Vyjádření TDI ke skutečnostem uvedeným výše A) až E):

TDI potvrzuje, že výše uváděné skutečnosti při realizaci stavby technicky nastaly. TDI doporučuje Zástupci Objednatele vydat Zhotoviteli ve věci Oznamovaných skutečností A) až E) Pokyn ke zpracování a předložení návrhů ZBV. TDI si vyhrazuje k těmto návrhům a s tím souvisejícím skutečností se i v dalších krocích administrace dále vyjadřovat.

S pozdravem


KOMOVIA s.r.o. ③
Olšanská 2643/1a
PSČ 130 00 Praha 3
IČ 04363795
Ing. Pavel Šindelář
TDI



**ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.**
Ohradní 24b
140 00 Praha 4 - Michle

Firma je registrována v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 31260

Váš dopis/email zn.: KSÚS Stř.kr.

Ze dne: 13.03.2025

Naše zn.: APIS-1

Vyřizuje: Ing. Jan Adamů

Tel: +420 724 372 965

Gsm:

E-mail: j.adamu@crproject.cz

Datová schránka: 279neic

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Pan Martin Voříšek, Projektový manažer
Pověřená osoba Objednavatele
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Datum: 2025-03-21

Věc: Vyjádření AD k zaslaným oznámením od zhotovitele stavby

Akce: „II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212 - PD“

FA/146/JD: Provádění zemních prací

Zhotovitel musel upravit postup realizace stavby kvůli probíhající přeložce dvou nadzemních vedení VN a jednoho podzemního kabelu NN. Přeložky nadzemních vedení VN byly dokončeny až v dubnu 2024. Přesto zhotovitel na začátku stavební sezóny převzal staveniště a v roce 2023 zrealizoval „Větev B“. V roce 2024 pak pokračoval výstavbou OK, jejím napojením na okolní komunikace a vybudováním stykové křižovatky komunikace III/27212 s ulicí „Mladská“. Tento postup prací, ovlivněný nezrealizovanými přeložkami vedení ČEZ Distribuce při zahájení stavby, způsobil v průběhu prací nedostatek násypového materiálu, který zhotovitel vyřešil po dohodě s TDI a zástupcem objednatele otevřením dvou zemníků v prostoru stavby.

FA/147/JD: Vegetační úpravy v OK

Během realizace stavby vznesli zástupci města Benátky n. J. požadavek na změnu osázení vnitřní části OK. TDI a zástupce objednatele s touto úpravou předběžně souhlasili, za předpokladu, že neovlivní cenu ani dobu výstavby. Oceněný rozdílový výkaz osázení bude zahrnut do návrhu ZBV zhotovitele.

FA/148/JD: Provádění zemních prací

Během realizace III. etapy stavby byly identifikovány nepředvídatelné geotechnické podmínky, což potvrdily nevyhovující statické zátěžové zkoušky (SZZ). V trase původní komunikace III/27212 (v bouraném souvrství komunikace) byl navíc objeven starý kabel zasypaný nevhodným materiálem, na kterém spočívala betonová vrstva.

V rámci realizace větví G a B bylo nutné provést lokální sanace podloží podle aktuálně zastižených geotechnických podmínek. V dotčených úsecích byly sanace prohloubeny, aby vyhověly požadavkům na stabilitu. Řešení těchto podmínek a návrhy opatření zhotovitele byly projednávány přímo na místě za účasti Z, GT-Z, GT-O, TDI a odpovídají informacím uvedeným v Oznámení zn. zhot.: FA/148/JD ze dne 9. 9. 2024.



**ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.**
Ohradní 24b
140 00 Praha 4 - Michle

Firma je registrována v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 31260

FA/149/JD: Realizace vodovodu závlahy dle požadavků provozovatele

Během realizace dvou přeložek a úpravy závlahového vodovodu společnosti Předměřická a.s. zástupci majitele a provozovatele upřesnili své požadavky na provedení těchto prací. Zástupce objednatele a TDI na jednáních předběžně souhlasili s těmito požadavky, pod podmínkou, že úpravy nepřekročí nabídkovou cenu stanovenou zhotovitelem a neovlivní dobu výstavby.

FA/150/JD: Výměna uložení žulové dlažby v ostrůvcích u OK

Po realizaci dělicích ostrůvků u OK ze žulové dlažby, která byla uložena do lože z DDK a vyspávaná pomocí DDK, docházelo po nevhodném pojezdu nákladními vozidly ostrůvků ke zvlnění této dlažby, což následně vedlo k jejímu rozvolnění a vytrhávání.

Na příslušném KD bylo všemi zúčastněnými odsouhlaseno řešení, při kterém budou dělicí ostrůvky u OK provedeny s žulovou dlažbou uloženou do betonu minimálně třídy XF3 a spáry vyplněny betonovou cementovou maltou třídy XF4.

Autorský dozor souhlasí, že uvedené skutečnosti popsané výše během výstavby nastaly a souhlasí se způsobem jejich řešení.

S pozdravem

Ing. Jan
Adamů

Podepsal Ing. Jan Adamů
DN: cn=Ing. Jan Adamů, c=CZ
, email=j.adamu@crproject.cz
Datum: 2025.03.21 15:41:55 +
01'00'

.....
Ing. Jan Adamů
AD

KOMOVIA s.r.o.
Olšanská 2643/1a
Praha 3, Žižkov
PSČ 130 80

Projekt: II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212

Věc: Změna člena realizačního týmu – Žádost o souhlas objednavatele se změnou člena TDS

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212“, na základě oznámení společnosti KOMOVIA s.r.o., souhlasí se změnou člena realizačního týmu na pozici „Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)“.

Změna je vyvolána z důvodu ukončení pracovního poměru člena realizačního týmu, Ing. Pavla Šindeláře, u společnosti KOMOVIA s.r.o. Novým členem týmu se na této pozici stává Ing. Václav Marvan.

Martin Voříšek
Projektový manažer



Tel.: 702 266 228
E-mail: martin.vorisek@ksus.cz
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
Kancelář: Praha
www.ksus.cz

**Martin
Voříšek**

Digitálně podepsal
Martin Voříšek
Datum: 2025.11.17
16:58:42 +01'00'

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 19.09.2023

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

STRABAG a.s.

1.2. Sídlo

Kačírkova 982/4

15800 Praha

Česká republika

1.3. IČO

60838744

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Dipl. Ing. Moritz Freyborn	předseda představenstva
Ing. Pavel Brychcín	člen představenstva
Ing. Tomáš Hoza	člen představenstva

Způsob jednání

Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své funkce.

1.5. Ostatní osoby oprávněné jednat jménem dodavatele

Jméno a příjmení osoby	Právní titul jednání jménem dodavatele	Způsob jednání	Datum platnosti do
Ing. Radim Aulický	prokurista	Viz poznámka 1 za tabulkou	
Ing. Martin Bašár	prokurista	Viz poznámka 2 za tabulkou	
Mgr. Karin Bílková	člen dozorčí rady		
Ing. Richard Fischer	prokurista	Viz poznámka 3 za tabulkou	
Ing.arch. Jan Havelka	prokurista	Viz poznámka 4 za tabulkou	
Mag. Heribert Herzog	člen dozorčí rady		
Ing. Jiří Horálek	prokurista	Viz poznámka 5 za tabulkou	
Ing. Radek Hradil	prokurista	Viz poznámka 6 za tabulkou	
Ing. Jan Hýzl	prokurista	Viz poznámka 7 za tabulkou	
Ing. Jan Chromý	prokurista	Viz poznámka 8 za	

		tabulkou	
Petr Kafka	prokurista	Viz poznámka 9 za tabulkou	
Ing. Pavel Klas	prokurista	Viz poznámka 10 za tabulkou	
Ing. Karel Klofáč	prokurista	Viz poznámka 11 za tabulkou	
Ing. Michal Kopper	prokurista	Viz poznámka 12 za tabulkou	
Ing. Alexej Korotkov	prokurista	Viz poznámka 13 za tabulkou	
Ing. Rostislav Krones	prokurista	Viz poznámka 14 za tabulkou	
Ing. Mag. Michal Pristaš	prokurista	Viz poznámka 15 za tabulkou	
Ing. Lukáš Příbyl	prokurista	Viz poznámka 16 za tabulkou	
Ing. Tomáš Rys	prokurista	Viz poznámka 17 za tabulkou	
Ing. Jiří Svoboda Ph.D.	prokurista	Viz poznámka 18 za tabulkou	
Michal Vaněček	prokurista	Viz poznámka 19 za tabulkou	
Dipl. Ing. (FH) Alfred Watzl	předseda dozorčí rady		

Pozn. 1

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 2

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 3

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 4

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 5

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 6

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 7

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 8

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 9

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 10

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 11

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 12

Ing. Michal Kopper je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

Pozn. 13

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 14

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 15

je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

Pozn. 16

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 17

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 18

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 19

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.5. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Oprávnění SBS 12255/2023/OBÚ-02	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	Viz poznámka 1 za tabulkou		14.03.2023	
Oprávnění SBS 43884/2019/OBÚ-02	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	Viz poznámka 2 za tabulkou		11.12.2019	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 5	Geologické práce		08.09.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení		08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Opravy silničních vozidel		08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Alena Procházková, notářka v Praze	Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci		05.04.2018	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Projektová činnost ve výstavbě		08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Alena Procházková, notářka v Praze	Provádění ohňostrojních prací		05.04.2018	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Alena Procházková, notářka v Praze	Viz poznámka 3 za tabulkou		05.04.2018	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Výkon zeměměřických činností		08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Alena Procházková, notářka v Praze	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 4 za tabulkou	05.04.2018	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Alena Procházková, notářka v Praze	Výzkum, vývoj, výroba, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací		05.04.2018	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Zámečnictví, nástrojářství		08.12.2010	
Výpis ze živnostenského rejstříku	Městská část Praha 5	Distribuce pohonných hmot		08.11.2017	

Pozn. 1

Oprávnění k hornické činnosti a k činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování a navrhování objektů a zařízení při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., § 2 písm. b), c), d), e), f), g), i) a § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i)

Pozn. 2

Oprávnění organizaci odborně způsobilé pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Pozn. 3

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní

provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Pozn. 4

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

Výroba potravinářských a škrobářských výrobků

Pěstitelské pálení

Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

Výroba hnojiv

Výroba plastových a pryžových výrobků

Výroba a zpracování skla

Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

Broušení technického a šperkového kamene

Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

Umělecko-řemeslné zpracování kovů

Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

Výroba elektronických součástí, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

Výroba strojů a zařízení

Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

Stavba a výroba plavidel

Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

Výroba a opravy čalounických výrobků

Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

Výroba zdravotnických potřeb

Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáček a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Sklenářské práce, rámování a paspartování

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

Skládování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 Ubytovací služby
 Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 Pronájem a půjčování věcí movitých
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 Projektování pozemkových úprav
 Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 Projektování elektrických zařízení
 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 Testování, měření, analýzy a kontroly
 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 Fotografické služby
 Překladatelská a tlumočnická činnost
 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 Poskytování technických služeb
 Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Osvědčení o autorizaci 16034	Ing. Jiří Horálek je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	26.05.1995	
Osvědčení o autorizaci 29154	Ing. Miloš Húsek je autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce	ČKAIT	29.06.2007	
Osvědčení o autorizaci 22251	Ing. Zdeněk Led je autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby	ČKAIT	27.06.2000	
Osvědčení o autorizaci 23852	Ing. Jiří Štolba je autorizovaným technikem v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení	ČKAIT	25.02.2003	
Osvědčení o autorizaci 23851	Ing. Jiří Štolba je autorizovaným inženýrem v oboru technologická zařízení staveb	ČKAIT	25.02.2003	
Osvědčení o autorizaci 30902	Ing. Martin Bašár je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	24.06.2008	
Osvědčení o autorizaci 30326	Ing. Radek Blaško je autorizovaným inženýrem v oboru geotechnika	ČKAIT	04.12.2007	
Osvědčení o autorizaci 44858	Ing. Ivo Gaja je autorizovaným inženýrem v oboru geotechnika	ČKAIT	01.07.2021	
Osvědčení o autorizaci 38777	Ing. Marián Chotár je autorizovaným inženýrem v oboru geotechnika	ČKAIT	02.11.2017	
Osvědčení o autorizaci 34311	Ing. Aleš Teichmann je autorizovaným inženýrem v oboru geotechnika	ČKAIT	26.06.2012	
Osvědčení o autorizaci 37488	Ing. Václav Dohnálek je autorizovaným	ČKAIT	28.04.2015	

	inženýrem v oboru geotechnika			
Osvědčení o odborné způsobilosti SBS/01168/2013/OBÚ-02	Ing. Marián Chotár je odborně způsobilý k výkonu funkce technický dozor pro vedení důlních a podzemních děl	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	15.02.2013	
Osvědčení o odborné způsobilosti 84/2015	Ing. Aleš Teichmann je odborně způsobilý k výkonu funkce báňský projektant	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	31.08.2015	
Osvědčení o odborné způsobilosti 1353/2001	Ing. Jaroslav Havelka je odborně způsobilý projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru: Inženýrská geologie	Ministerstvo životního prostředí	03.05.2001	
Osvědčení o odborné způsobilosti ZEKA/857/KOO/2020	Vladimír Wimmer je odborně způsobilý k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů	ZEKA plus, s.r.o. Slavičín	29.05.2020	29.05.2025
Osvědčení o odborné způsobilosti báňského projektanta SBS 17696/2019/OBÚ-02/2	Ing. Ivo Gaja je odborně způsobilý k výkonu funkce báňský projektant	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	14.08.2019	
Osvědčení o odborné způsobilosti závodního SBS 33875/2014/OBÚ-02	Ing. Václav Dohnálek je odborně způsobilý k výkonu funkce závodní	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	03.12.2014	
Osvědčení o odborné způsobilosti závodního 85/2015	Ing. Aleš Teichmann je odborně způsobilý k výkonu funkce závodní	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	31.08.2015	
Osvědčení o odborné způsobilosti závodního SBS 33872/2014/OBÚ-02	Ing. Jan Panuška je odborně způsobilý k výkonu funkce závodní	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	03.12.2014	
Osvědčení o odborné způsobilosti závodního SBS 21218/2015/OBÚ-02	Ing. Marián Chotár je odborně způsobilý k výkonu funkce závodní	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	15.07.2015	
Osvědčení o odborné způsobilosti závodního SBS 17696/2019/OBÚ-02/1	Ing. Ivo Gaja je odborně způsobilý k výkonu funkce závodní	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	14.08.2019	
Osvědčení TD 0095	Ing. Václav Dohnálek je způsobilý k výkonu funkce technický dozor pro činnost prováděnou hornickým způsobem	Obvodní báňský úřad v Brně	30.04.2009	
Rozhodnutí SBS 39819/2022/ČBÚ-21/4	Ing. Jaroslav Spáč je odborně způsobilý k výkonu regulované činnosti: hlavní důlní měřič	Český báňský úřad, Praha	18.10.2022	
Úřední oprávnění č.j. 4525/1995-12	Ing. Stanislav Bílek je úředně oprávněn pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro ověřování c)	Český úřad zeměměřický a katastrální	19.11.2007	
Úřední oprávnění 1098	Ing. Radim Mikula je úředně oprávněn pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro ověřování: b), c)	Český úřad zeměměřický a katastrální	20.10.1995	
Úřední oprávnění 1098	Ing. Radim Mikula je úředně oprávněn pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro ověřování: a)	Český úřad zeměměřický a katastrální	02.04.1998	

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 09.06.2004.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 14.09.2023.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 19.09.2023

Evidenční číslo: W23090003089

