

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 301 Svodný vodovod DN 900

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:
301 / 01Číslo ZBV:
05

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Zborovská 81/11, 15000 Praha 5
IČ: 00066001

Objednatel: Obec Předměřice nad Jizerou

č.p. 132, 29474 Předměřice nad Jizerou

IČ: 00238473

Zhotovitel:

Skanska a.s.

Křížkova 682/34a, Karlín, 18600 Praha 8, 18600 Praha

IČ: 26271303

Rekapitulace ZBV č. 05 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05.3	0,00	541 330,16	541 330,16

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05	0,00	541 330,16	541 330,16

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Změnový list																							
Název stavby dle SoD II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): SO 301 Svodný vodovod DN 900	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 301 / 01	Číslo ZBV / Skupina změny: 05.3																					
Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0939/00066001/2024 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.10.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 15000 Praha 5 Zhotovitel: Skanska a.s. se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 18600 Praha 8, 18600 Praha																							
<u>Přílohy změnového listu:</u> <table><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>11</td><td>počet listů</td></tr></table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	11	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize
1. Krycí list	1	počet listů																					
2. Změnový list	2	počet listů																					
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																					
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																					
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																					
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																					
Další doklady dle přehledu dokladů	11	počet listů																					
Iniciátor změny: Zhotovitel																							
Předmět Změny: Skutečná délka DN 900																							
<u>Popis a zdůvodnění Změny:</u> Dne 29. 4. 2025 bylo při realizaci výkopových prací pro přeložku DN 900 zjištěno, že z důvodu odlišné polohy hrdel původního vodovodu nelze provádět napojení přeložky v určených místech dle předpokladu PDPS. K původní trase nebyl k dispozici kladečský plán, nebylo tak možné přesně určit místa napojení. Místo napojení nového a původního potrubí tak musí být posunuto. Z důvodu odlišné polohy napojení bylo v místech napojení nutné dodat na stávající řád DN 900 trubky rozdílné délky s ohledem na skutečnou možnost umístění hrdel a spojek. Skutečně nutná délka vodovodu je o 3,6 m delší, než předpokládala PDPS (viz zápis v SD). Dne 18. 8. 2025 dal objednatel pokyn, aby byla přeložka prodloužena oproti PDPS (viz přiložený Pokyn). Pro účely zohlednění změny v ZBV byla celá původní částka za přeložku DN900 na SO301, jenž byla vykázána jako komplet, podělena původní délkou a vynásobena skutečnou délkou. Výše uvedené skutečnosti jsou pro zadavatele jednajícího s náležitou péčí nepředvídatelné, jelikož skutečnou polohu hrdel bylo možné ověřit a zjistit až v průběhu samotné realizace výkopových prací. Současně nebylo možné konkrétní místa předem s jistotou určit, a to vzhledem k neexistenci kladečského plánu. Změny byly v souladu se Směrnicí R-Sm-36, čl. 10.2. b) zařazeny mezi změny nepředvídatelné (dle § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.), jelikož se jedná o nepředvídané fyzické podmínky vzniklé na stavbě v průběhu realizace, jak již bylo uvedeno výše.																							

Změnový list											
Název stavby dle SoD II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): SO 301 Svodný vodovod DN 900		Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 301 / 01	Číslo ZBV / Skupina změny: 05.3								
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th>Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>541 330,16</td> <td>541 330,16</td> <td>541 330,16</td> </tr> </tbody> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných	0,00	541 330,16	541 330,16	541 330,16
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných								
0,00	541 330,16	541 330,16	541 330,16								
Technická pomoc Objednatele	jméno	Bc. Martin Horešovský	podpis								
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:											
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Viktor Stržínek, MBA	podpis								
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Bažil	podpis								
Stavební dozor	jméno	Ing. Dušan Minárik	podpis								
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis								
Zástupce Objednatele č. 1	jméno	Jan Boček	podpis								
Zástupce Objednatele č. 2	jméno	Martin Ježek	podpis								
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.											
Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba) KSUS	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis								
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba) Předměřice nad Jizerou	jméno	Ing. Klement Florian	podpis								
Zhotovitel	jméno	Ing. Radim Pokorný	podpis								

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 05

Název stavby:

II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jízery u Předměřic

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

301 / 01

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

SO 301 Svodný vodovod DN 900

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
10 024 632,51

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	10 024 632,51	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	541 330,16	541 330,16	5,40

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	10 565 962,67	541 330,16	5,40

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic

Číslo a název SO/PS: 301 - SO 301 Svodný vodovod DN 900

Číslo a název rozpočtu: 301 - SO 301 Svodný vodovod DN 900

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 301

Skupina Změn:

3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	01	Cena celkem	KPL	1,000	1,054	0,054	10 024 632,51	10 024 632,51	0,00	541 330,16	10 565 962,67	541 330,16	5,400%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						10 024 632,51	0,00	541 330,16	10 565 962,67	541 330,16	5,40%
		Celkem za stavební objekt						10 024 632,51	0,00	541 330,16	10 565 962,67	541 330,16	5,40%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Viktor Stržínek, MBA, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Dušan Minárik, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby:

II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic - 28342

	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	63 427 003,00 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	66 291 547,80 Kč
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	80 212 772,84 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	104,52%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 864 544,80 Kč
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	4,52%
8=1*0,3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	19 028 100,90 Kč

12=(1)*0,15	Limit	9 514 050,45 Kč
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00 Kč

5=(28/1)*100					Sledování záměny položek (Skupina 2)		0,00%																
						Skupiny Změn																	
						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -					
						Vyhrazená změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměníící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)					
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny zá								

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Změnového listu ke schválení.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	05
Název stavby:	II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 301 Svodný vodovod DN 900
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	301 / 01

Doklad	počet listů
8. Soupis prací SO	1
9. 2025-08-13_Oznámení_Zhotovitele_s_příloh.	4
10. 2025-08-18_Pokyn_Objednatele	2
11. 2025-10-06_VyjadreniAD_ZBV-01-08	2
12. 2025-10-18_VyjadreniTDS_ZBV-05	2
Počet listů celkem	11

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic

Číslo a název SO/PS: 301 - SO 301 Svodný vodovod DN 900

Číslo a název rozpočtu: 301 - SO 301 Svodný vodovod DN 900

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 01

celkem po všech změnách

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	01	Cena celkem zhotovitel zajistí přeložku SO 301 včetně proplachu vč. koordinace s ostatními SO stavby	KPL	1,000	1,054	0,054	10 024 632,51	10 024 632,51	0,00	541 330,16	10 565 962,67	541 330,16	5,40%
		Původní množství: kpl 1 = 1,000 => A Celkové množství 1,000000 = 1,000 => B ZBV č.05: navýšení o 3,67 m z původní délky 66,27 m: $3,60/66,27 = 0,054 \Rightarrow A$ Jedná se preliminařovou položku, kterou provádí určený dodavatel. Veškeré náklady jsou závislé na skutečně provedené délce, proto byla položka určeným dodavatelem navýšena přímou úměrou.											
		Celkem						10 024 632,51	0,00	541 330,16	10 565 962,67	541 330,16	5,40%

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

k rukám: Jan Boček
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Skanska a.s.

Sídlo
Křížíkova 682/34a
186 00 Praha 8 – Karlín

Doručovací adresa
divize Inženýrské stavitelství
závod Technologie, oblast Mosty Čechy
Tiskařská 270/8
108 00 Praha 10 - Malešice

Datum
13.8. 2025

Vyřizuje
Richard Jambor

Kontakt

Naše značka
010/2025/Předm/RJ

Věc: II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic

Oznámení Zhotovitele o zjištění nepředvídatelných okolností a dodatečných prací nutných k provedení díla.

Žádost o pokyn objednatele

Zhotovitel v souladu se zněním smlouvy o dílo č. SMLD-0939/00066001/2024 (dále „SoD“) a směrnici R-Sm-36 oznamuje Objednateli nepředvídatelné okolnosti během provádění prací na SO 301 – řadu DN 900.

Při provádění zemních prací, po provedení výkopu a vytýčení napojení roury DN 900 dle PDPS bylo zjištěno, že toto napojení nelze provádět v určených místech dle PDPS z důvodu odlišné polohy hrdel na stávajícím řadu DN 900. Místa napojení byla konzultována a určena přímo PVS a PVK (pan Prager) a je nutné v místech napojení na stávající řadu DN 900 dodat trubky rozdílné délky s ohledem na možnost umístění hrdel a spojek. Výměna roury DN 900 tak bude provedena v rozsahu cca +3,0bm oproti PDPS.

Zhotovitel s ohledem na výše uvedené okolnosti oznamuje Objednateli, že tyto nové podmínky mají vliv na technologii výstavby, a budou mít časový dopad na dílo.

Finanční dopad:

Odhad finančního dopadu na základě cen z SoD je +540.000 Kč.

Časový dopad


Dle odhadu Zhotovitele 14-20 dnů – je nutné objednat nové kusy potrubí DN 900 upravené na míru.

Zhotovitel tímto žádá Objednatele o písemný pokyn, ke kompletnímu zpracování návrhu řešení, jeho ocenění a provedení.

Přílohy:

- SD ze dne 29.4. 2025
- Situace – znázornění nových délek

Richard Jambor
Skanska a.s.

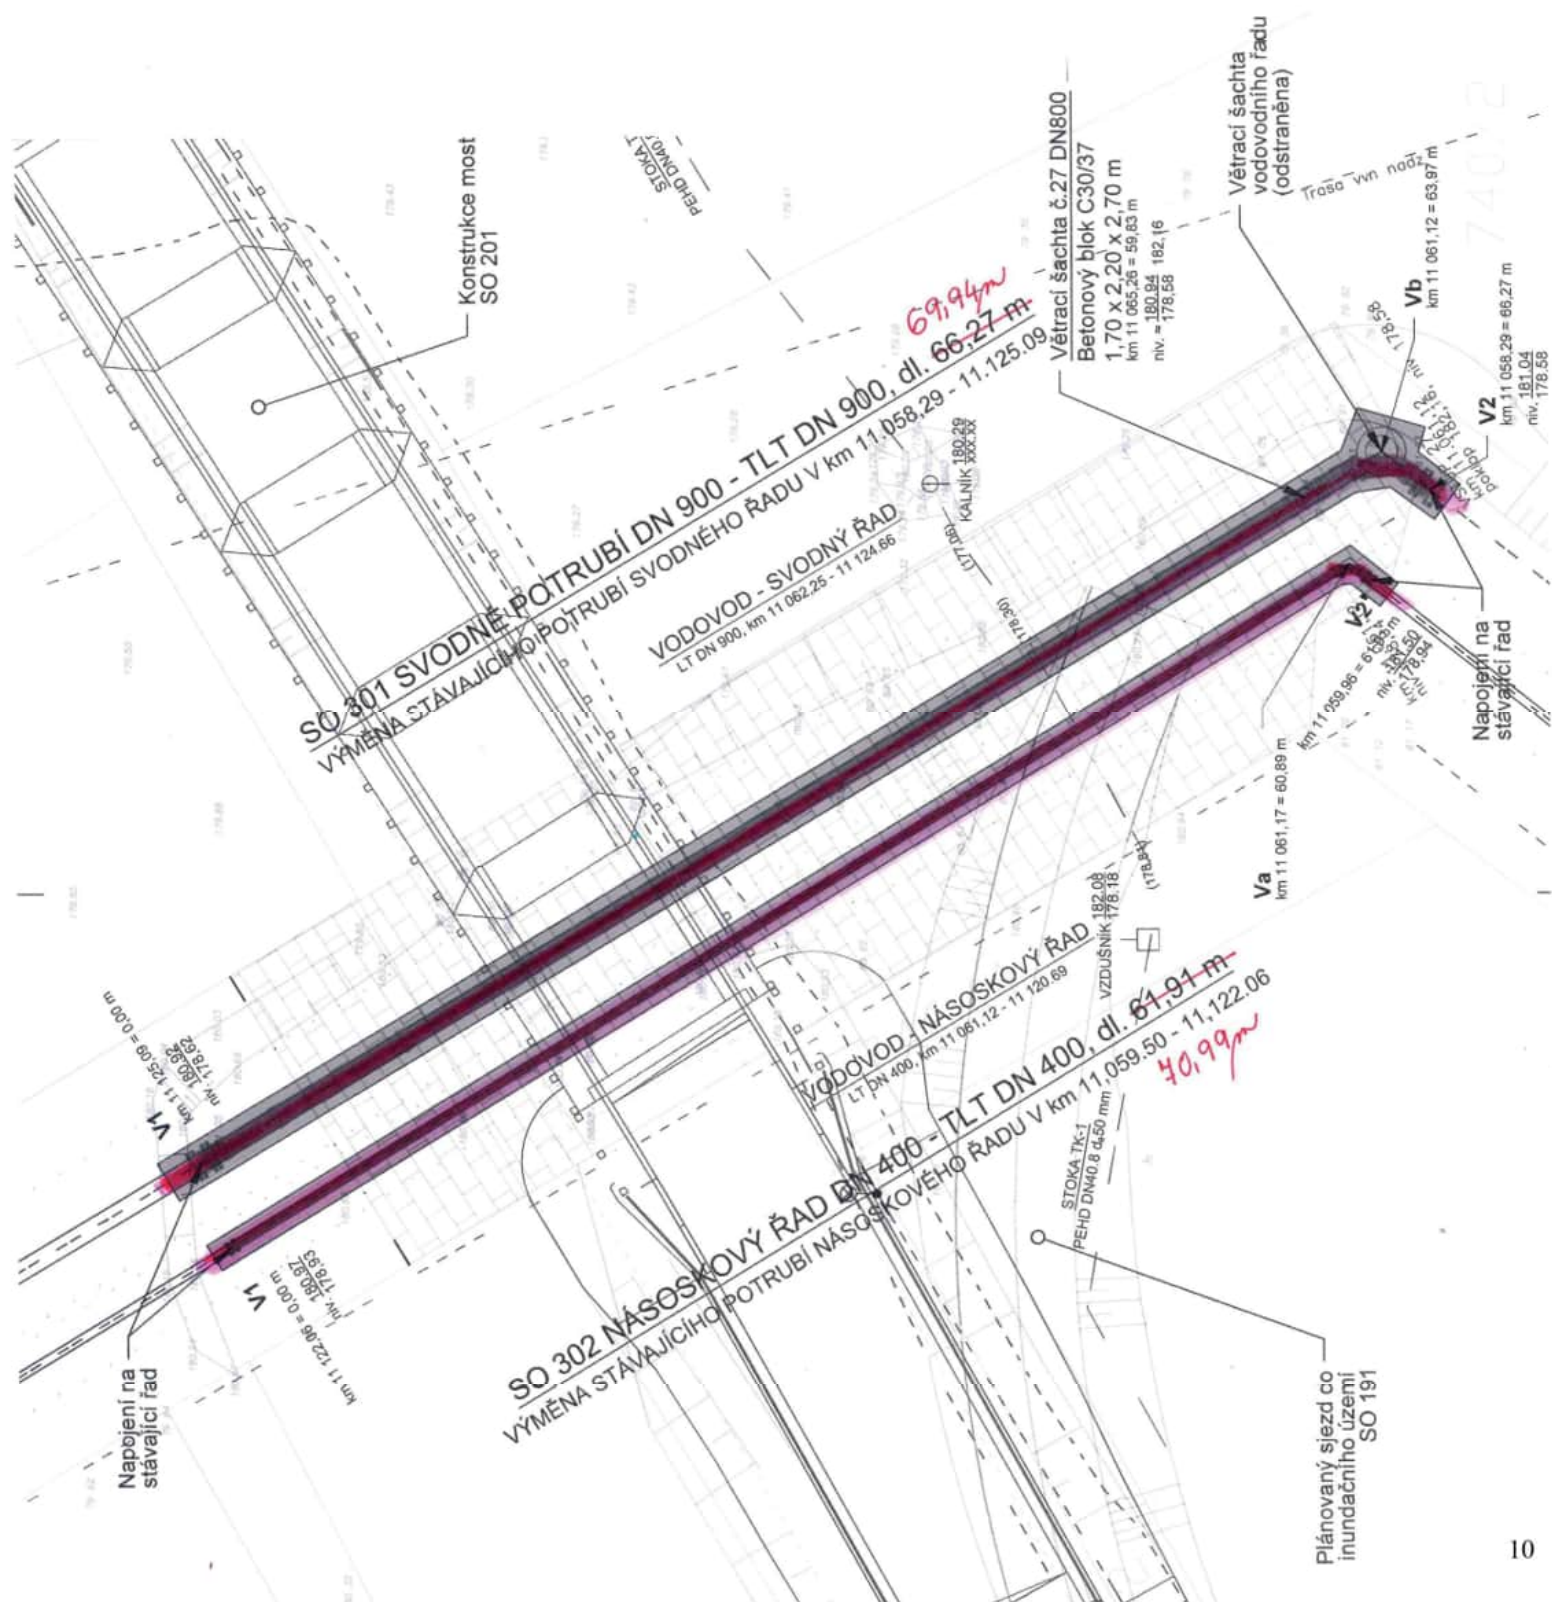

Informace:

Značka stavby: 28342

Název stavby: II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: Skanska a.s.

Počasí:

Čas	07:00	10:00	13:00	16:00	Teplota	
Počasí					Min	Max
Srážky	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	14.57 °C	21.19 °C

Pracovníci:

Jméno a Příjmení / Typ	Společnost	Počet	Počet hodin	Celkem hodin
THP Smolák, 5x dělník / Čermák a Hrachovec	-	6	10	60

Mechanizace:

Typ	Společnost	Počet
Pasový bagr 15t	-	1
Kolový bagr 10t	-	1

Materiály:

Typ	Měrná jednotka	Počet

Zápis prováděných prací:

Richard Jambor, Postup prací (29.04.2025) Rozpojení vodovodu DN 900 a provizorní zaslepení. Bourání větrací šachty. Zápis Zhotovitele: po odkrytí vodovodu DN 900 byla za souhlasu PVK (pan Prager) upravena poloha styků trubky DN 900 s ohledem na skutečnou polohu hrdel a možných míst napojení - toto nemohla dokumentace předpokládat až do skutečného obnažení trubky DN 900. Skutečná délka vodovodu DN 900 tak bude o cca 3m delší, než předpokládá PDPS.
Dušan Minárik, TDI (30.04.2025) Kontrola vypoštěného vodovodu DN 900, jeho rozpojení a provizorní zaslepení, bourání stávající šachty a související zemní práce.

Podpisy:

Richard Jambor

Dušan Minárik

Fotodokumentace:



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a, Karlín,
186 00 Praha 8

**Pokyn Objednatele č.5, k provedení změny během výstavby Díla
„II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic“.**

Dne: 18.8. 2025

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo SMLD-0939/00066001/2024 ze dne 1.10. 2024, odst 6.7 a oznámení zhotovitele č.6 –11, žádáme o změny v rozsahu díla:

1) Nález původních kamenných křídel

Při bourání přibetonávek opěr bylo zjištěno, že přibetonávky kryjí kamenná křídla původního mostu. Křídla jsou tvořena pískovcovými bloky. Dle vyjádření NPÚ jsou křídla součástí původní mostní konstrukce a není možné je tím pádem zdemolovat. Původní křídla byla skryta za dobetonávkami a nosníky, které ve 40. letech 20. století zajistily rozšíření původního kamenného mostu. Jejich existenci nešlo předvídat a bylo možné je nalézt až při realizaci stavby. Nalezení kamenných křídel je tedy nepředvídatelnou okolností. Požadavek na zachování křídel ze strany NPÚ a následně Magistrátu města Mladá Boleslav vede k vynucené úpravě založení, spodní stavby a nosné konstrukce na obou opěrách. Tuto skutečnost nemohl zhotovitel při podávání nabídky předpokládat a její provedení je pro zdárné dokončení akce nezbytné. Návrh technického řešení zpracuje AD, zhotovitel poté zpracuje změnu RDS.

2) Nalezení neúnosného podloží pod O6

Během vrtání mikropilot na O6 bylo zjištěno, že pod opěrou se nachází neúnosná vrstva nakypřených štěrkopísků o mocnosti ~3m. V této vrstvě není možno dosáhnout žádné únosnosti mikropilot a je tedy nutné mikropiloty prodloužit. U ostatních podpěr bude v případě nalezení neúnosné vrstvy postup po vyhodnocení geotechnikem obdobný, s nezbytnou délkou prodloužení, schválenou AD. Přítomnost nakypřených štěrkopísků lokálně pod jednou podpěrou nebylo možno předpokládat a jedná se o nepředvídatelnou okolnost.

3) Bourání nadbetonávek nad ledolamy pilířů

Při rozšíření mostu ve 40. letech 20. století byly původní kamenné pilíře rozšířeny způsobem, kdy na ledolamy byly vybetonovány žb. bloky pro uložení nových nosníků. Tyto žb. bloky mají být dle PDPS odstraněny. Zhotovitel zahájil bourací práce v souladu s projektovou dokumentací a použil malé bourací kladivo na 3t minirypadle. Postupně se ukázalo, že i při použití této malé techniky akutně hrozí poškození původního kamenného zdiva. Byla diskutována i možnost ručního bourání žb. bloků. S ohledem na objem a kvalitu bouraného betonu je toto řešení technicky málo smysluplné. Jako nejvhodnější řešení se jeví rozřezání žb. bloků na menší díly a následné snášení jeřábovou technikou. Snesené bloky budou zdemolovány mimo vlastní konstrukci a zbytky betonu na mostní konstrukci budou opatrně odstraněny ruční technikou. S ohledem na historickou konstrukci se jedná o nejšetrnější řešení.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

4) SO 301 potrubí DN 400

Při realizaci výkopových prací pro přeložku potrubí DN400 bylo zjištěno, že trasa DN400 je odchylná od předpokladu PDPS. Původní trasa procházela přímo pod stožárem vedení vysokého napětí (VN). Na základě pokynu PVS a PVK byla trasa přeložky upravena, aby do budoucna nebyla v kolizi se stožárem VN. Odchylná poloha trasy potrubí DN400 je nepředvídatelná okolnost.

5) SO 301 potrubí DN 900

Při realizaci výkopových prací pro přeložku potrubí DN900 bylo zjištěno, že napojení nového a původního potrubí musí být posunuto tak, aby respektovalo polohu hrdel původního potrubí. Místa napojení byla konzultována a určena přímo PVS a PVK. Z tohoto důvodu došlo k prodloužení trasy přeložky o ~3m oproti PDPS. K původní trase potrubí nebyl k dispozici kladečský plán a zaměření, nebylo tedy možno přesně určit místa hrdel a napojení. Vynucená úprava délky přeložky je tedy nepředvídatelnou okolností.

6) Zastižení kabelu NN ČEZ Distribuce

Zhotovitel v rámci vytyčení stávajících sítí zjistil, že mezi původní opěrnou zdí za O6 a rodinným domem bylo položeno nové vedení NN v majetku ČEZ Distribuce. V rámci přípravy stavby byl proveden průzkum existence inženýrských sítí, v rámci kterého byla oslovena i společnost ČEZ Distribuce. Předmětný kabel NN se v době přípravy stavby v lokalitě nenacházel. Zastižení kabelu NN je tedy nepředvídatelnou okolností.

Kabel NN probíhá v souběhu s opěrou č. 06 v dostatečné vzdálenosti pro provedení nové opěry č. 06, ale zasahuje do výkopů pro opěru č. 6 a navazující opěrnou zeď. Kabel není nutné přeložit, ale je třeba ho vyvěsit a provést ochranu, následně provést zpětný zásyp, zároveň se zásypy opěr a opěrné zdi.

Žádáme tedy zhotovitele o předložení návrhu řešení výše uvedených změn.

Uvedené změny musí být podloženy souhlasným písemným vyjádřením autorského dozoru a IDS.

Výše uvedené okolnosti budou mít dopad do ceny Díla a budou mít dopad na HMG postupu výstavby, resp. na smluvní termín dokončení Díla.

Žádáme zhotovitele o předložení aktualizovaného harmonogramu postupu výstavby ve vazbě na uvedené změny. Na základě schválení aktualizovaného HMG požádá zhotovitel o uzavření termínového dodatku k SoD.

Zhotovitel zpracuje Změnové listy dle SOD – odstavce 6.7. a v souladu se Směrnicí R-SM-36, v jejím aktuálním znění. Obsah a vyčíslení změn bude ještě předmětem kontroly a supervize ze strany technického dozoru Objednatele a externí organizace, která provádí kontrolu změn v průběhu zpracování změnových listů stavby.

Na základě výše uvedených skutečností požadujeme zpracovat tyto nezbytné a nepředvídané změny v rámci RDS potažmo dokumentace skutečného provedení stavby, a souhlasíme se zpracováním ZBV dle smlouvy o dílo. Financování změnových položek (fakturace) bude probíhat na základě rozdílového soupisu prací odsouhlaseného technickým dozorem a Objednatelem, nejdříve však po uveřejnění ZBV v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Jan Boček

Provozní manažer úseku mosty
oblast Mnichovo Hradiště

KSÚS Středočeského kraje

Zborovská 11
150 00 Praha 5Čj : PX5205/2025
V Praze : 13. října 2025
Vyřizuje: Ing. Jan BažilStavba: **II/610 Předměřice, most ev. č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic**Věc: **Vyjádření AD k ZBV č. 1 – 8**

Toto vyjádření vydávám jako stanovisko k zaslaným návrhům ZBV č. 1-8.

ZBV 1

V rámci přípravy stavby bylo získáno souhlasné stanovisko OÚ Předměřice nad Jizerou. Obec Tuřice nebyla účastníkem Stavebního řízení ani Územního řízení, protože stavba nezasahuje do katastru obce Tuřice. Když se projednávala uzavírka silnice II/610, vznesla obec Tuřice požadavek na vybudování pěšího koridoru v místě stavby pro zajištění bezpečného pohybu pěších v blízkosti stavby. K požadavku na vybudování pěšího koridoru se přidala i Obec Předměřice nad Jizerou.

Nový požadavek obcí Tuřice a Předměřice nebylo možno předvídat, jedná se o novou nepředvídatelnou okolnost. S návrhem ZBV č. 1 souhlasím.

ZBV 2

V rámci zajištění IČ pro stavební povolení bylo získáno souhlasné stanovisko ČEZ Distribuce a.s. (č.j. 001126439360 z 23.6.2022). V tomto stanovisku ČEZ Distribuce stanovuje podmínku, že při nemožnosti dodržení ochranného pásma je nutno požádat o vypnutí.

Ve vyjádření ČEZ Distribuce získaném Zhotovitelem (č.j. 001151624502, 27.8.2024) je uvedeno, že vypnutí je možné pouze po potahu. Vypínání po potahu v našem případě není řešením, protože díky výrazně šikmému křížení je i při vypnutí po potahu část založení mostu nedosažitelná. Požadavek ČEZ Distribuce a.s. na vypínání po potahu je novým nepředvídatelným požadavkem a bylo nutno upravit provádění mikropilotového založení mostu. Souhlasím s návrhem ZBV č. 2.

ZBV 3 + 4

Při zahájení prací bylo zjištěno, že rozsah dřevin k odstranění (keře, náletové dřeviny, stromy) je větší, než předpokládala zadávací dokumentace. Odstranění dřevin (vč. nutného projednání a povolení) je nutné pro realizaci stavby.

Zhotovitel při realizaci stavby zjistil, že v rozsahu dočasného záboru mezi pozemky p.č. 740/1 a 739/6 bylo provedeno odstranění dřevin. Na místě byly ponechány pařezy a odpad, který má charakter komunálního / stavebního odpadu. Odstranění tohoto odpadu je nutné pro přístup k O6 SO 201 a tím pádem je nutné pro realizaci díla.

Jedná se o nepředvídatelné skutečnosti a provedení prací je nutné pro realizaci díla. Souhlasím s návrhem ZBV č. 3 a č. 4.



ZBV 5

Dne 29. 4. 2025 bylo při realizaci výkopových prací pro přeložku DN 900 zjištěno, že z důvodu odlišné polohy hrdel původního vodovodu nelze provádět napojení přeložky v určených místech dle předpokladu PDPS. K původní trase nebyl k dispozici kladečský plán (ani jiná dokumentace), nebylo tak možné přesně určit místa napojení. Místo napojení nového a původního potrubí tak muselo být posunuto. Z důvodu odlišné polohy napojení bylo v místech napojení nutné dodat na stávající řád DN 900 trubky rozdílné délky s ohledem na skutečnou možnost umístění hrdel a spojek. Skutečně nutná délka vodovodu je o 3,6 m delší, než předpokládala PDPS.

Jedná se o nepředvídatelnou skutečnost, poloha možných místo pro napojení byla zjistitelná až při realizaci stavby po odkrytí potrubí. Souhlasím s návrhem ZBV č. 5.

ZBV 6

Dne 24. 3. 2025 bylo při provádění zemních prací pro přeložku vodovodu DN 400 zjištěno, že stávající trasa vodovodu DN 400 není v souladu s předpoklady PDPS. Stávající trasa procházela přímo pod stožárem VN. Nová trasa by tak byla v přímé kolizi se základovou konstrukcí stožáru VN. Aby trasa nebyla do budoucna v kolizi se stožárem VN bylo nutné po diskuzi se správcem vodovodu provést výřez před a za sloupem VN a prodloužit trubicí vedení o 9,08 m.

Jedná se o nepředvídatelnou skutečnost. Poloha potrubí předaná v orientačních podkladech od PVK byla odchýlná od polohy skutečně zastížené. Souhlasím s návrhem ZBV č. 6.

ZBV 7

Při rozšíření mostu ve 40. letech 20. století byly nad ledolamy dobetonovány betonové bloky, které pak nesly betonové nosníky pro rozšíření původní kamenné klenby. Tyto bloky měly být podle PDPS odstraněny. Dne 17.7.2025 bylo během bouracích prací zjištěno, že není možné bourat nadbetonávky ledolamů kladivem na 3t minirypadle (odsouhlasené na KD 15.7. 2025 za účasti NPÚ). Ukázalo se, že i při použití takto malé techniky hrozí akutní poškození zdiva - kvůli vibracím vypadávala spárovací malta a uvolňovaly se pískovcové kvádry z kamenných ledolamů. Reálně hrozilo poškození nosných částí původních kamenných pilířů a potažmo i kleneb. Bylo tedy nutno navrhnout jinou, šetrnější metodu odstranění nadbetonávek. Jako technicky a ekonomicky nejvhodnější byla vybrána metoda rozřezání nadbetonávek, jejich snesení a rozrušení mimo kamenné pilíře. Zbytky po rozřezání byly odstraněny malou ruční technikou.

Skutečná odezva konstrukce na vibrace způsobené při demolici byla zjistitelná až při realizaci. Jedná se o nepředvídatelnou skutečnost, která nemohla být před zahájením realizace známá. S návrhem ZBV č. 7 souhlasím.

ZBV 8

Při vrtání mikropilot byly zastíženy polohy kyprých štěrků a písků přímo pod základy. Pro zajištění dostatečné únosnosti mikropilot a pro omezení sedání podpěr bylo nutné mikropiloty prodloužit. IGP provedený v rámci přípravy stavby tyto neúnosné vrstvy neodhalil – v rámci provedených ani archivních vrtných děl. Zastížení kyprých vrstev přímo pod základy tedy představuje nepředvídatelnou okolnost, na kterou bylo nutno v rámci realizace reagovat. Souhlasím s návrhem ZBV č. 8.

Ing. Jan Bažil
Autorský dozor

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o

Zborovská 11

Č.j.:ZBV č .5

Vyřizuje/kontakt
Ing. Michal Pietsch

Praha
18.10.2025

Stavba: II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic

Věc: Stanovisko TDS k ZBV č.05 , SO 301

Popis a zdůvodnění změny :

Dne 29.4. 2025 byl odkryt vodovod DN 900. Zjistilo se, že z důvodu odlišné polohy hrdel nelze provádět napojení přeložky v určených místech dle PDPS. V místech napojení bylo nutné dodat na stávající řád DN 900 trubky rozdílné délky s ohledem na možnost umístění hrdel a spojek. Skutečná délka vodovodu je o cca 3 m delší, než předpokládala PDPS (viz zápis v SD).

Dne 18.8. dal objednatel pokyn, aby byla přeložka prodloužena oproti PDPS. K původní trase nebyl k dispozici kladečský plán, nebylo tak možné přesně určit místa napojení (viz Pokyn).

Zvýšené položky

1 01 Cena celkem

Cena navrhovaných změn záporných 0,00 Kč bez DPH.

Cena navrhovaných změn kladných 541 330,16Kč bez DPH.

Celková hodnota ZBV č. 05 je 541 330,16 Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle §5, odst. 1, písm. c), resp. podle §10 Směrnice R-SM_36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského, upřesňující provádění změn zakázek dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle §222 se jedná o změnu nezbytnou.

TDS provedl kontrolu zhotovitelem předloženého znění ZBV č. 05 včetně všech jeho příloh a konstatuje :

1) Doklady ZBV č.05 jsou zpracovány dle Směrnice upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

2) Soupis změny předložený zhotovitelem je Úplný a je zpracován správně.


3) Deklarované množství a výměra v soupisu změny odpovídá skutečnosti.

4) Způsob ocenění položky je zpracováno v souladu s platným zněním Smlouvy o dílo.

5) Výpočet zvýšení celkové ceny ZBV č.05 je proveden procentuelně správně.

SHP TS s. r. o.

Šumavská 33, 602 00 Brno, tel.: +420 549 133 405, fax: +420 549 133 406, e-mail: ts@shp.eu, www.shpts.eu
IČ: 28342771, DIČ: CZ 28342771, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 2102228101/2700
Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512



6) Výše uvedené skutečnosti uvedené ve Zdůvodnění změny nebylo možno předvídat, jedná se o novou nepředvídatelnou okolnost.

Za TDS s navrženým ZBV č.05 **souhlasím.**

S pozdravem

Ing. Michal Pietsch

SHP TS s. r. o.

Šumavská 33, 602 00 Brno, tel.: +420 549 133 405, fax: +420 549 133 406, e-mail: ts@shp.eu, www.shpts.eu
IČ: 28342771, DIČ: CZ 28342771, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 2102228101/2700
Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512

