

Výtisk č.:1
Počet listů: 3
Přílohy: 1/1

Dodatek č. 2

**ke smlouvě o dílo č. j.: KRPA-280355 -14/ČJ-2024 - 0000MN-S ze dne 1. 8. 2025
„ P 2.0 – Bohušovická 485/10, Praha 9 – oprava sociálního zázemí“**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Čl. I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Se sídlem: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle
IČO: 75151472
DIČ: CZ75151472
Zastoupená: plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele Krajského
ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
Adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
PO BOX 1151, 110 00 Praha 1
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 3509881/0710
Vyřizuje: Odbor veřejných zakázek
Tel.: 974 823 250-4
Fax: 974 823 257
e-mail: krpa.ovz.evidence@pcr.cz
dále jen „objednatel“

a

2. **Solution Construction s.r.o.**
Se sídlem: Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO: 17708095
DIČ: CZ17708095
Zastoupená:  **jednatel společnosti**
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 375319
bankovní spojení: Raiffeisenbank
číslo účtu: 9744476002/5500
tel.: 
e-mail: yan.bilobrovenko@solutiobuildings.co
dále jen „zhotovitel“

uzavírají,

tento dodatek č. 2, kterým se upravuje:

Čl. III.

Cena díla, termín a místo plnění

bod 1.: Cena díla : 1 696 634,59 Kč
 356 293,26 Kč DPH 21%
 2 052 927,85 Kč cena včetně DPH

nově **1 756 926,29 Kč**
 368 954,52 Kč DPH 21%
 2 125 880,81 Kč cena včetně DPH

Cenové navýšení o 72 952,96 Kč představuje realizované změny oproti původní projektové dokumentaci vyvolané aktuálním požadavkem uživatele v souvislosti s navýšením počtu žen na pracovišti místního oddělení, vysloveným požadavkem na bez problémové užívání prostor z hlediska provozní údržby a úklidu. Úpravy spočívají v komunikačním propojení rozšířené dispozice šatny ženy a sociální zázemí, navýšení výměry obkladu povrchu stěn o keramický obklad včetně lištového profilového olemování.

bod 4.: Termín dokončení prací a předání díla ke dni 10.12. 2025


Důvodem je přetrvávající prodleva dodávky specifických skleněných sanitárních příček, která je závislá na kapacitních možnostech jejich výrobce.

Čl. VIII.

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku, a s obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z tohoto dodatku na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených v člancích smlouvy včetně jejích dodatků.
4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
5. Případné spory vzniklé z této smlouvy, dodatků smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
6. Smluvní strany této smlouvy, dodatků smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.

7. V souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejní objednatel smlouvu v Registru smluv.
8. Text smlouvy, dodatek smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením této smlouvy a dodatků.
9. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
10. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo v dodatku neuvedená, zůstávají beze změn.



police hl. m. Prahy pro ekonomiku

Stavba: KRPP_bohu_DPS_S0.01


Příloha ke Změnovému listu č.1

Objekt: KRPP_bohu_DPS_S0.01

V Praze dne 21.11.2025

Dodavatel: Solution Construction s.r.o.

Solution Construction s.r.o.

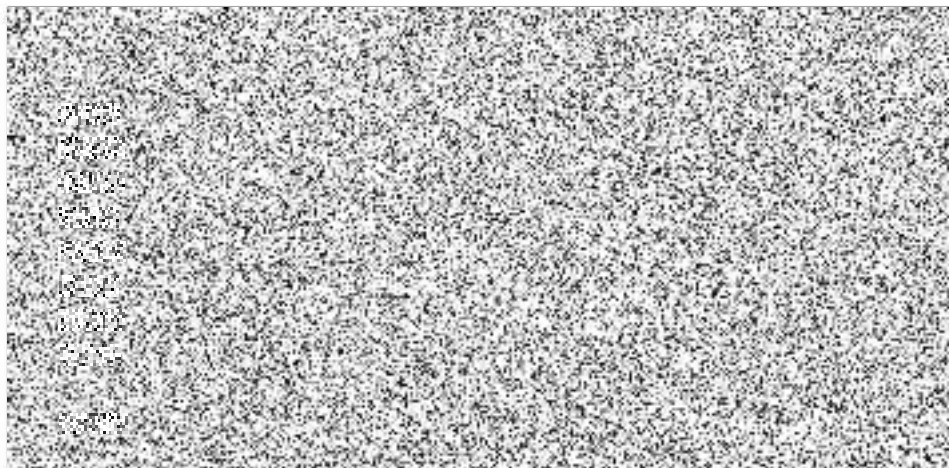

73,000

Cena celkem bez DPH

60 291,70 Kč
