



a

Společník: **PROMINECON CZ a.s., nyní: VISTORIA CZ a.s.**  
se sídlem: Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 25110977, DIČ: CZ 25110977

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 4581

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 491/2014

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 4 ke smlouvě ze dne 30.10.2014 (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

### PREAMBULE

Předmětem dodatku č. 4 je změna termínu zhotovení díla. Z důvodů ležících na straně Objednatele nebylo možné po dobu 2 kalendářních měsíců provádět stavební práce dle Harmonogramu postupu prací (neposkytnutí výluk). Smluvní strany se dohodly v souladu s § 222 odst. 6 a) zákona č. 134/2016 Sb. na prodloužení termínu zhotovení díla. Z tohoto důvodu je potřebné změnit text článku 3.6 smlouvy a přílohu č. 5 - Harmonogram postupu prací.

### I.

#### Článek 3, PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

**Ustanovení čl. 3, bod 3.6 se ruší a nahrazuje následujícím textem:**

3.6. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavázal dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen Harmonogram postupu prací), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění

Dokončení stavebních prací: 1.11.2017

Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil práce na Díle a předal Objednateli veškerá plnění připadající na Dílo, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla.

#### Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se tímto Dodatkem č. 4 mění Příloha č. 5 smlouvy – Harmonogram postupu prací. Tento aktualizovaný Harmonogram postupu prací je nedílnou součástí Dodatku č. 4 jako jeho příloha č. 1.



II.

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 4 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Aktualizovaná příloha č. 5 smlouvy Harmonogram postupu prací

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne

12 - 07 - 2017


V Praze dne

Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě pověření č. 1616 z 12. 7. 2013  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

Ing. Martin Plch, ředitel divize 3, Metrostav a.s.  
Na základě plné moci ze dne 2.4.2014

Ing. Jan Hehejčík, obchodní náměstek ředitele  
divize 3, Metrostav a.s.  
Na základě plné moci ze dne 15.10.2015



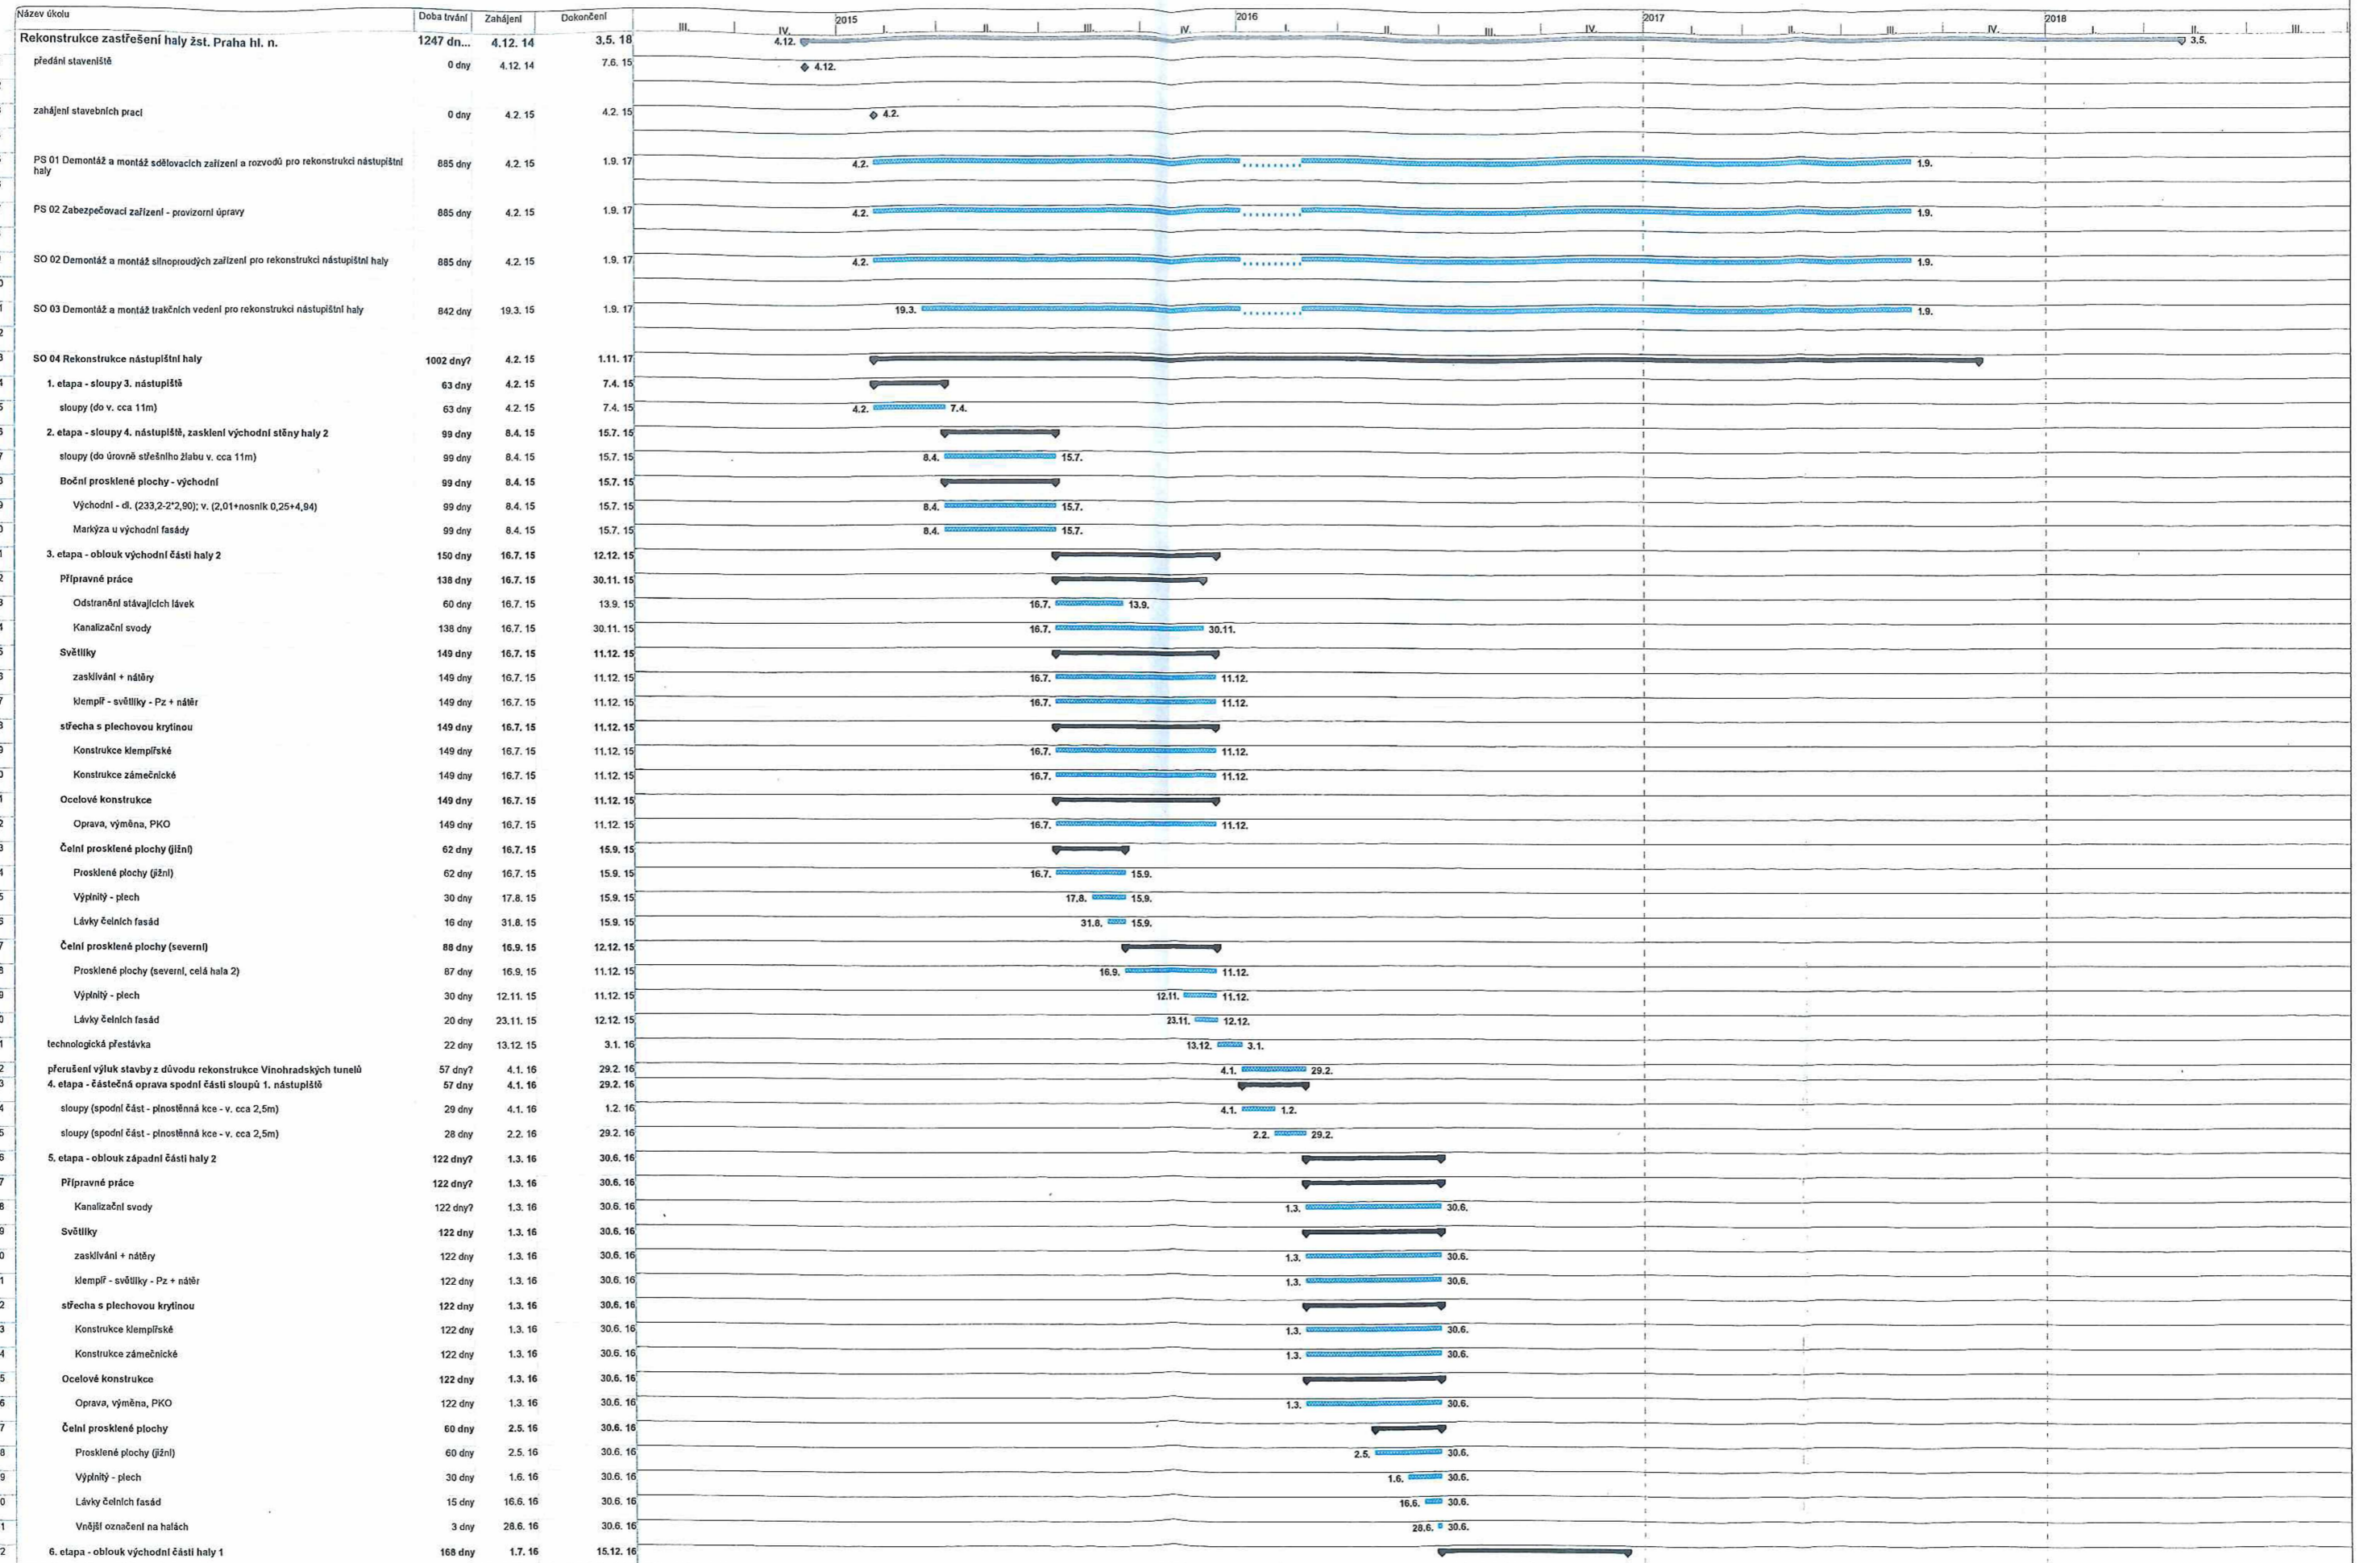

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n.

