



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 103

Stavební akce:	"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370
----------------	---

Dotčená část stavby:	SO 140 - Sjezdy (vč. ZL053)		
Název / označení změny:	SO 140 plochy - skutečnost		
Podklad pro změnu:	Skutečný stav na stavbě		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	15.01.2026
Zdůvodnění a popis změny: Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek. Změna se týká položek: viz příložený rozpočet			
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:		-	2 430,00 Kč
připočty celkem:			3 340,00 Kč
odpočty celkem:		-	5 770,00 Kč
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje JC geodetický protokol vč. situace SD obrázková příloha stanovisko AD stanovisko TDS		
firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.			
projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.			
objednatel /SÚSPK/			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			

REKAPITULACE STAVBY



Kód: Z_241016
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

KSO:
Místo: Rokycansko

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

IČ: 72053119
DIČ:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-2 430,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-2 430,00	-510,30
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-2 940,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: Z_241016

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-2 430,00	-2 940,30	
ZL103	SO 140 - skutečnost ploch	-2 430,00	-2 940,30	STA
SO 140	Sjezdy	-2 430,00	-2 940,30	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL103 - SO 140 - skutečnost ploch
Soupis:
SO 140 - Sjezdy

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			-2 430,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-2 430,00 0,00	21,00% 15,00%	-510,30 0,00
Cena s DPH			-2 940,30

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Objekt: ZL103 - SO 140 - skutečnost ploch

Soupis: **SO 140 - Sjezdy**

Místo: Rokycansko

Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-2 430,00

MPR - Méněpráce

-5 770,00

VCP - VÍCEPRÁCE

3 340,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL103 - SO 140 - skutečnost ploch
Soupis: SO 140 - Sjezdy

Misto: Rokycansko

Zadavatel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-2 430,00

D	MPR	Méněpráce					
1	K	93542	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M			-5 770,00
P		Poznámka k položce:					
		čisticí kus (0,5m) a vpust (0,5m) vykázány zvlášť vč. příp. zemních prací					
W		Položka z SOD z objektu SO 140 pol. 26					
W		dle PDPS" -24					
W		dle ZL 053					
W		-(13+13)					
W		GP - pol. SOD č. 24					
W		"dle skutečnosti" 26-2					
W		Součet					
D	VCP	VÍCEPRÁCE					3 340,00
2	K	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS			3 340,00
W		Položka z SOD z objektu SO 101.1 pol. 46					
W		"dle PDPS" 0					
W		"dle skutečnosti" 1					
W		Součet					

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL GEODETICKÝCH PRACÍ DODAVATELE STAVBY

Stavba	Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa	
Stavební objekt	SO1XX, 201, 202	Komunikace a mosty
Hlavní zhotovitel stavby	ROADFIN STAVBY s.r.o. , Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice	
Geodet zhotovitele stavby	GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň	
Zakázka objednatele	200-2023	

Zadání geodetické práce	Výkaz ploch skutečného provedení ploch a délek - asfalty, dlažba, obruby, liniové žlaby
-------------------------	---

Popis měření, rozsah, výpočet	Po dokončení výstavby bylo provedeno zaměření skutečného provedení. Následně byly nad tímto zaměřením vypočteny plochy a délky jednotlivých stavebních prvků (rozměry vodorovných průmětů do roviny zobrazení). Pouze u SO201 a 202 jsou uvedené prostorové délky a plochy.
-------------------------------	---

Výkaz ploch a délek:

SO	KM	objekt	plocha	
SO101.1		asfalt	9627	m ²
SO101.2		asfalt	9410	m ²
SO101.3		asfalt	7839	m ²
SO101.4		asfalt	11289	m ²
SO101.5		asfalt	9022	m ²
SO102		asfalt	813	m ²
SO103		asfalt	4087	m ²
SO103.2	silnice	asfalt	2097	m ²
	sjezd	asfalt	66	m ²
SO104.1		asfalt	2055	m ²
SO104.2		asfalt	4118	m ²
SO105		asfalt	791	m ²
SO106	silnice	asfalt	583	m ²
	sjezd	asfalt	42	m ²
SO107		asfalt	3892	m ²
SO108		asfalt	2550	m ²
SO109		asfalt	518	m ²
SO111.1		asfalt	1090	m ²
SO111.2		asfalt	810	m ²
SO140		asfalt	892	m ²
SO122		asfalt	614	m ²
SO123		asfalt	1354	m ²
SO201		asfalt	364	m ²

SO101.1		bet. dlažba ostr.	39,0	m ²
		zatrav. dlažba	77,8	m ²
SO101.5		bet. dlažba ostr.	52,9	m ²
SO103		bet. dlažba ostr.	50,7	m ²
		bet. dl. chodník	230,1	m ²
		kamenná dl.	77,6	m ²
SO103.2		bet. dl. chodník	613,0	m ²
		bet. dl. retardér	41,0	m ²
SO104.1		bet. dlažba ostr.	15,6	m ²
SO104.2		bet. dlažba ostr.	15,4	m ²
		bet. dl. chodník	220,0	m ²
SO105		bet. dlažba ostr.	15,3	m ²
SO106		bet. dl. chodník	59,8	m ²
		bet. dlažba ostr.	15,4	m ²
SO107		bet. dl. chodník	193,3	m ²
		bet. dlažba ostr.	15,3	m ²
SO111.1		bet. dlažba ostr.	3,0	m ²
SO111.2		R materiál	147	m ²
SO122		kam. dlažba	17,0	m ²
SO140		R materiál	170,0	m ²
SO201		kam.dlažba	145,3	m ²
SO202		kam.dlažba	70,0	m ²

SO101.1		bet. obr. š.8cm	16,4	m
		bet. obr. š.15cm	944,6	m
		žul. obr. š.20cm	43,7	m
SO101.5		žul. obr. š.20cm	55,7	m
SO103		bet. obr. š.8cm	165,8	m
		bet. obr. š.15cm	185,1	m
		žul. obr. š.20cm	72,9	m
		žul. obr. š.30cm	124,8	m
SO103.2		bet. obr. š.8cm	419,8	m
		bet. obr. š.15cm	395,8	m
SO104.1		žul. obr. š.20cm	19,0	m
SO104.2		bet. obr. š.5cm	2,7	m
		bet. obr. š.15cm	83,6	m
		žul. obr. š.20cm	19,0	m
SO105		žul. obr. š.20cm	19,0	m
SO106		bet. obr. š.8cm	76,6	m
		bet. obr. š.15cm	55,4	m
		žul. obr. š.20cm	19,1	m
SO107		bet. obr. š.8cm	216,9	m
		bet. obr. š.15cm	144,5	m
		žul. obr. š.20cm	19,0	m
SO109		bet. obr. š.8cm	15,0	m
SO111.1		žul. obr. š.20cm	8,3	m
SO122		bet. obr. š.8cm	330,4	m
		palisády	161,5	m
SO123		bet. obr. š.8cm	474,8	m
SO140		bet. obr. š.8cm	54,1	m
SO201		bet. obr. š.8cm	146,2	m
		bet. obr. š.15cm	14,5	m
SO202		bet. obr. š.8cm	68,1	m

SO101.1		liniový žlab	8,0	m
SO109		liniový žlab	7,0	m
SO140		liniový žlab	26,0	m
		odtok KG DN160	4,4	m

náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

16.01.2026

15/2026




Přílohy:


Výkaz výměr pro jednotlivá SO - grafická část


Výkaz výměr SOIXX - plochy asfaltů

Grafická část

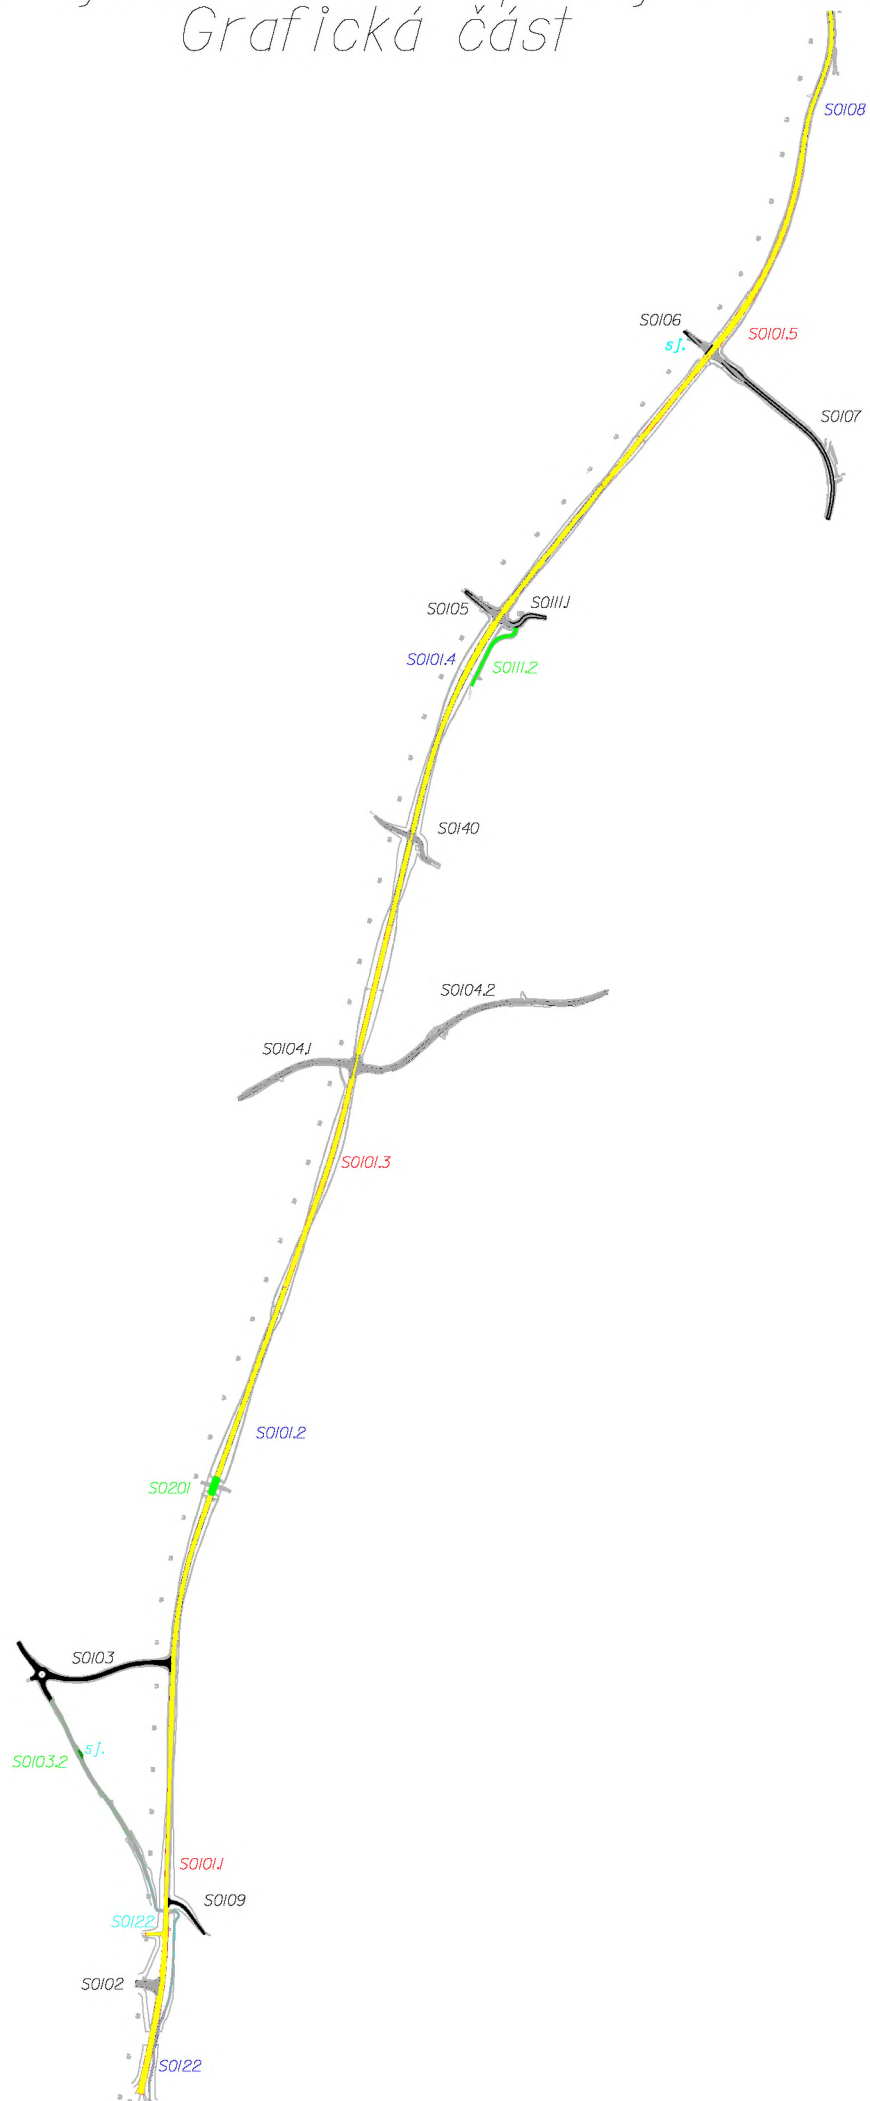

S0140 - výkaz délek a ploch

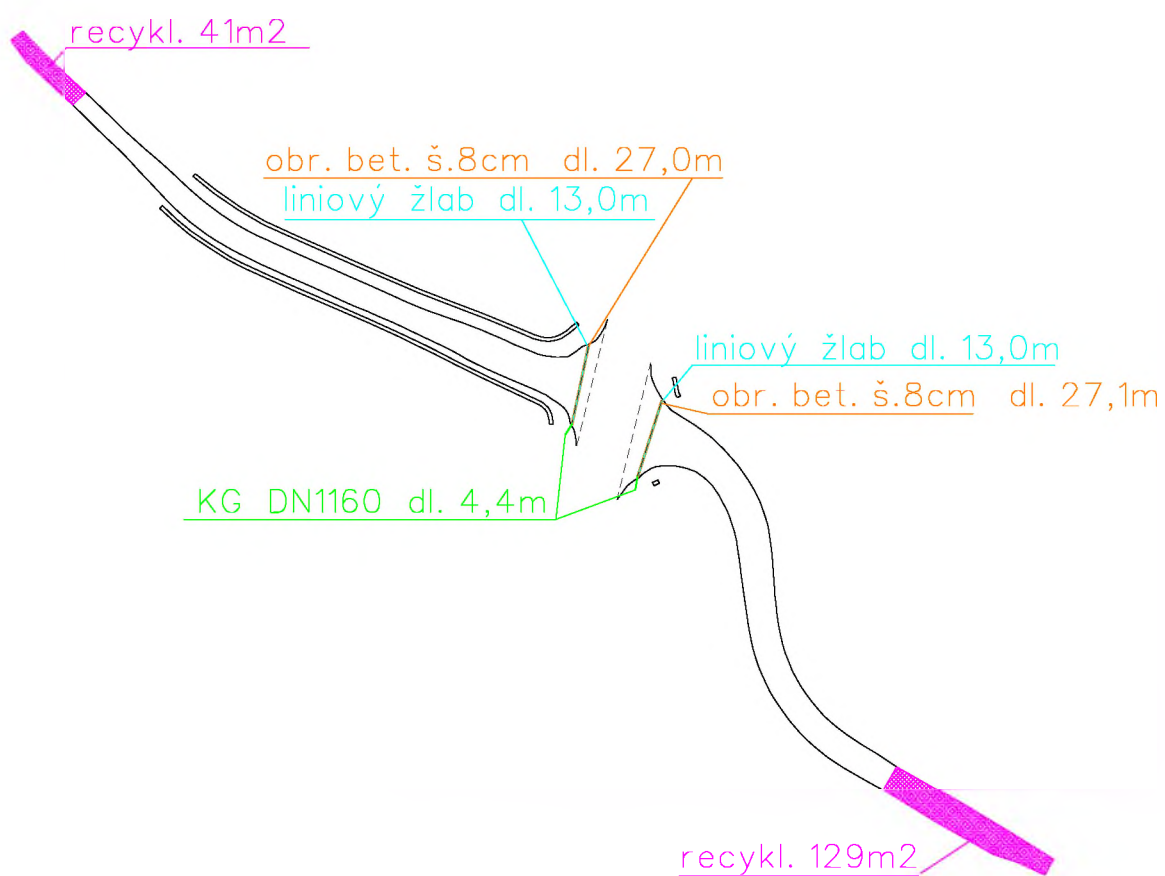



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



DENÍK: SO 140 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 140 - SJEZDY

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	8,5°C	0,0 mm/h	1,3 m/s	3°	95%
12:00	Déšť	9,6°C	0,8 mm/h	1,9 m/s	33°	87%
18:00	Zamračeno	10,4°C	0,0 mm/h	2,7 m/s	62°	83%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Stavbyvedoucí	1	8
	Dělník	1	8		Vedoucí Pokládky	1	8
	Hlavní Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Finišer Voge 1900	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Silniční válec Hamm DV90	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Kropící vůz	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Silniční válec Hamm HD12	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Nákladní vozidlo - AB směs	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 140 - Sjezdy			
ROADFIN STAVBY s.r.o.			
- prováděna pokládka asfaltobetonové vrstvy ACP v tl. 50 mm			
- hutnění válcem na požadovanou míru zhutnění			
- teplota směsi: 158; 158; 159 °C			
- proveden spojovací postřik			
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP			
- prováděna pokládka asfaltobetonové vrstvy ACO v tl. 40 mm			
- hutnění válcem na požadovanou míru zhutnění			
- teplota směsi: 159; 157; 157 °C			
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP			

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


SO 140 - Sjezdy
Žádám TDS o kontrolu vrstvy ACP a povolení pokládky vrstvy ACO

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 23.10.2024:
Na základě výsledků provedených zkoušek a po kontrole pokládky vrstvy ACP SO 140 povolují pokládku ACO.

Podpisy:





STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



DENÍK: SO 140 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 140 - SJEZDY

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Mlha	3,2°C	0,0 mm/h	1,9 m/s	102°	100%
12:00	Polojasno	7,2°C	0,0 mm/h	2,5 m/s	103°	86%
18:00	Polojasno	10,0°C	0,0 mm/h	2,3 m/s	112°	76%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
BIGGEST s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Dělník	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásové rypadlo HITACHI 30t	BIGGEST s.r.o.		1	8
Dumper VOLVO	BIGGEST s.r.o.		1	8
Dozér CAT D8	BIGGEST s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:


POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO140 - sjezdy	BIGGEST s.r.o.		
- prováděna pokládka 2. vrstvy ŠD v tl. 150 mm			
- rovnání do požadované nivelety			
- hutnění válcem			
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP			

Podpisy:







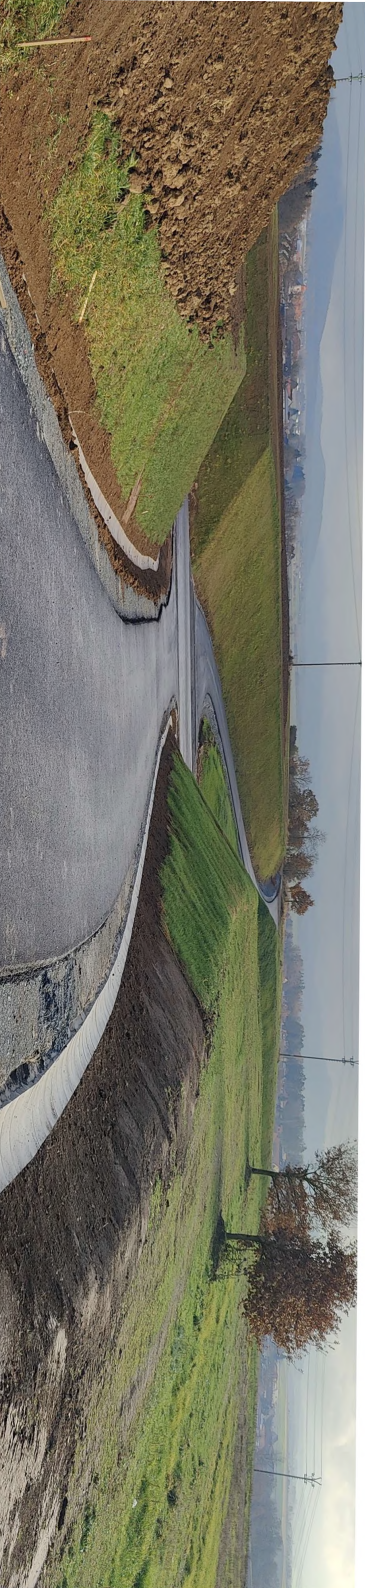

Ragemia, s.r.o.

Plzeňská 27

266 01 Beroun

IČ: 14180235

[REDACTED]

[REDACTED]

IDDS: pwq8mry

Vyjádření autorského dozoru

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Objekt: SO 140 - Sjezdy (vč. ZL053)


ZL č.: 103

Název změny: SO 140 plochy - skutečnost

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek.

Beze změny technického řešení stavby.

AD souhlasí s navrženou změnou.



Ragemia, s.r.o.

STANOVISKO TDS K ZL č. 103

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Číslo ZL: 103

Název ZL: SO 140 plochy - skutečnost

Zdůvodnění:

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek.

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou.

Technické posouzení:

Bylo provedeno doměření dle skutečného zaměření.

Ocenění změny (bez DPH):

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu.

Odpočítané položky: - 5 770,00 Kč

Připočítané položky: 3 340,00 Kč

Celkem ZL: - 2 430,00 Kč

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí.

Za TDS:



DOZOR inženýring 5
DOZOR inženýring s.r.o.
Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň
www.dozori.cz, IČO: 07870213
