

Předmět: RE: Smlouva o dílo č.201/2026 - VD Stanovice - nátěr jeřábu v dolní strojovně - posun termínu předání staveniště

Děkujeme za Vaší informaci a budeme věřit, že se to podaří.

Hezký den

Vážení obchodní přátelé,

tímto vás informujeme, že v původně předpokládaném termínu 2.3.2026 není možné předat staveniště k realizaci díla dle uzavřené smlouvy č. 201/2026, předmětem které je nátěr jeřábu v dolní strojovně.

Důvodem je skutečnost, že v daném prostoru bude v uvedeném období probíhat realizace jiné stavby spočívající ve výměně spodní výpusti vodního díla. Jedná se o strategickou zakázku nejvyšší priority, která zajišťuje bezpečnost přehrady zejména při povodních.

Pro výměnu armatur spodní výpusti je nezbytné využití předmětného jeřábu.

Zhotovitel této stavby je v současné době v prodlení oproti původnímu harmonogramu, který předpokládal dokončení této zakázky v dřívějším termínu. Zpoždění dodávky bylo dle zhotovitele způsobeno nepředvídanými technologickými okolnostmi, které měly přímý vliv na časový postup.


Z uvedených důvodů není možné zajistit bezpečný souběh obou staveb a tedy předání staveniště pro nátěr jeřábu ve sjednaném termínu.

Současně uvádíme, že uzavřená smlouva umožňuje v odůvodněných případech po vzájemné dohodě smluvních stran úpravu termínů ( viz čl. II Termín plnění, odst. 2)

Velice se omlouváme za komplikace a sdělujeme, že jsme schopni vám staveniště předat ve 13. týdnu, tedy 23.3.2026.

Smluvní termín dokončení díla 30.4.2026 tak snad není ohrožen.

S pozdravem

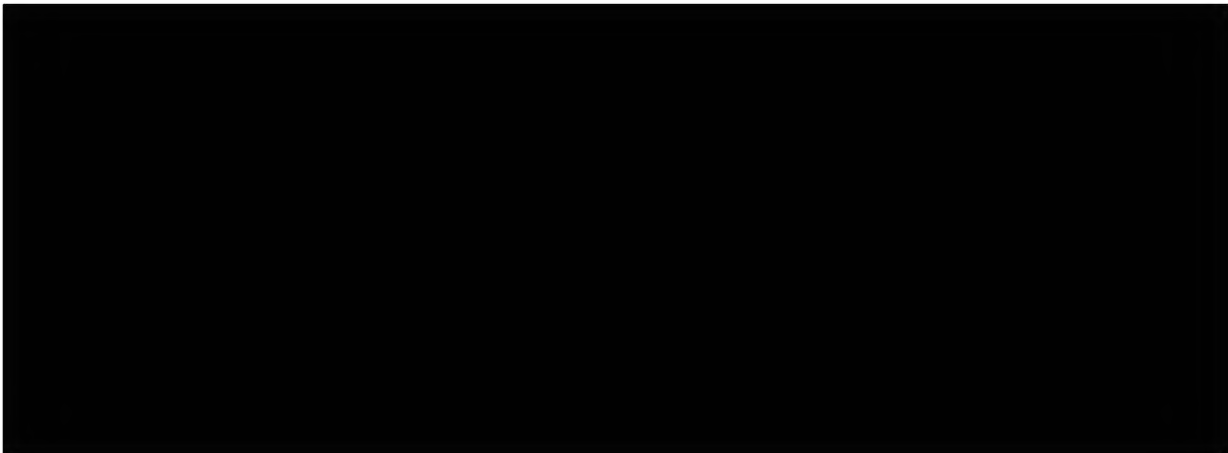

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není myšlena jako závazný návrh na uzavření smlouvy, podání nabídky či přijetí nabídky. Slouží pouze jako podklad pro případné následné právní jednání stran. Jakékoli právní jednání Povodí Ohře, státního podniku uvedené v předchozí větě musí být učiněno výhradně v písemné formě včetně podpisu oprávněné osoby.

🌿 Zvažte prosím tisk této zprávy.  
Kontrolováno antivirovým systémem Sophos.
