

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 10. 2025

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupená: [REDACTED]

příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 25. 11. 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

HOLONA&POŠTULKA ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.

se sídlem: Orlovská 726/155, 713 00 Ostrava – Heřmanice

IČ: 29384214

DIČ: CZ29384214

zastoupená: Davidem Poštulkou, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 37974

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 10. 2025, ev. č. Objednatele: 005/OVZ/25/087-OD, ev. č. Zhotovitele: Z.340_FNO_Atys (dále jen „**Smlouva**“). Tuto Smlouvu uzavřeli Zhotovitel a Objednatel na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava vnitřního vybavení elektrorozvaděčů na JIP stanicích objektu Diferencované péče ve FN Ostrava“.

II. Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení termínu pro provedení Díla stanoveného v čl. IV. **Doba plnění** odst. 1 Smlouvy (dále jen „**termín provedení Díla**“). Důvodem prodloužení termínu provedení Díla je kapacitní vytížení a změny v plánu sanitárních dnů Fakultní nemocnice Ostrava. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Smluvní strany se dohodly, že se termín provedení Díla prodlužuje a nový termín provedení Díla je nejpozději do 31. 7. 2026. S ohledem na tuto skutečnost se odst. 1 čl. IV. Doba plnění Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním odst. 1 čl. IV. následujícího znění:


„1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do 31. 7. 2026.“

2. Přesná specifikace důvodů pro prodloužení termínu provedení Díla je uvedena v Oznámení o změnách akce č. 1, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „**Příloha č. 1**“).
3. Současně se Smluvní strany dohodly na harmonogramu prací, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Dodatek č. 1 vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:
 - Příloha č. 1 – Oznámení o změnách akce č. 1.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____



V Ostravě dne _____

**David
Poštulka**


Digitálně podepsal David
Poštulka
Datum: 2026.03.05 06:47:01
+01'00'

Zhotovitel

David Poštulka
jednatel spol. HOLONA&POŠTULKA
ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.

Oznámení o změnách akce č 1.

Identifikační údaje akce	
Název	Oprava vnitřního vybavení elektrorozvaděčů na JIP stanicích objektu Diferencované péče ve FN Ostrava.
005/OVZ/25/087-OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	HOLONA & POŠTULKA ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.
Adresa	Orlovská 726/155, 713 00 Ostrava – Heřmanice
Oznámení vystavil:	
David Poštulka	
Navrhované změny akce	
Název změnového listu: ZL 01 – Úprava termínu plnění a harmonogramu prací	
<u>Méněpráce:</u> nejsou	
<u>Vícepráce:</u> nejsou	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
S ohledem na kapacitní vytížení a změn v plánu sanitárních dnů, který vylučují odstávku oddělení JIP, dochází k úpravě termínu plnění a harmonogramu, který je přílohou Smlouvy. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zadavatel vypsal zadávací řízení v září 2025, přičemž k uzavření smlouvy došlo až v říjnu 2025. Předpoklad doby plnění, který je uveden i ve smlouvě, byl 6 měsíců od podpisu smlouvy. Tento termín byl podle plánu sanitárních dnů dostačující. Vzhledem k úpravě harmonogramu sanitárních dnů ze strany FNO nelze termín dle smlouvy dodržet. Termíny z harmonogramu prací jsou uvedeny v bodu „Nově sjednaná lhůta dokončení díla“ tohoto změnového listu. Harmonogram je zároveň přílohou tohoto změnového listu. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto změnovým listem výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.	
Odkazy na	specifikaci: -
	na výkresy: -
	na rozpočtové podklady: -
	na jinou část smlouvy: -
Důvod vícepráce / méněpráce:	
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.	

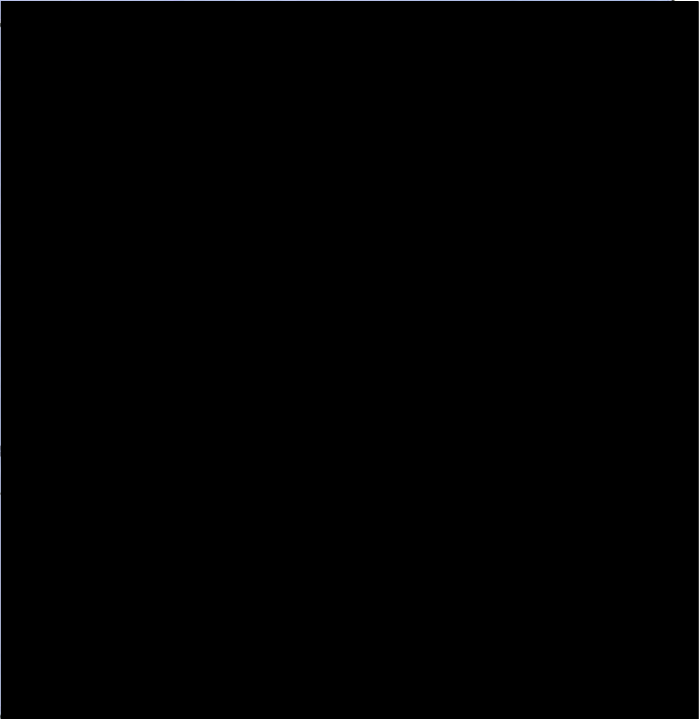odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		Výsledná celková cena změny DPH	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do 31.7.2026 dle přílohy č. 1 – harmonogram prací.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 30.1.2026			
Datum: 30.1.2026 Podpis zmocněnce zhotovitele:			
Stanovisko TDI:			
Stanovisko projektanta stavby:		Datum: Podpis TDI: 	
Seznam přiložených dokladů:		Datum: Podpis projektanta stavby: 	
Příloha 1 - Harmonogram – aktualizace			

Příloha č. 1 - Harmonogram prací k akci:

Oprava vnitřního vybavení rozvaděčů na JIP stanicích objektu Diferencované péče ve FN Ostrava

Neurochirurgie II., 4.p.	2.-8.2.2026
Traumatologická, 0.p.	11.-13.2.2026
Neurologická, 0.p.	16.-19.2.2026 (18.-21.5.2026)
Koronární II. 2.p.	26.-27.3.2026
Chirurgická 1.p.	3.-5.3.2026
Kardiochirurgická I. 1.p.	16.-18.3.2026 (22.-24.6.2025)
Koronární I. 2.p.	26.-27.3.2026
Neurochirurgie I. 4.p.	13.-19.4.2026 (8.-14.6.2025)
Transplantační 3.p.	21.-26.4.2026
Metabolická 3.p.	2.-7.6.2026
