

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Generála Píky, rek. komunikace, P6, č. akce 1000001 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 2	Číslo ZBV: 2
--	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo č. 3/24/5900/022 PID: TSKAX002COQE na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 06.03.2025:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: Společnost pro údržbu III,
DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2 (vedoucí sdružení)

SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město (člen sdružení)

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Situace s vyznačenými plochami
- (d) Fotodokumentace z realizace
- (e) Výstřižek ze vzorového řezu
- (f) Zápisy z KD č. 8, 9

Paré č. 1	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Paré č. 2	DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2
Paré č. 3	SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Zhotovitel v rámci stavby realizoval kompletní rekonstrukci komunikace, ale taktéž i chodníků. V rámci rekonstrukce chodníků Zhotovitel kompletně odstranil původní vrstvy a následně položil vrstvu ze štěrku. Kvůli množícím se stížnostem na problémovou schůdnost chodníku (hlavně u maminek s dětma v kočárku a pacienti Ústavu leteckého zdravotnictví), vydal zástupce Objednatele na základě koordinátora BOZP pokyn k realizaci podkladní vrstvy ze směsi stmelené cementem, po které bylo umožněno chodit pěším bez jakékoliv komplikace. Byla použita vrstva SC v tloušťce 10 cm, o kterou byla následně ponížena vrstva ze štěrku (z původních 15cm na 5cm).

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 4 ZZVZ, a to vzhledem k tomu, že změny byly zpracované na základě požadavku Objednatele.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-290 985,84	573 760,00	282 774,16

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

jméno

Technický dozor stavby

jméno

Autorský dozor

jméno

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osvědčení


Objednatel (místopředseda představenstva TSK hl. m. Prahy, a.s.)


jméno

Zhotovitel (místopředseda představenstva SILNICE GROUP a.s.)

jméno














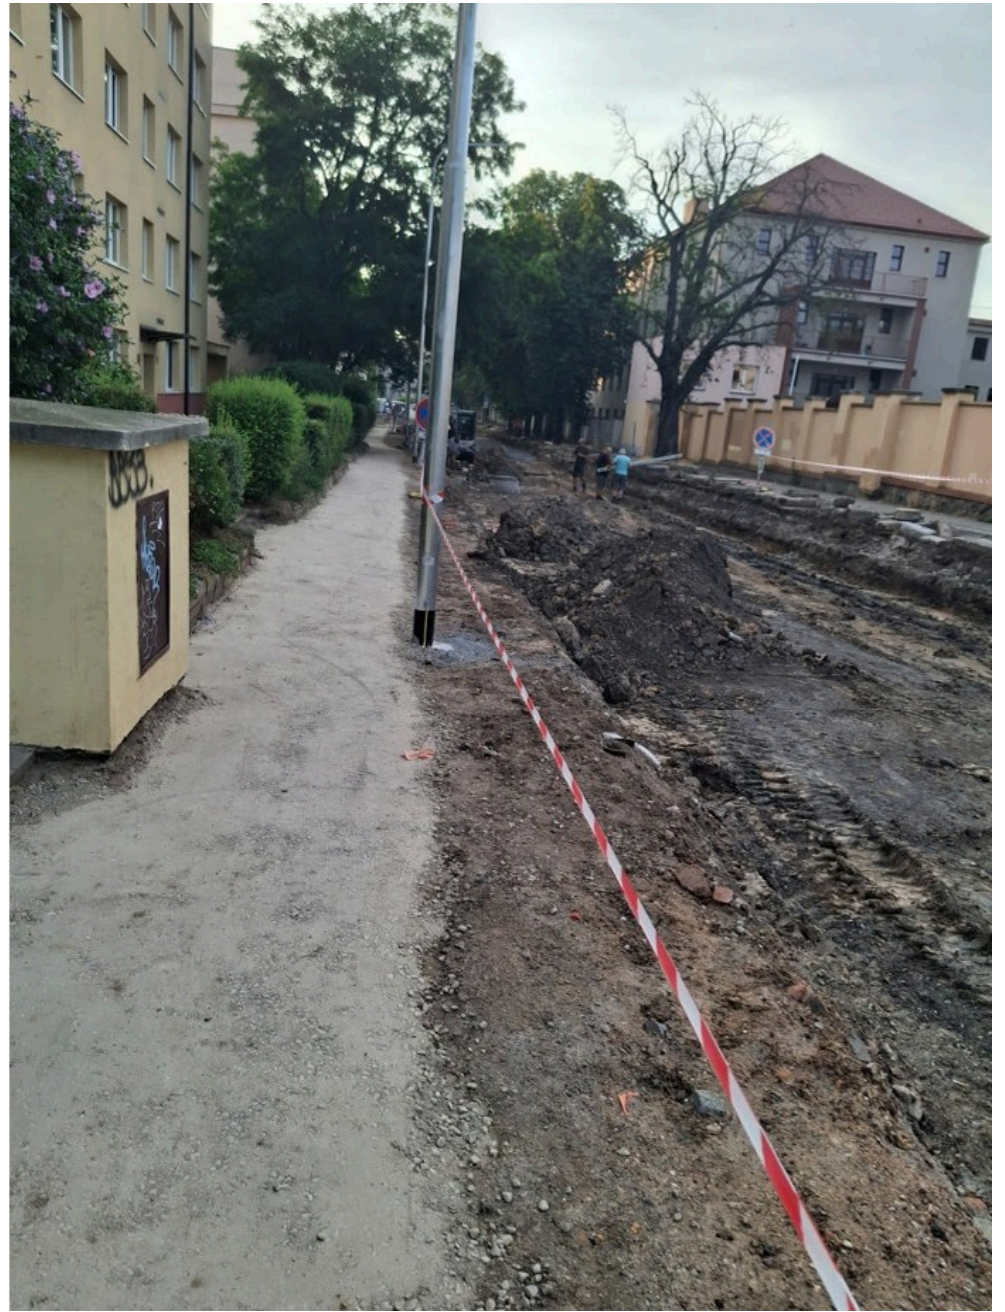









VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1 VĚTEV A

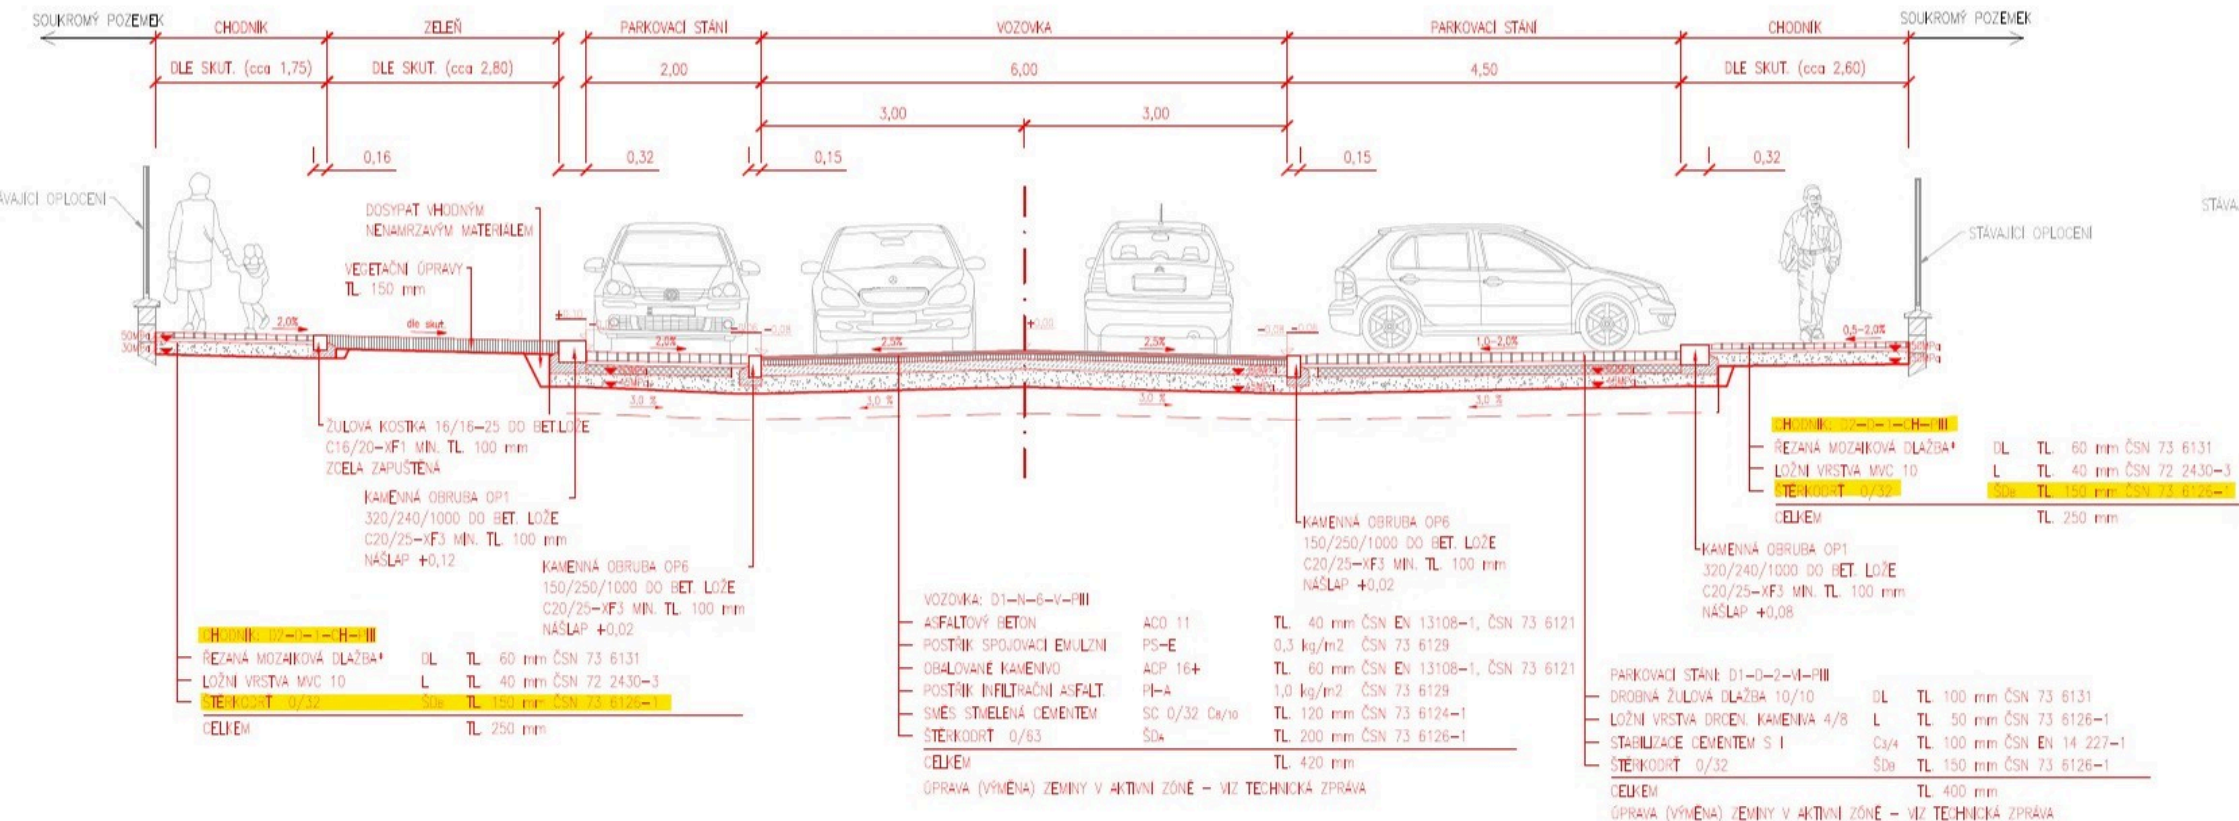





Evidenční číslo:




TSK HL.M. PRAHY	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	GENERÁLA PIKY, PRAHA 6	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/2



provedena podkladní úprava z kmenové stromové





Vyhotoveno v Tiskárně – Rozesláno účastníkům dle přeznění listiny elektronicky ve formátu PDF.

TSK HL.M. PRAHY	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	GENERÁLA PIKY, PRAHA 6	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/2
