

Změnový list

č. 75

stavba: Nová plavecká hala Litvínov

Datum : 13.02.2026
Vypracoval : 

Popis změny a její účel :

Oprava oplocení

Odůvodnění změnového listu č. 75

Po vykácení svahu pod severní částí oplocení areálu z důvodu možnosti uložení stropních panelů jeřábem z přilehlé komunikace Podkrušnohorská, byla narušena stabilita svahu a následně došlo k ohrožení stability podezdívky oplocení. Proto bylo nezbytné dílčí zasanování podezdívky a vzhledem ke zjištěnému stavu koroze plotových dílců i k jejich výměně.

Na základě jednání mezi generálním dodavatelem (GD) a investorem bylo dohodnuto, že GD provede opravu stávajícího oplocení u ulice Podkrušnohorská.

Předmět změny zahrnuje zejména:

demontáž stávajícího oplocení,
opravu otvorů po původních sloupcích,
dodávku a montáž nových plotových polí,
doplnění základové konstrukce zdi v místě původního vjezdu,
lokální opravu stávající zídky.


Současně upozorňujeme, že předmětem tohoto změnového listu je pouze oprava stávajícího konstrukčního stavu. Generální dodavatel nepřebírá odpovědnost za statické parametry a životnost původních základových konstrukcí a na tuto část nebude poskytována záruka.

Dopad do HMG stavby:

- ne


Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Změny - VCP	kpl	1	1 558 350,00	1 558 350,00 Kč	
Změny - MNP	kpl	1	-8 366,00	- 8 366,00 Kč	
cena celkem bez DPH				1 549 984,00 Kč	

Vypracoval :



Datum :

Podpis:

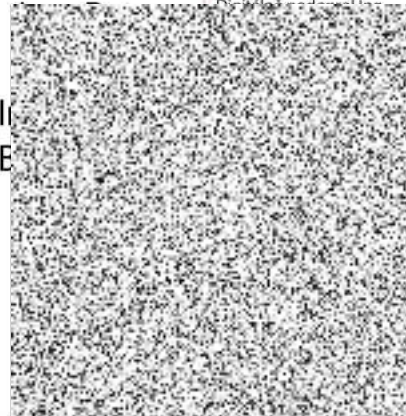

Za TDS:

Datum :

Podpis:

Za AD:

Datum :

Podpis:

Za objednatele:

Datum :

Podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

metrostav CZ

Stavba:

Příloha č.10 ZD_Soupis prací_2024_05_09

Objekt:

00 - Nová plavecká hala L...

Soupis:

ZL75 - Změnový list 75 Oprava oplocení koupaliště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 549 984,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 549 984,00	21,00%	325 496,64
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 875 480,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

metrostav CZ

Stavba:

Příloha č.10 ZD_Soupis prací_2024_05_09

Objekt:

00 - Nová plavecká hala L...

Soupis:

ZL75 - Změnový list 75 Oprava oplocení koupaliště

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 549 984,000

D HSV

HSV

1 549 984,000

D 001

Oprava oplocení areálu koupaliště

1 549 984,000

1	K	NP1	Demontáž a odvoz oplocení	kpl	1,000	21 840,000	21 840,000	R položka
			PP Demontáž a odvoz oplocení					
2	K	NP2	Výzisk z kovového odpadu	kpl	1,000	-8 366,000	-8 366,000	R položka
			PP Výzisk z kovového odpadu - 2 145 kg					
3	K	NP3	Výroba oplocení, montáž do betonových patek, výška oplocení 150 cm, plotové dílce v osách po 200 cm, kotvené závitovými tyčemi do chemické malty, povrchová úprava zinkováním	m	143,000	8 970,000	1 282 710,000	R položka
			PP Výroba oplocení, montáž do betonových patek, výška oplocení 150 cm, plotové dílce v osách po 200 cm, kotvené závitovými tyčemi do chemické malty, povrchová úprava zinkováním					
4	K	NP4	Zednické a stavební výspravy oplocení	m	143,000	1 600,000	228 800,000	R položka
			PP Zednické a stavební výspravy oplocení - cena za bm obsahuje: - nutné zednické / betonářské opravy oplocení - nutné opravy oplocení z spodní strany - sanaci základů - doplnění betonů základu v nezbytném rozsahu - finální sjednocující nátěr zidky - doplnění oca 10m chybějícího základu a zdi v místě stávajícího přejezdu					
5	K	NP5	VRN - zaměření, průzkumné práce, technické řeše	kpl	1,000	25 000,000	25 000,000	R položka
			PP VRN - zaměření, průzkumné práce, technické řeše					

Výška: 1500 mm

