

# Změnový list

č. 86

## stavba: Nová plavecká hala Litvínov

Datum : 15.04.2026  
Vypracoval : 

### Popis změny a její účel :

#### Nový návrh nerezového zábradlí - ochoz bazénové haly:

Odůvodnění změnového listu č. 86:

Tento změnový list reflektuje potřebu dopracování a úpravy návrhu zábradlí na ochozu bazénové haly ve 3. NP. Původní návrh neřešil zábradlí jako součást tribuny. V rámci požadavků investora, souvisejících se získáním dotace na sportovní halu, byl však tento prostor nově definován jako tribuna pro diváky plaveckých závodů.

Z tohoto důvodu je nutné navrhnout zábradlí v souladu s příslušnými normovými požadavky pro tribuny. Generální dodavatel proto zajistil zpracování statického posouzení zábradlí, návrh nového kotevního detailu a kompletní výrobně technickou dokumentaci (VTD).

Tento změnový list řeší výhradně projekční a inženýrské práce. Samotná realizace upraveného zábradlí bude předmětem samostatného změnového listu.

### Dopad do HMG stavby:

NE


Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Změny - VCP	kpl	1	56 250,00	56 250,00 Kč	
Změny - MNP	kpl	1		- Kč	
cena celkem bez DPH				<b>56 250,00 Kč</b>	

Vypracoval :



Datum :

Podpis:

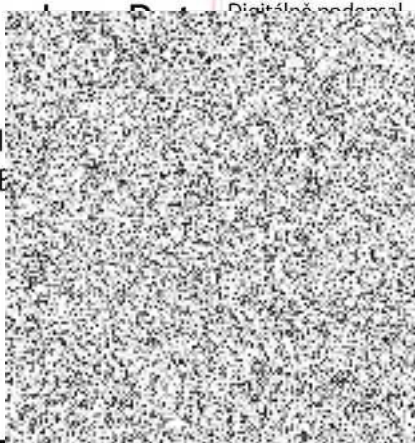

Za TDS:

Datum :

Podpis:

Za AD:

Datum :

Podpis:

Za objednatele:

Datum :

Podpis:

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

metrostav CZ

Stavba:

Příloha č.10 ZD\_Soupis prací\_2024\_05\_09

Objekt:

00 - Nová plavecká hala L...

Soupis:

**ZL86 - Změnový list 86 Projekční práce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>56 250,00</b>
	Základ daně	Sazba daně		Vyše daně
DPH základní	56 250,00	21,00%		11 812,50
snižovaná	0,00	12,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>68 062,50</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

metrostav CZ

Stavba:

Příloha č.10 ZD\_Soupis prací\_2024\_05\_09

Objekt:

00 - Nová plavecká hala L...

Soupis:

**ZL86 - Změnový list 86 Projekční práce**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**56 250,000**

D HSV HSV 56 250,000

D 01 Ostatní a projekční práce 56 250,000

1	K	NP1	Projekční práce	kpl	1,000	56 250,000	56 250,000	
---	---	-----	-----------------	-----	-------	------------	------------	--

PP

Projekční práce - doplnění statického výpočtu na zábradlí na ochozu v bazénové hale - TRIBUNA  
Doplnění detailů kotvení, dopracování návrh skla  
Vypracování kompletní VTD  
Geodetická měření tvaru a pasport stavu

**AUTORIZOVANÝ TECHNIK PRO POZEMNÍ STAVBY  
MODELOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ – 3D SYSTÉM TEKLA  
KOMUNIKACE V HOLANDSKÉM JAZYCE**

Dodavatel:

Bc. Petr Štark,  
Kamenná 258,  
415 01 Teplice.  
IČO 727 35 597  
DIČ CZ7503122869  
Číslo účtu: 181 702 879 / 0300

tel:



e-mail: [bc](#)

Kancelář:

Řetenická 133,  
415 01 Teplice - Újezdeček.

**NABÍDKA**

Odběratel: Metrostav a.s., Divize 8, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.  
IČO 00 01 49 15.  
DIČ CZ00014915.

Datum vystavení nabídky: 14.04.2026.

Dle poptávky Ing. Lohniského Vám nabízím výrobní a montážní dokumentaci ocelové a skleněné konstrukce zábradlí na tribuně krytého bazénu Litvínov včetně statického výpočtu.

Cena celkem: 45000Kč bez DPH.

S pozdravem Bc. Petr Štark.



415 01 Teplice I  
IČO: 72735597
