


ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	18.IX.17	25.IX.17	2.X.17	9.X.17	16.X.17	23.X.17	30.X.17	6.XI.17	
						N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P
1	<b>Podrobný HMG pro 4. a 5. etapu</b>	<b>37 dny</b>	<b>19.9. 17</b>	<b>8.11. 17</b>										
2	<b>4.etapa</b>	<b>21 dny</b>	<b>19.9. 17</b>	<b>17.10. 17</b>										
3	Dokončení statických prvků	1 den	19.9. 17	19.9. 17										
4	Povrchy stěn/stropů	4 dny	20.9. 17	25.9. 17	3									
5	Příprava pro podlahy	3 dny	20.9. 17	22.9. 17	3									
6	Lití podlahy	1 den	25.9. 17	25.9. 17	5									
7	Výměna rozváděče	1 den	28.9. 17	28.9. 17										
8	Technologická přestávka	5 dny	26.9. 17	2.10. 17	6									
9	Povrchy podlah	5 dny	3.10. 17	9.10. 17	8									
10	Malba	2 dny	10.10. 17	11.10. 17	9									
11	Zapojovací práce elektro	3 dny	12.10. 17	16.10. 17	10									
12	Dodávka oken	1 den	9.10. 17	9.10. 17										
13	Výplně otvorů, zakrytí stropů	5 dny	10.10. 17	16.10. 17	12									
14	Kompletace	1 den	17.10. 17	17.10. 17	13									
15	<b>Dávka investora</b>	<b>7 dny</b>	<b>10.10. 17</b>	<b>18.10. 17</b>										
16	Montáž truhlářských prvků	3 dny	10.10. 17	12.10. 17	9									
17	Instalace IT techniky	2 dny	13.10. 17	16.10. 17	16									
18	Otevření přepážek pro veřejnost - HALA	1 den	18.10. 17	18.10. 17	14;17									
19	<b>5.etapa</b>	<b>13 dny</b>	<b>18.10. 17</b>	<b>3.11. 17</b>	<b>2</b>									
20	Schodiště	10 dny	18.10. 17	31.10. 17										
21	Hrubé práce	7 dny	18.10. 17	26.10. 17										
22	Povrchy stěn/stropů	4 dny	27.10. 17	1.11. 17	21									
23	Povrch podlah	2 dny	2.11. 17	3.11. 17	22									
24	Výplně, kompl.	5 dny	27.10. 17	2.11. 17	21									
25	<b>Dokončení díla</b>	<b>8 dny</b>	<b>30.10. 17</b>	<b>8.11. 17</b>										
26	Revize, měření osvětlení apod.	1 den	6.11. 17	6.11. 17	23									
27	Dokumentace průvodní + DSPS	7 dny	30.10. 17	7.11. 17	21									
28	<b>Předání díla</b>	<b>1 den</b>	<b>8.11. 17</b>	<b>8.11. 17</b>	<b>27</b>									

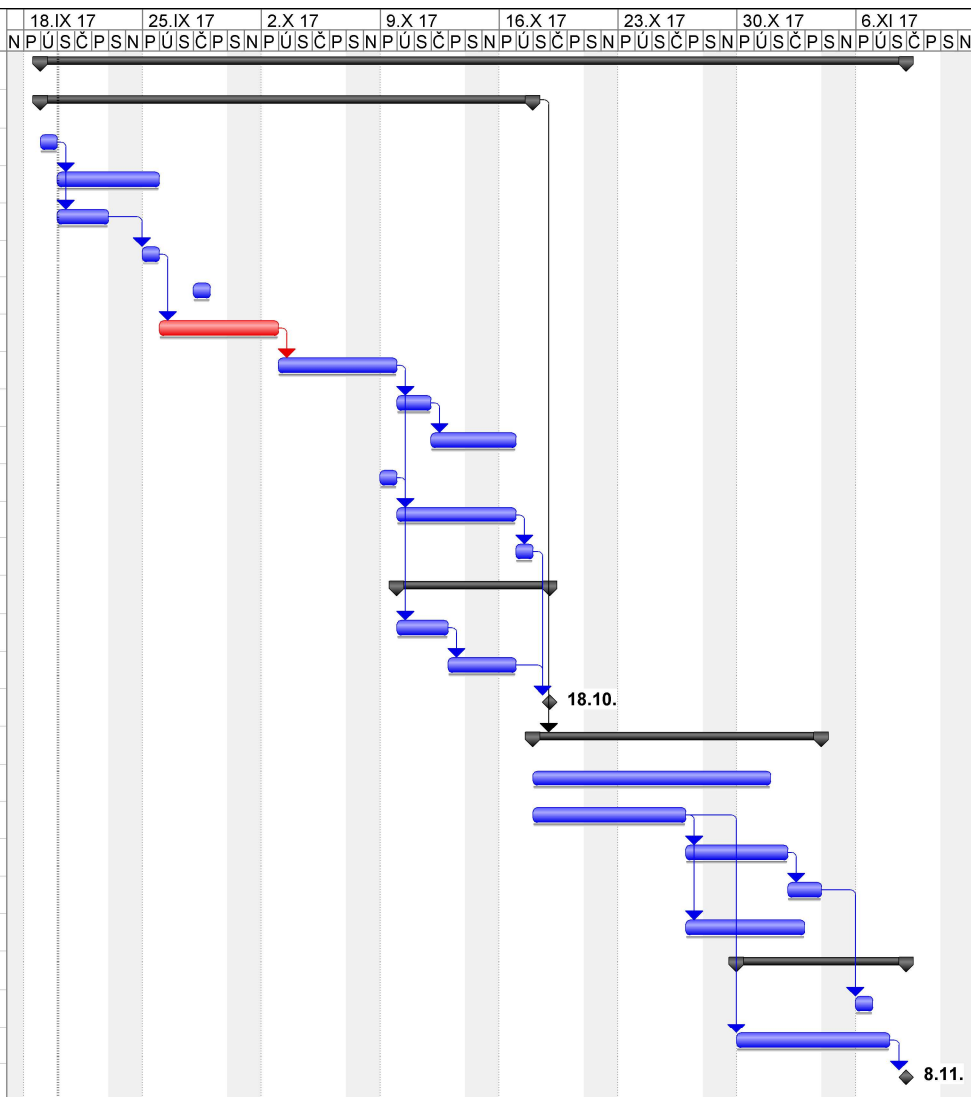

Projekt: HMG 4a5etapa\_R01  
Datum: 20.9. 17

Úkol Průběh Souhrnný Vnější úkoly Konečný termín   
Rozdělení Milník Souhrn projektu Vnější milník
