

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 24. 10. 2016

číslo smlouvy objednatele č. 62-2-5313/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 2016/022/418

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl.

V. odst. 7 smlouvy o dílo
(dále jen „**dodatek**“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

IČO: 70884099

DIČ: CZ70884099, není plátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno

Číslo účtu:

Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem

Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla (dále jen „kontaktní osoba“):

E-mail:

Telefon:

Fax:

Datová schránka:

(dále jen „objednatel“)

a

První KEY-STAV, a.s.

Sídlo: Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

Kontaktní adresa: 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek

IČO: 25385127

DIČ: CZ25385127

Jejíž jménem jedná: Roman Michlíček, předseda představenstva
Ing. Petr Kabát, místopředseda představenstva
Ing. Karel Krchňáček, člen představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek - Místek

Číslo účtu:

Zástupci zhotovitele, pověřeni řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „Kontaktní osoba(y)“):

Ing. Petr Kabát

E-mail:

Telefon:

E-mail:

Telefon:

Datová schránka:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781
(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V.2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 10. 2016 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-5313/2016, ev. č. zhotovitele 2016/022/418, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2017 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných stavebních prací v celkové hodnotě 4 865 647,49 Kč vč. DPH (což je 4 021 196,25 Kč bez DPH) a vzhledem k nutnosti méněprací ve výši 1 677 286,10 Kč včetně DPH (což je 1 386 186,87 Kč bez DPH) se v návaznosti na změnové listy č. 2b, 5 až 18 a 20 až 27 odsouhlasené objednatelem a v návaznosti na čl. V. odst. 7 smlouvy mění čl. V. odst. 2 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o **3 188 361,39** Kč včetně DPH (což je 2 635 009,41 Kč bez DPH) – takto:

„Cena díla stanovená podle výše popsaných pravidel činí v Kč :

CENA	cena bez DPH	DPH (21%)	cena vč. DPH
CELKEM	80 518 817,92	16 908 951,76	97 427 769,68

(slovy: devadesátšedmmiliónůčtyřístadvacetsedmtisícšedmssetšedesátdevět korunčeskýchšedesátosm haléřů)

3. Dále se vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných stavebních prací v návaznosti na změnové listy č. 2b, 5 až 18 a 20 až 27 odsouhlasené objednatelem a v návaznosti na čl. V. odst. 7 smlouvy mění čl. III.2 smlouvy, a to tak, že se zhotovitel zavazuje ukončit práce a dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději do 15. 12. 2017. Stavební objekt SO-02 „MYČKA POLICIE“ bude ve stavu stavební připravenosti pro osazení a instalaci technologie myčky předán nejpozději do 30. 11. 2017. Čl. III.2 smlouvy se mění takto:
Zhotovitel se u stavebního objektu SO-02 „MYČKA POLICIE“ zavazuje ukončit práce a dodávky na objektu do stavu stavební připravenosti pro osazení a instalaci technologie myčky a předat nejpozději do 30. 11. 2017. Celkově se zavazuje ukončit práce a dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději do 15. 12. 2017.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou následující dokumenty:
 - a) Změnový list č. 2b, 5 až 18 a 20 až 27



4. Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.

V Brně dne 12. 10. 2017

V Třinci dne 12. 10. 2017




Za objednatele
Českou republiku - Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
plk. Ing. Jiří Pelikán
krajský ředitel
otisk razítka


Za zhotovitele
První KEY-STAV, a.s.
Ing. Petr Kabát
místopředseda představenstva
otisk razítka


KEY-STAV, a.s.
Lánská čp. 128, 739 61 Třinec
tel.: +420 595 530 700
GSM BRÁNA: +420 802 532 848
IČ: 25395127, DIČ: CZ25395127


Če... ilka
Hasič... zraný sbor
Jihomoravského kraje
614... Zubatého 1
16


Změnový list číslo		24	Omítka stropů	
Název akce:	"PS Znojmo - výstavba požární stanice "			
Číslo akce SMVS:				
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever			
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s.			
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 76, 623 00 Brno			
Předmět změnového listu				
Doplnění doskočiště u věže				
Část díla dotčená změnovým listem				
SO 01 - Požární stanice				
Popis změny, popis technického řešení				
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :				
Omítka stropů - celá výměra				
Nové řešení :				
Omítka stropů - 50%				
Zdůvodnění změny :				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
Není				
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: ne				
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.				
Vliv na cenu:				
		Cena bez DPH		Cena s DPH (21%)
Přípočty k ceně díla:		- Kč		- Kč
Odpočty z ceny díla:	-	110 958,12 Kč	-	134 259,33 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	-	110 958,12 Kč	-	134 259,33 Kč
Fakturováno v	0%	- Kč	0%	- Kč
Změnu odsouhlasil	datum	podepis		
Zhotovitel : stavbyvedoucí	21. 09. 2017			
Zhotovitel : statutární zástupce	21. 09. 2017			
Projektant :	19. 09. 2017			
Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických	12. 10. 2017			
Objednatel : statutární zástupce	12. 10. 2017			

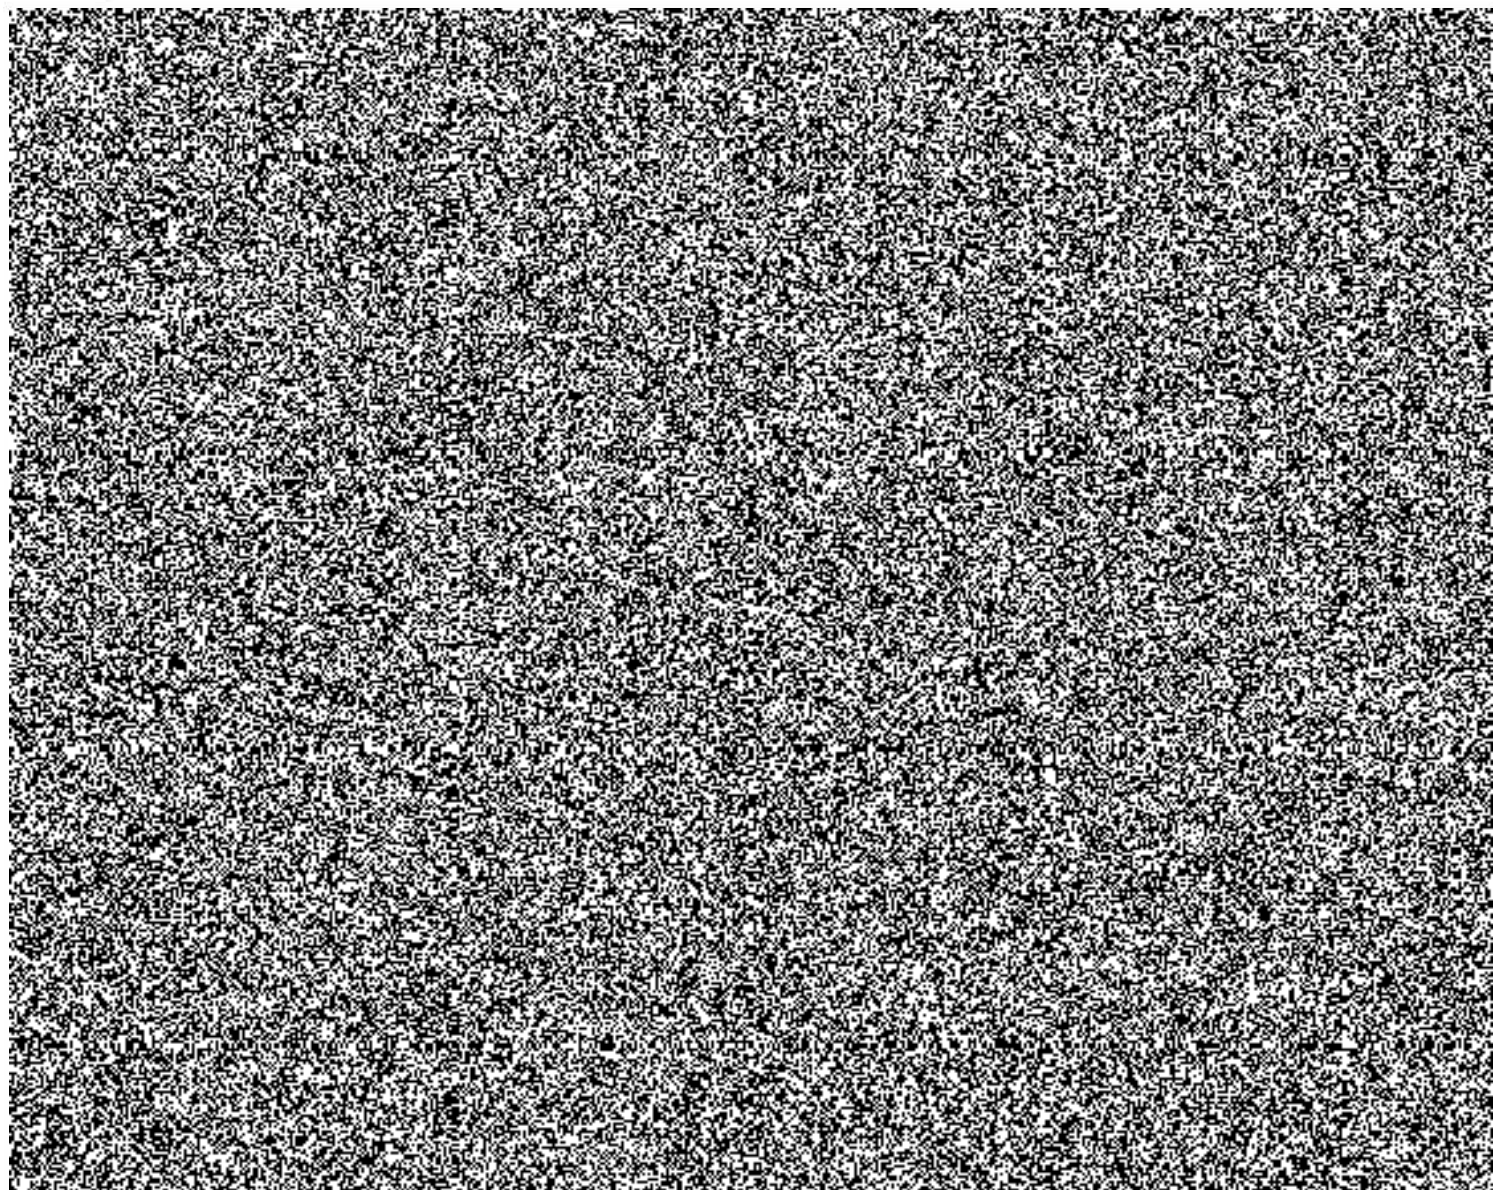


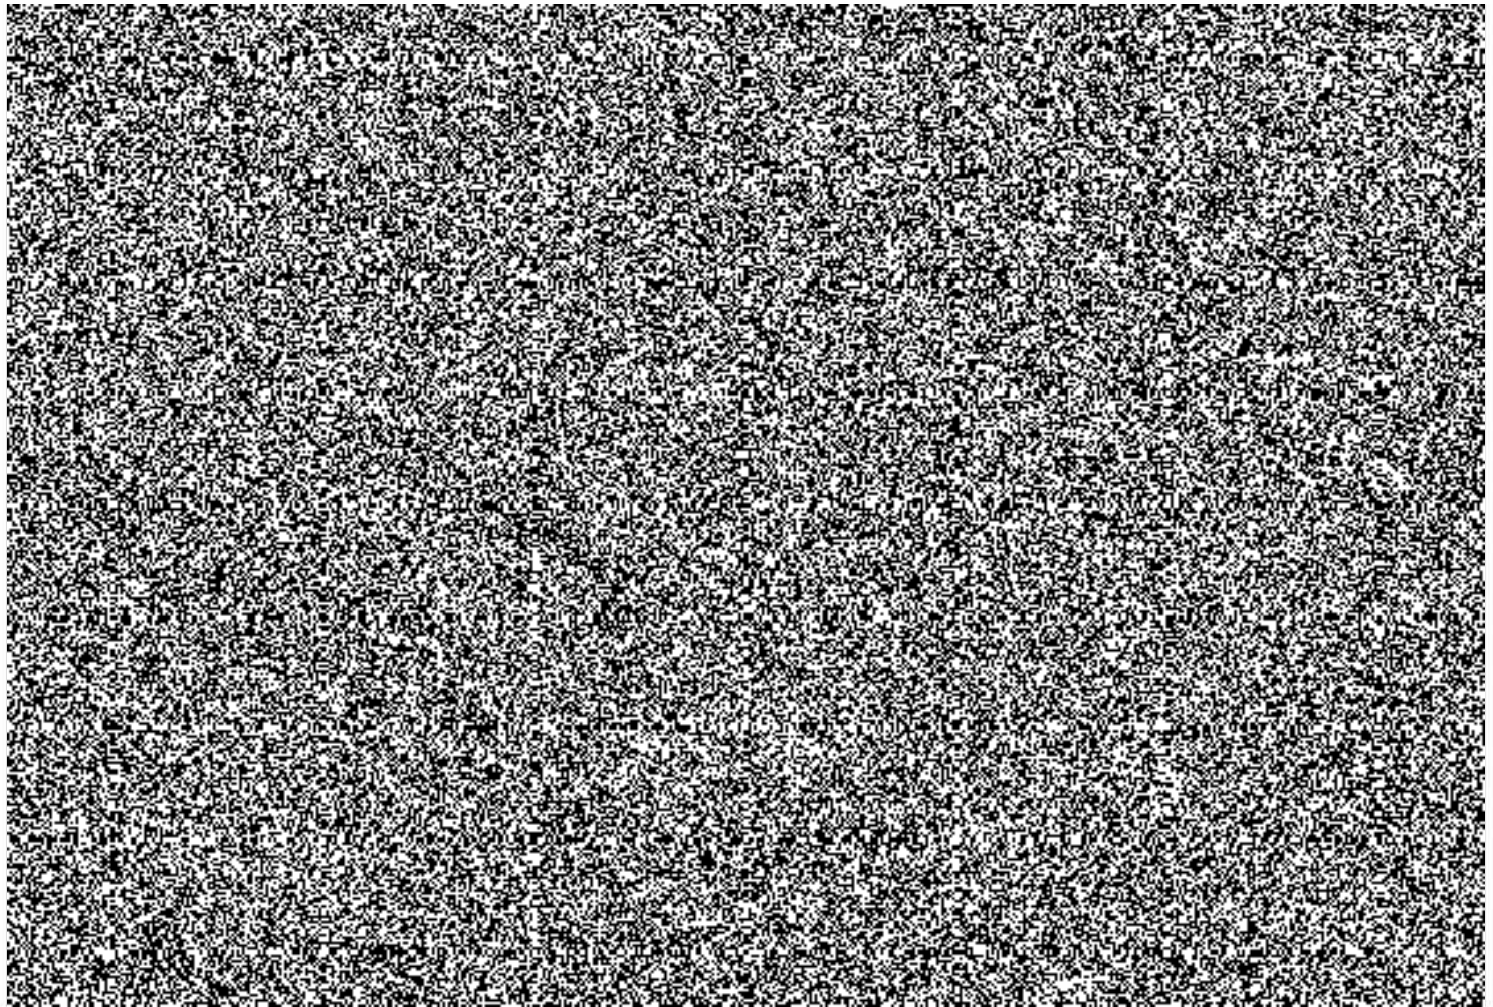


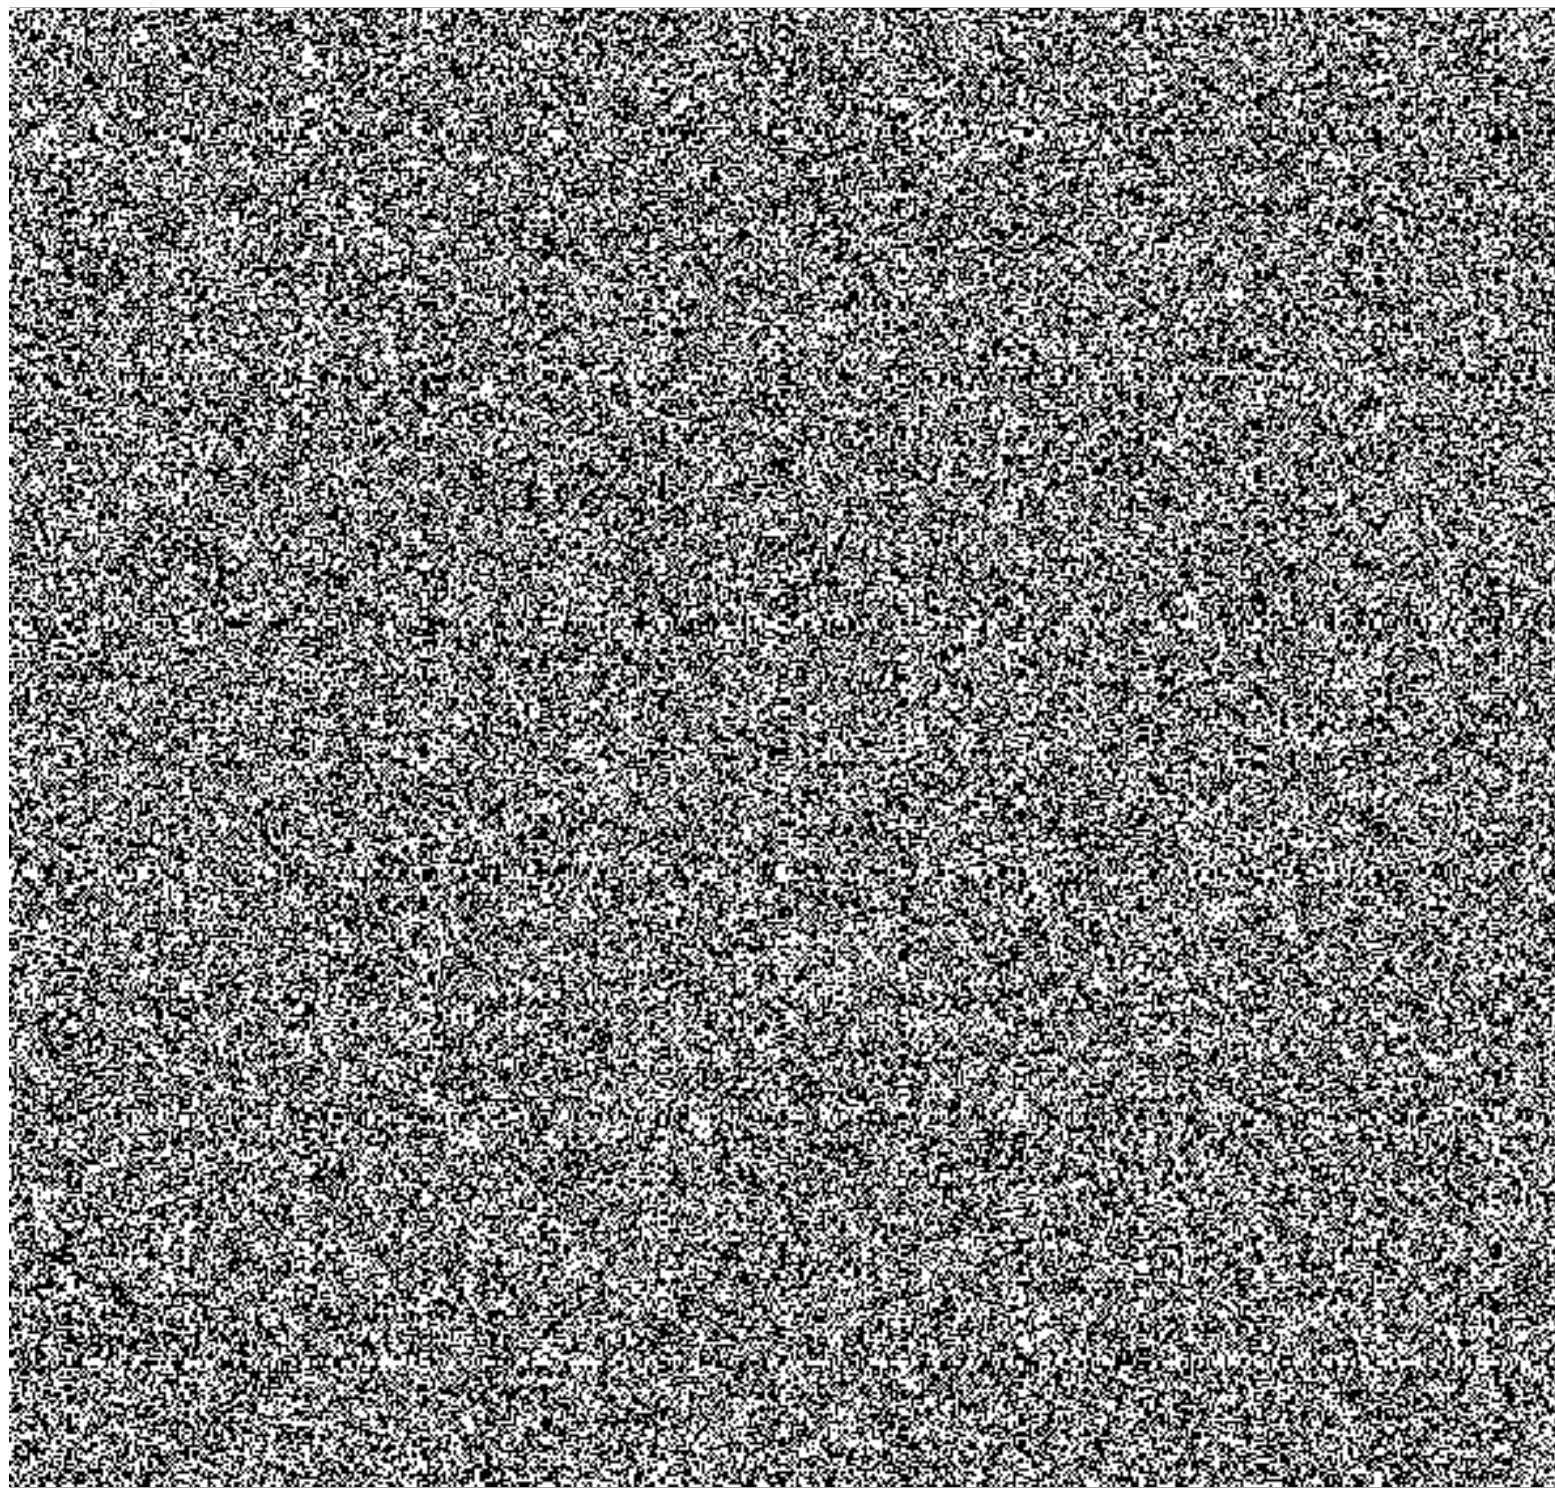


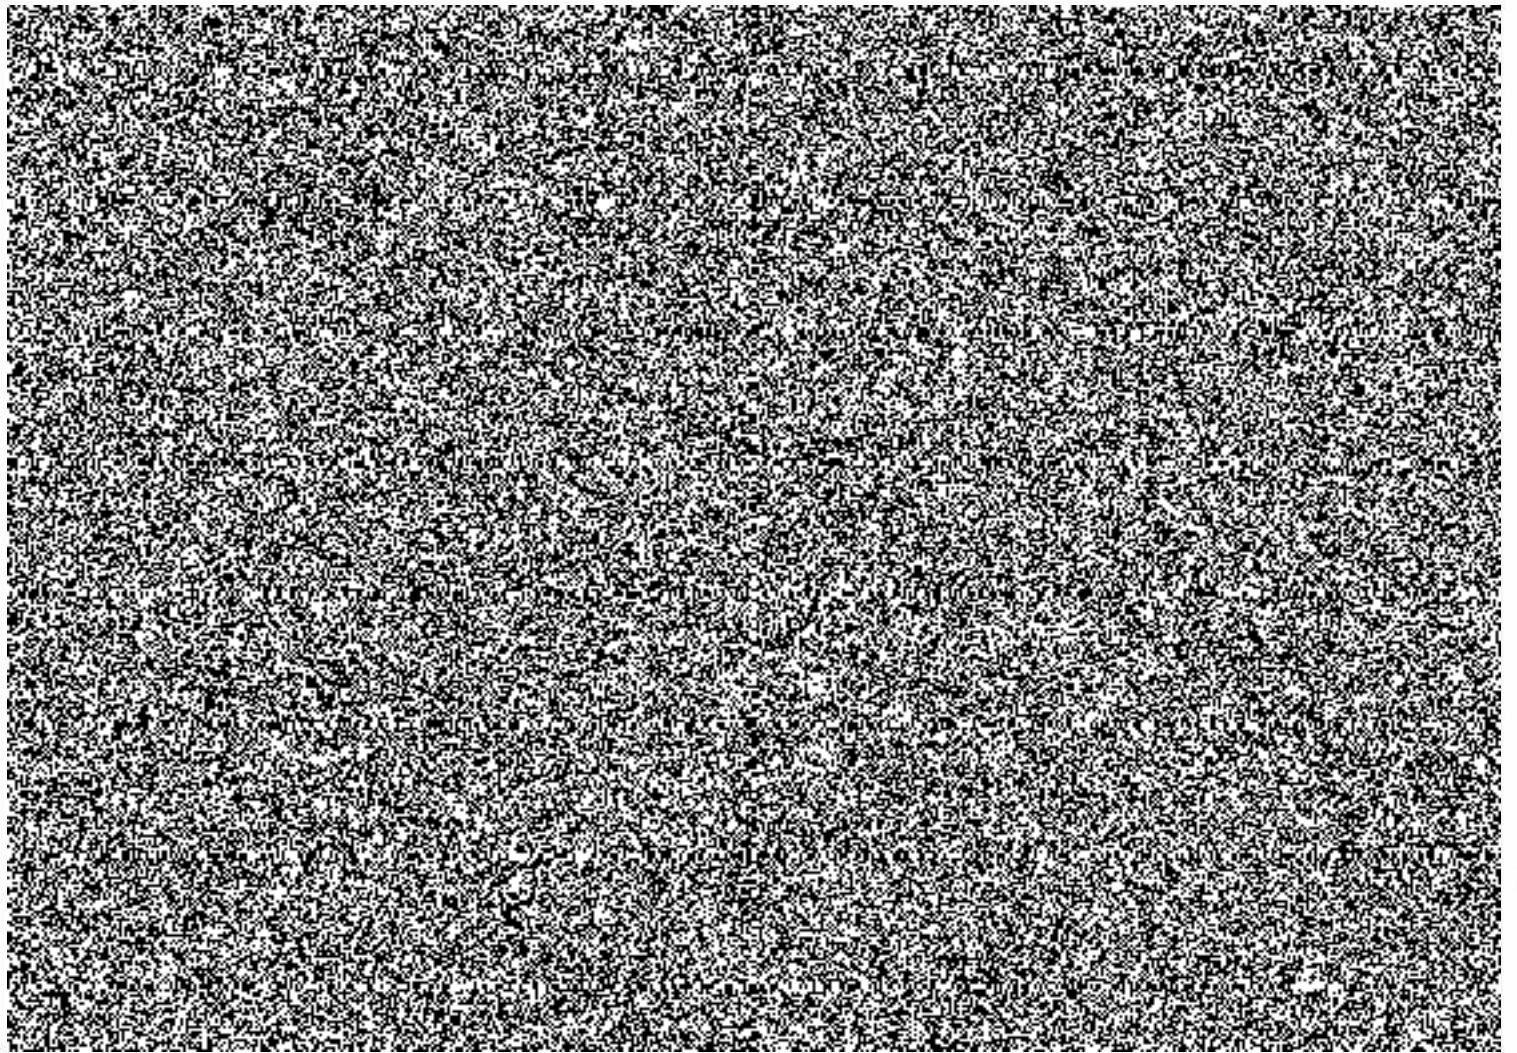



Změnový list číslo		25	Revizní šachty na kanalizaci SO 01	
Název akce:	"PS Znojmo - výstavba požární stanice "			
Číslo akce SMVS:				
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever			
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s.			
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 76, 623 00 Brno			
Předmět změnového listu				
Doplnění revizních šachet na ležaté kanalizaci pod podlahou 1.NP				
Část díla dotčená změnovým listem				
SO 01 - Požární stanice				
Popis změny, popis technického řešení				
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :				
Bez revizních šachet				
Nové řešení :				
Doplnění revizních šachet, celkem 5 ks				
Zdůvodnění změny :				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
Ano				
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: ne				
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.				
Vliv na cenu:				
		Cena bez DPH		Cena s DPH (21%)
Přípočty k ceně díla:		80 932,00 Kč		97 927,72 Kč
Odpočty z ceny díla:	-	659,00 Kč	-	797,39 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		80 273,00 Kč		97 130,33 Kč
Fakturováno v	0%	- Kč	0%	- Kč
Změnu odsouhlasil	datum			
Zhotovitel : stavbyvedoucí	21. 09. 2017			
Zhotovitel : statutární zástupce	21. 09. 2017			
Projektant :	19. 09. 2017			
Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických	12. 10. 2017			
Objednatel : statutární zástupce	12. 10. 2017			

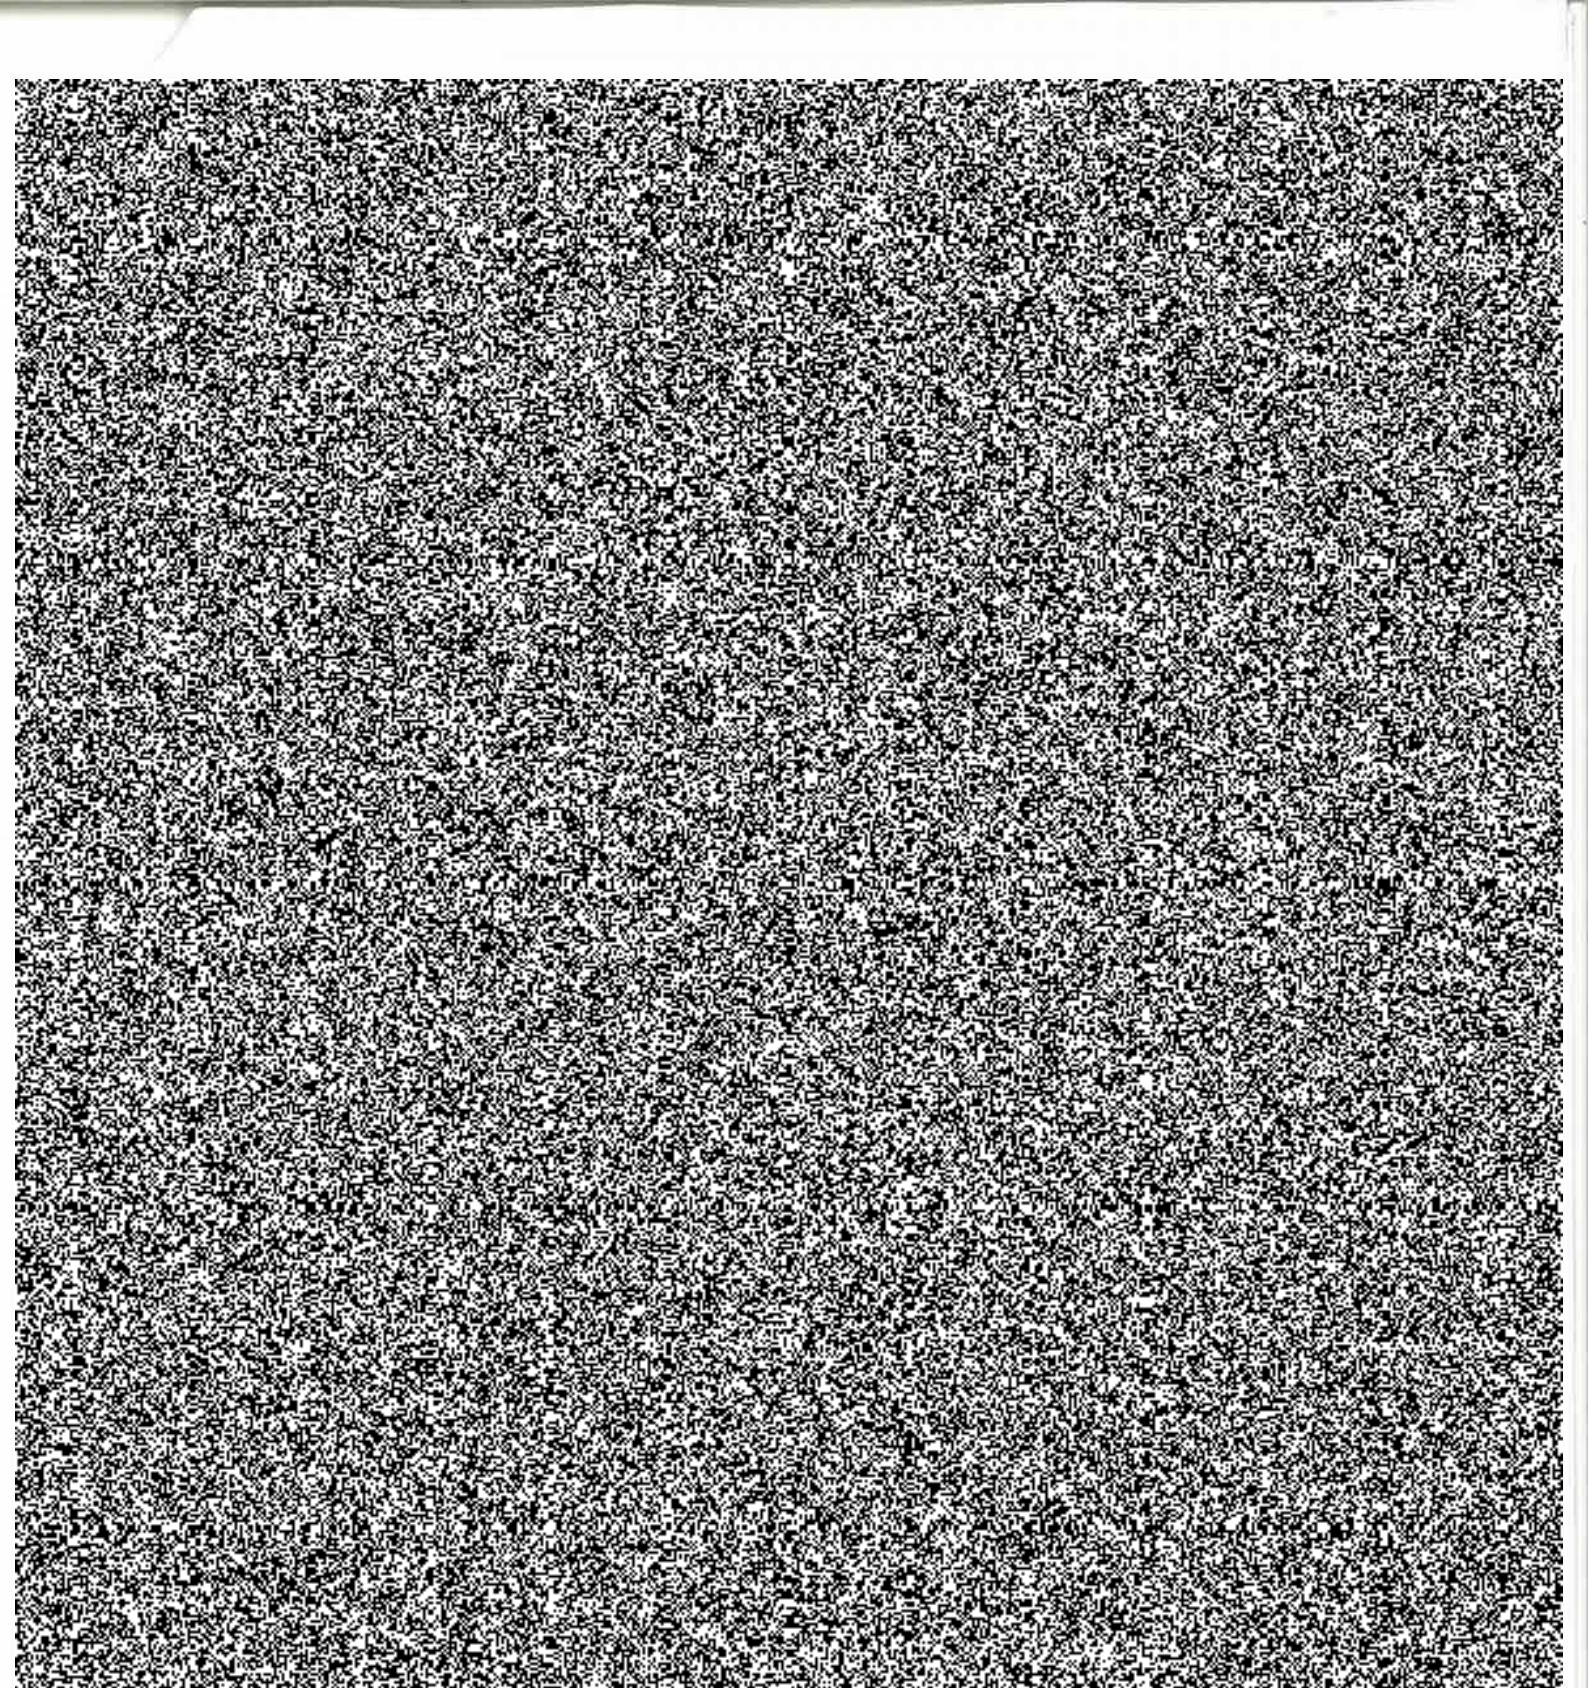


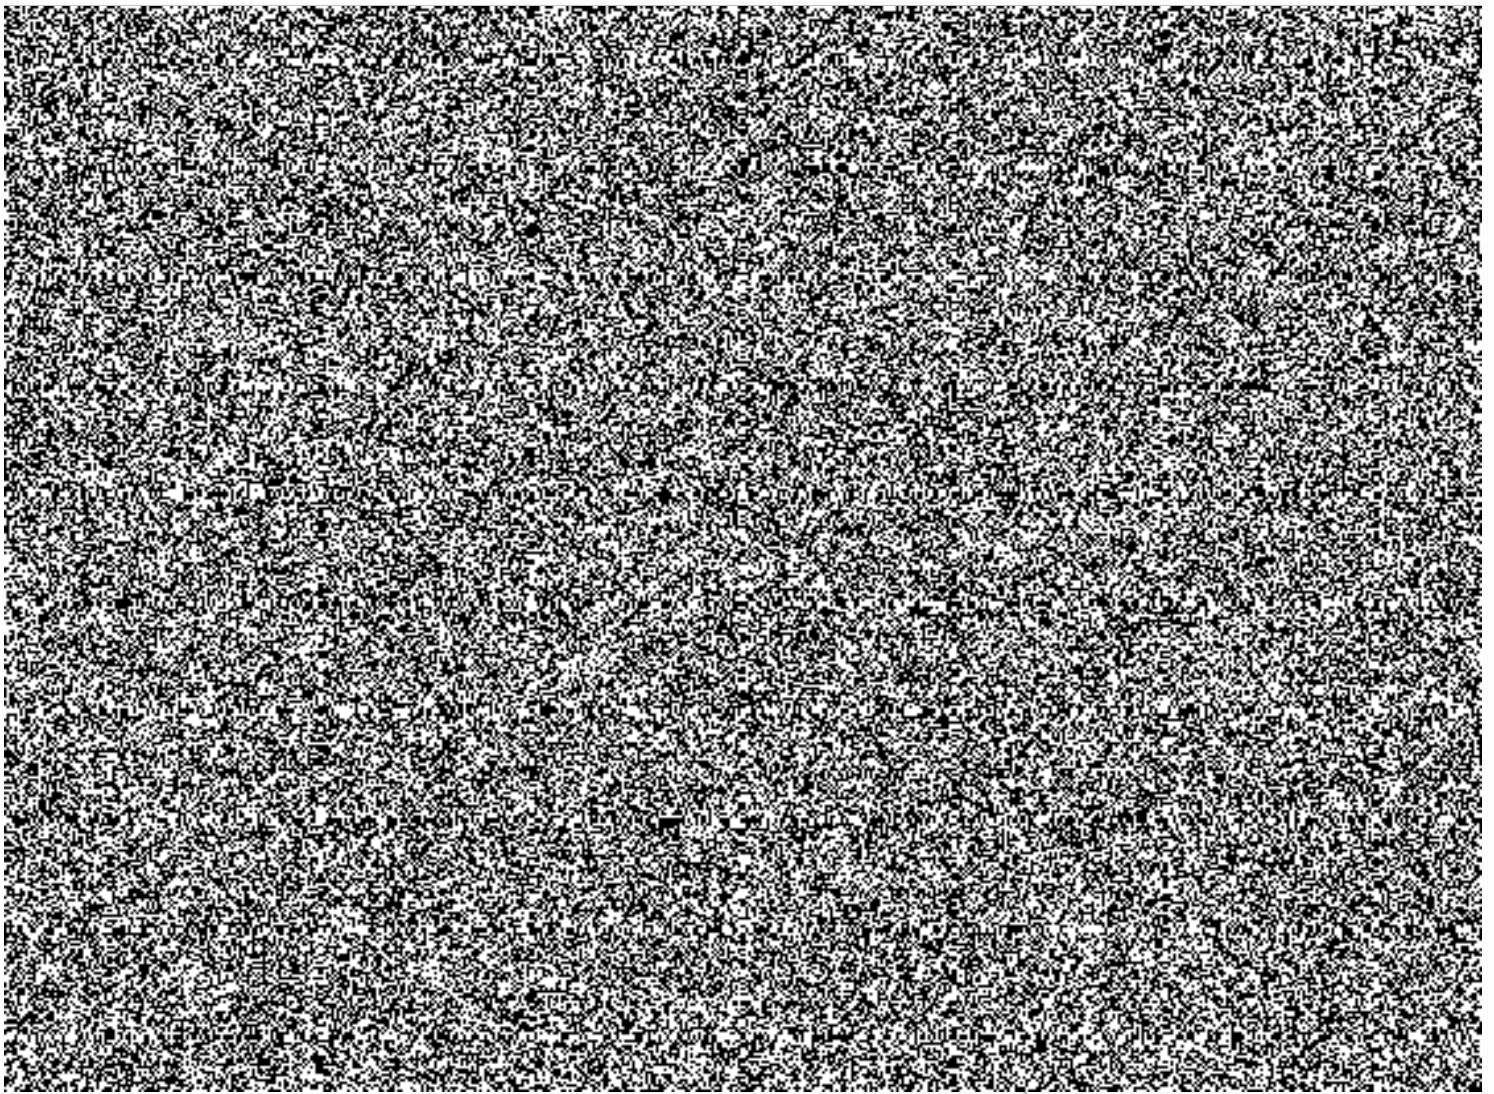


Změnový list číslo		26	Hasící přístroje	
Název akce:	"PS Znojmo - výstavba požární stanice "			
Číslo akce SMVS:				
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever			
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s.			
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 76, 623 00 Brno			
Předmět změnového listu				
Zrušení dodávky PHP				
Část díla dotčená změnovým listem				
SO 01 - Požární stanice, SO 02 Myčka, SO 03 Přístřešek pro automobily				
Popis změny, popis technického řešení				
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :				
Nové řešení :				
Zdůvodnění změny :				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
Ano				
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: ne				
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.				
Vliv na cenu:				
		Cena bez DPH		Cena s DPH (21%)
Přípočty k ceně díla:		- Kč		- Kč
Odpočty z ceny díla:		22 500,00 Kč	-	27 225,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		22 500,00 Kč	-	27 225,00 Kč
Fakturováno v	0%	- Kč	0%	- Kč
Změnu odsouhlasil	datum			
Zhotovitel : stavbyvedoucí	21. 09. 2017			
Zhotovitel : statutární zástupce	21. 09. 2017			
Projektant :	19. 09. 2017			
Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických	12. 10. 2017			
Objednatel : statutární zástupce	12. 10. 2017			

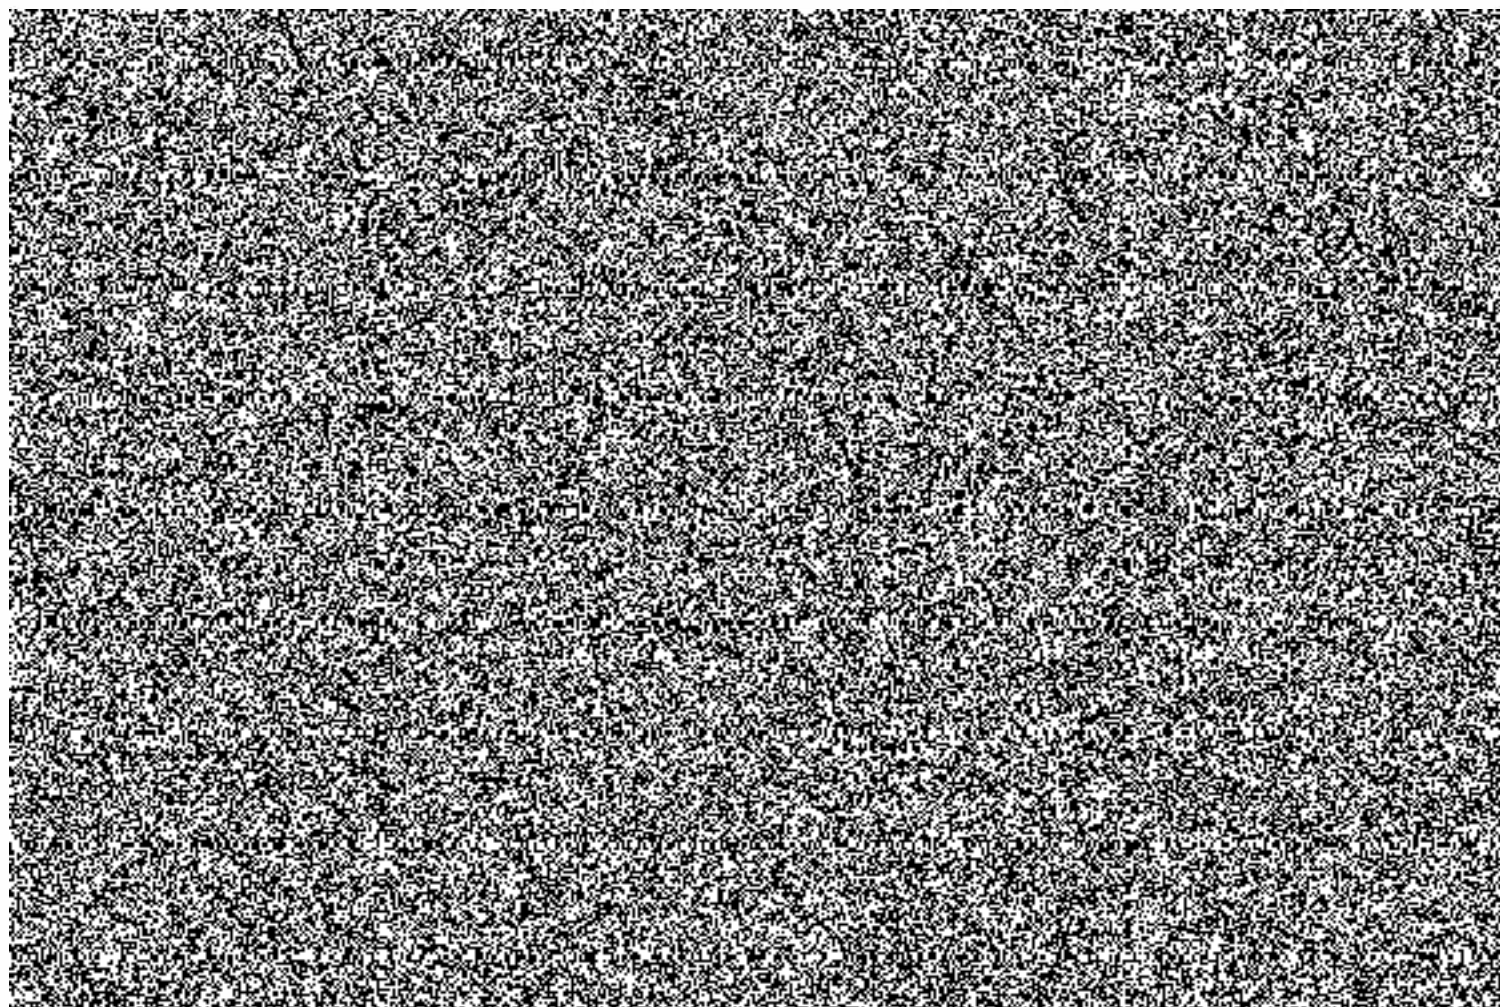

Změnový list číslo		27	Požární skluz	
Název akce:	"PS Znojmo - výstavba požární stanice "			
Číslo akce SMVS:				
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever			
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s.			
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 76, 623 00 Brno			
Předmět změnového listu				
Změna materiálu požárního skluzu				
Část díla dotčená změnovým listem				
SO 01 - Požární stanice				
Popis změny, popis technického řešení				
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :				
Skluz v provedení z oceli s polyuretanovým nátěrem.				
Nové řešení :				
Nerezový skluz.				
Zdůvodnění změny :				
Změna zadání materiálu.				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
ne				
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: ne				
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.				
Vliv na cenu:				
		Cena bez DPH		Cena s DPH (21%)
Přípočty k ceně díla:		86 580,00 Kč		104 761,80 Kč
Odpočty z ceny díla:	-	41 250,00 Kč	-	49 912,50 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		45 330,00 Kč		54 849,30 Kč
Fakturováno v	0%	- Kč	0%	- Kč
Změnu odsouhlasil	datum			
Zhotovitel : stavbyvedoucí	21. 09. 2017			
Zhotovitel : statutární zástupce	21. 09. 2017			
Projektant :	19. 09. 2017			
Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických	12. 10. 2017			
Objednatel : statutární zástupce	12. 10. 2017			

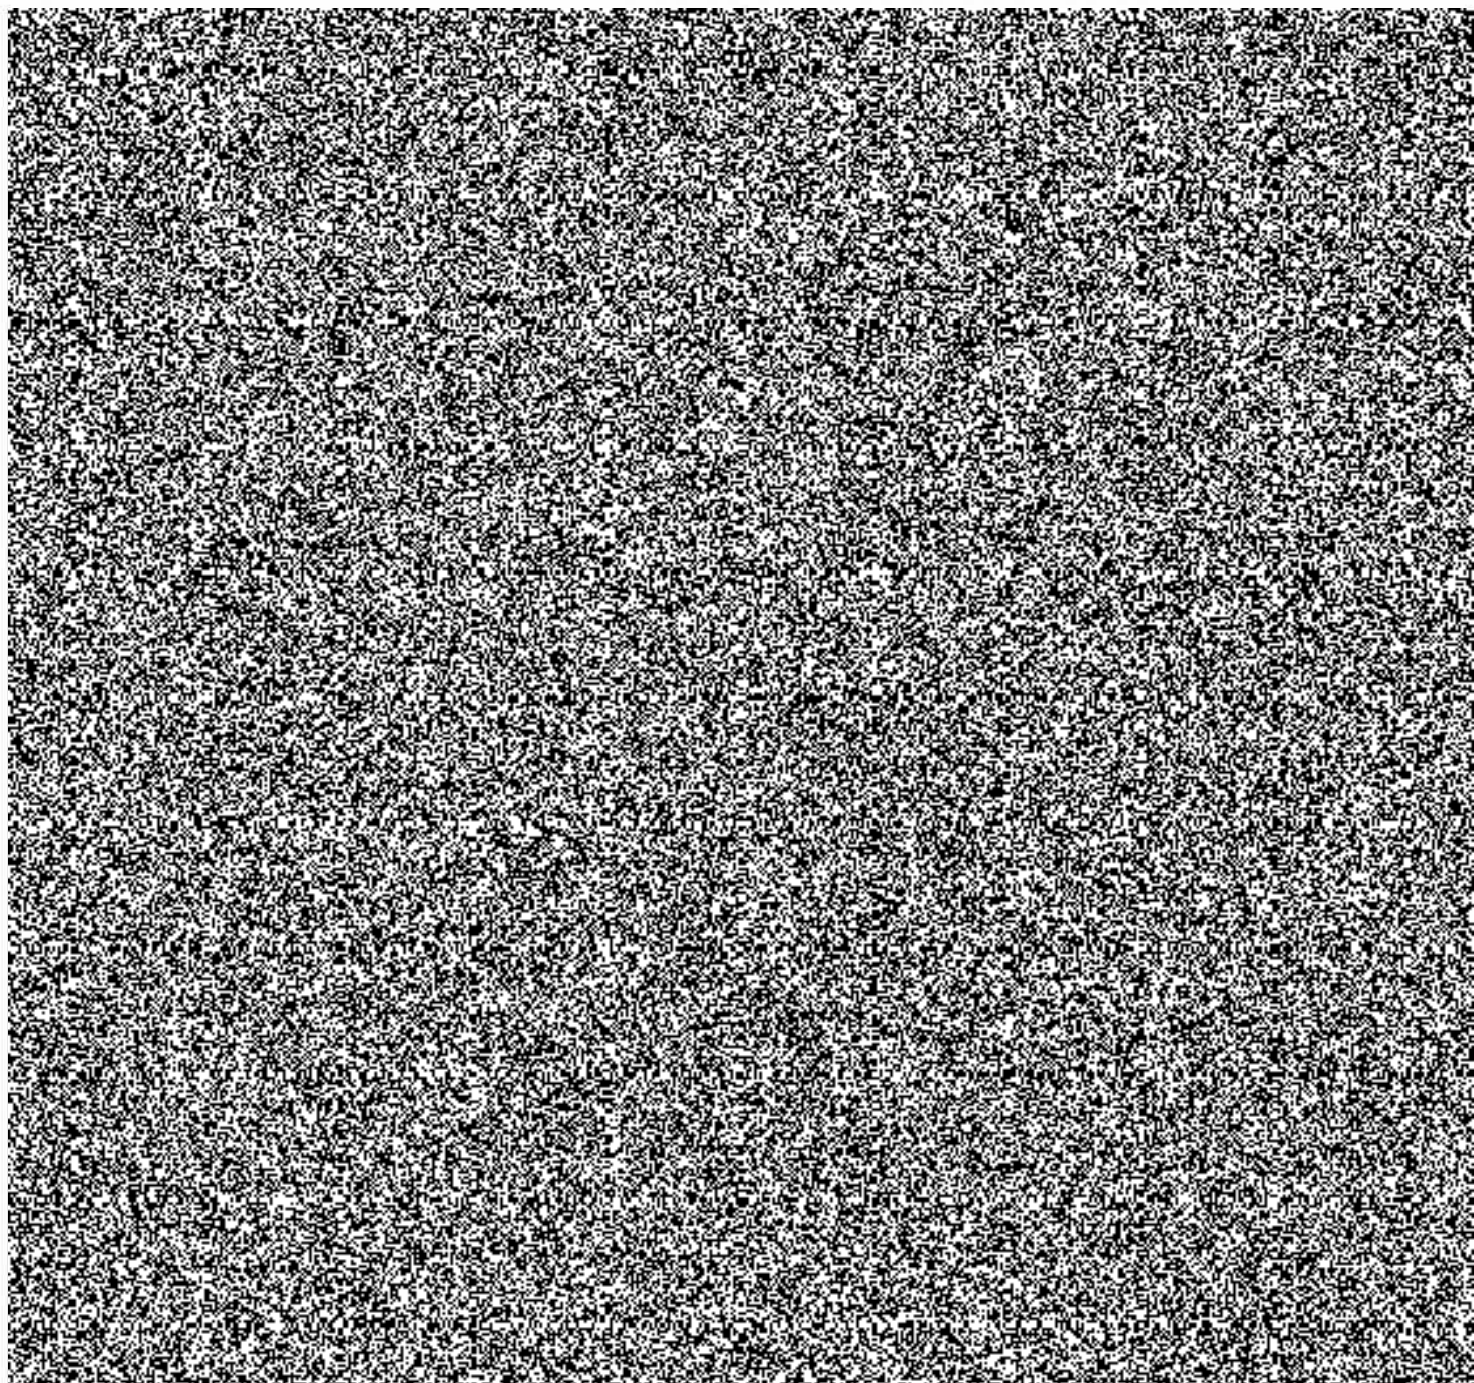


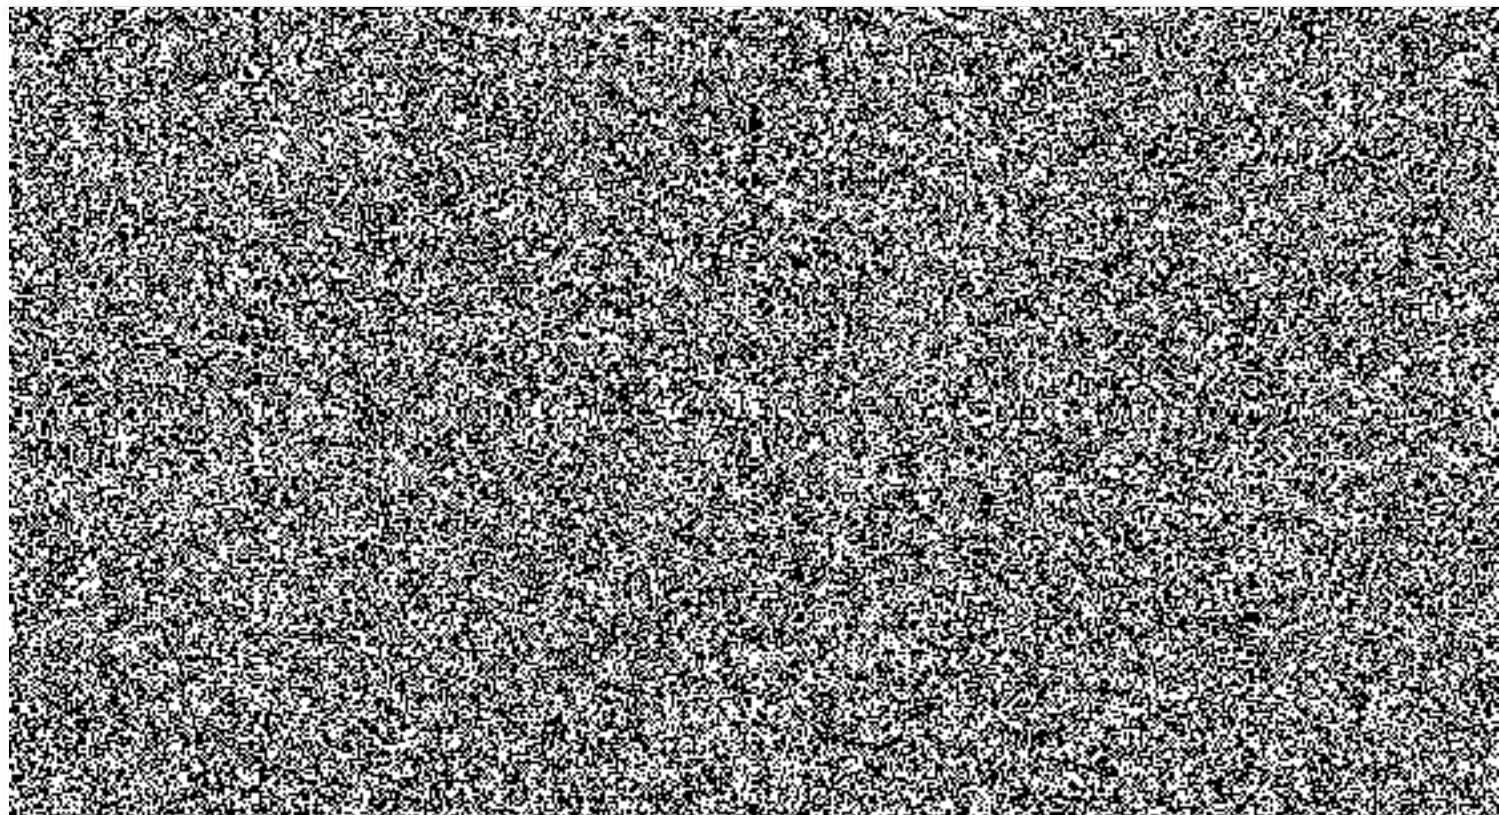

Změnový list číslo

18

Doskočiště u věže

Název akce:	"PS Znojmo - výstavba požární stanice "		
Číslo akce SMVS:			
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever		
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s.		
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 76, 623 00 Brno		
Předmět změnového listu			
Doplnění doskočiště u věže			
Část díla dotčená změnovým listem			
SO 01 - Požární stanice			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Chodník			
Nové řešení :			
Doskočiště			
Zdůvodnění změny :			
Požadavek uživatele			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: ne			
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.			
Vliv na cenu:			
		Cena bez DPH	Cena s DPH (21%)
Přípočty k ceně díla:		67 588,34 Kč	81 781,89 Kč
Odpočty z ceny díla:	-	22 394,40 Kč	27 097,22 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		45 193,94 Kč	54 684,66 Kč
Fakturováno v	0%	- Kč	0% - Kč
Změnu odsouhlasil	datum		
Zhotovitel : stavbyvedoucí	21. 09. 2017		
Zhotovitel : statutární zástupce	21. 09. 2017		
Projektant :	19. 09. 2017		
Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických	12. 10. 2017		
Objednatel : statutární zástupce	12. 10. 2017		

