

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 24. 10. 2016

číslo smlouvy objednatele č. 62-2-5313/2016






číslo smlouvy zhotovitele: 2016/022/418

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti na čl.

V. odst. 7 smlouvy o dílo  
(dále jen „dodatek“)







### Článek I. Smluvní strany

#### Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
IČO: 70884099  
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno  
Číslo účtu:   
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem  
Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla (dále jen „kontaktní osoba“): o. z. Libor Macháček  
E-mail:   
Telefon:   
Fax:   
Datová schránka:   
(dále jen „objednatel“)

a

#### První KEY-STAV, a.s.

Sídlo: Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada  
Kontaktní adresa: 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek  
IČO: 25385127  
DIČ: CZ25385127  
Její jmž jménem jedná: Roman Michlíček, předseda představenstva  
Ing. Petr Kabát, místopředseda představenstva  
Ing. Karel Krchňáček, člen představenstva  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek - Místek  
Číslo účtu:   
Zástupci zhotovitele, pověřeni řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „Kontaktní osoba(y)“):  
Ing. Petr Kabát  
E-mail:   
Telefon:   
E-mail:   
Telefon:   
Datová schránka:   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781  
(dále jen „zhotovitel“)



Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

## Článek II. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V.2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 10. 2016 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-5313/2016, ev. č. zhotovitele 2016/022/418, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2017 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných stavebních prací v celkové hodnotě 4 865 647,49 Kč vč. DPH (což je 4 021 196,25 Kč bez DPH) a vzhledem k nutnosti méněprací ve výši 1 677 286,10 Kč včetně DPH (což je 1 386 186,87 Kč bez DPH) se v návaznosti na změnové listy č. 2b, 5 až 18 a 20 až 27 odsouhlasené objednatelem a v návaznosti na čl. V. odst. 7 smlouvy mění čl. V. odst. 2 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o **3 188 361,39** Kč včetně DPH (což je 2 635 009,41 Kč bez DPH) – takto:

„Cena díla stanovená podle výše popsaných pravidel činí v Kč :

<b>CENA</b>	<b>cena bez DPH</b>	<b>DPH ( 21%)</b>	<b>cena vč. DPH</b>
<b>CELKEM</b>	<b>80 518 817,92</b>	<b>16 908 951,76</b>	<b>97 427 769,68</b>

(slovy: devadesátšedmmiliónůčtyřístadvacetsedmtisícšedmssetšedesátdevět korunčeskýchšedesátosm haléřů“)

3. Dále se vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných stavebních prací v návaznosti na změnové listy č. 2b, 5 až 18 a 20 až 27 odsouhlasené objednatelem a v návaznosti na čl. V. odst. 7 smlouvy mění čl. III.2 smlouvy, a to tak, že se zhotovitel zavazuje ukončit práce a dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději do 15. 12. 2017. Stavební objekt SO-02 „MYČKA POLICIE“ bude ve stavu stavební připravenosti pro osazení a instalaci technologie myčky předán nejpozději do 30. 11. 2017. Čl. III.2 smlouvy se mění takto:  
*Zhotovitel se u stavebního objektu SO-02 „MYČKA POLICIE“ zavazuje ukončit práce a dodávky na objektu do stavu stavební připravenosti pro osazení a instalaci technologie myčky a předat nejpozději do 30. 11. 2017. Celkově se zavazuje ukončit práce a dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději do 15. 12. 2017.*
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

## Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou následující dokumenty:
  - a) Změnový list č. 2b, 5 až 18 a 20 až 27





4. Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.



Za objednatele  
Českou republiku - Hasičský záchranný sbor  
Jihomoravského kraje  
plk. Ing. Jiří Pelikán  
krajský ředitel  
otisk razítka

Če  
Hasičský záchranný sbor  
Jihomoravského kraje  
614 00 Brno, Zubatého 1  
16


Za zhotovitele  
První KEY-STAV, a.s.  
Ing. Petr Kabát  
místopředseda představenstva

otisk razítka


**První KEY-STAV, a.s.**  
Lánská čp. 128, 739 61 Třinec  
tel.: +420 595 530 700  
GSM BRÁNA: +421 602 532 849 ©  
IČ: 25385127, DIČ: CZ25385127


Změnový list číslo		20	Provizorní podepření průvlaku	
Název akce:	"PS Znojmo - výstavba požární stanice "			
Číslo akce SMVS:				
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever			
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s.			
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 76, 623 00 Brno			
<b>Předmět změnového listu</b>				
Doplnění doskočiště u věže				
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>				
HTÚ, TI03 Zpevněné plochy				
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>				
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>				
Definitivní ocelové konstrukce podepření.				
<b>Nové řešení :</b>				
Dočasné zajištění stability průvlaku v ose 2' podpěrnou konstrukcí.				
<b>Zdůvodnění změny :</b>				
V době montáže ŽB skeletu nebyl k dispozici statický výpočet ocelové konstrukce podepření.				
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>				
Není				
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>				
SD 2, 9.6.2017				
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>				
Vliv na termín: ne				
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.				
Vliv na cenu:				
		<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH (21%)</b>	
<b>Přípočty k ceně díla:</b>		<b>11 366,45 Kč</b>	<b>13 753,41 Kč</b>	
<b>Odpočty z ceny díla:</b>		<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla:</b>		<b>11 366,45 Kč</b>	<b>13 753,41 Kč</b>	
<b>Fakturováno v</b>	<b>0%</b>	<b>- Kč</b>	<b>0%</b>	<b>- Kč</b>
<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>datum</b>			
Zhotovitel : stavbyvedoucí	23. 09. 2017			
Zhotovitel : statutární zástupce	23. 09. 2017			
Projektant :	19. 09. 2017			
Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických	12. 10. 2017			
Objednatel : statutární zástupce	12. 10. 2017			



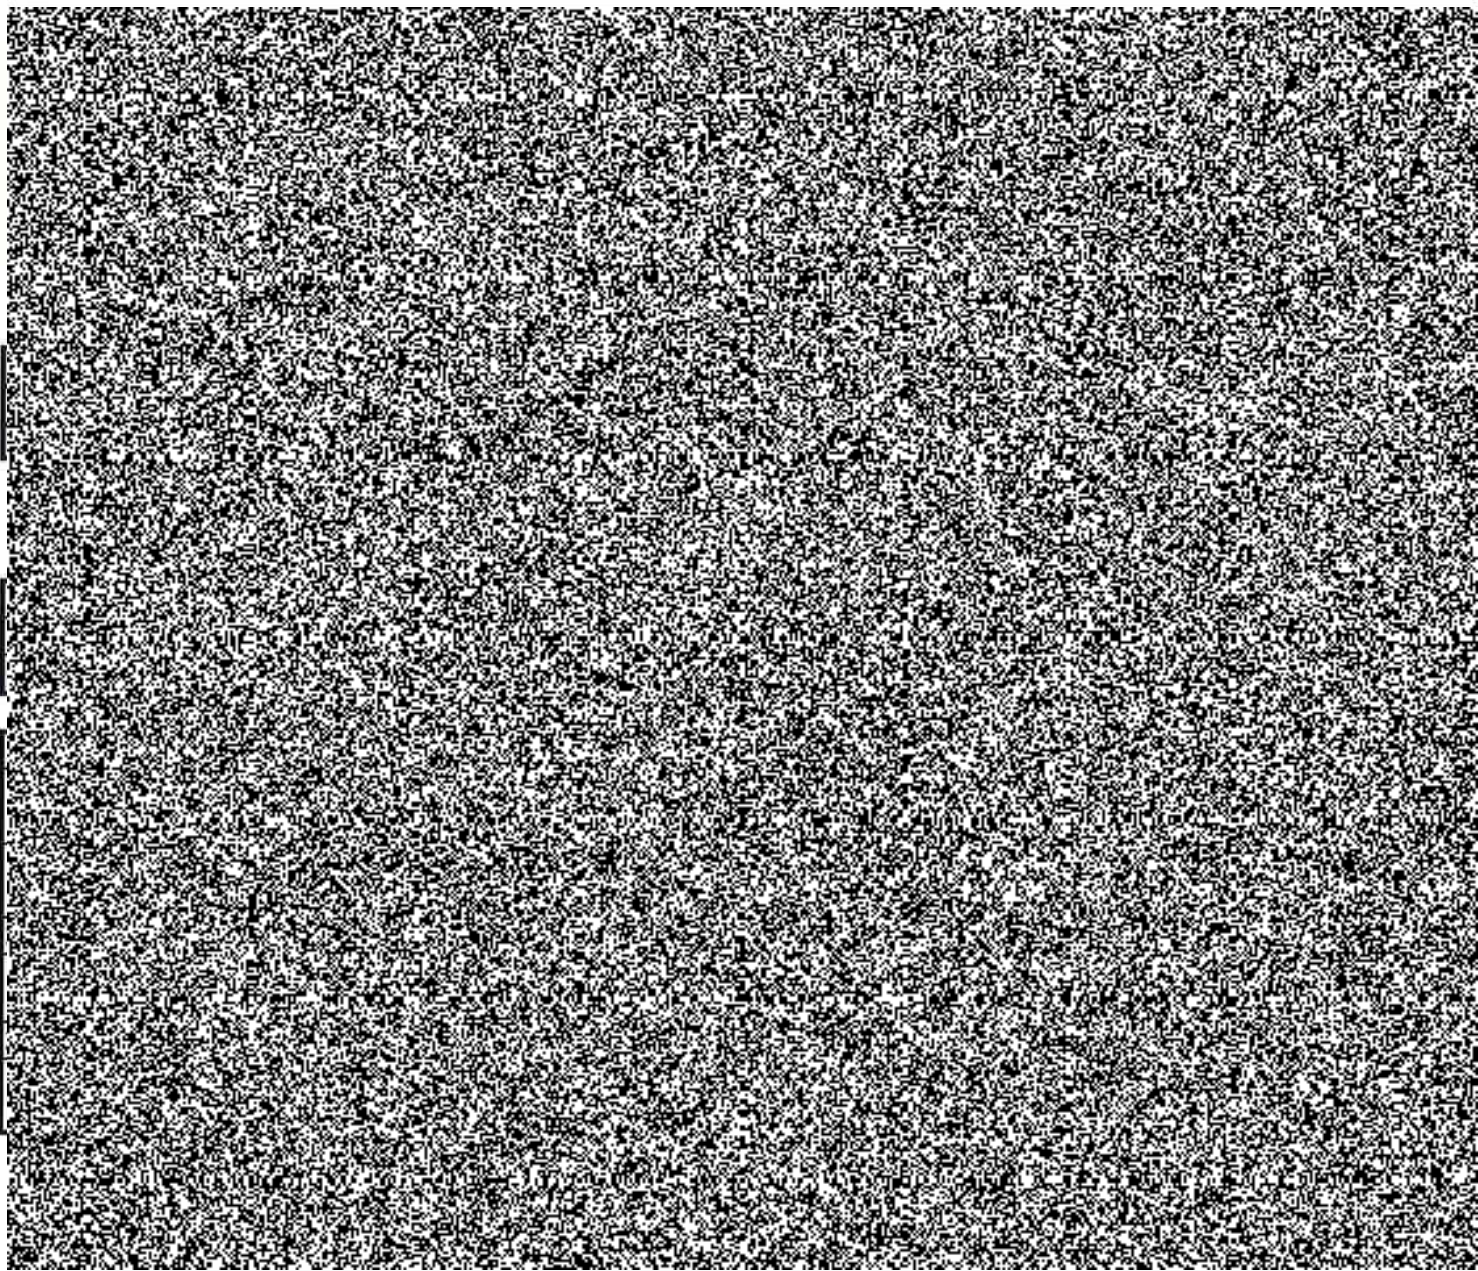




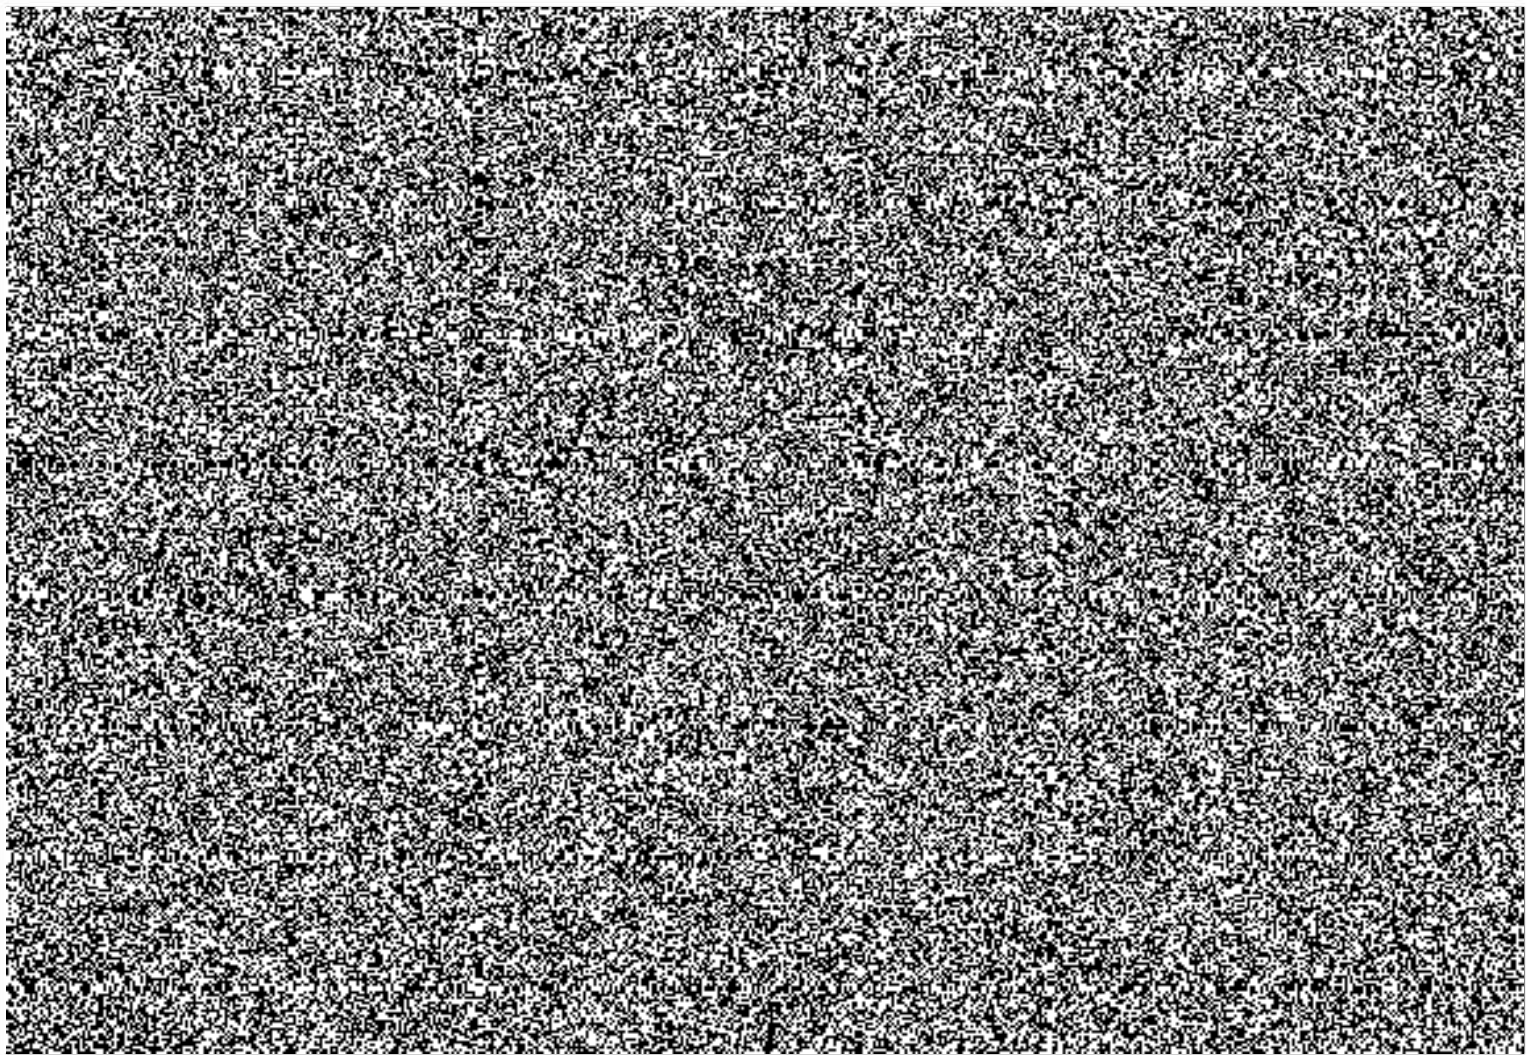


Změnový list číslo		21	Navýšení opěrné zdi vlevo	
Název akce:	"PS Znojmo - výstavba požární stanice "			
Číslo akce SMVS:				
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever			
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s.			
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 76, 623 00 Brno			
<b>Předmět změnového listu</b>				
Opěrná stěna vjezdu vlevo				
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>				
SO 01				
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>				
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>				
Původní základová spára v zámrzné hloubce				
<b>Nové řešení :</b>				
Navýšení zdi o 0,60 m z důvodu snížení úrovně základové spáry o 60 cm.				
<b>Zdůvodnění změny :</b>				
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>				
Ano				
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>				
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>				
Vliv na termín: ne				
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.				
Vliv na cenu:				
		<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH (21%)</b>	
<b>Přípočty k ceně díla:</b>		<b>63 382,15 Kč</b>	<b>76 692,40 Kč</b>	
<b>Odpočty z ceny díla:</b>		<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla:</b>		<b>63 382,15 Kč</b>	<b>76 692,40 Kč</b>	
<b>Fakturováno v</b>	<b>0%</b>	<b>- Kč</b>	<b>0%</b>	<b>- Kč</b>
<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>datum</b>			
Zhotovitel : stavbyvedoucí	21. 09. 2017			
Zhotovitel : statutární zástupce	21. 09. 2017			
Projektant :	10. 09. 2017			
Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických	12. 10. 2017			
Objednatel : statutární zástupce	12. 10. 2017			



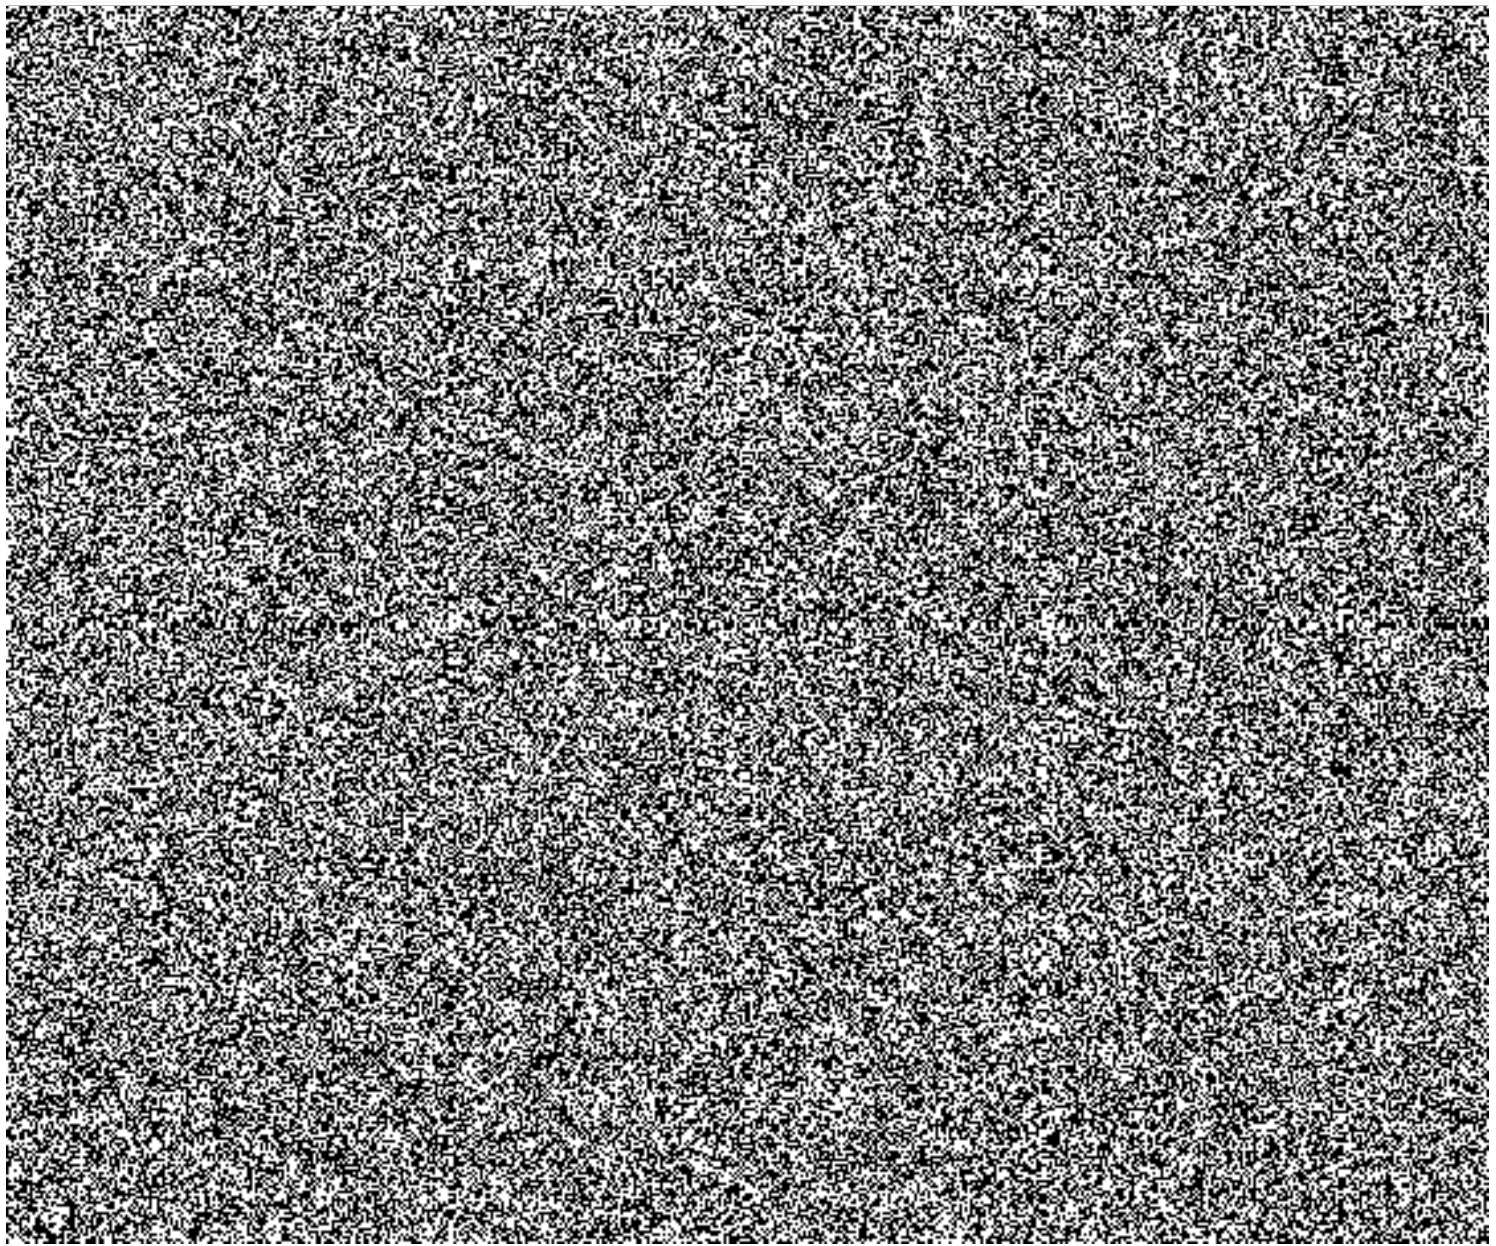



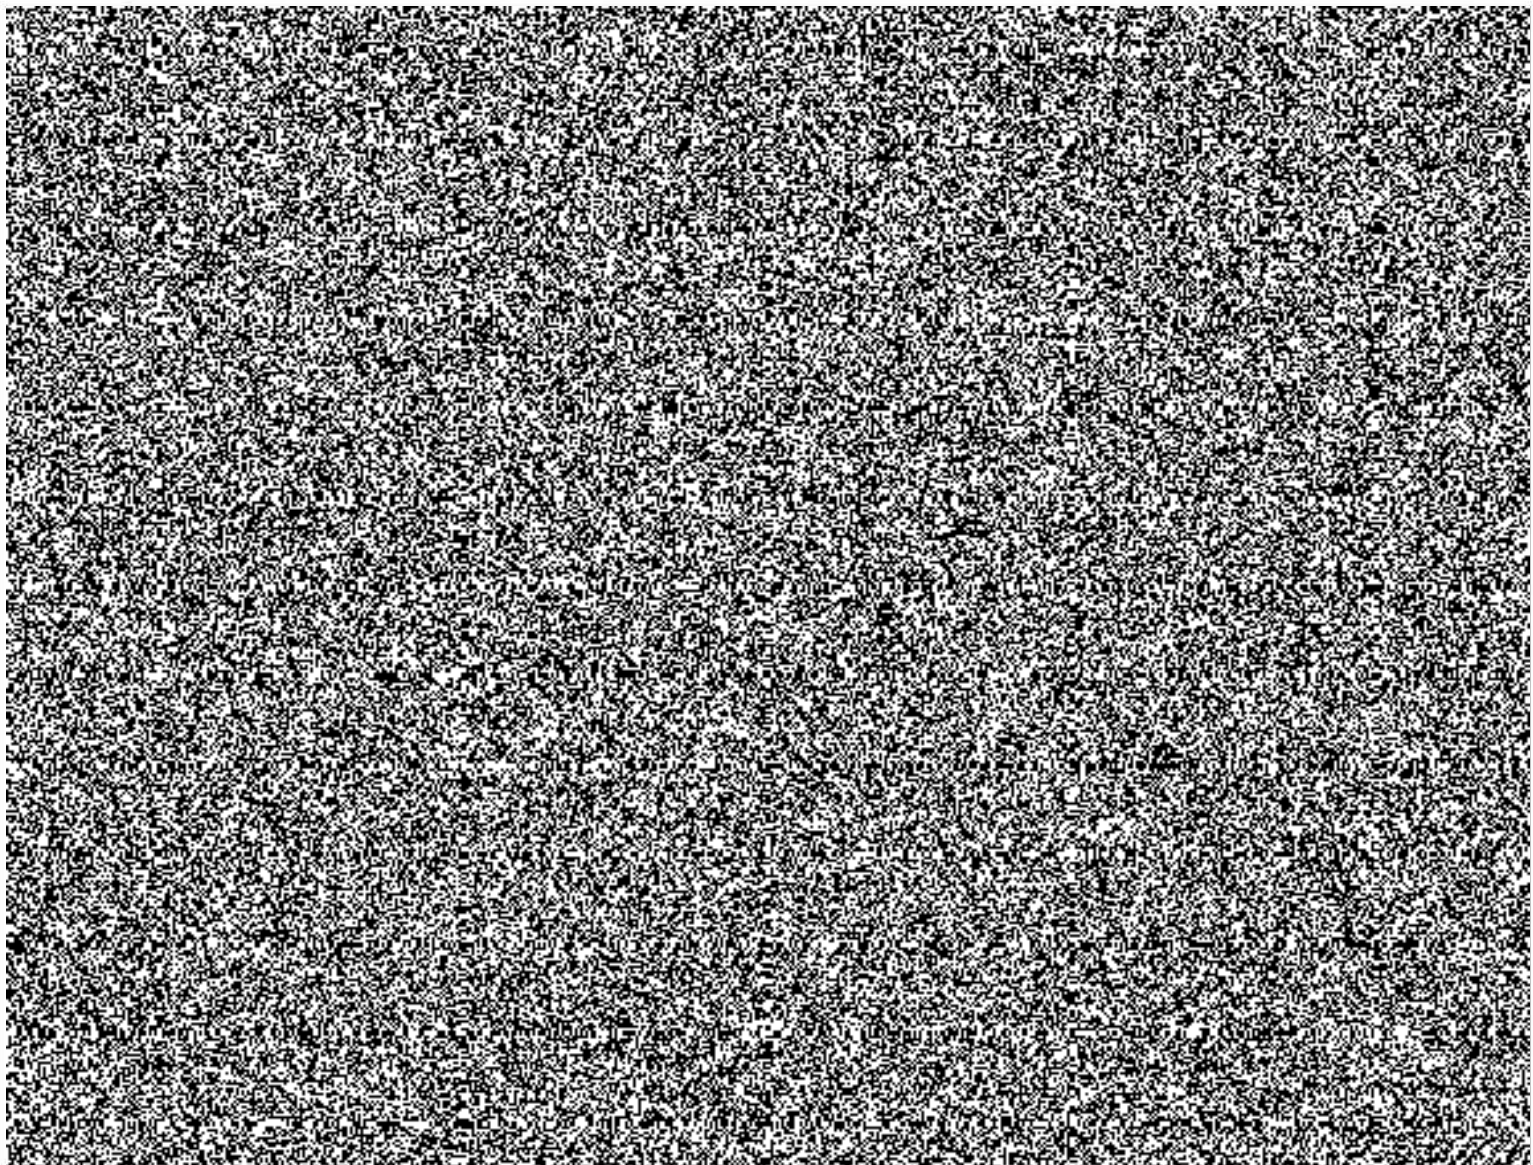



## Změnový list číslo

22

## Demontáž stávající opěrné stěny

Název akce:	"PS Znojmo - výstavba požární stanice "
Číslo akce SMVS:	
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s.
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 76, 623 00 Brno

## Předmět změnového listu

Opěrná stěna vjezdu vlevo

## Část díla dotčená změnovým listem

SO 01

## Popis změny, popis technického řešení

## Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

## Nové řešení :

Demontáž části stávající opěrné stěny s odstraněním ocelových sloupků z I profilů, odstranění křovin v horní části včetně úpravy pláně.

## Zdůvodnění změny :

## Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Není

## Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

## Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne


Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.

Vliv na cenu:


	Cena bez DPH	Cena s DPH (21%)
<b>Přípočty k ceně díla:</b>	<b>34 613,89 Kč</b>	<b>41 882,81 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla:</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla:</b>	<b>34 613,89 Kč</b>	<b>41 882,81 Kč</b>
<b>Fakturováno v</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>

Změnu odsouhlasil	datum
Zhotovitel : stavbyvedoucí	21. 09. 2017
Zhotovitel : statutární zástupce	21. 09. 2017
Projektant :	19. 09. 2017
Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických	12. 10. 2017
Objednatel : statutární zástupce	12. 10. 2017




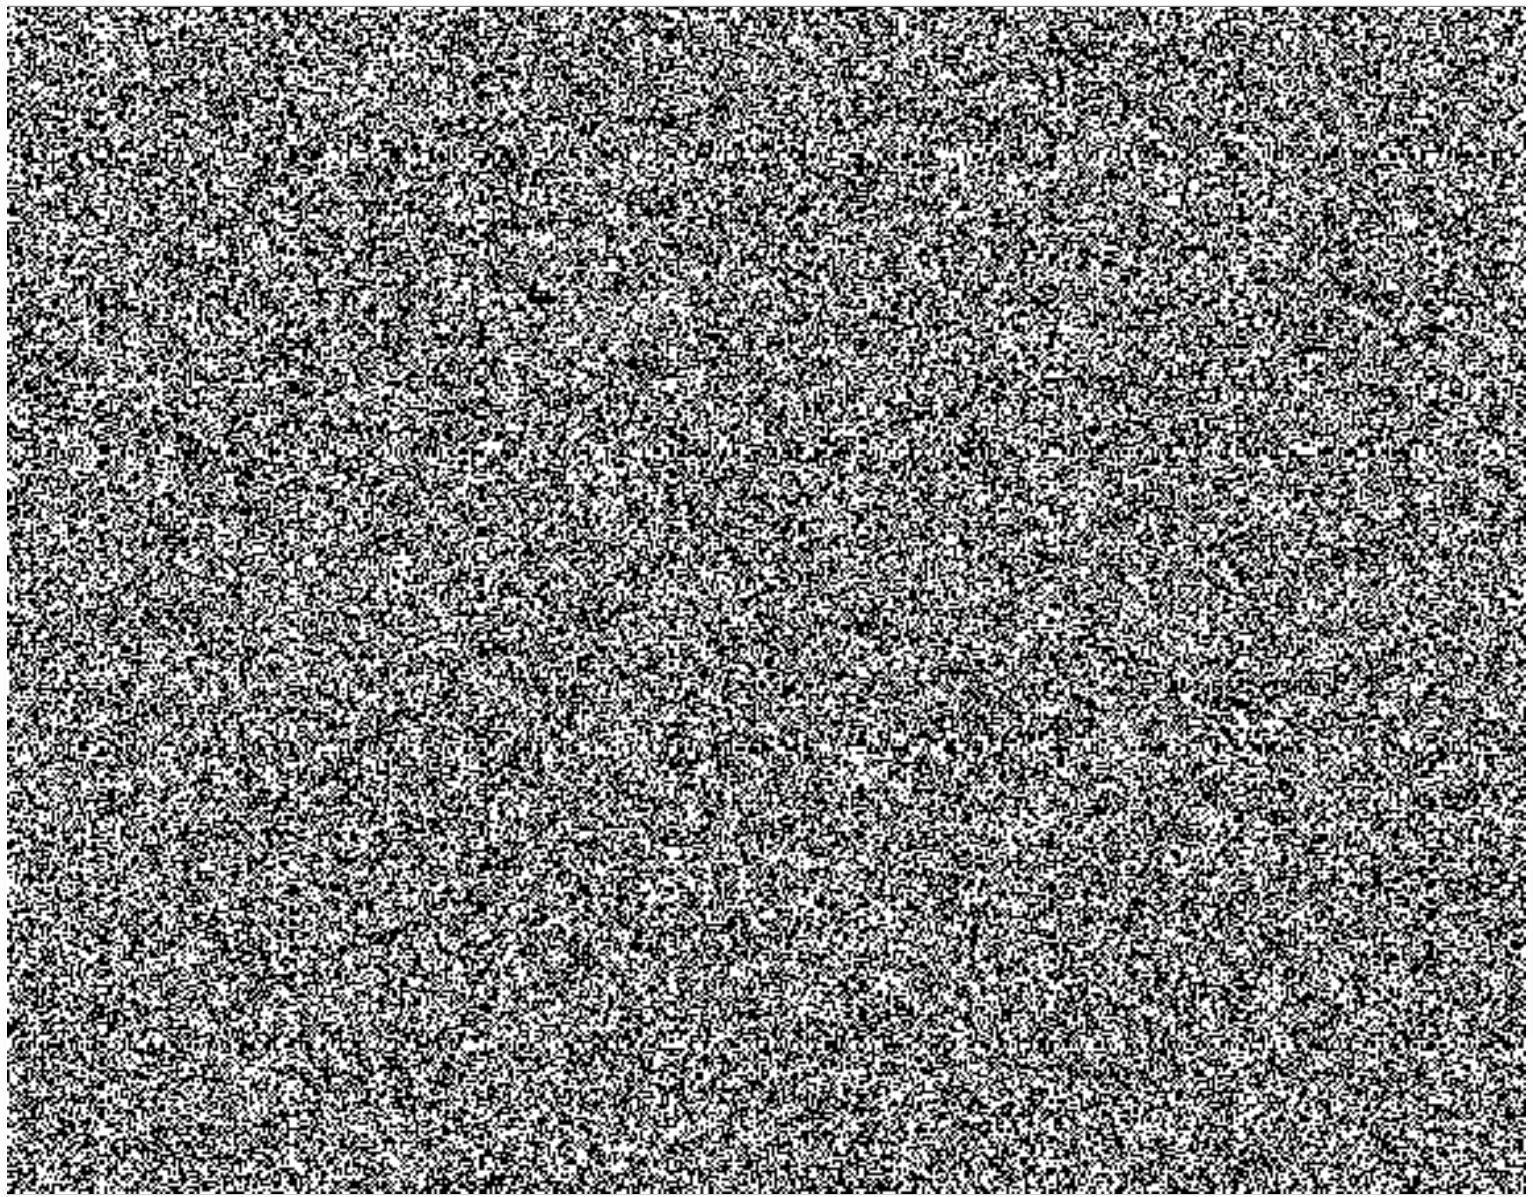



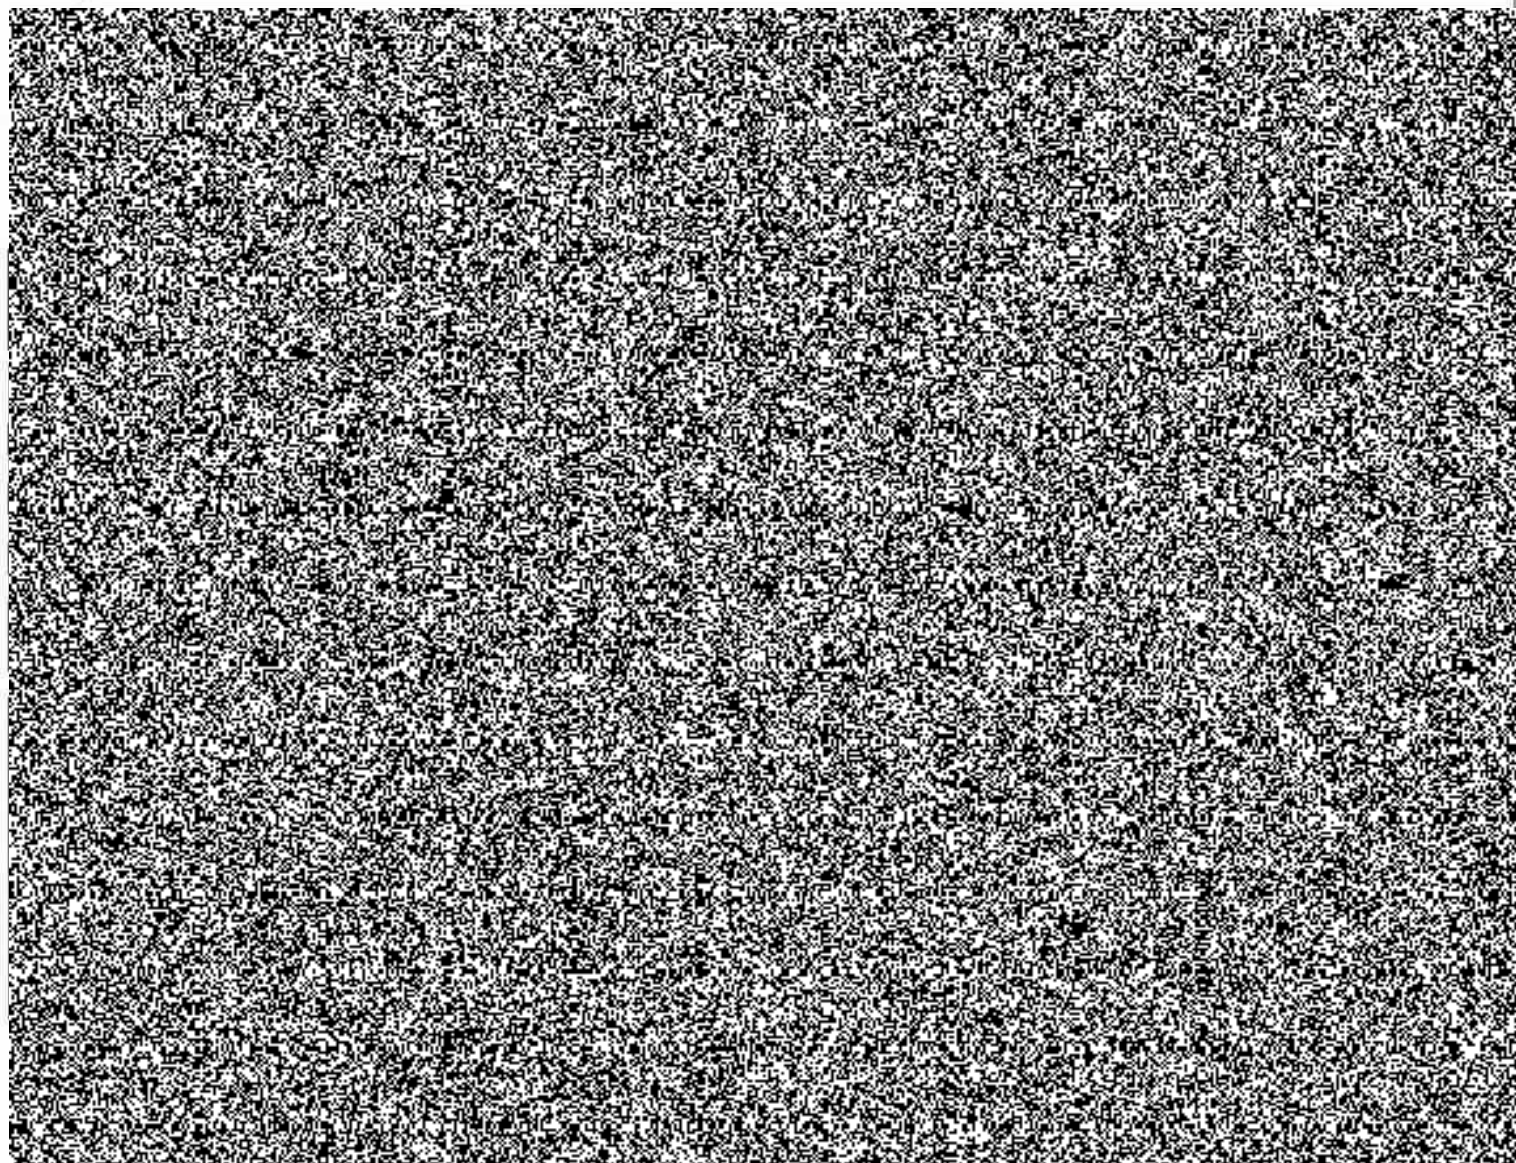



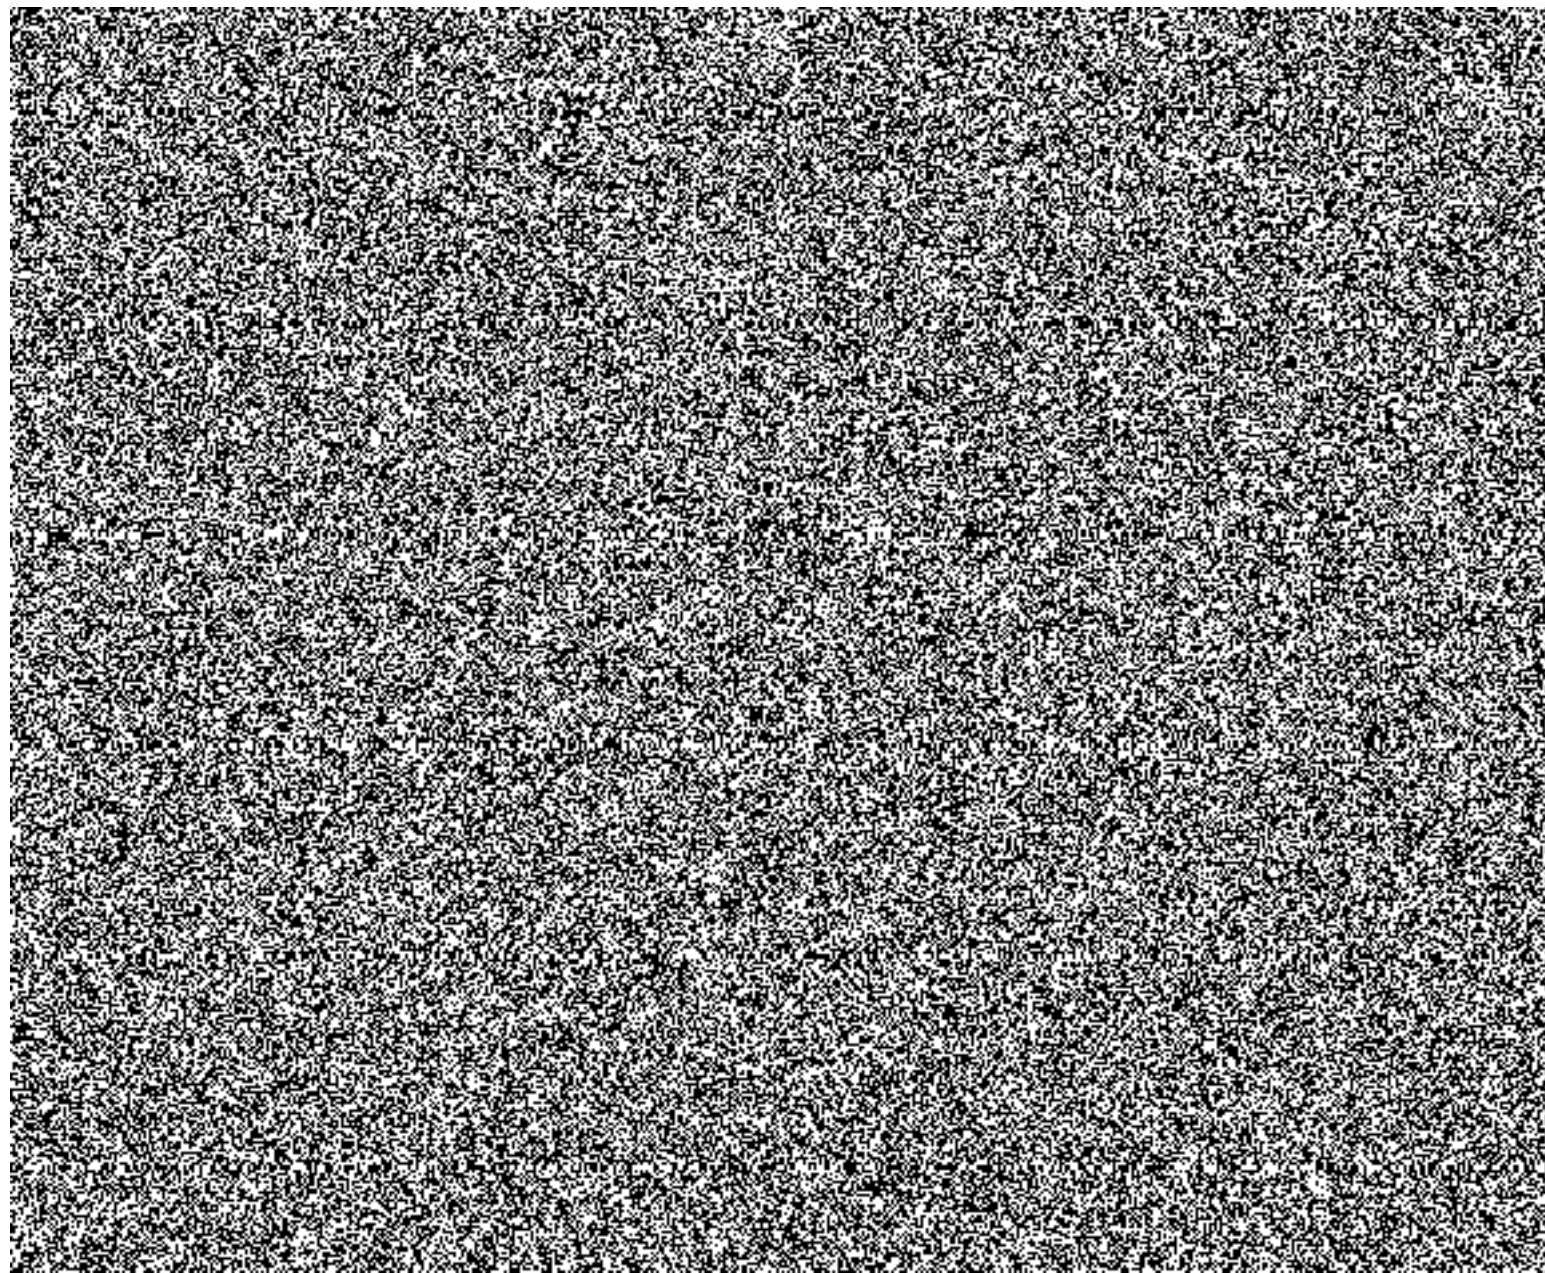



## Změnový list číslo

23

## Revize Slaboproudu č 1

Název akce:	"PS Znojmo - výstavba požární stanice "
Číslo akce SMVS:	
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s.
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 76, 623 00 Brno

## Předmět změnového listu

Revize Slaboproudu č 1

## Část díla dotčená změnovým listem

SO 01

## Popis změny, popis technického řešení

## Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

## Nové řešení :

Revize Slaboproudu č. 1

## Zdůvodnění změny :

Změna zadání

## Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ano

## Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

## Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ano


Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.

Vliv na cenu:


	Cena bez DPH	Cena s DPH (21%)
Přípočty k ceně díla:	284 005,23 Kč	343 646,33 Kč
Odpočty z ceny díla:	- 67 155,00 Kč	- 81 257,55 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	216 850,23 Kč	262 388,78 Kč
Fakturováno v	0% - Kč	0% - Kč

Změnu odsouhlasil	datum
Zhotovitel : stavbyvedoucí	21. 09. 2017
Zhotovitel : statutární zástupce	21. 09. 2017
Projektant :	19. 09. 2017
Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických	12. 10. 2017
Objednatel : statutární zástupce	12. 10. 2017




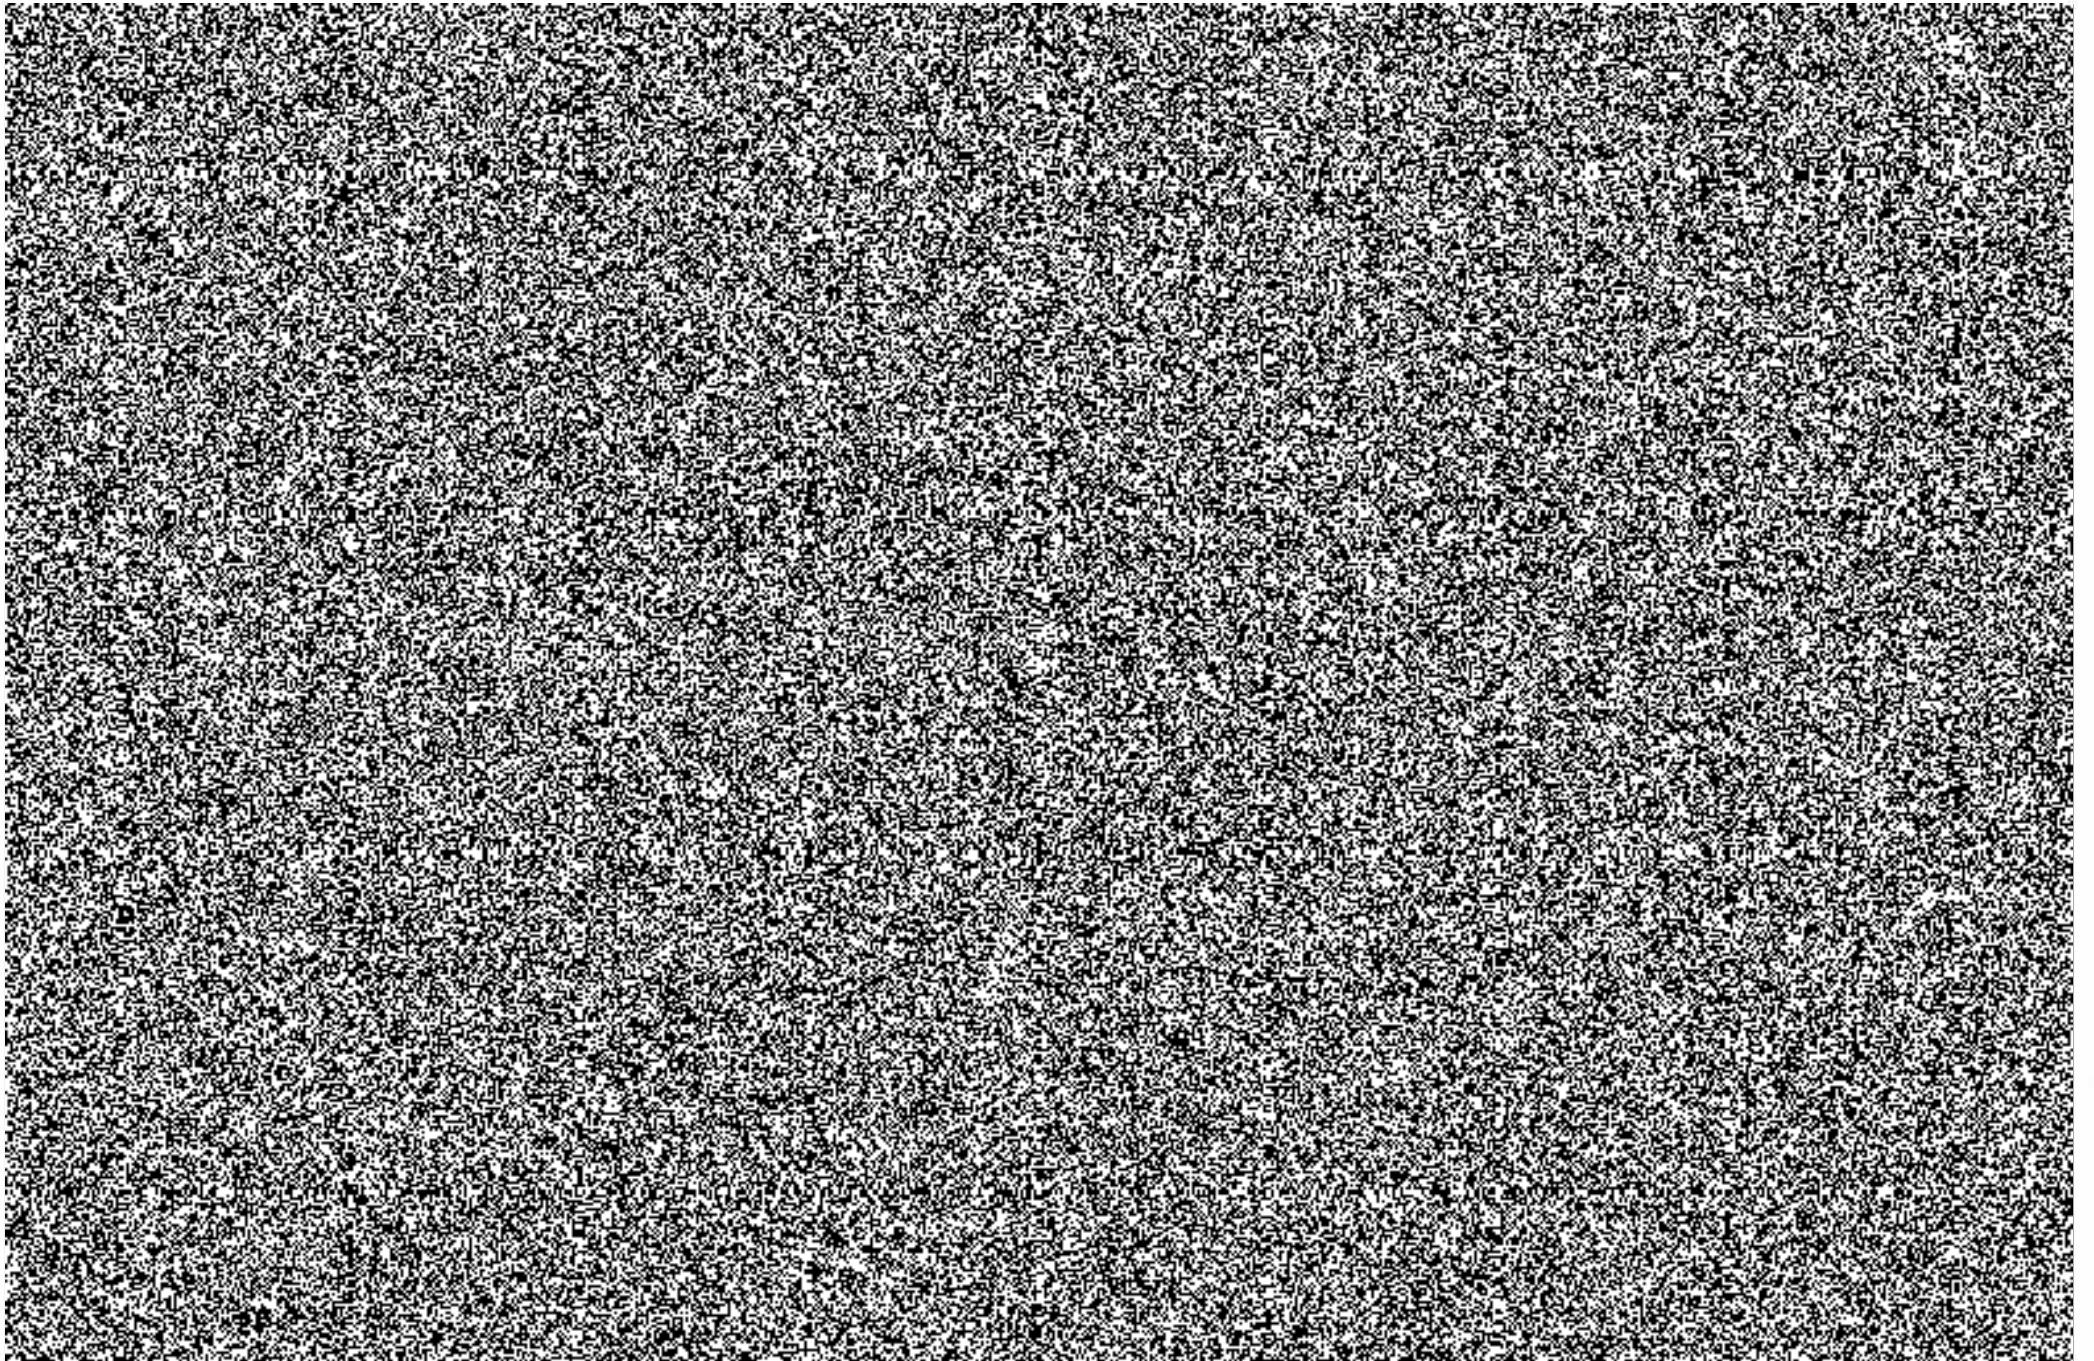



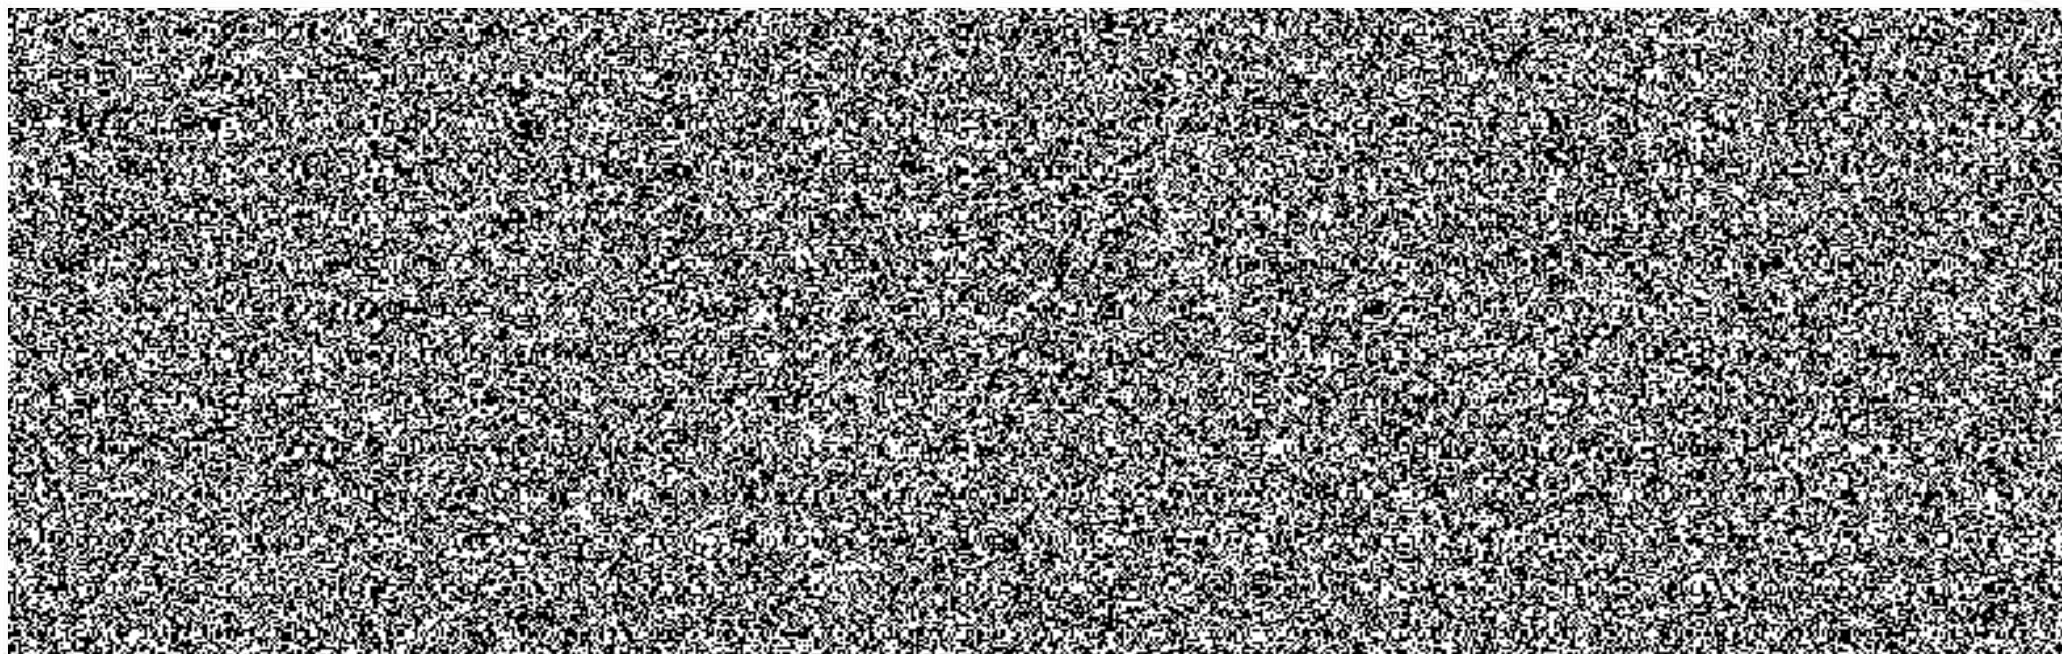



Změnový list číslo		13	SO 01 - ŽB jímka
Název akce:	"PS Znojmo - výstavba požární stanice "		
Číslo akce SMVS:			
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever		
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s.		
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 76, 623 00 Brno		
<b>Předmět změnového listu</b>			
Montážní jímka v garáži SO 01 v ose 2 - 3			
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>			
SO 01 - Požární stanice			
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>			
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>			
Chybí ve výkazu výměř			
<b>Nové řešení :</b>			
Doplněno do výkazu výměř			
<b>Zdůvodnění změny :</b>			
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>			
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>			
SD 1 str 418420, 418426			
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>			
Vliv na termín: ne			
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.			
Vliv na cenu:			
		<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH (21%)</b>
<b>Přípocety k ceně díla:</b>		<b>181 644,45 Kč</b>	<b>219 789,78 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla:</b>		<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla:</b>		<b>181 644,45 Kč</b>	<b>219 789,78 Kč</b>
<b>Fakturováno v</b>	<b>0%</b>	<b>- Kč</b>	<b>0% - Kč</b>
<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>datum</b>		
Zhotovitel : stavbyvedoucí	23.09.2017		
Zhotovitel : statutární zástupce	13.09.2017		
Projektant :	10.09.2017		
Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických	12.10.2017		
Objednatel : statutární zástupce	12.10.2017		



