



KUJIP0184VS6

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 15. 3. 2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na akci

„SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod – půdní vestavba“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické:	Ing. Radomír Janů
tel.:	564602283
IČO:	70890749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

Zhotovitel:	ATOS, spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou
se sídlem	Husovo náměstí 139,584 01 Ledeč nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Jaroslavem Brodilem a Miroslavem Tichým – jednateli společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Jaroslav Brodil
zástupce pro věci technické:	Milan Kruml
Tel./fax:	569 731 200
IČO:	620 28 081
DIČ:	CZ62028081
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	2792220237/0100
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 3. 2017 je změna termínu dokončení díla v důsledku okolností nezávinných zhotovitelem, a to nabytí právní moci stavebního povolení dne 21. 6. 2017 a následného zahájení prací dne 3. 7. 2017 oproti předpokládanému termínu zahájení prací (3/2017).

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 3 a 13 Smlouvy uzavřely následující dodatek, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Článek 3. Termín a místo plnění, staveniště, odst. 3.3. nově zní takto:

3.3. Předmět díla bude dokončen nejpozději: **31. 3. 2018**

Smluvní strany dále sjednávají v rámci realizace díla dílčí termín pro dokončení krytiny objektu, a to nejpozději do **30. 11. 2017**

Výše uvedený termín vyplývá z Harmonogramu stavebních prací, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Zhotovitel současně prohlašuje, že bude respektovat Dohodu o dočasném záboru pozemku pro stavbu mezi Tiskárnami Havlíčkův Brod a.s. a Krajem Vysočina. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla, nerespektováním Dohody o dočasném záboru pozemku pro stavbu nebo nedokončením krytiny v termínu uhradí na svůj náklad zhotovitel.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.


Příloha: Harmonogramu stavebních prací

V Havlíčkově Brodě 5. 10. 2017

V Jihlavě 18. 10. 2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:


ATOS s.p.a.
HUSOVONAM 139 ©
LEDFO NA SÁZAVOU
IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081
tel.: 569 734 200 fax: 569 720 887


Ing. Jaroslav Brodík
jednatel


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

43

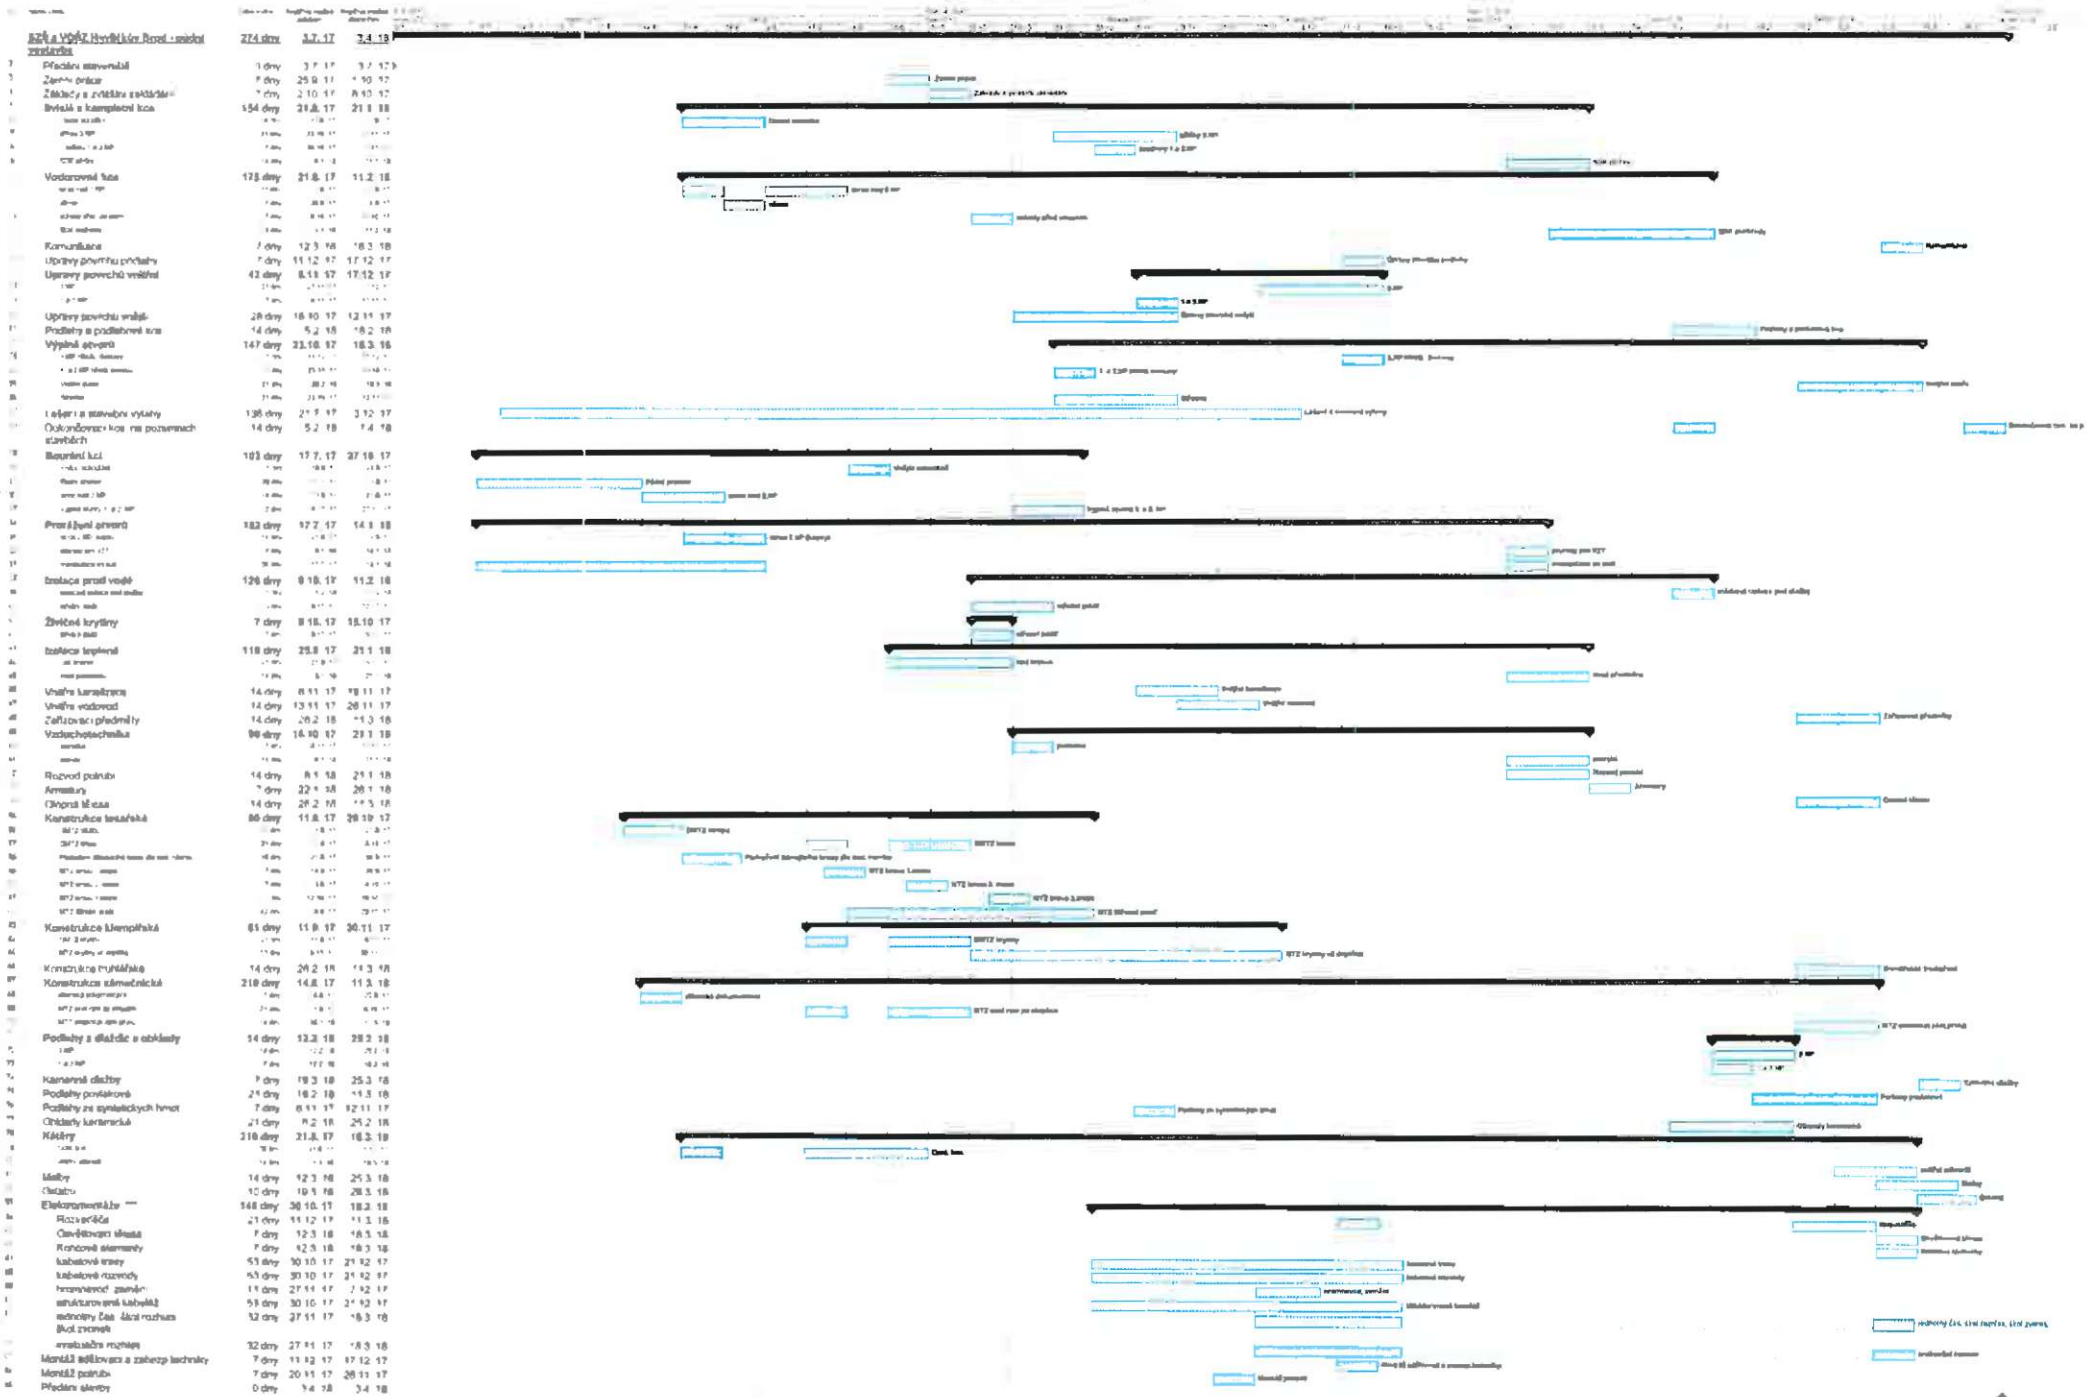


Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmana kraje
pro oblast ekonomiky a majetku


ATOS s.p.a.
HUSOVONAM 139 ©
LEDFO NA SÁZAVOU
IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081
tel.: 569 734 200 fax: 569 720 887

Miroslav Tichý
jednatel

Harmonogram stavebních prací



*** Elektromontáže realizované ve stávající části budovy (mimo rekonstruovanou část), budou probíhat pouze o víkendech a prázdninách
