

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. A3817_019

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
vč. příslušných obecných ustanovení téhož zákoníku mezi stranami

I. Smluvní strany

Objednatel: **Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace**
Se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Čs. legií 148/14
zastoupená: Jiřím Nekvasilem, ředitelem organizace
IČ: 00100528
DIČ: CZ00100528

a

Zhotovitel: **ATELIER 38 s.r.o.**
Se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupená: Vladimírem Milatou, jednatelem společnosti
IČ: 258 58 343
DIČ: CZ25858343
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Tel: 
E-mail: 

Článek 1 Dodatku.

Smluvní strany uzavřely dne 22.05.2017 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele pro změnu využití stavby „**Pavilon G, Černá Louka, Ostrava**“ včetně zajištění stavebního povolení. K této smlouvě smluvní strany dne 22.08.2017 uzavřely Dodatek č.1. Pro označení smlouvy ve znění Dodatku se dále používá pojem Smlouva.

Na základě Dodatku č.1 Smlouvy měl zhotovitel objednateli předat projektovou dokumentaci do 31.10.2017.

Dne 21.09.2017 bylo objednatelem rozhodnuto o nerealizaci záměru dočasné divadelní scény ve stávajícím objektu Pavilonu G z ekonomických důvodů, kdy nároky DOSS, zvláště pak HZS MSK ve věci požární ochrany objektu byly vyhodnoceny jako neúměrně vysoké už ve vazbě na dočasnost programu divadelní scény v záměru.

Po dohodě smluvních stran bude projektová dokumentace vypracována dle nového zadání objednatele, které je Přílohou tohoto Dodatku č.2.

Na základě změny zadání předložil zhotovitel objednateli cenovou analýzu víceprací a méněprací, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2.

S ohledem na změnu zadání se smluvní strany dohodli, že termín pro předání projektové dokumentace se stanovuje na 30.04.2018.

Článek 2. Dodatku.

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na změně:

Článek III odst. 1 Smlouvy – stanovení nového termínu vypracování projektové dokumentace:

Dodatek č. 2 ke smlouvě na vypracování projektové dokumentace „Pavilon G, černá louka, Ostrava“ DSP+DPS+IČ

- Projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele včetně plánu BOZP a rozpočtu / výkazu výměr nejpozději do 30.04.2018.
- Zajištění stavebního povolení v termínu dle správních lhůt veřejnoprávních orgánů.

Článek 2 Dodatku.

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na změně: Článku II odst. 1 Smlouvy – Předmět plnění („dílo“).

1. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zadáním objednatele ze dne 22.09.2017. Specifikace zadání je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Článek 3 Dodatku.

Na základě cenové analýzy víceprací a méněprací v poměru: Vícepráce + 50 %, Méněpráce: - 20 % se tímto dodatkem mění cena díla dle článku IV, odstavec 1 a je následující:

IV. Cena díla

1. Celková cena díla činí:

Položka č.	Popis	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
1	Vypracování Projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele včetně plánu BOZP a rozpočtu / výkazu výměr	866.000	181.860	1.047.860
2	Zajištění stavebního povolení v právní moci	65.000	13.650	78.650
3	Účast v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby v rozsahu dle článku II., odst. 1, písm. e) této smlouvy	5.000	1.050	6.050
	CELKEM	936.000	196.560	1.132.560

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění dle této smlouvy.

Článek 4 Dodatku.

Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý je originálem. Po jejich potvrzení obdrží každá ze smluvních stran po dvou vyhotoveních.

Příloha:

Cenová analýza

Zadání – specifikace předmětu díla

V Ostravě dne: 12.10.2017

V Ostravě dne 12.10.2017

Za zhotovitele:
Vladimír Milata – jednatel společnosti

Za objednatele:
Jiří Nekvasil – ředitel organizace


Příloha číslo 1 (cenová analýza):

Vícepráce:

Komplexní řešení obálky budovy včetně stavebních zásahů + řešení venkovního prostoru, nástupní schodiště, širší vztahy.

Méněpráce:

Neřešení elevace hlediště, divadelní techniky, prostorové akustiky.

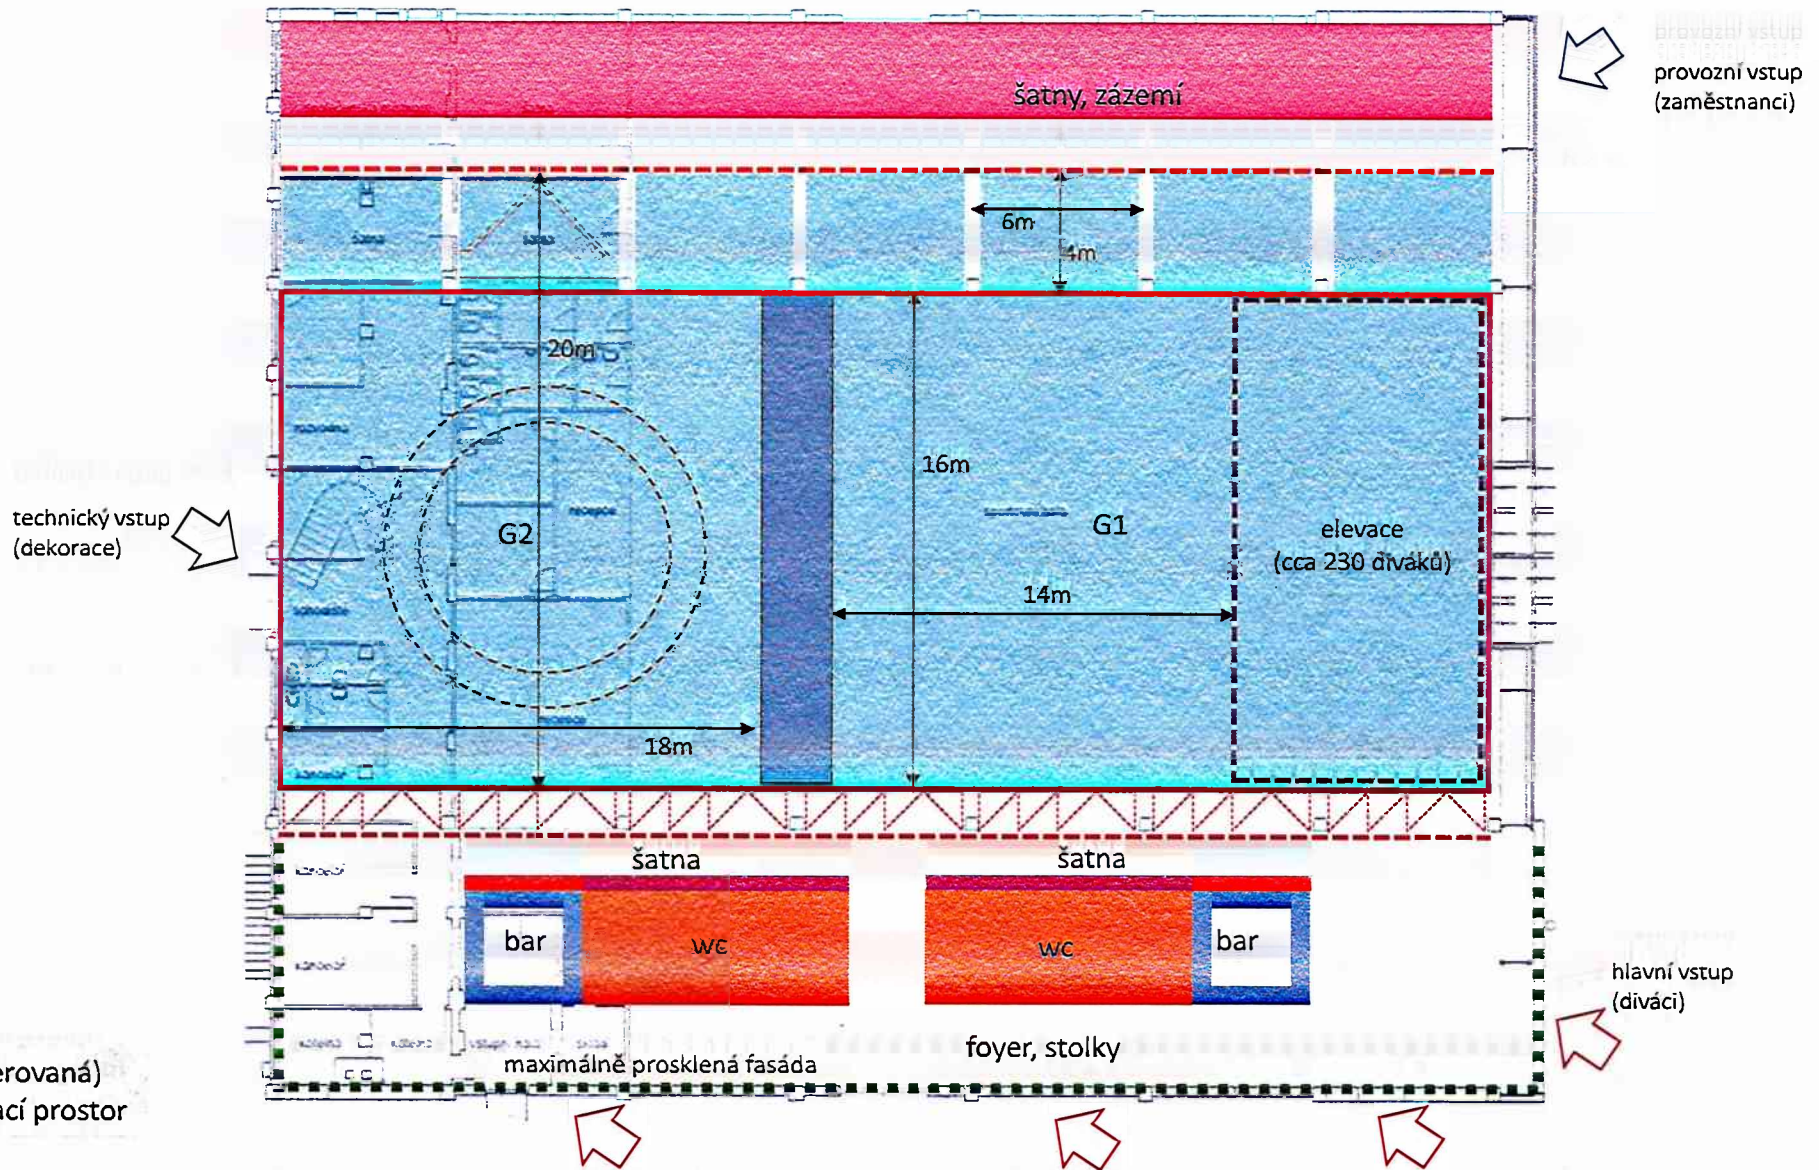

verze 1. (preferovaná)
zkušebna a hrací prostor
