

DODATEK Č. 3**ke smlouvě o dílo na „ZHOTOVENÍ STAVBY“****Název projektu: „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení
žst. Lovosice“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384zastoupena: Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek GŘ pro modernizaci dráhy,
na základě pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-737/2015/sij

ISPROFOND: 5423520011

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 14616zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodní ředitel, na základě plné moci
dále také jako „vedoucí účastník společnosti“

a

MONZAS, spol. s r.o.

se sídlem Ústí nad Labem, Blahoslavova 937/62, PSČ 400 01

IČ: 44222734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 1713zastoupena: Františkem Sobotkou, jednatelem společnosti
dále také jako „další účastník společnosti“

společníci společnosti „Společnost Lovosice“

**Operační program
Doprava**Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Fond soudržnosti

uzavřené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 5.12.2014, dle ustanovení §2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, se sídlem AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17, Praha 10, kdy vedoucím účastníkem společnosti „Společnost Lovosice“ je obchodní firma AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, IČ: 48029483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny pro a za další společníky a za celou společnost. Smlouvu o dílo, včetně jejích případných dodatků podepisuje vedoucí účastník společnosti.

(dále společně uváděni jako „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 149-PVO/2014

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku byly nepředvídatelné okolnosti při realizaci prací, na jejichž základě došlo k dodatečným úpravám a posunu předání schválených závěrových tabulek pro definitivní zabezpečovací zařízení, jako neopomenutelné součásti projektové dokumentace stavby, Objednatel Zhotoviteli.

Tato skutečnost byla zapříčiněna zejména dodatečným požadavkem na změnu rozsahu stavby ve smyslu vydaného pokynu k zastavení všech prací v úseku ŽST Lovosice - Chotiměř z důvodu havarijní situace způsobené sesuvem u Dobkoviček (dopis čj. 37017/2015-SŽDC-O6 ze dne 03.09.2015). Tato změna si mimo výše uvedené vyžádala aktualizaci projektové dokumentace a návazně dodatečné úpravy dokumentace Zhotovitele, změnu způsobu zabezpečení předmětné trati včetně žel. přejezdů a je předmětem změnového řízení dle Směrnice Objednatele (SŽDC) č. 105.

Na základě těchto skutečností a současně i vlivem nezbytné koordinace se souběžně realizovanými stavbami Objednatele („Rekonstrukce RZZ kolejí řady 600 v žst. Lovosice“ – prodlouha v administraci veřejné zakázky, průběh stavebního řízení, koordinace souběžných/návazných kabelových tras) a „Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa“ – úprava stavebních postupů z důvodu sladění výluk žel. provozu) došlo k prodloužení časové náročnosti díla a návazných prací. Termín pro dokončení stavebních prací na části díla specifikované v příloženém věcném a fin. harmonogramu prací se posouvá o 12 měsíců a 12 dnů, tedy na celkovou lhůtu stavebních prací v délce 29 měsíců a 12 dnů, a tudíž dochází ke změně článku 3. odst. 3.6 Smlouvy a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogramu postupu prací. Celková lhůta pro provedení díla se tak návazně posouvá o 10 měsíců a 12 dnů, tj. do termínu 30.12.2017.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-737/2015/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: 149-PVO/2014, uzavřené dne 18.3.2015 (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatků č. 1 a 2, na úpravě čl. 3 odst. 3.6 Smlouvy takto:

1. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:



Zahájení stavebních prací: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Termín dokončení celého Díla: **do 30.12.2017** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Termín dokončení stavebních prací: **do 30.8.2017** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla). Tato lhůta zůstane zachována i v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok na změnu Harmonogramu postupu prací podle odst. 3.6.5.2 Obchodních podmínek.

Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace skutečného provedení stavby je **do 4 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

2. V souvislosti s výše uvedenou skutečností smluvní strany ruší původní Přílohu č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací a nahrazují ji přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 – Aktualizovaný harmonogram postupu prací.

II.

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. smlouvy Objednatele: E618-S-737/2015/sij, č. smlouvy Zhotovitele: 149-PVO/2014, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž čtyři vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři vyhotovení obdrží Zhotovitel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram postupu prací





5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 17 -08- 2016

V Praze dne 16 -08- 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

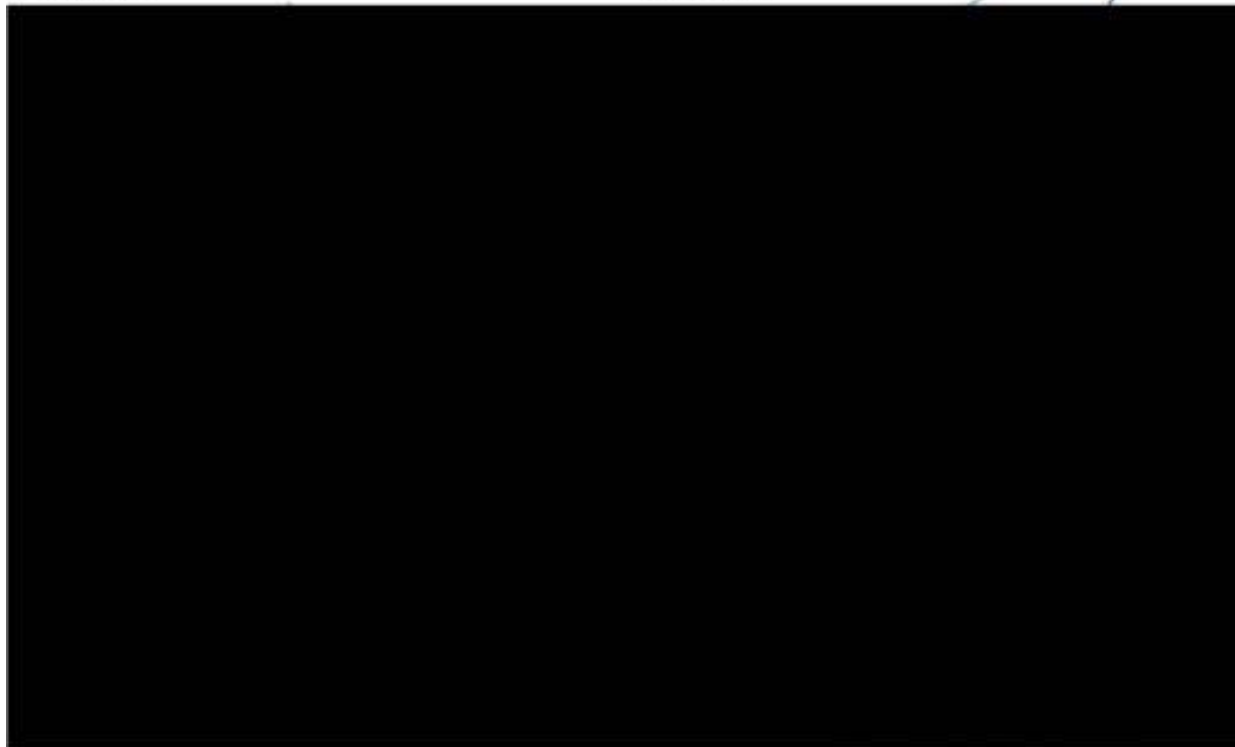


Operační program
Doprava



Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Fond soudržnosti



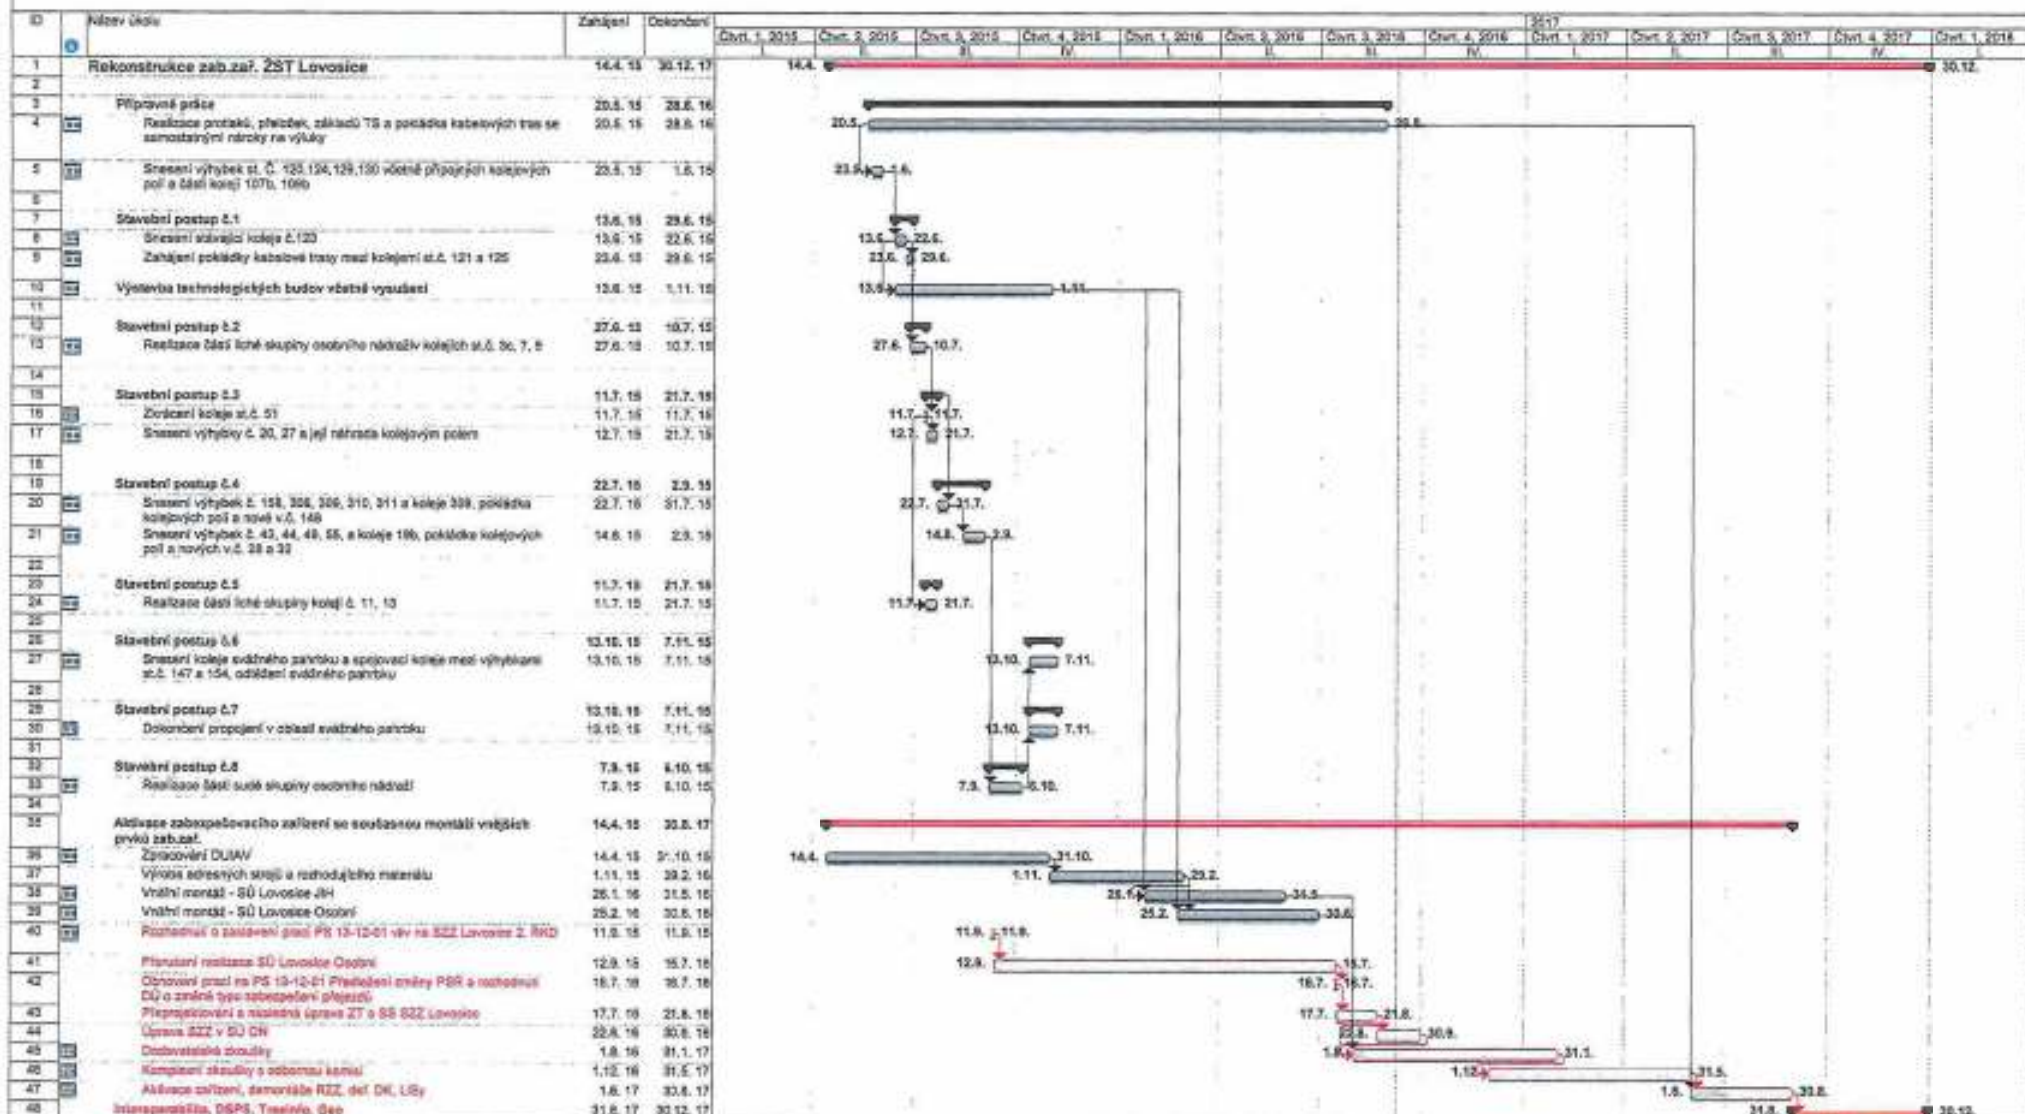

Projekt: HMG_Lovosice_2016_06 Okraj: [Legend] Přechod: [Legend] Souhrn: [Legend] Vnější úkoly: [Legend] Okraj: [Legend]
