

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S913/2017/376

č. zhot. sml. 2017/062 | N275 | S22501



LCR0852948

## I.

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitel  
Krajského ředitelství Šumperk.

(dále jen „objednatel“)

a

**Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**

IČO: 45193118

DIČ: CZ45193118

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

Sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

Zastoupený: Ing. **Jakubem Sajdlem**, ředitelem DSV, na základě plné moci

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

## II.

### P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LC Pod Břidličnou**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/376**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací při realizaci zakázky. Jedná se o provedení rozbití balvanů pneumatickým kládívem. Vzhledem ke stávajícímu stavu komunikace nebyl výskyt balvanů

předpokládán, tyto balvany nelze zpracovat technologií recyklace (drcení frézou). Podrobně viz změnový list stavby, zápis ve stavebním deníku a položkový rozpočet.

### III. Cena za dílo

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD: 689 791,04 Kč bez DPH  
Vícepráce: 17 982,80 Kč bez DPH

**Nově sjednaná cena: 707 773,84 Kč bez DPH**

*slovy: sedmsetšedesát tisíc sedmsetšedesát tři korun českých osmdesát čtyři haléřů.*

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.


Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Ve Frýdku-Místku, dne: 7. 11. 2017

V Šumperku, dne: 8. 11. 2017

  
.....  
Za zhotovitele  
Ing. Jakub Sajdl  
ředitel DSV






STAVBY Frýdek-Místek a.s.  
ská 2766, Frýdek-Místek  
PSČ: 738 01  
DIČ: CZ45193118 100

Lesy České republiky, s.p. 1031  
se sídlem Přemysla I. 106/19, Nový Hradec Králové  
500 03 Hradec Králové

  
.....  
Za objednatele  
Ing. Tomáš Pospíšil  
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- zápis o předání a převzetí staveniště stavby
- kopie rozpočtu
- kopie stavebního deníku

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1		
		Datum změny: 30.10.2017		
Název veř. zakázky: S913/2017/376 LC Pod Břidličnou				
Zhotovitel: Lesostavby Frýdek – Místek, a.s. slezská 2766, Frýdek – Místek 738 01 IČO: 451 931 18      DIČ: CZ45193118				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk LS Loučná nad Desnou IČO: 421 96 451      DIČ: CZ42196451				
Název akce (majetku): LC Pod Břidličnou Inv.č. 123 045	Charakter akce:  I    N	Číslo objektů: SO 01	Stavební díly: HSV	
<b>Popis změny:</b> Při úpravě pláně do jednostranného příčného sklonu u LC Pod Břidličnou byly z pláně vytaženy balvany, které není schopna fréza přemlít. Nutno použít pneumatické kladivo k rozbití těchto kamenů. Je nežádoucí jejich odstranění.				
<b>Zdůvodnění změny:</b> LC Pod Břidličnou byla již dříve recyklována a proto se předpokládalo, že nedojde k vytahání velkých kamenů z podkladu. Balvany vystupují i do příkopy, čímž ji zužují. Také budou odstraněny.				
Posouzení změny – TP pro SČ KŘ Šumperk: Ing. Josef Kubíček		Datum: 30.10.2017	Podpis: 	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)      I: N:	Bilance:	17.982,80 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)      I: N: 17.982,80		
	Konečná celková cena akce po změně		707.773,84 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		707.773,84 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Josef Kubíček	Datum: 31.10.2017	Podp 	
Na vědomí LS Loučná na Desnou – jméno:	Ing. Ján Dvořák	Datum: 31.10.2017	Podp 	
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Jakub Sajdl	Datum: 30.10.2017	Podp 	
Autorizovaný stavbyvedoucí:	Zdeněk Kovář	Datum: 30.10.2017	Podp 	
<b>Přílohy:</b> 1. Rozpočet víceprací 2. Předání staveniště stavby 3. Kopie stavebního deníku				
Poznámka:				

[09]  
 Lesy České republiky, s.p.  
 se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
 500 08 Hradec Králové  
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
 P. Potoční 22/22, 787 01 Šumperk



Lesy České republiky, s.p.,  
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové  
KŘ Šumperk, LS Loučná nad Desnou

**Z Á P I S o předání a převzetí staveniště stavby  
S913/2017/376**

**Název stavby:** LC Pod Břidličnou

**Místo stavby:** kraj Olomouc, okres Šumperk, obec Vernířovice, k.ú. Vernířovice u Sobotína,  
parc.č. 1508

**Smlouva o dílo č.:** S913/2017/376

**Sepsaný dne:** 9.10.2017 v Loučné nad Desnou

**Přítomni:**

**Objednatel (předávající):** Lesy České republiky, s.p.,  
KŘ Šumperk, LS Loučná nad Desnou  
zastoupený: Ing. Tomáš Pospíšil

ve věcech technických jedná: Ing. Josef Kubíček, TP pro SČ KŘ Šumperk

**Zhotovitel (přebírající):** Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.

IČO: 451 931 18

DIČ: CZ 45193118

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

za  
ve  
te

**Předmětem zápisu je předání staveniště:**

**1. Vytýčení stavby a výškové úrovně:**

*Zaměření provedeno na základě přímým měřením pomocí digitálního kolečka zn. Waugh Tools TP pro SČ KŘ Šumperk, Ing. Josefem Kubíčkem.*

**2. Vymezení (obvod) staveniště, BOZP:**

*Stavby se nachází mimo zastavěné území obce na neveřejné účelové komunikaci, předpokládá se zvýšený pohyb osob nepatřících na stavbu z důvodu turistických tras. Prostor stavby na začátku a konci před započítáním opravy je potřeba osadit svislymi dopravními značeními, podle technických podmínek TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ označující, že LC Pod Břidličnou je v celé délce stavbou, a že její průjezd je po dobu stavby zakázán.*

**3. Příjezdní komunikace a přístupy:**

*Na LC Pod Břidličnou je možný přístup ze státní silnice vedoucí ze Sobotína na Skřítek třídy I/11. Dále je možný přístup na stavbu z lesní dopravní sítě v majetku investora po LC Kočičí hřbet, LC Ztracená a LC K Měsíční. K realizaci stavby není nutné zřizovat nové příjezdové komunikace.*

**4. Pozemky k uskladnění materiálu, parkování techniky, zařízení staveniště a ubytování:**

*Pro skládku stavebního materiálu je navržena původní skládka na dřevní hmotu na konci opravovaného úseku v křížení s LC Ztracená nebo v km 1,186. Skládku je možno využít pouze pro stavební materiál využívaný na stavbě jako jsou svodnice a stroje. Do sousedních lesních porostů nebude v rámci zřízení zařízení staveniště nijak zasahováno – jde o Přírodní rezervaci.*

5. Odběrná místa a napojení na energie:

*Charakter stavby nevyžaduje napojení na elektrickou síť. Zhotovitel stavby zajistí zařízení staveniště z vlastních zdrojů. Elektrická energie může být dodávána prostřednictvím mobilních zařízení s benzínovým nebo naftovým motorem. Pitnou a užitkovou vodu bude zhotovitel na stavbu dovážet.*

6. Nakládání s odpady:

*Odpady, které mohou vzniknout při stavebních pracích (zemina, kamenivo, komunální odpad, dřevo, plasty, směsný stavební, atd.), budou likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb.*

7. Platná vyjádření o podzemních sítích a zařízeních:

*V rámci stavby není nutné realizovat žádná další opatření, např. přeložky inženýrských sítí apod. V zájmovém území stavby se nenachází inženýrské sítě.*

8. Manipulační pruh pro realizaci prací:

*Pro realizaci prací bude využito území pouze v bezprostřední blízkosti staveniště stavby výhradně na pozemcích LČR, s.p.*

*Staveniště musí být po dobu výstavby zabezpečeno, všechna nebezpečná místa budou řádně označená viditelnými bezpečnostními tabulkami.*

*Dodavatelé jsou povinni zajistit pravidelné čištění komunikace, čištění techniky před výjezdem na veřejné komunikace. Dále musí provádět stavební práce bez ohrožování okolí nadměrným hlukem a prachem, práce nesmí rušit noční klid.*

9. Dotčené organizace – CHKOJ:

*Oprava LC bude provedena navrženou technologií recyklace, bude zachována stávající šíře LC, pro opravu propustků bude na čela a vtokové jímky přírodního kamene (místní kámen). Agentura provede před vlastním zahájením opravy lesní cesty vyznačení lokalit výskytu chráněných druhů rostlin nebo jejich biotopu, aby byla zajištěna jejich ochrana.*

10. Kácení dřevin:

*Neuvažuje se.*

11. Specifika provádění prací:

*Možný pohyb osob a automobilů po LC Pod Břidličnou – jde o trasu navštěvovanou turisty.*

12. Předání projektové dokumentace:

*Výkaz výměr předán při předání staveniště stavby v tištěné podobě. V elektronické podobě zaslán na mail [kovar@lesostavby.cz](mailto:kovar@lesostavby.cz)*

13. Ostatní doklady:

*Nutné vyzvednout kličku od závorů před započítím prací – LC Pod Břidličnou opatřena závorou na začátku opravovaného úseku.*

14. Dotčené pozemky a stavby:

*Dotčené pozemky pro LC Pod Břidličnou jsou v k.ú. Vernířovice u Sobotína, obec Vernířovice:*

*- ve vlastnictví LČR, s.p. č.p. 1508;*

15. Ostatní ujednání:

*Řádně označit staveniště – využití zákazových značek z obou směrů, aby nedocházelo k výskytu turistů na lesní cestě.*

*Konzultace zahájených prací s revírníkem – Ing. Petr Novák, tel.: 725 393 025.*


16. Vyjádření účastníků:

Na základě vyzvání firmy *Lesostavby Frýdek-Místek a.s.* dojde k převzetí staveniště se zhotovitel v termínu **9.10.2017** dle nabytí účinnosti smlouvy. Termín dokončení stavby dle článku 3, odstavce 3 je stanoven na **8.11.2017**. Objednatel má veškeré dokumenty nutné k realizaci stavebního díla.

Přílohy: Příloha č. 1 – Vyjádření *CHKOJ*

**Zástupci objednatele staveniště předali a zástupci zhotovitele ho přebírají.**

Tento zápis byl vypracován ve 3 vyhotoveních, která obdrží: 1 x objednatel, 1 x zhotovitel, 1x LS Loučná nad Desnou.

	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Zástupci zhotovitele	Ing. Jakub Sajdl	Ředitel DSV	
	Zdeněk Kovář	Autorizovaný stavbyvedoucí	
	Radek Sedláček	Stavbyvedoucí	
Zástupci objednatele	Ing. Josef Kubíček, PhD.	TP pro SČ KŘ Šumperk	
	Ing. Jiří Pospíšil	Technický pracovník LS Loučná nad Desnou	
	Ing. Petr Novák	Revírník R07	

[09]  
Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hrádec-Králové  
500 06 Hrádec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Šumperk  
Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: 275-2-2 LC Pod Břidličnou  
 Objekt: 01 Dodatečné práce - vybourání skalních výchozů  
 Rozpočet: 01 LES 10/17

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. - Krajské ředitelství Šumperk IČO: 42196451  
 Potoční 2161/22 DIČ: CZ42196451  
 78701 Šumperk

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s. IČO: 45193118  
 Slezská 2766 DIČ: CZ45193118  
 73832 Frýdek-Místek

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	17 982,80
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>17 982,80</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17 982,80 CZK
Základní DPH	21 %	3 776,39 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **21 759,19 CZK**

v FRÝDKU-MÍSTKU dne 30.10.2017

 Frýdek-Místek a. s.  
 Slezská 2766  
 73832 Frýdek-Místek  
 IČO: 45193118

[09]  
 Lesy České republiky, s.p.  
 se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
 500 08 Hradec Králové  
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
 Krajské ředitelství Šumperk  
 Potoční 2161/22, 78701 Šumperk

Za objednatele

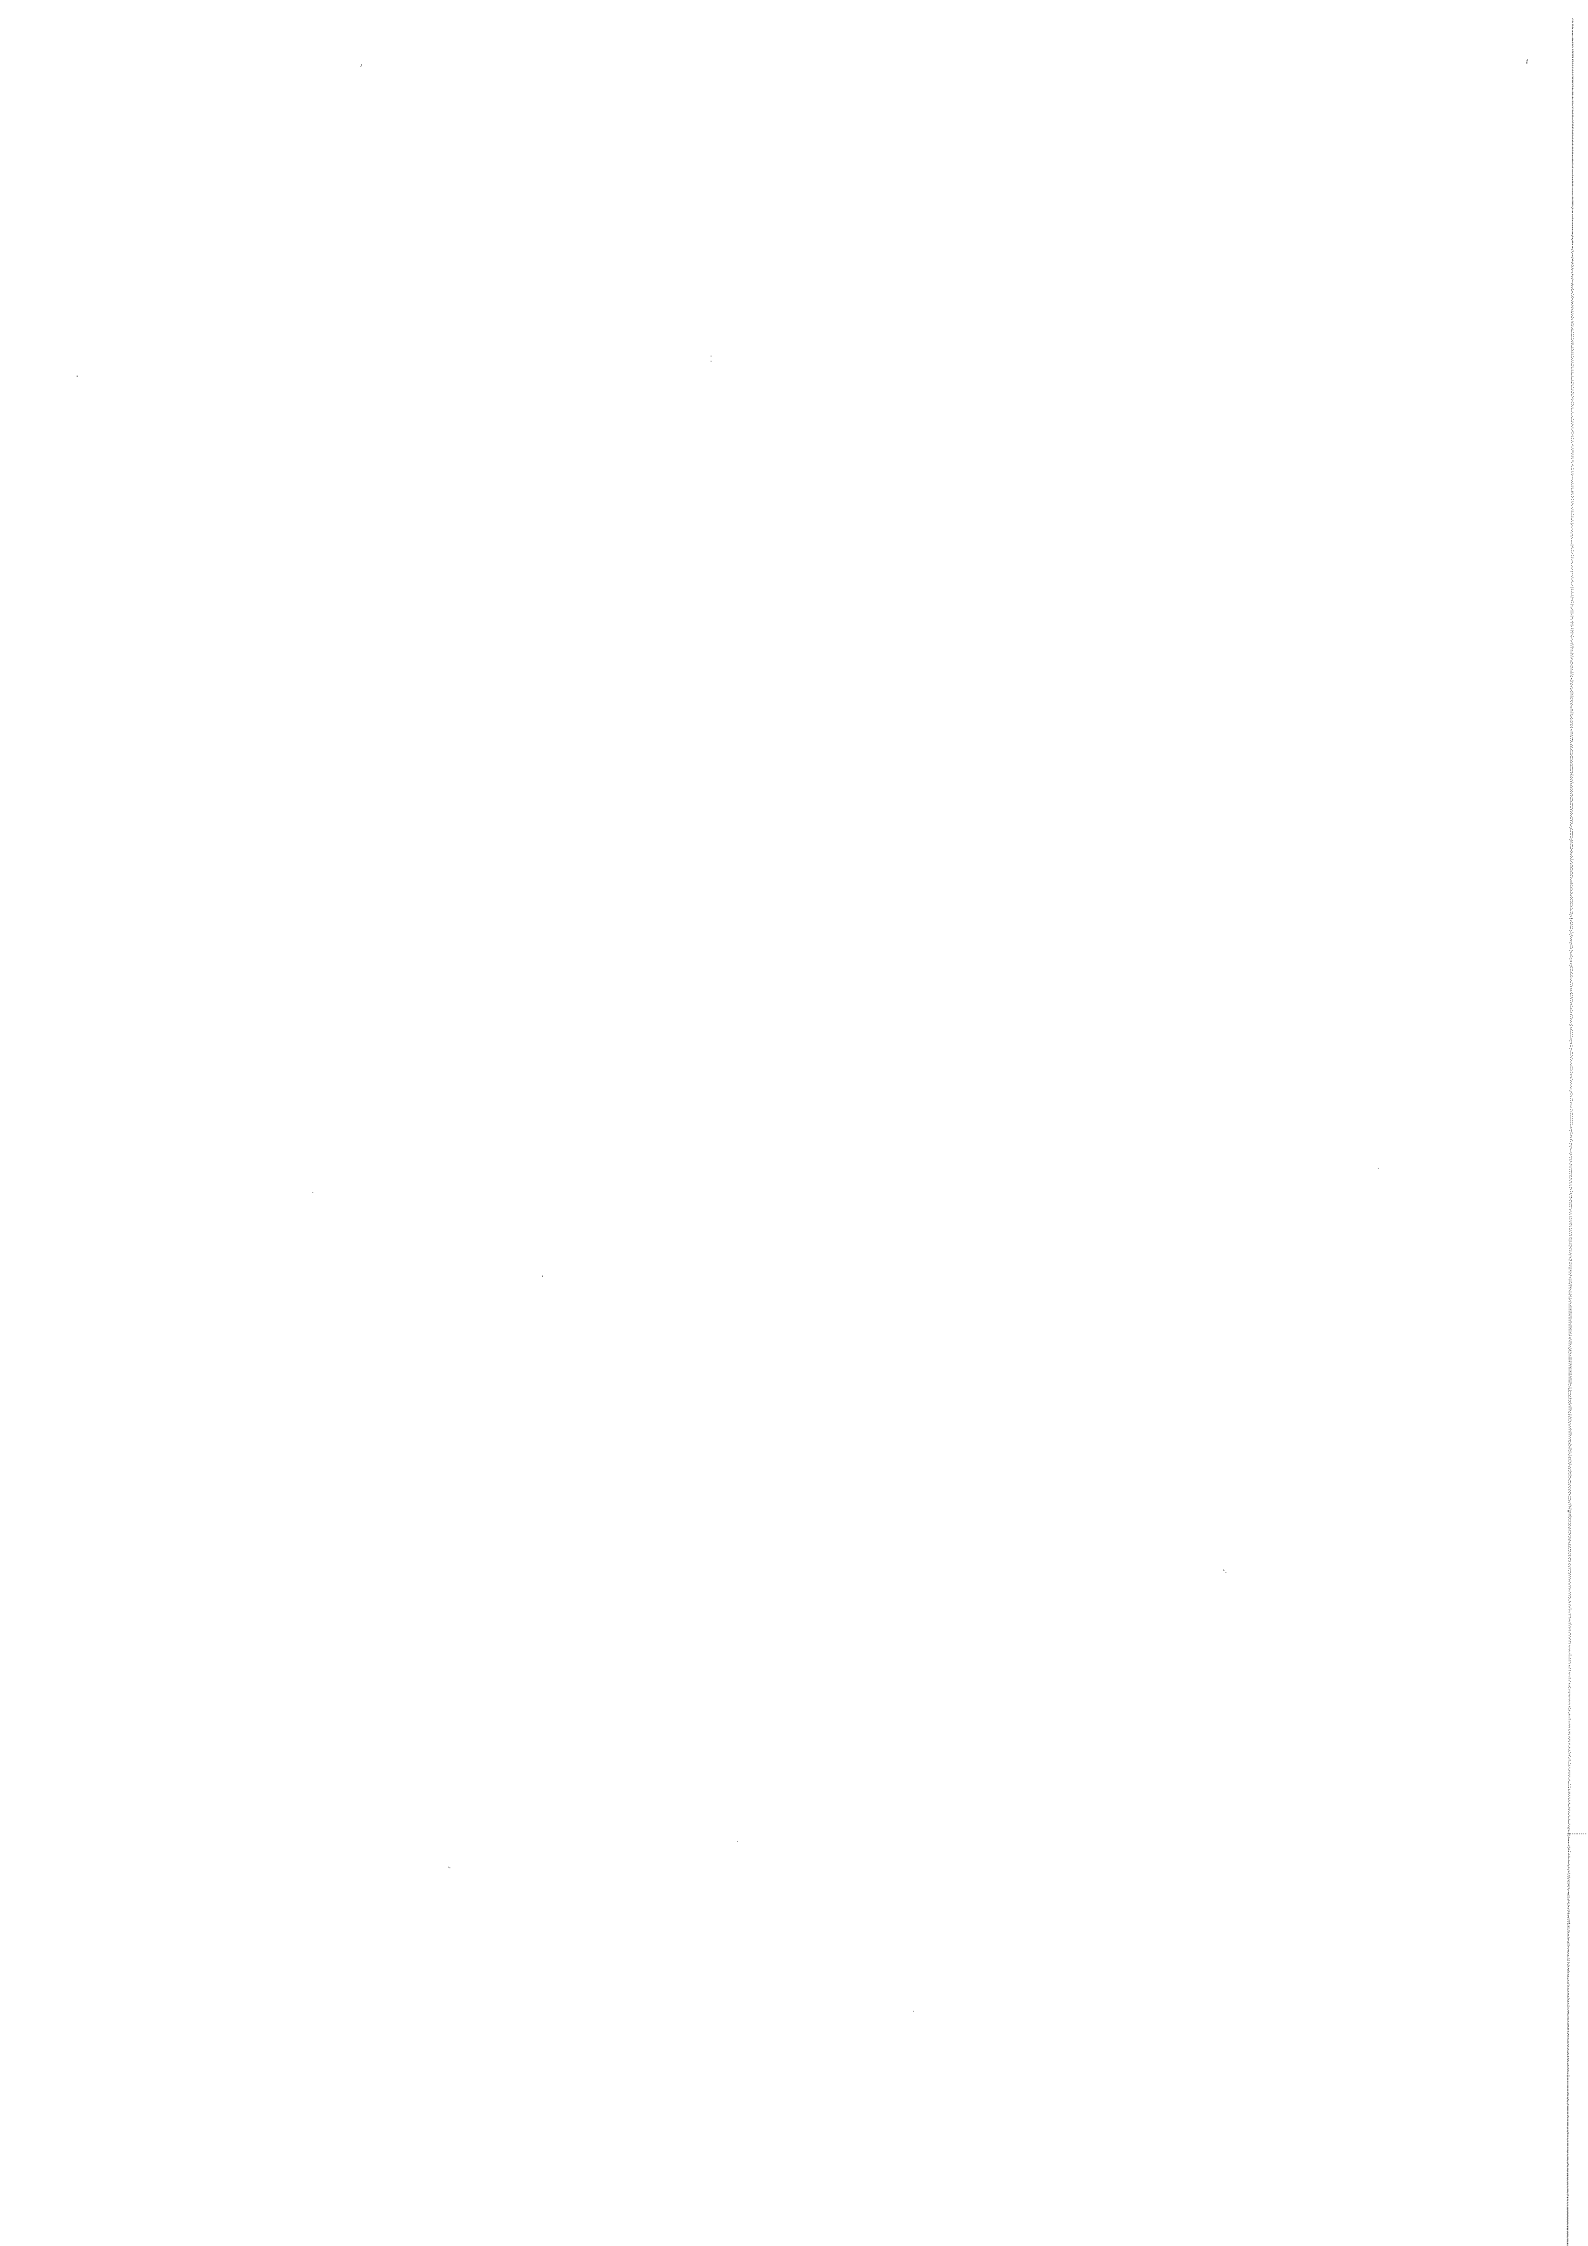
## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			17 600,00	100
Cena celkem					17 600,00	100

### Položkový rozpočet

S:	275-2-2	LC Pod Břidličnou
O:	01	Dodatečné práce - vybourání skalních výchozů
R:	01	LES 10/17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>17 982,80</b>
1	138400001	Rozbití a podrcení kamene v místě stavby Zbýjení skalních výchozů hydraulickým kladivem	t	11,00000	1 634,80	17 982,80



Datum

Denní záznamy stavby

24. 10. 14	PRACOVNÍCI: SCHWAR, KOPCEKÝ, MOŠŇOVSKÝ MECHANISMY: JCB, BULDŽER, FRÉZA, VÁLEC 6°C - 15°C PROBÍHA FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY A NÁSLEDNĚ ÚPRAVA SKLONU NA JEDNOSTRANNÝ POKOČÍ BULDŽERU A HUTNĚNÍ VALCŮ, ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPY STRANĚ
25. 10. 14	PRACOVNÍCI: SCHWAR, KOPCEKÝ, ŠEDŇOHA, MOŠŇOVSKÝ MECHANISMY: JCB, FRÉZA, BULDŽER, VÁLEC 6°C - 14°C FRÉZOVÁNÍ PŮVODNÍ VOZOVKY S NÁSLEDNOU ÚPRAVOU SKLONU NA JEDNOSTRANNÝ POKOČÍ BULDŽERU A HUTNĚNÍ VALCŮ, ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPY STRANĚ
	ZÁMĚRŮ:
	DĚŠKŮHO DNE PROBĚHLA REKONSTRUKČNÍ PRÁCE, PROBÍHAJÍ PRÁCE NA ÚPRAVĚ PŮVĚ A ZHOTOVĚNÍ JEDNOSTRANNÉHO SKLONU I PŘES TO ŽE LE DLA ŽIJÍ RECICLOVANÝ, BULDŽER VTAHUJE 2 PŮVĚ VELKÉ KAMENY. MŮŽNO ROZBÍT KAMENY A POKLEHŤ PRO RECICLÁŽ. TĚŽKOSTI BUDE VĚŠOVĚNO DO 26. 10. 2014. BILY KONTROLOVÁNÝ ČELA PROJEKSTŮ
26. 10. 14	PRACOVNÍCI: MOŠŇOVSKÝ, SCHWAR, KOPCEKÝ POLOVASNO MECHANISMY: JCB, VÁLEC, FRÉZA, BULDŽER 6°C - 14°C ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPY STRANĚ, FRÉZOVÁNÍ PŮVODNÍ VOZOVKY S NÁSLEDNOU ÚPRAVOU SKLONU NA JEDNOSTRANNÝ POKOČÍ BULDŽERU A HUTNĚNÍ VALCŮ.
24. 10. 14	PRACOVNÍCI: MOŠŇOVSKÝ, SCHWAR, KOPCEKÝ, ŠVAR POLOVASNO MECHANISMY: VÁLEC, GRADIR, JCB, AVIA 5°C - 12°C ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPY STRANĚ, SROVNÁNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ ZEMNÍHO TĚLESA GRADIREM A NÁSLEDNĚ HUTNĚNÍ POKOČÍM, POUŽITÍ LC VKLADANÍ SVODNIC DO LC S NÁSLEDNÍM HUTNĚNÍM VÍBAČNÍ DESKOU, STRANĚ VYTVOŘENIA VĚŠOVĚNA BILY VĚŠOVĚNY VĚŠOVĚ. TĚŽKOSTI KAMENY PRO ROZBÍTÍ KAMENY JE VĚŠOVĚNO NA MŮŽSTVÍ, MĚ.

