

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Neratovice - Mlékojedy - splašková kanalizace a ČOV“

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:
se sídlem

Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

U vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 2380

zastoupen:

zástupce ve věcech smluvních:

IČ: 46356991

DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

(dále: „zástupce objednatele“)

II. Zhotovitel: „Společnost POHL + GEOSAN – Neratovice-Mlékojedy“

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

zastoupen:

(na základě plné
moci)

Bankovní spojení:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Společníci:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky (vedoucí společník)

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

zastoupen:

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

Bankovní spojení:

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B složce 4934

a

GEOSAN GROUP a.s. (společník)

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

V souladu s ustanovením článku 1, bodu 1.8 smlouvy o dílo ze dne 20. 10. 2016 a z objektivních důvodů na straně objednatele, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č.2 (dále jen „Dodatek“) takto:

I.

1) **Ve Článku 3. Cena za dílo**

se bod 3.1 upravuje takto:

„3.1 Cena za dílo, specifikované v článku 1 této Smlouvy a dodatku č.1 Smlouvy, je stanovena v souladu s obecně platnými právními předpisy na základě nabídky uchazeče ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy, je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH	41 661 757,50 Kč
Celkem DPH	8 748 969,08 Kč
Cena díla včetně DPH	50 410 726,58 Kč

Cena díla se na základě oboustranně odsouhlasených změnových listů navyšuje o tyto částky:

Změnový list č. ZL 1	224 958,43 Kč
Změnový list č. ZL 2	0,00 Kč
Změnový list č. ZL 3	405 014,02 Kč
Změnový list č. ZL 5	685 979,43 Kč
Změnový list č. ZL 7	253 866,92 Kč

Celkem 1 569 818,80 Kč

Cena díla celkem po navyšení na základě tohoto Dodatku č.2:

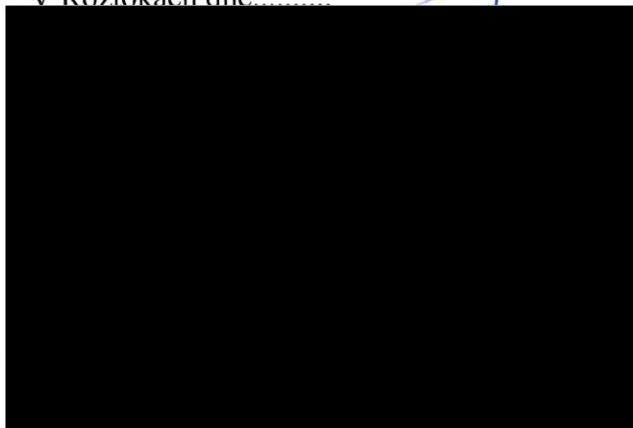
Cena díla bez DPH	43 231 576,30 Kč
Celkem DPH	9 078 631,00 Kč
Cena díla včetně DPH	52 310 207,30 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

III.

- 1) Všechna ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.








V Roztokách dne 1. 11. 2017



V Kladně dne 1. 11. 2017

Objednatel










Stavba : Neratovice-Mlékojedy splašková kanalizace a ČOV		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R 317/16/10 číslo zhotovitele: 30300115	
ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 1	
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 10.4.2017	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem
			osobně x
Týká se :	Posunutí stávajícího vodovodního řadu		
Odkazy :	na specifikaci :	dle standardů VKM	
	na výkresy :	ne	
	na rozp. podklady :	příloha č.1	
	na jinou část smlouvy :		
ZMĚNA : Úprava stávajícího vodovodního řadu v ul. V Rytínách v délce 102m a přepojení 3ks domovních přípojek - od křižovatky s ul. Borová po křižovatku s ul. Písková.			
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 5.4.2017	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Cenový rozdíl bez DPH	224 958,43 Kč		
Počet listů příloh :			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :	
224 958,43 Kč (bez DPH)		ne	
Odsouhlasil spávce stavby (TDI): Vodárny Kladno - Mělník a.s. 		Odsouhlasil generální projektant (GP): 	
Datum: 		Datum: 	
Předal : POHL cz 		Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Ing. 	
Datum: 12.4.2017		Datum: 	

Stavba : Neratovice-Mlékojedy splašková kanalizace a ČOV		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R 317/16/10 číslo zhotovitele: 30300115		
ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 2		
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 10.4.2017		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem	osobně x
Týká se :	Zajištění výkopu jámy ČOV - změna			
Odkazy :	na specifikaci :	dle standardů VKM		
	na výkresy :	ne		
	na rozp. podklady :	příloha č.1		
	na jinou část smlouvy :	příloha č.2 - protokol z dynamické penetrační zkoušky		
ZMĚNA : Změna navrženého řešení zajištění výkopu stavební jámy ČOV. Na základě provedené dynamické penetrace bylo zjištěno, že rostlý terén se nachází na kótě -9,7 m od stávajícího terénu. Vzhledem k ověřenému výskytu spodní vody na kótě - 1,7 m pod úrovní terénu, je nezbytné štětovou stěnu zaberanit až do této úrovně oproti předpokládaným 7m, tak aby se minimalizoval přítok spodní vody. Dále pak došlo ke změně navrženého řešení rozpěrných rámců a kotvení, které odpovídá geologickým podmínkám zjištěných v místě stavby. Změna řešení spočívá v zajištění výkopu stavební jámy ČOV na kótě -10,2 m. Prodloužení beraněných štětovnic na délku 10,5 m. Zvětšení prostoru mezi štětovou stěnou a budoucím monolitem na 1,2 m z důvodu manipulace a splnění předpisů BOZP. Kotvení štětové stěny je realizováno pomocnými zaberaněnými štětovnicemi, které s využitím ocelových táhel stabilizují štětovou stěnu .				
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 5.4.2017		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH		0,00 Kč		
Počet listů příloh :				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
0,00 Kč (bez DPH)		ne		
Odsouhlasil spávec stavby (TDI): Vodárny [redacted] Datum:		Odsouhlasil generální projektant (GP): [redacted] Datum:		
Předal : [redacted] Datum:		Odsouhlasil : Vodárny K [redacted] Datum:		

Stavba : Neratovice-Mlékojedy splašková kanalizace a ČOV		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R 317/16/10 číslo zhotovitele: 30300115		
ZMĚNOVÉ LIST		č. ZL 3		
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 22.8.2017		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem	osobně x
Týká se :	Prodloužení A1 - ul. Borová, A4 - ul. Slepá			
Odkazy :	na specifikaci :	dle standardů VKM		
	na výkresy :	ne		
	na rozp. podklady :	příloha č.1, č.2		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Prodloužení řady A1 ul. Borová a A4 ul. Slepá z důvodu nutnosti dodatečného připojení nově postavených nemovitostí				
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 22.8.2017		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH		405 014,02 Kč		
Počet listů příloh :		CN A4, CN A1, Rekapitulace		
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : 405 014,02 Kč (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : ne		
Odsouhlasil spávec stavby (TDI): Vodárny K [redacted] Datum: [redacted] Předal : [redacted] Datum: [redacted]		Odsouhlasil generální projektant (GP): [redacted] Datum: [redacted]		
[redacted]		Odsouhlasil : [redacted] Datum: [redacted]		

Stavba : Neratovice-Mlékojedy splašková kanalizace a ČOV		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R 317/16/10 číslo zhotovitele: 30300115		
ZMĚNOVÉ LIST		č. ZL 5		
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 22.8.2017		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem	osobně x
Týká se :	Změny a doplnění PD ČOV			
Odkazy :	na specifikaci :	dle standardů VKM		
	na výkresy :	ne		
	na rozp. podklady :	příloha č.1,č.2,č.3,č.4,č.5,č.6,č.7		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Přízpůsobení objektu ČOV požadavkům provozovatele.				
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 22.8.2017		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH		685 979,43 Kč		
Počet listů příloh :		CN		
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : 685 979,43 Kč (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : ano		
Odsouhlasil spávce stavby (TDI): Vodárny Kladno - Mělník [redacted] Datum: Předal [redacted] Datum:		Odsouhlasil generální projektant (GP): [redacted] Datum: [redacted] Datum:		
[redacted]		[redacted]		

Stavba : Neratovice-Mlékojedy splašková kanalizace a ČOV			Smlouva o dílo: číslo objednatele: R 317/16/10 číslo zhotovitele: 30300115	
ZMĚNOVÉ LIST			č. ZL	7
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.			Datum : 22.8.2017	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem	osobně x
Týká se :	Realizace řadu v ul. "Bezejmená"			
Odkazy :	na specifikaci :	dle standardů VKM		
	na výkresy :	PD		
	na rozp. podklady :	příloha č.1		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Požadavek investora - Město Neratovice				
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 22.8.2017	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH 253 866,92 Kč				
Počet listů příloh : CN				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : 474 911,21 Kč (bez DPH)			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : ano	
Odsouhlasil spávce stavby (TDI): Vodárny Kladno - Mělník a.s. 			Odsouhlasil generální projektant (GP): 	
Datum: 			Datum: 	
Předal : 			Odsouhlasil : 	
Datum: 			Datum: 
