



TSKRP008R2BD

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ě. 3/17/6300/0005

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: 3/17/6300/0005

číslo smlouvy zhotovitele: [REDAKCE]

**I.
Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 10 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286



zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků od 0,5 do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Sládek, ředitel úseku speciálních staveb.

Osoby zmocněné k jednání:

, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Jiří Sládek, ředitel úseku speciálních staveb

Ing. Jan Zemánek, vedoucí oddělení mostů

2. Zhotovitel: FREYSSINET CS, a.s.

Královická 267, [REDAKCE] Zápý

IČO: 616 73 048

DIČ: CZ61673048



zastoupena: Miroslavem Havlíčkem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Kalabisem, členem představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Bc. Milan Hedbávny, obchodní náměstek

- ve věcech technických: Ing. Mojmír Volf, technický náměstek

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/17/6300/0005 ze dne 10.2.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. II. Smlouvy (Předmět smlouvy) a čl. IV. (Cena díla), a to z důvodu nutné výměny 56ks ocelových vik, které jsou ve velmi špatném technickém stavu.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ustanovení), jak dále uvedeno.

III. Změna čl. II. Smlouvy (Předmět plnění)

1. Čl. II. věta „Předmětem plnění veřejné zakázky“ se mění následovně:
Předmětem plnění je výměna tlumičů kmitání, doplnění spojek lanových závěsů a dodávka 56ks nových ocelových vik tlumičů.
2. Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy se nemění.

IV. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Článek IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	3 131 100,96 Kč
DPH 21%:	657 531,20 Kč
Původní cena včetně DPH:	3 788 632,16 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH	296 800,00 Kč
Vícepráce DPH 21%	62 328,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 s DPH	359 128,00 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH	3 427 900,96 Kč
DPH 21%	719 859,20 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 vč. DPH	4 147 760,16 Kč

V. Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ustanovení)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 11, který zní:

11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se

zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterýkoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. ██████ Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. ██████ Sb.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. ██████ Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
5. Přílohou tohoto dodatku je:
 - a) Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel:

FREYSSINET CS, a.s.

Královická 267

■ ■ Zápy

IČ: 61673048

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3720

Váš dopis značky / ze dne :

- / -

Naše značka :

2017/0414

Vyřizuje :

Hedbávný

V Zápeč dne :

07.08.2017

Objednatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1

Akce:

Zavěšený most (Y 529) – údržba lanových závěsů, Praha 10

Věc:

Odůvodnění změny rozsahu prací a prodloužení termínu provádění díla

Dobrý den paní inženýrko,

níže uvádíme odůvodnění změny rozsahu prací prováděných naší společností na výše uvedené akci a dále odůvodnění žádosti o přiměřené prodloužení doby realizace díla v souladu s touto změnou.

a) Změna rozsahu prací

Po demontáži ocelových vík tlumičů závěsů, které jsme provedli v [redacted] na vybraných závěsech bylo s ohledem na velmi špatný stav ocelových vík svolána schůzka ohledně dalšího postupu prací. Schůzky byli přítomni zástupci zhotovitele [redacted] [redacted] [redacted] (Ing. Šimler, p. Klatovský), zástupce investora TSK (TDI – p. Plecítý) a autorský dozor (AD - Ing. Tomáš Míčka). Stav ocelových vík hodnotí ve své zprávě AD, která je přílohou č. 1 tohoto odůvodnění (e-mailem byla zaslána p. Plecítému, Ing. Zemánkovi, Ing. Junkovi a Ing. Šimlerovi). Závěrem schůzky bylo doporučení AD, aby víka byla nahrazena nově vyrobenými víky identických rozměrů, tento návrh byl zástupcem investora přijat.

Popis změny: Podle znění zadávací dokumentace a položkového soupisu prací, který byla podkladem pro stanovení nabídkové ceny, měla být víka „pouze“ repasována a nikoliv nahrazena novými. Změna se týká níže uvedené položky:

8	4214R	VÝMĚNA TLUMIČŮ ZÁVĚSŮ DESKOVÝCH MOSTŮ - demontáž stávajících tlumičů - doplnění maziva (předpoklad 50 litrů na 1 tlumič) - nový pryžový tlumič s ocelovou přírubou - nové šrouby pro doplnění maziva - repase ocelového víka průměru 340 mm	KUS	56,000	47 368,00	2 652 608,00
---	-------	--	-----	--------	-----------	--------------

Zhotovitel tuto změnu oceňuje částkou 5 300,-Kč/ks, která byla stanovena jako rozdíl nákladů na výrobu nových ocelových vík vč. PKO 8900,-Kč/ks a náklady na obnovu vík (otryskání, PKO, převrtání otvorů) 3600,-Kč/ks.

Změna bez DPH činí: **(8900 – 3600) x 56ks = 296 800,00 Kč**

DPH 21% **62 328,00 Kč**

Změna vč. DPH činí: **359 128,00 Kč**

b) Změny délky provádění:

Výrobu nových vík zásadně ovlivnil fakt, že nebyla k dispozici dokumentace skutečného provedení závěsů, na základě které by bylo možné zpracovat VTD vík nových. Vyrobený prototyp ocelového víka bylo tedy vhodné ověřit přímo na stavbě a to vzhledem k možnosti provést DIO nebylo možné dříve než 1.7.2017. Po ověření bylo možné vyrobit všech 56ks ocelových vík a nanést patřičnou skladbu PKO. Výroba ocelových vík vč. PKO je cca 6-8 týdnů.

Změna: S ohledem na změnu rozsahu prací oproti zadávací dokumentaci tímto žádáme investora o prodloužení lhůty výstavby o 10 dní, tj. celkem na 40dní.

Obr. 1 – Špatný stav stávajících ocelových vik




Přílohy:

Příloha č.1 – Zpráva AD ze dne 5.5.2017

S pozdravem

Bc. Milan Hedbávný - Obchodní náměstek
FREYSSINET CS, a.s.

c-mail: [REDACTED]



TSK a.s. Odd. 6300


Č.j.: PX [redacted]
V Praze dne 5. května 2017

Věc: Údržba závěsů – most ev.č. Y-529..3, zavěšený most na SDO přes seřazovací nádraží – „Mitas“

Pěkný den přeji,

Dne 04.05.2017 jsem v rámci autorského dozoru provedl kontrolu ocelového víka ocelové chráničky tlumiče závěsů, které bylo v rámci údržby sejmuto pracovníky firmy Freyssinet z referenčního závěsu předmětného mostu. Víko vykazuje lokální deformace až 1,5 mm zejména v oblastech otvorů pro osazení šroubů. S ohledem na tuto skutečnost a zjevnou možnost, že některé z později demontovaných vík bude vykazovat deformace ještě větší, je nezbytné při požadavku na stoprocentní vodotěsnost víka vyrobít víka nová. Toť vše.

foto demontovaného víka:

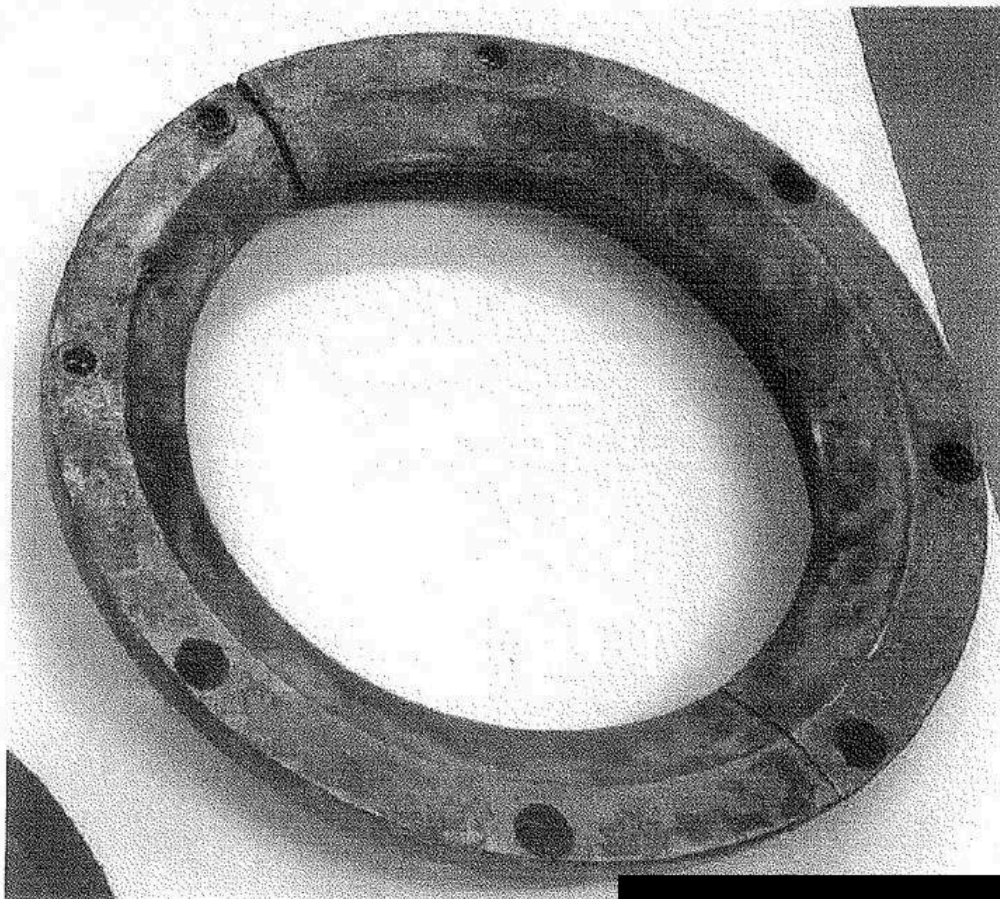

S úctou Vás zdraví

[redacted]
vedoucí skupiny diagnostiky Pontex spol. s r.o.

Pontex spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439
Bankovní spojení: ČSOB a.s. účtu [redacted]

Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991
