

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-14015/2016

ISPROFOND: 5623720011

a

společníci Společnosti „**Kuřim**“

založené Společenskou smlouvou ze dne 02. 09. 2016:

Společník - správce : **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1383

kterou dále zastupuje Ing. Ondřej Fuchs, místopředseda představenstva a Ing. Jirí Tesař, člen
představenstva

a

společník : **OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
kterou dále zastupuje: Ing. Petr Brzezina, předseda představenstva a Ing. Roman Kocúrek, člen
představenstva

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 02. 09. 2016, kdy správcem Společnosti „Kuřim“ je
S u b t e r r a a.s., se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 45309612, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383.

bank. spojení:

IBAN: CZ520300000000117843773

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1703014//SOD00105942

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 1. 2017 na zhotovení
stavby s názvem „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov“ (dále také jen „Dodatek“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů stavby č. 6, 10, 11, 14, 15 a změnového
listu č. 17 a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím
souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

| Změnový list | Navýšení nákladů | Snížení nákladů | Celková změna |
|--------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 6 | 874 833,48 Kč | 0,00 Kč | 874 833,48 Kč |
| 10 | 348 299,27 Kč | 0,00 Kč | 348 299,27 Kč |
| 11 | 6 675 701,03 Kč | 1 367 454,23 Kč | 5 308 246,80 Kč |
| 14 | 1 430 516,68 Kč | - 1 430 516,68 Kč | 0,00 Kč |
| 15 | 728 346,33 Kč | 728 346,33 Kč | 0,00 Kč |
| 17 | 205 036,09 Kč | 0,00 Kč | 205 036,09 Kč |

Více práce 8 103 869,87 Kč

Méně práce - 1 367 454,23 Kč

Původní Cena Díla dle dodatku č. 4 493 784 389,66 Kč

Změna Ceny Díla dle dodatku č. 5 + 6 736 415,64 Kč

Nová Cena Díla bez DPH 500 520 805,30 Kč

- 1.2 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících
změnách Smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

*Cena Díla bez DPH: **500 520 805,30 Kč***

*slovy:**pětsetmilionůpětsetdvacetisícosmsetpě korun českých a třicet haléřů***

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění dodatku č. 5 ke Smlouvě.“

- 1.3 V souladu s ustanoveními článků 3.6.5 a 3.6.7 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, a žádosti Zhotovitele č. 2017/0093 KURIM se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací na níže uvedeném stavebním objektu do 30. 6. 2018. Potřeba prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací pro níže uvedený SO vznikla z důvodu nepřipravenosti ploch určených k náhradní výsadbě stromů a křovin ze strany města Kuřim.

Prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací se týká těchto SO:

SO 05-43-01 Zabezpečení veřejných zájmů - vegetační úpravy

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení stavebních prací na dotčených stavebních objektech či provozních souborech mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.6 zní nově takto:

„3.6 *Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy, ve znění dodatku č. 5 ke Smlouvě (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Termín provedení Díla: do 31. 10. 2018 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 13 měsíců ode dne zahájení stavebních prací, a to s výjimkou SO 05-01-01 Žst. Kuřim, trakční vedení, který bude stavebně dokončen do 30. 4. 2018, SO 05-17-01 Žst. Kuřim, železniční svršek, který bude stavebně dokončen do 31. 3. 2018, SO 05-15-06 Žst. Kuřim, IPO, který bude stavebně dokončen do 30. 4. 2018, a SO 05-43-01 Zabezpečení veřejných zájmů - vegetační úpravy, který bude stavebně dokončen do 30. 6. 2018 (dokladem

prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

*Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **31. 10. 2018.**“*

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací Smlouvy. Aktualizovaný Harmonogram postupu prací je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Harmonogram postupu prací Smlouvy, ve znění jeho změny dle dodatku č. 1 ke Smlouvě.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tabulka Rozpis Ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rozpis Ceny Díla obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy o dílo.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 2.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je-li Smlouva uveřejňována v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.
- 2.5 Tento Dodatek je vyhotoven v **šesti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři** vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Příloha:

- Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis Ceny Díla
- Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram postupu prací

V Praze dne 3.1.2018

V Tišnově dne 25.1.2018

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Ondřej Fuchs
místopředseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Jiří Tesař

člen představenstva

S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Petr Brzezina

předseda představenstva

OHL ŽS, a.s.

.....
Ing. Roman Kocúrek

člen představenstva


OHL ŽS, a.s.

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

| Poř. č. | Číslo PS, SO | Název PS, SO | Původní rozpočet | Rozpočet po dod. č. 2 | Rozpočet po dod. č. 3 | Rozpočet po. č.4 | ZL č. | N/K | vícepráce | méněpráce | Rozpočet dle dod. č.4 |
|---------|---------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------|-----|--------------|---------------|-----------------------|
| 1. | PS 05-28-01.1 | Žst. Kuřim, definitivní SZZ | 69 184 506,00 | 69 184 506,00 | 69 184 506,00 | 69 184 506,00 | | | | | 69 184 506,00 |
| 2. | PS 05-28-01.2 | Žst. Kuřim, provizorní SZZ | 21 253 364,00 | 21 253 364,00 | 21 253 364,00 | 21 253 364,00 | | | | | 21 253 364,00 |
| 3. | PS 05-28-01.3 | Žst. Kuřim, klimatizace místností technologie | 198 381,00 | 198 381,00 | 198 381,00 | 198 381,00 | | | | | 198 381,00 |
| 4. | PS 05-14-01 | Žst. Kuřim, traťový kabel | 228 888,00 | 228 888,00 | 228 888,00 | 228 888,00 | | | | | 228 888,00 |
| 5. | PS 05-14-02 | Žst. Kuřim, místní kabelizace | 2 964 428,00 | 2 964 428,00 | 2 964 428,00 | 2 964 428,00 | | | | | 2 964 428,00 |
| 6. | PS 05-14-03 | Žst. Kuřim, trubky HDPE | 133 477,00 | 133 477,00 | 133 477,00 | 133 477,00 | | | | | 133 477,00 |
| 7. | PS 05-14-05 | Žst. Kuřim, sdělovací zařízení | 441 859,00 | 441 859,00 | 441 859,00 | 441 859,00 | | | | | 441 859,00 |
| 8. | PS 05-14-06 | Žst. Kuřim, telefonní zapojovač | 649 360,00 | 649 360,00 | 649 360,00 | 649 360,00 | | | | | 649 360,00 |
| 9. | PS 05-14-07 | Žst. Kuřim, ASHS | 848 661,00 | 848 661,00 | 848 661,00 | 848 661,00 | | | | | 848 661,00 |
| 10. | PS 05-14-08 | Žst. Kuřim, EZS | 278 530,00 | 278 530,00 | 278 530,00 | 278 530,00 | | | | | 278 530,00 |
| 11. | PS 05-14-09 | Žst. Kuřim, úpravy stávajícího systému lokální detekce požáru | 205 103,00 | 205 103,00 | 205 103,00 | 205 103,00 | | | | | 205 103,00 |
| 12. | PS 05-14-13 | Žst. Kuřim, rozhlasové zařízení | 618 419,00 | 618 419,00 | 618 419,00 | 618 419,00 | | | | | 618 419,00 |
| 13. | PS 05-14-14 | Žst. Kuřim, kamerový systém | 1 422 463,50 | 1 422 463,50 | 1 422 463,50 | 1 422 463,50 | | | | | 1 422 463,50 |
| 14. | PS 05-14-15 | Žst. Kuřim, informační zařízení | 5 640 804,00 | 5 640 804,00 | 5 640 804,00 | 5 640 804,00 | | | | | 5 640 804,00 |
| 15. | PS 05-14-10 | Žst. Kuřim, úprava MRTS | 330 615,00 | 330 615,00 | 330 615,00 | 330 615,00 | | | | | 330 615,00 |
| 16. | PS 05-14-11 | Žst. Kuřim, úprava TRS | 1 044 578,00 | 1 044 578,00 | 1 044 578,00 | 1 044 578,00 | | | | | 1 044 578,00 |
| 17. | PS 05-14-04 | Žst. Kuřim, doplnění přenosového zařízení | 898 490,00 | 898 490,00 | 898 490,00 | 898 490,00 | | | | | 898 490,00 |
| 18. | PS 05-14-12 | Žst. Kuřim, sdělovací zařízení, klimatizace | 101 442,00 | 101 442,00 | 101 442,00 | 101 442,00 | | | | | 101 442,00 |
| 19. | PS 05-05-01 | Žst. Kuřim, doplnění DŘT | 774 750,00 | 774 750,00 | 774 750,00 | 774 750,00 | | | | | 774 750,00 |
| 20. | PS 05-05-02 | ED Brno, doplnění DŘT a řídicího systému | 382 097,00 | 382 097,00 | 382 097,00 | 382 097,00 | | | | | 382 097,00 |
| 21. | PS 05-05-03 | Žst. Kuřim, DDTS ŽDC | 1 078 945,00 | 1 078 945,00 | 1 078 945,00 | 1 078 945,00 | | | | | 1 078 945,00 |
| 22. | PS 05-05-04 | ED Brno, DDTS ŽDC | 1 087 926,00 | 1 087 926,00 | 1 087 926,00 | 1 087 926,00 | | | | | 1 087 926,00 |
| 23. | PS 05-13-01 | Žst. Kuřim, trafostanice 25/0,4kV pro EOv | 1 983 578,00 | 1 983 578,00 | 1 983 578,00 | 1 983 578,00 | | | | | 1 983 578,00 |
| 24. | PS 05-13-02 | Žst. Kuřim, trafostanice 25/0,4kV pro zab. zař. | 928 307,00 | 928 307,00 | 928 307,00 | 928 307,00 | | | | | 928 307,00 |
| 25. | PS 05-13-03 | Žst. Kuřim, rekonstrukce trafostanice 22/0,4kV | 2 276 858,00 | 2 276 858,00 | 2 276 858,00 | 2 276 858,00 | | | | | 2 276 858,00 |
| 26. | PS 05-13-03.1 | Žst. Kuřim, klimatizace trafostanice 22/0,4kV | 154 029,08 | 154 029,08 | 154 029,08 | 154 029,08 | | | | | 154 029,08 |
| 27. | PS 05-13-04 | Žst. Kuřim, provizorní trafostanice 22/0,4kV | 731 769,00 | 731 769,00 | 731 769,00 | 731 769,00 | | | | | 731 769,00 |
| 28. | PS 05-13-04.1 | Žst. Kuřim, kontejnerová PNTS 6kV | 7 552 778,00 | 7 552 778,00 | 7 552 778,00 | 7 552 778,00 | | | | | 7 552 778,00 |
| 29. | PS 05-07-01 | Žst. Kuřim, rozvodna nn | 2 076 872,00 | 2 076 872,00 | 2 076 872,00 | 2 076 872,00 | | | | | 2 076 872,00 |
| 30. | PS 05-07-01.1 | Žst. Kuřim, náhradní zdroj | 970 256,00 | 970 256,00 | 970 256,00 | 970 256,00 | | | | | 970 256,00 |
| 31. | SO 05-17-01 | Žst. Kuřim, železniční svršek | 115 809 587,00 | 115 809 587,00 | 115 809 587,00 | 115 809 587,00 | 11 | K | 6 675 701,03 | -1 367 454,23 | 121 117 833,80 |
| 32. | SO 05-16-01 | Žst. Kuřim, železniční spodek | 26 899 970,00 | 26 899 970,00 | 35 338 804,76 | 36 994 007,59 | 6 | K | 874 833,48 | | 37 868 841,07 |
| 33. | SO 05-16-02 | Žst. Kuřim, nástupiště | 11 070 775,00 | 11 070 775,00 | 11 070 775,00 | 11 574 816,83 | | | | | 11 574 816,83 |
| 34. | SO 05-19-01 | Žst. Kuřim, most v km 18,500 | 5 379 360,00 | 5 379 360,00 | 5 379 360,00 | 5 379 360,00 | | | | | 5 379 360,00 |
| 35. | SO 05-19-02 | Žst. Kuřim, most v km 18,692 - podchod | 18 779 275,00 | 18 779 275,00 | 18 779 275,00 | 18 779 275,00 | | | | | 18 779 275,00 |
| 36. | SO 05-19-02.1 | Žst. Kuřim, most v km 18,692 - podchod - úpravy stávajících výtahů | 1 041 916,00 | 1 041 916,00 | 1 041 916,00 | 1 041 916,00 | | | | | 1 041 916,00 |
| 37. | SO 05-19-03 | Žst. Kuřim, most v km 18,936 | 3 540 756,00 | 3 540 756,00 | 3 540 756,00 | 3 540 756,00 | | | | | 3 540 756,00 |
| 38. | SO 05-19-04 | Žst. Kuřim, most v km 19,319 | 3 210 971,00 | 3 210 971,00 | 3 210 971,00 | 3 210 971,00 | | | | | 3 210 971,00 |
| 39. | SO 05-19-05 | Opěrná zeď vlevo v ekm 18,730 - 18,810 | 5 151 358,00 | 5 151 358,00 | 5 151 358,00 | 5 151 358,00 | | | | | 5 151 358,00 |
| 40. | SO 05-19-06 | Opěrná zeď vpravo v ekm 18,944 - 19,164 | 17 535 242,00 | 17 535 242,00 | 17 535 242,00 | 17 535 242,00 | | | | | 17 535 242,00 |
| 41. | SO 05-19-07 | Žst. Kuřim, návěstní lávka v km 18,119 | 1 686 988,00 | 1 686 988,00 | 1 686 988,00 | 1 686 988,00 | | | | | 1 686 988,00 |
| 42. | SO 05-19-07.1 | Žst. Kuřim, návěstní lávka v km 18,830 | 1 331 364,00 | 1 331 364,00 | 1 331 364,00 | 1 331 364,00 | | | | | 1 331 364,00 |
| 43. | SO 05-12-41 | Žst. Kuřim, přeložka kabelu vn E.ON v km 18,365 | | | | | | | | | |
| 44. | SO 05-14-01 | Žst. Kuřim, ochrana drážních sdělovacích kabelů | 1 479 915,00 | 1 479 915,00 | 1 479 915,00 | 1 479 915,00 | | | | | 1 479 915,00 |
| 45. | SO 05-14-02 | Žst. Kuřim, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů | | | | | | | | | |
| 46. | SO 05-14-02.1 | Žst. Kuřim, ochrana sdělovacích kabelů ČD-T | 2 912 059,00 | 2 912 059,00 | 2 912 059,00 | 2 912 059,00 | | | | | 2 912 059,00 |
| 47. | SO 05-14-02.2 | Žst. Kuřim, ochrana sdělovacích kabelů KME | 1 021 290,00 | 1 021 290,00 | 1 021 290,00 | 1 021 290,00 | | | | | 1 021 290,00 |
| 48. | SO 05-43-01 | Zabezpečení veřejných zájmů - vegetační úpravy | 1 228 568,00 | 1 228 568,00 | 1 228 568,00 | 1 228 568,00 | | | | | 1 228 568,00 |
| 49. | SO 05-21-01 | Žst. Kuřim, ochrana plynovodů | 6 289,00 | 6 289,00 | 6 289,00 | 6 289,00 | | | | | 6 289,00 |
| 50. | SO 05-22-01 | Žst. Kuřim, ochrana vodovodů | 5 241,00 | 5 241,00 | 5 241,00 | 5 241,00 | | | | | 5 241,00 |
| 51. | SO 05-27-01 | Žst. Kuřim, ochrana kanalizací | 7 861,00 | 7 861,00 | 7 861,00 | 7 861,00 | | | | | 7 861,00 |


| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|---|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 52. | SO 05-18-01 | Žst. Kuřim, plocha VNPK u koleje č.5 | 7 746 740,00 | 7 746 740,00 | 8 312 645,00 | 8 312 645,00 | | | | | 8 312 645,00 |
| 53. | SO 05-15-04 | Žst. Kuřim, kabelovod | 11 378 207,00 | 11 511 009,70 | 11 511 009,70 | 11 511 009,70 | 10 | N | 348 299,27 | | 11 859 308,97 |
| 17 | SO 05-15-01 | Žst. Kuřim, stavební úpravy výpravní budovy | 1 090 567,00 | 1 090 567,00 | 1 090 567,00 | 1 090 567,00 | 17 | K | 18 200,74 | | 1 108 767,74 |
| 55. | SO 05-15-02 | Žst. Kuřim, stavební úpravy technologické budovy | 2 312 723,00 | 2 312 723,00 | 2 312 723,00 | 2 312 723,00 | 17 | K | 186 835,35 | | 2 499 558,35 |
| 56. | SO 05-15-03.A | Žst. Kuřim, zastřešení nástupišť A | 16 197 413,00 | 19 594 833,36 | 19 594 833,36 | 19 594 833,36 | | | | | 19 594 833,36 |
| 57. | SO 05-15-03.B | Žst. Kuřim, zastřešení nástupišť B dešťová kanalizace | 1 522 234,00 | 1 522 234,00 | 1 522 234,00 | 1 522 234,00 | | | | | 1 522 234,00 |
| 58. | SO 05-15-05 | Žst. Kuřim, PHS | 20 977 569,00 | 20 977 569,00 | 20 977 569,00 | 20 977 569,00 | | | | | 20 977 569,00 |
| 59. | SO 05-15-06 | Žst. Kuřim, IPO | 530 505,00 | 530 505,00 | 530 505,00 | 530 505,00 | | | | | 530 505,00 |
| 60. | SO 05-15-07 | Žst. Kuřim, Orientační systém | 358 089,00 | 358 089,00 | 358 089,00 | 358 089,00 | | | | | 358 089,00 |
| 61. | SO 05-01-01 | Žst. Kuřim, trakční vedení | 37 814 411,00 | 38 704 709,75 | 38 704 709,75 | 38 704 709,75 | | | | | 38 704 709,75 |
| 62. | SO 05-01-02 | Žst. Kuřim, napájení EOv z TV | 1 386 307,00 | 1 386 307,00 | 1 386 307,00 | 1 386 307,00 | | | | | 1 386 307,00 |
| 63. | SO 05-01-03 | Žst. Kuřim, napájení zab.zař. z TV | 481 255,00 | 481 255,00 | 481 255,00 | 481 255,00 | | | | | 481 255,00 |
| 64. | SO 05-01-04 | Žst. Kuřim, převěšení ZOK | 843 299,00 | 843 299,00 | 843 299,00 | 843 299,00 | | | | | 843 299,00 |
| 65. | SO 05-01-05 | Žst. Kuřim, zavěšení kabelu 6kV | 1 556 504,00 | 1 556 504,00 | 1 556 504,00 | 1 556 504,00 | | | | | 1 556 504,00 |
| 66. | SO 05-06-01 | žst. Kuřim, EOv | 3 673 302,00 | 3 673 302,00 | 3 673 302,00 | 3 673 302,00 | | | | | 3 673 302,00 |
| 67. | SO 05-04-02 | Žst. Kuřim, rekonstrukce rozvodu 6kV | 2 656 809,85 | 2 656 809,85 | 2 656 809,85 | 2 656 809,85 | | | | | 2 656 809,85 |
| 68. | SO 05-06-03 | Žst. Kuřim, úprava rozvodů nn | 1 610 341,00 | 1 610 341,00 | 1 610 341,00 | 1 610 341,00 | | | | | 1 610 341,00 |
| 69. | SO 05-06-04 | Žst. Kuřim, venkovní osvětlení | 5 116 091,00 | 5 116 091,00 | 5 116 091,00 | 5 116 091,00 | | | | | 5 116 091,00 |
| 70. | SO 05-06-05 | Žst. Kuřim, osvětlení nákladíště. | 1 031 476,00 | 1 031 476,00 | 1 031 476,00 | 1 031 476,00 | | | | | 1 031 476,00 |
| 71. | SO 05-06-06 | Žst. Kuřim, osvětlení nástupišť a podchodu | 6 073 928,00 | 6 073 928,00 | 6 073 928,00 | 6 073 928,00 | | | | | 6 073 928,00 |
| 72. | SO 05-06-07 | Žst. Kuřim, DOÚO | 2 230 953,00 | 2 230 953,00 | 2 230 953,00 | 2 230 953,00 | | | | | 2 230 953,00 |
| 73. | SO 05-06-08 | Žst. Kuřim, úprava rozvodů nn ve VB | 704 040,00 | 704 040,00 | 704 040,00 | 704 040,00 | | | | | 704 040,00 |
| 74. | SO 05-06-09 | Žst. Kuřim, přeložky silnoproudých zařízení | 1 977 818,00 | 1 977 818,00 | 1 977 818,00 | 1 977 818,00 | | | | | 1 977 818,00 |
| 75. | SO 05-01-06 | žst. Kuřim, ukolejnění | 1 270 395,00 | 1 270 395,00 | 1 270 395,00 | 1 270 395,00 | | | | | 1 270 395,00 |
| 76. | SO 05-06-10 | Žst. Kuřim, uzemnění TS 25/0,4kV pro EOv | 128 918,00 | 128 918,00 | 128 918,00 | 128 918,00 | | | | | 128 918,00 |
| 77. | SO 05-06-11 | Žst. Kuřim, uzemnění TS 25/0,4kV pro zab. zař. | 96 044,00 | 96 044,00 | 96 044,00 | 96 044,00 | | | | | 96 044,00 |
| 78. | SO 05-06-12 | Žst. Kuřim, uzemnění TS 22/0,4kV | 263 189,00 | 263 189,00 | 263 189,00 | 263 189,00 | | | | | 263 189,00 |
| 79. | SO 98-98-98 | Všeobecné položky | 2 630 437,00 | 2 630 437,00 | 2 630 437,00 | 2 630 437,00 | | | | | 2 630 437,00 |
| | CELKEM | | 478 199 883,43 | 482 620 405,24 | 491 625 145,00 | 493 784 389,66 | | | 8 103 869,87 | -1 367 454,23 | 500 520 805,30 |

| ID | PS/SO | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Předchůdci | Název zdroje |
|----|---------------|--|----------------|-----------------|------------------|------------|--------------|
| 1 | | Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov | 661 dny | 9.1. 17 | 31.10. 18 | | |
| 2 | | Předpokládané zahájení stavebních prací | 0 dny | 9.1. 17 | 9.1. 17 | | |
| 3 | | Hlavní kolejové výluky: | 263 dny | 13.3. 17 | 30.11. 17 | | |
| 4 | | A1 - nepřetržitá výluka kolejí č. 1, 3, 5, 5a, 5b, 7, 7a, 9 | 110 dny | 13.3. 17 | 30.6. 17 | | |
| 5 | | A2 - nepřetržitá výluka zhlaví a záhlaví traťové k.č. 1 vč. liché kol. skupiny | 31 dny | 1.7. 17 | 31.7. 17 | | |
| 6 | | A3 - nepřetržitá výluka kol. č. 2, 4, 6 a zhlaví a záhlaví t. k. č. 2 | 31 dny | 1.8. 17 | 31.8. 17 | 5 | |
| 7 | | A4 - nepřetržitá výluka kolejí č. 2, 4, 6, 6b | 91 dny | 1.9. 17 | 30.11. 17 | 6 | |
| 8 | | Stavební postupy | 447 dny | 9.1. 17 | 31.3. 18 | | |
| 9 | | SPO - Přípravné práce (rušení kolejí č. 7, 8, 9, vlečka TOS) | 63 dny | 9.1. 17 | 12.3. 17 | | |
| 10 | | SP1 - Práce na liché kol. sk., na vybr. výhybkách, ostr. nástup., most km 18,500 a km 18,936 | 110 dny | 13.3. 17 | 30.6. 17 | | |
| 11 | | SP2 - Zhlaví a záhlaví t.k. č. 1 vč. Liché kol. skupiny; most km 19,319 pod k.č. 1, pokračují práce na mostech km 18,500 a km 18,936, DKS 1 a 3 | 35 dny | 1.7. 17 | 4.8. 17 | | |
| 12 | | SP 3a - Práce na sudé kol. sk., zhlaví a záhlaví t.k. č. 2 + t.k. č. 2, práce na vybraných výhybkách, most km 19,319 pod k.č. 2; spojky + DKS 2 a 4, PHS | 28 dny | 4.8. 17 | 31.8. 17 | | |
| 13 | | SP 3b - Práce na sudé kol. sk., zhlaví a záhlaví t.k. č. 2 + t.k. č. 2, práce na vybraných výhybkách, most km 19,319 pod k.č. 1; PHS | 9 dny | 31.8. 17 | 8.9. 17 | | |
| 14 | | SP 4 - Práce na sudé kol. skup., vybraných výhybkách; ostr. nástup., most km 18,936 pod k.č. 2 | 84 dny | 8.9. 17 | 30.11. 17 | | |
| 15 | | 3. podbití, broušení kolejí, rychlá pantografová zkouška | 31 dny | 1.3. 18 | 31.3. 18 | | |
| 16 | | TECHNOLOGICKÁ ČÁST | 397 dny | 9.1. 17 | 9.2. 18 | | |
| 17 | | ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ | 397 dny | 9.1. 17 | 9.2. 18 | | |
| 18 | | STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ | 397 dny | 9.1. 17 | 9.2. 18 | | |
| 19 | PS 05-28-01.1 | Žst. Kuřim, definitivní SZZ | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 20 | PS 05-28-01.2 | Žst. Kuřim, provizorní SZZ | 204 dny | 9.1. 17 | 31.7. 17 | | |
| 21 | PS 05-28-01.3 | Žst. Kuřim, klimatizace místností technologie | 61 dny | 1.6. 17 | 31.7. 17 | | |
| 22 | | ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 23 | | MÍSTNÍ KABELIZACE | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 24 | PS 05-14-01 | Žst. Kuřim, traťový kabel | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 25 | PS 05-14-02 | Žst. Kuřim, místní kabelizace | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 26 | PS 05-14-03 | Žst. Kuřim, trubky HDPE | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 27 | | INTEGROVANÁ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ | 172 dny | 13.3. 17 | 31.8. 17 | | |
| 28 | PS 05-14-05 | Žst. Kuřim, sdělovací zařízení | 172 dny | 13.3. 17 | 31.8. 17 | | |
| 29 | PS 05-14-06 | Žst. Kuřim, telefonní zapojovač | 172 dny | 13.3. 17 | 31.8. 17 | | |
| 30 | | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ A ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE | 110 dny | 13.3. 17 | 30.6. 17 | | |
| 31 | PS 05-14-07 | Žst. Kuřim, ASHS | 110 dny | 13.3. 17 | 30.6. 17 | | |
| 32 | PS 05-14-08 | Žst. Kuřim, EZS | 110 dny | 13.3. 17 | 30.6. 17 | | |
| 33 | PS 05-14-09 | Žst. Kuřim, úpravy stávajícího systému lokální detekce požáru | 110 dny | 13.3. 17 | 30.6. 17 | | |
| 34 | | INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 35 | PS 05-14-13 | Žst. Kuřim, rozhlasové zařízení | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 36 | PS 05-14-14 | Žst. Kuřim, kamerový systém | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 37 | PS 05-14-15 | Žst. Kuřim, informační zařízení | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 38 | | TRAŤOVÉ RADIOVÉ SPOJENÍ | 187 dny | 7.8. 17 | 9.2. 18 | | |
| 39 | PS 05-14-10 | Žst. Kuřim, úprava MRTS | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 40 | PS 05-14-11 | Žst. Kuřim, úprava TRS | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 41 | | JINÁ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ | 187 dny | 7.8. 17 | 9.2. 18 | | |
| 42 | PS 05-14-04 | Žst. Kuřim, doplnění přenosového zařízení | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 43 | PS 05-14-12 | Žst. Kuřim, sdělovací zařízení, klimatizace | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 44 | | SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNÉ DRŤ | 306 dny | 10.4. 17 | 9.2. 18 | | |
| 45 | | DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA | 224 dny | 1.7. 17 | 9.2. 18 | | |
| 46 | PS 05-05-01 | Žst. Kuřim, doplnění DRŤ | 122 dny | 11.10. 17 | 9.2. 18 | | |
| 47 | PS 05-05-02 | ED Brno, doplnění DRŤ a řídicího systému | 153 dny | 10.9. 17 | 9.2. 18 | | |
| 48 | PS 05-05-03 | Žst. Kuřim, DDTS ŽDC | 153 dny | 10.9. 17 | 9.2. 18 | | |
| 49 | PS 05-05-04 | ED Brno, DDTS ŽDC | 153 dny | 10.9. 17 | 9.2. 18 | | |
| 50 | | TECHNOLOGIE TRAFOSTANIČNÍCH STANIC vn/nn | 306 dny | 10.4. 17 | 9.2. 18 | | |
| 51 | PS 05-13-01 | Žst. Kuřim, trafostanice 25/0,4kV pro EOv | 122 dny | 11.10. 17 | 9.2. 18 | | |
| 52 | PS 05-13-02 | Žst. Kuřim, trafostanice 25/0,4kV pro zab. zař. | 134 dny | 29.9. 17 | 9.2. 18 | | |
| 53 | PS 05-13-03 | Žst. Kuřim, rekonstrukce trafostanice 22/0,4kV | 134 dny | 29.9. 17 | 9.2. 18 | | |
| 54 | PS 05-13-03.1 | Žst. Kuřim, klimatizace trafostanice 22/0,4kV | 134 dny | 29.9. 17 | 9.2. 18 | | |
| 55 | PS 05-13-04 | Žst. Kuřim, provizorní trafostanice 22/0,4kV | 204 dny | 21.7. 17 | 9.2. 18 | | |
| 56 | PS 05-13-04.1 | Žst. Kuřim, kontejnerová PNTS 6kV | 235 dny | 20.6. 17 | 9.2. 18 | | |
| 57 | | PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU | 212 dny | 13.7. 17 | 9.2. 18 | | |
| 58 | PS 05-07-01 | Žst. Kuřim, rozvodna nn | 141 dny | 22.9. 17 | 9.2. 18 | | |
| 59 | PS 05-07-01.1 | Žst. Kuřim, náhradní zdroj | 141 dny | 22.9. 17 | 9.2. 18 | | |

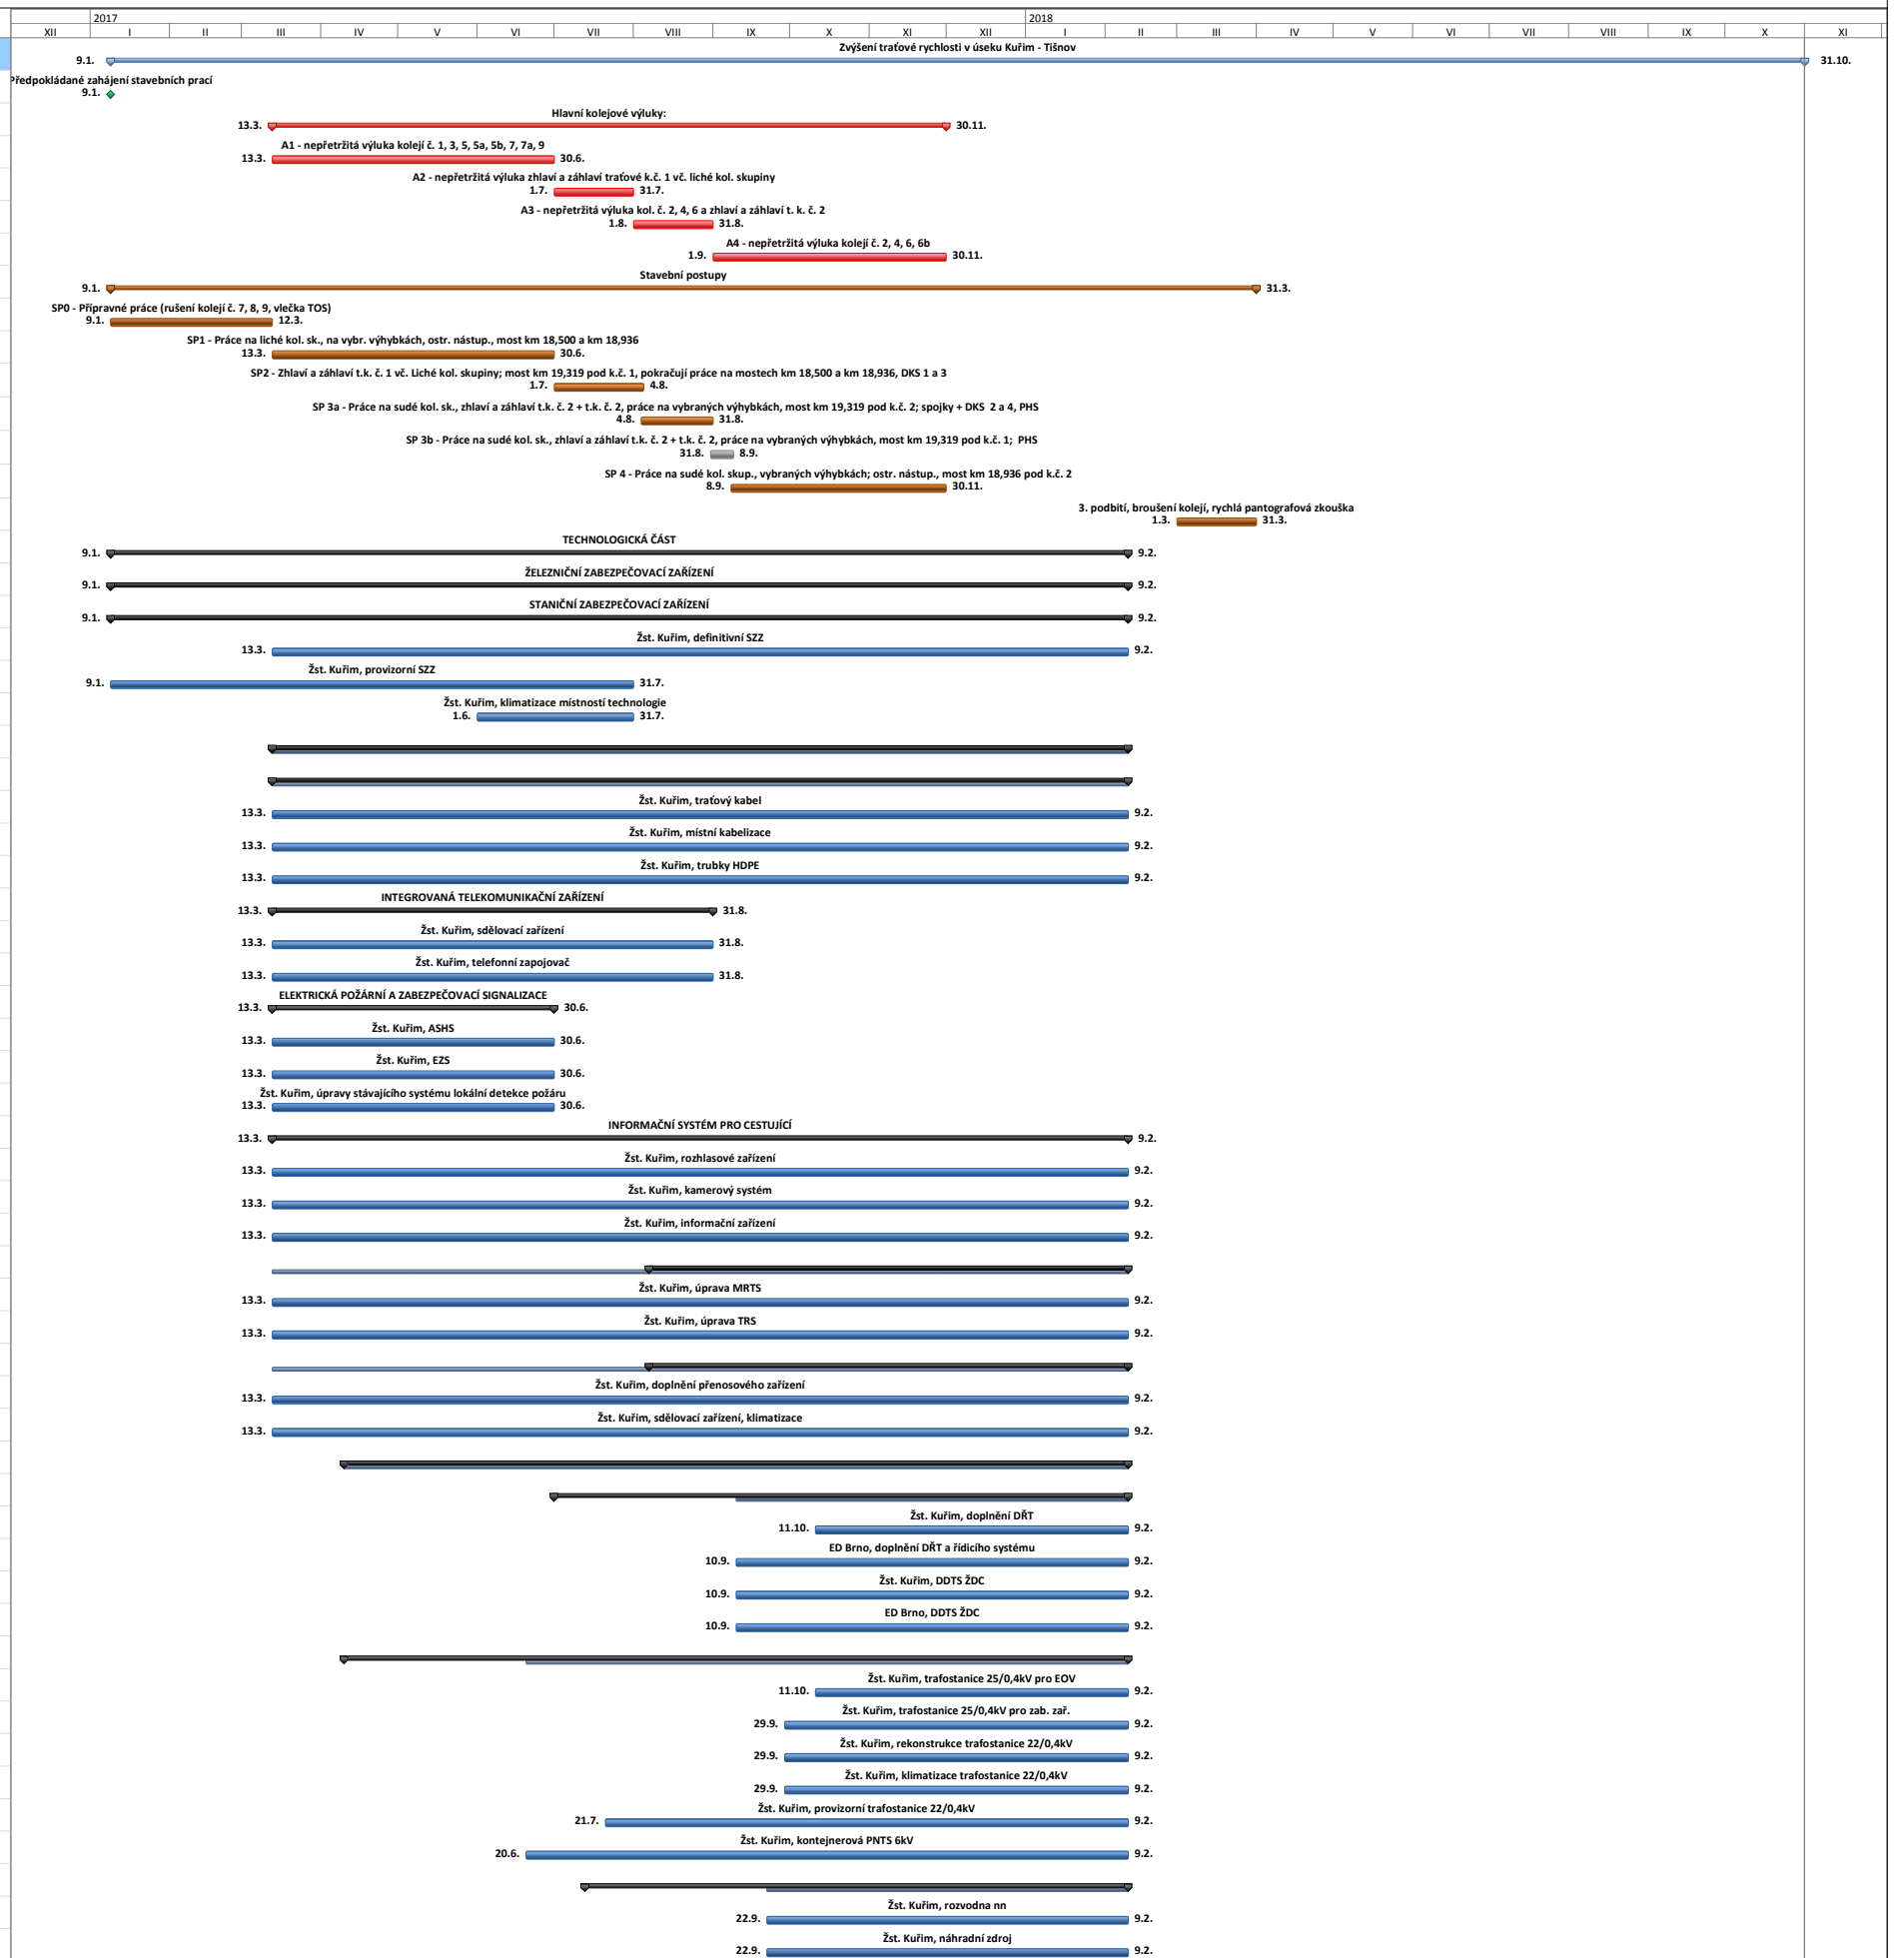

HARMONOGRAM PRACÍ

| ID | PS/SO | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Předchůdci | Název zdrojů |
|-----|---------------|---|----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|
| 60 | | STAVEBNÍ ČÁST | 538 dny | 9.1. 17 | 30.6. 18 | | |
| 61 | | INŽENÝRSKÉ OBJEKTY | 397 dny | 9.1. 17 | 9.2. 18 | | |
| 62 | | ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 63 | SO 05-17-01 | Žst. Kuřim, železniční svršek (od 9.1.-13.3.17 demontáž k.č. 7, 8, 9, vlečka TOS) | 384 dny | 13.3. 17 | 31.3. 18 | | |
| 64 | SO 05-16-01 | Žst. Kuřim, železniční spodek | 263 dny | 23.5. 17 | 9.2. 18 | | |
| 65 | | NÁSTUPIŠTĚ | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 66 | SO 05-16-02 | Žst. Kuřim, nástupiště | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 67 | | Ostrovní nástupiště mezi kol. č. 1 a 3 | 141 dny | 13.3. 17 | 31.7. 17 | | |
| 68 | | Ostrovní nástupiště mezi kol. č. 2 a 4 | 122 dny | 11.10. 17 | 9.2. 18 | 67 | |
| 69 | | MOSTY, PROPUSTKY A ZDI | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 70 | SO 05-19-01 | Žst. Kuřim, most v km 18,500 | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 71 | SO 05-19-02 | Žst. Kuřim, most v km 18,692 - podchod | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 72 | SO 05-19-02.1 | Žst. Kuřim, most v km 18,692 - podchod - úpravy stávajících výtahů | 271 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 73 | SO 05-19-03 | Žst. Kuřim, most v km 18,936 | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 74 | SO 05-19-04 | Žst. Kuřim, most v km 19,319 | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 75 | SO 05-19-05 | Opěrná zeď vlevo v ekm 18,730 - 18,810 | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 76 | SO 05-19-06 | Opěrná zeď vpravo v ekm 18,944 - 19,164 | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 77 | SO 05-19-07 | Žst. Kuřim, návěstní lávka v km 18,119 | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 78 | SO 05-19-07.1 | Žst. Kuřim, návěstní lávka v km 18,830 | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 79 | | OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY | 475 dny | 13.3. 17 | 30.6. 18 | | |
| 80 | SO 05-12-41 | Žst. Kuřim, přeložka kabelu vn E.ON v km 18,365 | 208 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 81 | SO 05-14-01 | Žst. Kuřim, ochrana drážních sdělovacích kabelů | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 82 | SO 05-14-02 | Žst. Kuřim, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 83 | SO 05-14-02.1 | Žst. Kuřim, ochrana sdělovacích kabelů ČD-T | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 84 | SO 05-14-02.2 | Žst. Kuřim, ochrana sdělovacích kabelů KME | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 85 | SO 05-43-01 | Zabezpečení veřejných zájmů - vegetační úpravy | 291 dny | 13.3. 17 | 30.6. 18 | | |
| 86 | | POTRUBNÍ VEDENÍ | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 87 | SO 05-21-01 | Žst. Kuřim, ochrana plynovodů | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 88 | SO 05-22-01 | Žst. Kuřim, ochrana vodovodů | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 89 | SO 05-27-01 | Žst. Kuřim, ochrana kanalizací | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 90 | | POZEMNÍ KOMUNIKACE | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 91 | SO 05-18-01 | Žst. Kuřim, plocha VN VK u koleje č.5 | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 92 | | KABELOVODY, KOLEKTORY | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 93 | SO 05-15-04 | Žst. Kuřim, kabelovod | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 94 | | POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY | 367 dny | 8.2. 17 | 9.2. 18 | | |
| 95 | | POZEMNÍ OBJEKTY BUDOV | 110 dny | 13.3. 17 | 30.6. 17 | | |
| 96 | SO 05-15-01 | Žst. Kuřim, stavební úpravy výpravní budovy | 110 dny | 13.3. 17 | 30.6. 17 | | |
| 97 | SO 05-15-02 | Žst. Kuřim, stavební úpravy technologické budovy | 110 dny | 13.3. 17 | 30.6. 17 | | |
| 98 | | ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠTĚ, PŘÍSTŘEŠKY NA NÁSTUPIŠTÍCH | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 99 | SO 05-15-03 | Žst. Kuřim, zastřešení nástupišť_A | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 100 | | Žst. Kuřim, zastřešení nástupišť_B dešťová kanalizace | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 101 | | INDIVIDUÁLNÍ PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ | 414 dny | 13.3. 17 | 30.4. 18 | | |
| 102 | SO 05-15-05 | Žst. Kuřim, PHS | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 103 | SO 05-15-06 | Žst. Kuřim, IPO | 60 dny | 2.3. 18 | 30.4. 18 | | |
| 104 | | ORIENTAČNÍ SYSTÉM | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 105 | SO 05-15-07 | Žst. Kuřim, Orientační systém | 221 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 106 | | TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ | 471 dny | 15.1. 17 | 30.4. 18 | | |
| 107 | | TRAKČNÍ VEDENÍ | 414 dny | 13.3. 17 | 30.4. 18 | | |
| 108 | SO 05-01-01 | Žst. Kuřim, trakční vedení | 414 dny | 13.3. 17 | 30.4. 18 | | |
| 109 | SO 05-01-02 | Žst. Kuřim, napájení EO V z TV | 172 dny | 13.3. 17 | 31.8. 17 | | |
| 110 | SO 05-01-03 | Žst. Kuřim, napájení zab.zař. z TV | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 111 | SO 05-01-04 | Žst. Kuřim, převěšení ZOK | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 112 | SO 05-01-05 | Žst. Kuřim, zavěšení kabelu 6kV | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 113 | | OHREV VÝMĚN | 224 dny | 1.7. 17 | 9.2. 18 | | |
| 114 | SO 05-06-01 | žst. Kuřim, EO V | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 115 | | ROZVODY vn,nn OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ | 391 dny | 15.1. 17 | 9.2. 18 | | |
| 116 | SO 05-04-02 | Žst. Kuřim, rekonstrukce rozvodu 6kV | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 117 | SO 05-06-03 | Žst. Kuřim, úprava rozvodů nn | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 118 | SO 05-06-04 | Žst. Kuřim, venkovní osvětlení | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |
| 119 | SO 05-06-05 | Žst. Kuřim, osvětlení nákladíště. | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | |

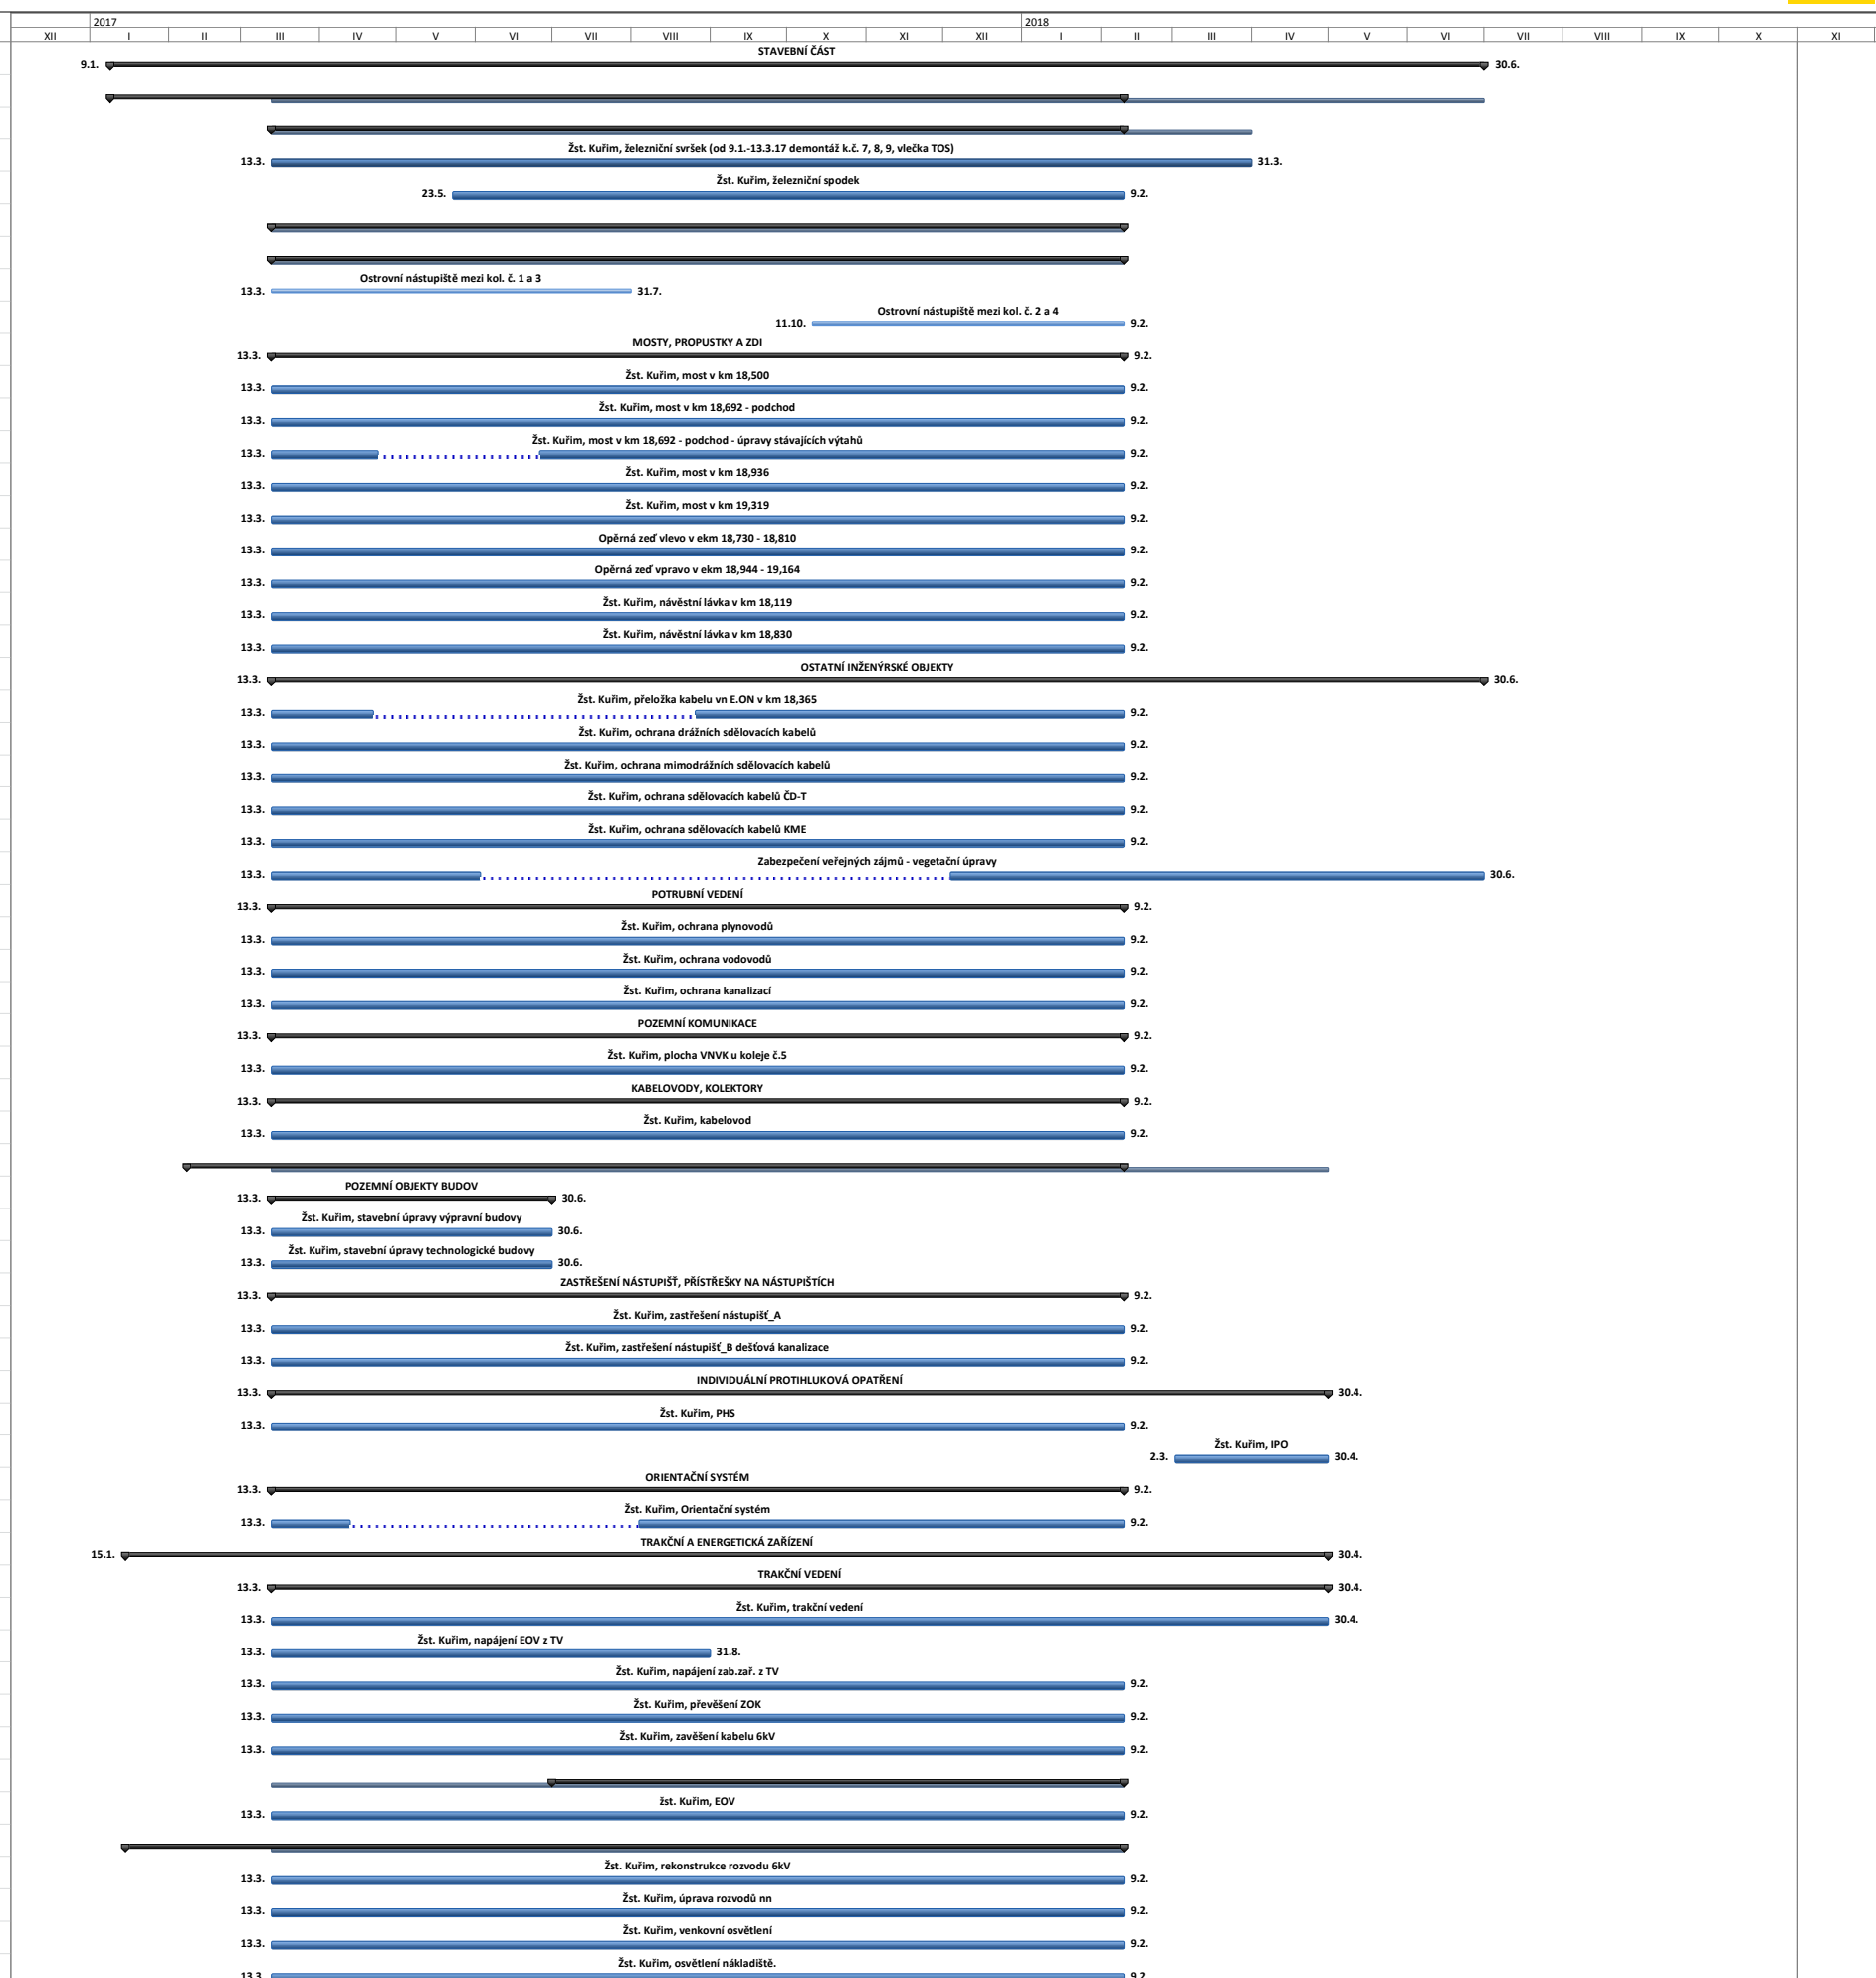

| ID | PS/SO | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Předchůdci | Název zdrojů | 2017 | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------|--------------|--|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|---|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|--------|
| | | | | | | | | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 120 | SO 05-06-06 | Žst. Kuřim, osvětlení nástupišť a podchodu | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | | 13.3. Žst. Kuřim, osvětlení nástupišť a podchodu | | | | | | | | | | | | 9.2. | | | | | | | | | | | |
| 121 | SO 05-06-07 | Žst. Kuřim, DOÚO | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | | 13.3. Žst. Kuřim, DOÚO | | | | | | | | | | | | 9.2. | | | | | | | | | | | |
| 122 | SO 05-06-08 | Žst. Kuřim, úprava rozvodů nn ve VB | 61 dny | 13.3. 17 | 12.5. 17 | | | 13.3. Žst. Kuřim, úprava rozvodů nn ve VB | | | | | | | | | | | | 12.5. | | | | | | | | | | | |
| 123 | SO 05-06-09 | Žst. Kuřim, přeložky silnoproudých zařízení | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | | 13.3. Žst. Kuřim, přeložky silnoproudých zařízení | | | | | | | | | | | | 9.2. | | | | | | | | | | | |
| 124 | UKOLEJNĚNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ | | 391 dny | 15.1. 17 | 9.2. 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | SO 05-01-06 | žst. Kuřim, ukolejnění | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | | 13.3. žst. Kuřim, ukolejnění | | | | | | | | | | | | 9.2. | | | | | | | | | | | |
| 126 | VNĚJŠÍ UZEMNĚNÍ | | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | SO 05-06-10 | Žst. Kuřim, uzemnění TS 25/0,4kV pro EOV | 334 dny | 13.3. 17 | 9.2. 18 | | | 13.3. Žst. Kuřim, uzemnění TS 25/0,4kV pro EOV | | | | | | | | | | | | 9.2. | | | | | | | | | | | |
| 128 | SO 05-06-11 | Žst. Kuřim, uzemnění TS 25/0,4kV pro zab. zař. | 141 dny | 13.3. 17 | 31.7. 17 | | | 13.3. Žst. Kuřim, uzemnění TS 25/0,4kV pro zab. zař. | | | | | | | | | | | | 31.7. | | | | | | | | | | | |
| 129 | SO 05-06-12 | Žst. Kuřim, uzemnění TS 22/0,4kV | 141 dny | 13.3. 17 | 31.7. 17 | | | 13.3. Žst. Kuřim, uzemnění TS 22/0,4kV | | | | | | | | | | | | 31.7. | | | | | | | | | | | |
| 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | | Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů | 214 dny | 1.4. 18 | 31.10. 18 | | | | | | | | | | | | | | | 1.4. Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů | | | | | | | | | | | 31.10. |
| 132 | | Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem | 214 dny | 1.4. 18 | 31.10. 18 | | | | | | | | | | | | | | | 1.4. Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem | | | | | | | | | | | 31.10. |
| 133 | | Předání souborného zpracování geodetické části DOPS | 214 dny | 1.4. 18 | 31.10. 18 | | | | | | | | | | | | | | | 1.4. Předání souborného zpracování geodetické části DOPS | | | | | | | | | | | 31.10. |
| 134 | | Předání technické části DOPS | 214 dny | 1.4. 18 | 31.10. 18 | | | | | | | | | | | | | | | 1.4. Předání technické části DOPS | | | | | | | | | | | 31.10. |
