

Změnový list / předložení vzorků k odsouhlasení

Projekt: Sanace dna a dělící hráze neplaveckého bazénu a vybudování mola na LKOP
Název ZL: Betonáž dna LKOP
Číslo ZL: 001

Č.smlouvy: 17SMTU0100000013

Zdůvodnění změny / předložení vzorků k odsouhlasení:

Tímto změnovým listem jsou řešeny tyto vícepráce a méněpráce:

Zemní práce a betonáž dna

a) Při bouracích pracích betonového dna LKOP byla zjištěna skutečnost, že podklad pod stávajícím dnem je v rohové části bazénu nevyhovující (viz příloha č.2). Došlo k odstranění a odvozu celé mocnosti nevhodných zásypových materiálů. Po přihlédnutí veškerých okolností bylo rozhodnuto, že mocnost nové vrstvy kameniva bude navýšena včetně síly nové železobetonové desky. Plocha prováděné části je 980 m2, kdy konkrétně byla navýšená mocnost vrstvy štěrkodrti o 5 cm a mocnost železobetonové desky o 10 cm.

Přílohy:
Příloha č. 1 Soupis prací k ZL 001 - Betonáž dna LKOP
Příloha č. 2 schéma
Příloha č. 3 fotodokumentace

Cenový dopad změny (je-li nějaký):	400 771,00 Kč bez DPH
---	------------------------------

Vystavil:
DEV Company spol. s.r.o.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jméno, příjmení

Podpis: _____

Datum: _____

Schválil za Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.:

Adresa Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 25385691

INVESTOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jméno, příjmení

Podpis: _____

Datum: _____

AD: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jméno, příjmení

Podpis: _____

Datum: _____


Položky
Slepý rozpočet

Stavba :	LKOP	Rozpočet: VCP
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201202R00	Hloubení jam v hor.3 do 1000 m3 vč. zachování spádování dna	m3	147,00	430,00	63 210,00
2	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	147,00	38,00	5 586,00
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	147,00	85,00	12 495,00
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	147,00	91,00	13 377,00
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	588,00	16,00	9 408,00
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	147,00	185,00	27 195,00
		Celkem za 1 Zemní práce				131 271,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
10	273321611R00	Železobeton základových desek C25/30 XC2, XD2, XF3-CI 0,4 - Dmax 16-S3	m3	98,00	2 320,00	227 360,00
		Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání				227 360,00
Díl: 5		Komunikace				
16	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	980,00	43,00	42 140,00
		Celkem za 5 Komunikace				42 140,00

Cena celkem	400 771,00
--------------------	-------------------

schéma

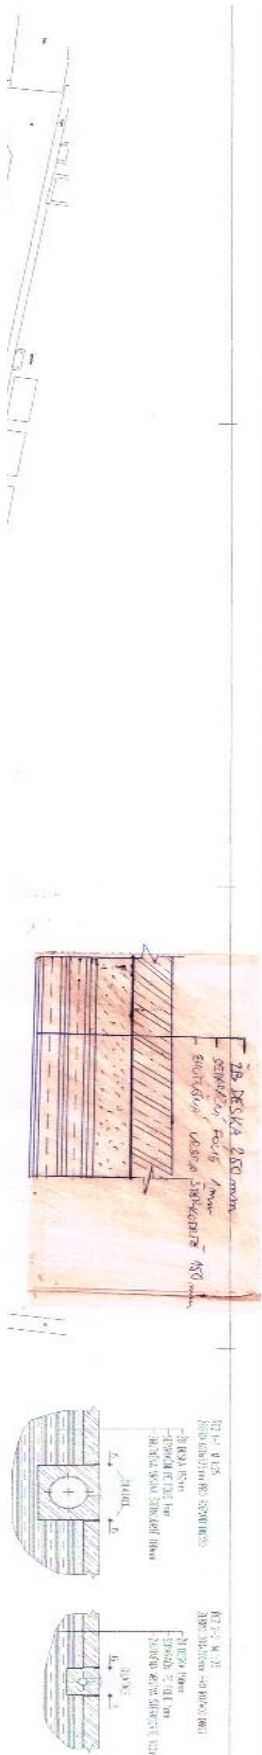

schéma

