



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo


číslo objednatele: S-1510/DOP/2017

číslo zhotovitele: O-17-10-178

„Oprava mostu ev. č. 102-028 Most přes Vápenický potok ve Velké“

Smluvní strany

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek,
IČ:70891095 DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu 
dále jen „objednatel“

a

„Společnost TAQ – ROBSTAV stavby“


která je tvořena společnostmi:

Společnost T.A.Q. s. r. o. - „vedoucí společník“

se sídlem: Fetrovská 1002/59, 16000 Praha 6 - Dejvice,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 150147

zastoupena: Petrem Jelínkem, jednatelem

IČ: 28868781, DIČ: CZ28868781

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 

a

ROBSTAV stavby k. s., - „druhý společník“

se sídlem: Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01 Písek,
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl A, vložka 11191

zastoupena: Ing. Radkem Kozákem, komplementářem

IČ: 27430774, DIČ: CZ27430774

která je na základě Plné moci ze dne 7.6.2017 a čl. VI odst. 2, písm. b) Společenské smlouvy
zastoupena Petrem Jelínkem (viz příloha č. 1 tohoto dodatku)

dále společně jen „zhotovitel“



se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“)

Článek I.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění Smlouva o dílo ze dne 1. 9. 2017, č. smlouvy o dílo Objednatele: S-1510/DOP/2017, č. smlouvy o dílo Zhotovitele: O-17-10-178 (dále jen „smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6.12.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 9.4.2018 (dále jen „Smlouva“) následovně:

a) Článek **III. Cena za dílo, odstavec 3.1** se nahrazuje následujícím (tučným) textem:
Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující celkovou nabídkovou cenu stavby:

Cena díla dle Dodatku č. 2:

Cena bez DPH	12.020.262,07 Kč
DPH	2.524.255,03 Kč
Celková cena včetně DPH	14.544.517,10 Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH	12.170.016,27 Kč
DPH	2.555.703,41 Kč
Celková cena včetně DPH	14.725.719,68 Kč

Oceněný výkaz výměr, který byl Zhotovitelem zpracován a Objednatelem odsouhlasen v rámci Smlouvy o dílo, se nahrazuje aktualizovaným soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

2. V projektové přípravě byl vypracován návrh dopravně inženýrských opatření, ke kterému Policie ČR DI Příbram vydala dne 21. 8. 2015, čj. KRPS-287542-1/ČJ-2015-011106 předběžné stanovisko k návrhu DIO, ve kterém požaduje před samotnou realizací stavby předložení nového návrhu DIO. S odvoláním na toto stanovisko požaduje Policie ČR Územní odbor Příbram DI (PČR Příbram) svým emailem ze dne 26.10.2017 por. Mgr. Lucie Valíčková úpravu původně navrženého DIO, kterou byla zcela pozměněna objízdná trasa. Požadavek PČR Příbram na doplnění výstražných světel S7 z obou stran uzavřeného úseku byl dodatečně písemně potvrzen mailem PČR Příbram ze dne 5. 1.



2018. Na základě nových požadavků tak dochází k navýšení počtu dopravních značek a doplnění výstražných světel S7. Dopravní značení a dopravní zařízení je odsouhlasené orgánem Policie ČR, KŘ DI Příbram pod č.j. KRPS-349683-1/ČJ-2017011106 ze dne 8. 11.2017.

Na základě Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích, které vydalo Samostatné oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Příbram dne 2. 12. 2017 pod číslem jednacím MeUPB St/104019/2017/SOSH/ŠtZ, bude přechodná úprava provozu provedena v termínu od 4. 12.2017 do 30. 6. 2018. Z tohoto důvodu dochází ke snížení délky pronájmu dopravního značení z původně uvažovaných 240 dnů na 209 dnů.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, na základě požadavků orgánů veřejné správy. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Detailní zdůvodnění jednotlivých změn je přílohou ZBV č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

3. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSUS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek. V souladu s § 5 odst. 1 Směrnice se jedná o nepodstatné změny a považují se za změny zařazené do Skupiny č. 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřevyšuje limit 50% původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny. Součet hodnoty všech změn je 17,32 %. Hodnota změny ve spojení s dalšími změnami nepřekračuje limit 30% původní hodnoty závazku. Změny kladné ve výši **149.754,20 Kč bez DPH, 181.202,58 Kč s DPH**, činí celkem v součtu se změnami uvedenými v dodatku č. 2 9,87 % z celkové ceny díla. Změny záporné ve výši **0,00 Kč bez DPH, 0,00 s DPH** činí celkem v součtu se změnami uvedenými v dodatku č. 2 7,45 % z celkové ceny díla (hodnota změny nepřekračuje limit 30% původní hodnoty závazku dle Směrnice).



4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno ve Formuláři pro ohlášení změn stavby ze dne 30.1.2018 – příloha č. 2 tohoto dodatku.
3. Tento Dodatek č. 3 vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 047-12/2018/RK ze dne 6.4.2018.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:
 - 1) Společenská smlouva, plná moc
 - 2) ZBV č. 2 SO DIO, formulář ohlášení změny, soupis prací

V Praze, dne 10. 4. 2018

Zhotovitel

Za „Společnost TAQ – ROBSTAV stavby“



Petr Jelínek

jednatel Společnosti T.A.Q. s.r.o.



V Praze, dne 14-05-2018

Objednatel

Středočeský kraj



MVDr. Josef Řihák

radní pro oblast investic a
veřejných zakázek

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA

uzavřená dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v souvislosti s realizací díla

„Oprava mostu ev.č. 102-028 Most přes Vápenický potok ve Velké“

„Společnost TAQ – ROBSTAV stavby“

Čl. I Smluvní strany

Společnost T.A.Q. s. r. o.

se sídlem Fetrovská 1002/59, 16000 Praha 6 - Dejvice,

IČO: 28868781

DIČ: CZ28868781

Zastoupená: Petrem Jelínkem, jednatelem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150147

dále jen „**vedoucí společník**“

a

ROBSTAV stavby k. s.,

se sídlem: Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01 Písek,

IČ: 27430774,

DIČ: CZ27430774

Zastoupená: Ing. Radkem Kozákem, komplementářem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl A, vložka 11191

dále jen „**druhý společník**“

(vedoucí společník a druhý společník jsou dále uváděni společně jako „**smluvní strany**“ nebo jako „**společníci**“ a každý z nich samostatně jako „**společník**“)

Čl. II Účel společnosti, název společnosti

1. Společníci touto smlouvou vytvářejí společnost:

- a) za účelem vypracování a podání společné nabídky do zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „**Oprava mostu ev.č. 102-028 Most přes Vápenický potok ve Velké**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“), zadávané veřejným zadavatelem Středočeský kraj, se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČO: 70891095 (dále jen „**zadavatel**“), ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 523891 (dále jen „**zadávací řízení**“).
- b) za účelem společného provedení veřejné zakázky (dále také jako „**dílo**“) v případě úspěchu v zadávacím řízení, a to v rozsahu a za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo uzavřené mezi zadavatelem, jako objednatel na straně jedné, a společníky, jako zhotovitelem na straně druhé (dále jen „**smlouva se zadavatelem**“).

000092



2. Pro úspěšné dosažení účelu společnosti se společníci zavazují vyvíjet činnost směřující k dosažení sjednaného účelu způsobem stanoveným v této smlouvě a zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu.
3. Společnost bude označována názvem: „**Společnost TAQ – ROBSTAV stavby**“ (dále jen „**společnost**“).

Čl. III **Vznik a zánik společnosti**

1. Členství společníka vzniká uzavřením této smlouvy a trvá po celou dobu existence práv a povinností plynoucích z předložené společné nabídky, případně ze smlouvy se zadavatelem, jejímž předmětem bude realizace veřejné zakázky.
2. Společnost zanikne v případě:
 - a) že zadávací řízení bude zrušeno, a to dnem jeho zrušení;
 - b) uplynutí zadávací lhůty dle § 40 zák. č. 134/2016 Sb, Zákon o zadávání veřejných zakázek, pokud zadavatel neuzavře smlouvu se společníky, případně po vrácení veškerých jistot za nabídku, dojde-li k němu později;
 - c) splnění veškerých závazků společníků vůči zadavateli, které vyplývají ze společné nabídky a ze smlouvy se zadavatelem a splnění všech závazků zadavatele vůči společníkům ze smlouvy se zadavatelem (tj. včetně splnění všech závazků vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost, vrácení jistoty nebo obdržení a rozdělení poslední platby od zadavatele a splnění všech závazků vyplývajících z veřejné zakázky a uzavření všech s ní souvisejících účtů, podle toho, co nastane jako poslední);
 - d) ostatních důvodů stanovených v § 2744 občanského zákoníku.
3. Ustanovení odst. 2 písm. a) tohoto článku se neuplatní v případě, že společníci nebo jiný uchazeč v zadávacím řízení podá důvodnou:
 - a) námitku dle § 241 zákona č. 134/2016 Sb, Zákon o zadávání veřejných zakázek, nebo
 - b) návrh na přezkoumání úkonů zadavatele při zadávacím řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nebo
 - c) žalobu proti rozhodnutí vydanému v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávacím řízení vedeném u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, včetně řízení o kasační stížnosti a bude-li k takovému právnímu jednání společníků nebo jiného uchazeče zrušeno rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení.
4. Společníci výslovně sjednávají, že tato společenská smlouva zůstane účinná:
 - a) v případě uzavření smlouvy se zadavatelem do okamžiku skončení smluvní záruční doby, vrácení jistoty nebo obdržení a rozdělení poslední platby od zadavatele a splnění všech závazků vyplývajících z veřejné zakázky a uzavření všech s ní souvisejících účtů, podle toho, co nastane jako poslední.

Čl. IV **Právní postavení společníků**

1. Společnost není právnickou osobou, nemá způsobilost k právům a povinnostem a nezapisuje se do obchodního rejstříku ani do jiného rejstříku právnických a fyzických osob ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb.
2. Společnost není samostatnou účetní jednotkou ani plátcem daně z příjmů. Touto jednotkou a plátcem je každý ze společníků sám.
3. Společníci jsou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky a smlouvy se zadavatelem.

Čl. V

Práva a povinnosti společníků navzájem

1. Každý ze společníků je povinen vyvíjet činnost k dosažení sjednaného společného účelu společnosti způsobem a v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
2. Společník vykonává činnost pro společnost osobně. Společník není oprávněn členství ve společnosti zřídit jiné osobě, ani své členství postoupit. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy může jeden ze společníků převést na třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem druhého společníka.
3. Společníci se dohodli, že veřejná zakázka bude v rámci společnosti prováděna společníky společně, a to prostřednictvím společného řídicího (realizačního) týmu s tím, že na činnosti společnosti, na majetku získaného společnou činností a na zisku nebo na ztrátě se společníci podílejí v tomto poměru:

a) vedoucí společník	60 %
b) druhý společník	40 %
4. Rozhodnutí o záležitostech Společnosti se přijímají jednomyslně, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

Čl. VI

Správa společnosti

1. O všech otázkách, které se týkají spravování společných záležitostí společnosti, rozhodují společníci jednomyslně.
2. Vedoucí společník je na základě této společenské smlouvy pověřen správou společných věcí v následujícím rozsahu:
 - a) podpisu a podání společné nabídky účastníků Společnosti v příslušném výběrovém řízení
 - b) podpisu příslušné Smlouvy o dílo
 - c) přijímání závazků a pokynů pro a za každého a všechny účastníky Společnosti
 - d) přijímání plateb od zadavatele
3. Společníci touto společenskou smlouvou sjednávají, že v následujících záležitostech budou jednat a zastupovat společnost výhradně společně:
 - a) jednání ve věci podané nabídky a provádění veškerých úkonů spojených s účastí v zadávacím řízení, včetně podávání námitek proti úkonům zadavatele v zadávacím řízení a podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže;
 - b) činění veškerých právních úkonů souvisejících s činností společníků v rámci společnosti a při provádění veřejné zakázky.

000093



4. Druhý společník tímto výslovně dle § 2737 a § 2439 občanského zákoníku zmocňuje vedoucího společníka, aby jeho jménem právně jednal v rozsahu čl. VI odst. 2 této smlouvy.
5. Vedoucí společník se zavazuje informovat společníka o všech podstatných úkonech, které ve věci společnosti učinil nebo hodlá učinit.
6. Společníci jsou povinni poskytnout si navzájem veškerou potřebnou součinnost při zpracování nabídky, poskytnout si veškeré potřebné informace a podklady a účastnit všech jednání týkajících se společnosti.

Čl. VII

Práva a povinnosti společníků při vypracování nabídky

1. V rámci zadávacího řízení mají společníci následující práva a povinnosti:
 - a) společníci jsou povinni kvalifikovaně prostudovat a prověřit zadávací dokumentaci a veškeré další dokumenty či podklady, které byly zadavatelem společníkům zpřístupněny nebo od něj převzaty;
 - b) druhý společník je povinen s vedoucím společníkem spolupracovat, poskytovat mu veškeré potřebné informace, podklady, dokumenty a doklady prokazující kvalifikaci a schopnost realizovat veřejnou zakázku;
 - c) vedoucí společník je povinen zajistit koordinaci činnosti společníků při zpracování nabídky;
 - d) vedoucí společník se zavazuje zkompletovat společnou nabídku společnosti a včas kompletní nabídku předat zadavateli;
 - e) vedoucí společník poskytne k zajištění splnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu (§ 41 zák. č. 134/2016 Sb, Zákon o zadávání veřejných zakázek) ve výši a formě požadované zadávacími podmínkami. Náklady spojené s poskytnutím jistoty si společníci vypořádají mezi sebou v poměru dle jejich podílu na činnosti společnosti. Případně-li poskytnutá jistota zadavateli z důvodu, který nezavinil vedoucí společník, nýbrž jiný společník, vzniká vedoucímu společníkovi společnosti vůči tomuto společníkovi nárok na náhradu škody, tj. zejména na úhradu částky ve výši propadnuté jistoty. Totéž platí v případě vyloučení společníků z účasti v zadávacím řízení z důvodů ležících na straně člena společnosti;
 - f) vedoucí společník poskytne k zajištění splnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení a z provádění díla pojištění, a to ve výši, formě a za podmínek požadovaných v zadávacích podmínkách a ve smlouvě o dílo. Každý společník se bude podílet na nákladech na pojištění dle výše svého podílu na činnosti společnosti;
 - g) každý společník nese své vlastní náklady vzniklé v souvislosti s přípravou a podáním nabídky a nemá právo požadovat jejich náhradu, a to ani tehdy, když nedojde k uzavření smlouvy se zadavatelem.
2. V případě, že zadavatel vybere společnou nabídku společníků jako nabídku nejvýhodnější, zavazují se společníci uzavřít se zadavatelem smlouvu (tímto není nijak dotčeno či omezeno zmocnění vedoucího společníka k podpisu návrhu smlouvy o dílo) a realizovat komplexně svůj podíl na díle, jakož i splnit další podmínky dané veřejné zakázky.

Čl. VIII

Práva a povinnosti Společníků při provádění díla

1. Společníci se v případě uzavření smlouvy se zadavatelem zavazují bez zbytečného odkladu uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým budou dodatečně upraveny, v souladu s podmínkami smlouvy se

zadavatelem konkrétní způsoby a podmínky vzájemné spolupráce při provádění veřejné zakázky, zejména pak otázky související s:

- a) organizačně-řídícími záležitostmi (orgány společnosti)
- b) výběrem a řízením subdodavatelů
- c) bankovním účtem společnosti
- d) majetkem společnosti
- e) hospodařením společnosti
- f) vedením účetnictví,
- g) financováním
- h) vystavením bankovních záruk
- i) pojištěním díla
- j) projednáváním změn smlouvy se zadavatelem
- k) přípravou projektové dokumentace
- l) řešením reklamací v rámci záruční doby
- m) dalšími podrobnostmi týkajícími se vnitřních poměrů společnosti a činnosti společnosti vč. jejího hospodaření.

Čl. IX Ostatní ujednání

1. Společníci berou na vědomí, že informace, které se dozvěděli v souvislosti s jejich spoluprací v rámci této smlouvy, jsou důvěrné, a tvoří obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 NOZ. Společníci se zavazují, že veškeré informace, získané v souvislosti s činností společnosti, použijí výhradně pro účely přípravy nabídky a realizace díla. Tyto informace budou poskytovány k dispozici třetím osobám jenom do míry nutné pro přípravu nabídky a realizaci díla.
2. Společníci se zavazují, že v souvislosti s veřejnou zakázkou se oni sami a/nebo jimi ovládané osoby a/nebo je ovládající osoby (ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích) nebudou účastnit zadávacího řízení a/nebo na realizaci veřejné zakázky jinak, než jak je uvedeno v této smlouvě. V této souvislosti se každý ze společníků zavazuje, že nepodá nabídku samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo jako subdodavatel, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. V případě porušení tohoto ujednání, je ten společník, který tento závazek porušil, povinen uhradit ostatním společníkům smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo domáhat se náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti, které společníci tímto sjednávají v souladu s § 1 odst. 2 občanského zákoníku odchylně od § 2050 občanského zákoníku
3. Smluvní strany se zavazují, že pohledávky z této smlouvy za ostatními smluvními stranami nepostoupí, nezastaví ani jiným způsobem nezatíží bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany – dlužníka na třetí osobu. Provedení postoupení, zastavení či jiného zatížení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je absolutně neplatné.

Čl. X Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
2. Měnit nebo doplňovat tuto společenskou smlouvu lze pouze písemnými dodatky. Za písemné dodatky nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

000094



3. Tato smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem, kdy k ní připojí svůj podpis poslední ze smluvních stran.
4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy může jeden ze společníků převést na třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem ostatních společníků.
5. Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž každý společník obdrží 1 vyhotovení a 1 vyhotovení bude součástí nabídky.

V Písku, dne 7. 6. 2017



ROBSTAV stavby k. s.,
Ing. Radek Kozák
komplementář

V Berouně, dne 7. 6. 2017



Společnost T.A.Q. s.r.o.
Petr Jeříněk
jednatel

Plná moc

Účastník společnosti „Společnost TAQ – ROBSTAV stavby“ (dále jen „Společnost“) společnost ROBSTAV stavby k. s., se sídlem: Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01 Písek, IČ 27430774, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl A, vložka 11191, zastoupena Ing. Radkem Kozákem (dále jen „Druhý společník“) jakožto „zmocnitel“

zmocňuje tímto

vedoucího účastníka Společnosti podle předmětné Smlouvy o společnosti, Společnost T.A.Q. s.r.o. se sídlem Fetrovská 1002/59,160 00 Praha 6, IČO: 28868781 zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150147 zastoupenou panem Petrem Jelínkem – jednatelem (dále jen „Vedoucí společník“)

• ke všem jednáním faktickým a právním v souvislosti s veřejnou zakázkou „Oprava mostu ev.č. 102-028 Most přes Vápenický potok ve Velké“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 523891, vyhlášenou zadavatelem Středočeským krajem, se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČO: 70891095 (dále jen „Veřejná zakázka“), Zmocněnec (Vedoucí společník) je za zmocnitele oprávněn zejména, nikoli však pouze, k:

- podpisu a podání společné nabídky účastníků Společnosti v příslušném výběrovém řízení
- podpisu příslušné Smlouvy o dílo
- přijímání závazků a pokynů pro a za každého a všechny účastníky Společnosti
- přijímání plateb od zadavatele

Kontaktní adresa pro doručování:

Společnost T.A.Q. s.r.o. se sídlem Fetrovská 1002/59,160 00 Praha 6

Za zmocnitele, ROBSTAV stavby k. s.,
V Písku, dne 7. 6. 2017

ROBS
Na Stínadlech
S. sek
7

Vedoucí účastník Společnosti „Společnost TAQ – ROBSTAV stavby“ podle předmětné Smlouvy o společnosti tuto plnou moc přijímá.

Za zmocněnce, Společnost T.A.Q. s.r.o.
V Berouně dne 7. 6. 2017

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Petr Jelínek
jednatel společnosti

000095

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	Oprava mostu ev. č. 102-028 Most přes Vápenický potok ve Velké
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	DIO
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	DIO / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Stanovisko Policie ČR 21.8.2015	1	
DI Policie ČR email 26.10.2017	2	
DI Policie ČR email 05.01.2018	2	
Stanovisko PČR, KŘ DI Příbram pod č.j. KRPS-349683-1/ČJ-2017011106 ze dne 08.11.2017.	5	
Měú Příbram odd sil.hosp - 2.12.2017	1	
Stanovisko TDI k ZBV 2 z 26.1.2018	1	
Stanovisko AD k ZBV 2 z 26.1.2018	2	
Počet listů celkem	14	

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava mostu ev. č. 102-028 Most přes Vápenický potok ve Velké Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DIO		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: DIO / 1	Číslo ZBV: 2
Objednatel: Středočeský kraj Zborovská 11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 70891095			
Zhotovitel: Společnost TAQ – ROBSTAV stavby se sídlem: Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 založená společníky: 1. Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 IČ: 28868781 2. ROBSTAV stavby k. s., Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01 Pí IČ: 27430774			
Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	149 754,20	149 754,20
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00		
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	149 754,20	149 754,20
Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.			
ZBV - krycí list			Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava mostu ev. č. 102-028 Most přes Vápenický potok ve Velké Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DIO	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: DIO / 1	Číslo ZBV: 2
--	---	------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-1510/DOP/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 1.9.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost TAQ - ROBSTAV stavby

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.
1. Krycí list 1 počet listů	1 Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů	2 Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	3 Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů	4 TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů	5 RDK
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů	
7. Ostatní doklady dle přehledu dokladů 14 počet listů	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Policie ČR DI Příbram vydala dne 21.8.2015, čj. KRPS-287542-1/ČJ-2015-011106 předběžné stanovisko k návrhu DIO, ve kterém požaduje před samotnou realizací stavby předložení nového návrhu DIO. S odvoláním na toto stanovisko požaduje Policie ČR Územní odbor Příbram DI (PČR Příbram) svým emailem ze dne 26.10.2017 por. Mgr. Lucie Valíčková úpravu původně navrženého DIO, kterou byla zcela pozměněna objízdná trasa. Požadavek PČR Příbram na doplnění výstražných světel S7 z obou stran uzavřeného úseku byl dodatečně písemně potvrzen emailem PČR Příbram ze dne 5.1.2018. Na základě nových požadavků tak dochází k navýšení počtu dopravních značek a doplnění výstražných světel S7. Dopravní značení a dopravní zařízení je odsouhlasené orgánem Policie ČR, KŘ DI Příbram pod č.j. KRPS-349683-1/ČJ-2017011106 ze dne 08.11.2017.

Na základě Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích, které vydalo Samostatné oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Příbram dne 2.12.2017 pod číslem jednacího MeUPB St/104019/2017/SOSH/ŠtZ, bude přechodná úprava provozu provedena v termínu od 04.12.2017 do 30.6.2018. Z tohoto důvodu dochází ke snížení délky pronájmu dopravního značení z původně uvažovaných 240 dnů na 209 dnů.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, na základě požadavků orgánů veřejné správy. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	149 754,20	149 754,20	149 754,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Oldřich Káš	datum	10.4.18	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Tomáš Vávra	datum	10.4.2018	podpis
Technický dozor investora	jméno	Petr Burger	datum	10.4.2018	podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	17-04-2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	MVDr. Josef Řihák	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Petr Jelínek Společnost T.A.Q. s.r.o.	datum	10.4.2018	podpis
					Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby: Oprava mostu ev. č. 102-028 Most přes Vápenický potok ve Velké	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	DIO / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DIO	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
603 292,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	603 292,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	149 754,20	149 754,20	24,82%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	753 046,20	149 754,20	24,82%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Oldřich Káš

Souhlasím 10.4.18

Projektant (autorský dozor): Ing. Tomáš Vávra

Souhlasím 10.4.2018

Stavební dozor: Petr Burger

Souhlasím 10.4.2018

Zástupce Objednatele: Bc. Zdeněk Dvořák

17-04-2018

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Aleš Čermák, MBA

16.4.2018



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: Oprava mostu ev.č. 102-028 Most přes Vápenický potok ve Velké								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO DIO								č. 1					
Číslo a název rozpočtu: SO DIO								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9	10	11	12	13	14
0 Všeobecné konstrukce a práce:													
1	027421	PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ	M2	40,00	40,00	0,00	3 195,00	127 800,00	0,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00%
2	027422	PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ	MĚS	8,00	8,00	0,00	27 787,50	222 300,00	0,00	0,00	222 300,00	0,00	0,00%
3	027423	PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ	M2	40,00	40,00	0,00	1 867,50	74 700,00	0,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00%
9 Ostatní konstrukce a práce:													
4	914124	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	40,00	52,00	12,00	152,00	6 080,00	0,00	1 824,00	7 904,00	1 824,00	30,00%
5	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	9 600,00	10 868,00	1 268,00	11,40	109 440,00	0,00	14 455,20	123 895,20	14 455,20	13,21%
		<i>52 x 209 dní</i>											
6	914244	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	8,00	20,00	12,00	152,00	1 216,00	0,00	1 824,00	3 040,00	1 824,00	150,00%
7	914249	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 3 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 920,00	4 180,00	2 260,00	14,30	27 456,00	0,00	32 318,00	59 774,00	32 318,00	117,71%
		<i>20 x 209 dní</i>											
8	914250	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	20,00	20,00	0,00	400,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
9	914251	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	20,00	20,00	0,00	355,00	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00%
10	914252	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM	MDEN	4 800,00	4 800,00	0,00	4,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00%
Nové položky - JC dle OTSKP SPK 2017													
11	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KS	0,00	3,00	3,00	1 030,00	0,00	0,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	100,00%
12	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KS	0,00	3,00	3,00	522,00	0,00	0,00	1 566,00	1 566,00	1 566,00	100,00%
13	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,00	627,00	627,00	151,00	0,00	0,00	94 677,00	94 677,00	94 677,00	100,00%
		<i>3 x 209 dní</i>											
Celkem								603 292,00	0,00	149 754,20	753 046,20	149 754,20	24,82%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **Oprava mostu ev. č. 102-028 Most přes Vápenický potok ve Velké**

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	11 882 458,92
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	12 170 016,27
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	14 725 719,68
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	102,42%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování změny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	7,45%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	287 557,35
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	2,42%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 564 737,68

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	17,32%
10=(38A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+38A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 058 595,05
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 941 229,46

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 142 668 000 Kč	0,00
14=142668000-37		142 668 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změna (Doměrky)			- 2 - Záměna položek (Započítávání)			- 3 - Nepředvidanost				- 4 - Nezbytnost				- 5 - Změny de minimis			
						Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 668 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		Oprava mostu ev. č. 102-028 Most přes Vápenický potok ve Velké	- 885 518,85	1 173 076,20	287 557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 885 518,85	1 173 076,20	9,87%	287 557,35	2 058 595,05	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
201	1	Most přes Vápenický potok ve Velké / změna způsobu založení	- 885 518,85	1 023 322,00	137 803,15			0,00			0,00	- 885 518,85	1 023 322,00	8,61%	137 803,15	1 908 840,85			0,00%	0,00	0,00		0,00%
DIO	2	DIO / úprava DIO na základě požadavku DI Policie ČR	0,00	149 754,20	149 754,20			0,00			0,00	0,00	149 754,20	1,26%	149 754,20	149 754,20			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00																				

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Příbram
Dopravní inspektorát
Žežická 498, 26123 Příbram V - Zdaboř

Č. j. KRPS-287542-1/ČJ-2015-011106

Příbram 21. srpna 2015
Počet stran: 1
Přílohy: 1x koordinační situace
2x návrh DIO

METROPROJEKT Praha a.s.
I.P.PAVLOVA 2/1786
120 00 PRAHA 2

Stanovisko ke stavbě (DSP) a vyjádření k předběžnému návrhu DIO - rekonstrukce mostu přes Vápenický potok - most ev.č. 102-028 na sil. č. II/102 v obci Velká
K č. j. 55-1639/2015/2015-Kle

Dopravní inspektorát PČR Příbram na základě předložené žádosti s přílohou a provedeného místního šetření, jakožto orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 77 odst. 1 písm. a), c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích


s o u h l a s í

s návrhem projektové dokumentace a s předběžným návrhem DIO stavby: **"Rekonstrukce mostu přes Vápenický potok - most ev.č. 102-028 na sil. č. II/102 v obci Velká"**, dle předložené projektové dokumentace a návrhu DIO, které jsou nedílnou součástí tohoto stanoviska.

Pro vydání stavebního povolení považujeme návrh DIO za dostačující. Avšak před samotnou realizací stavby požadujeme v dostatečném časovém předstihu předložit nový návrh dopravně inženýrských opatření zohledňující aktuální situaci na objízdné trase (např. omezení tonáže na mostech či stav komunikací na objízdné trase). Je nutné počítat s úpravami a doplněním DIO dle aktuální situace. Např. DZ IS 11c bude nahrazeno DZ IS 11b pokud bude objízdná trasa sloužit současně pro více uzavírek, apod.

PČR DI Příbram si vyhrazuje právo toto stanovisko doplnit nebo činit návrhy a opatření v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na výše uvedené komunikaci.

Zpracovala:


por. Mgr. Lucie Valíková
komisař

tel.: 
e-mail: 



por. Ing. Miroslav Ptáček
vedoucí oddělení DI Příbram



From: [REDACTED]

Sent: Thursday, October 26, 2017 2:14 PM

To: QUO - Štěpán Horal [REDACTED]

Cc: Zuzana Štěrbová [REDACTED] Jitka Váňová [REDACTED]

Subject: RE: žádost o vyjádření

Dobrý den pane Horale,

s odvoláním na naše stanovisko z roku 2015, Čj. KRPS-287542-1/ČJ-2015-011106 (viz příloha) sdělujeme, že bude nutná úprava navrženého DIO, tj. předložení nového DIO.

Objízdnu trasu nelze pro nákladní dopravu vést po III/11816, neboť v obci Dolní Hbity je most s omezenou tonáží Jediné vozidlo 16t. Nákladní dopravu pro směr Praha, Příbram, je nutné vést po sil. II/118 – D4 – I/18.

Část dopravy směřující z Kamýka na Sedlčany asi je možné vést po sil III/10229 přes Hrachov a Dražkov, za určitých opatření – v Dražkově jsou dvě úzká místa – umístit zde alespoň A 6a + B 20a (30). Pokud by v místě vznikly zásadnější problémy, muselo by se v předemném místě přistoupit například ke kyvadlové dopravě řízené semaforem – ale to zatím není nutné řešit, ale případně s tím do nákladů počítat. (Toto řešit s Měú Sedlčany)

Na sil. č. III/11817 přes Vápenice a Třtí žádáme umístit omezení B4 /3,5t/ mimo dopravní obsluhu - tam je to opravdu hodně úzké.

Z oblasti od obce Obory směřovat veškerou dopravu po I/18 směr Skalka – D4 (osobní může odbočit u Višňové na III/11816 – ale tam je modrý směrák Kamýk – tudíž bych tudy objízdnu trasu vůbec nevyznačovala), nákladní bude pokračovat na Skalku – D4 – MUK Háje.

Snažila jsem se schématicky zakreslit do přílohy..

Do toho v termínu (snad) 2.-3.12. se má uzavřít II/118 v Kamýku pro pokládku povrchu – ti povedou objízdňku přes Hrachov a Dražkov (je to víkend) – bude se muset zkoordinovat případné zakrytí DZ IS 11b „Kamýk“, které v té době nebude platit.

(na tyto dva dny budeme mít také problém s těmi IS 11b „Kamýk, co teď máte na Skalce, kvůli objízdňce na I/4 Dubenec – řeší p. Podhorský)

Zítرا budu po 14:30 v kanceláři. Můžeme si ještě zavolat a domluvit detaily.

Na vědomí: Měú Příbram, Měú Sedlčany

S pozdravem a přáním pěkného dne

por. Mgr. Lucie Valičková

dopravní inženýr





ÚZEMNÍ ODBOR PŘÍBRAM

Dopravní inspektorát

Žežická 498
261 23 Příbram



From: QUO - Štěpán Horal [redacted]
Sent: Wednesday, October 25, 2017 3:10 PM
To: VALIČKOVÁ Lucie [redacted]
Subject: žádost o vyjádření

Vážená paní inženýrko,

v příloze Vám zasílám žádost o vyjádření k akci: Oprava mostu ev. č. 102 – 028 Most přes Vápenický potok ve Velké.

Děkuji Vám za jakoukoliv odpověď.

S přáním hezkého dne

Štěpán Horal
technik dopravního značení

mobil: [redacted]
přímý tel. [redacted]
e-mail: [redacted]

Quo s.r.o., Křížíkova 2158, CZ-256 01 Benešov • Dopravní značení
tel.: [redacted] www.quo.eu


From: [REDACTED]
Sent: Friday, January 05, 2018 2:38 PM
To: QUO - Štěpán Horal [REDACTED]
Subject: RE: most ve Velké - dodatečné potvrzení požadavku PČR

Dobrý den!

Ve věci připomínkování návrhu přechodného DZ pro uzavírku sil. č. II/102 obci Velká v souvislosti s opravou mostu č. ev. 102-028 jsme požadovali doplnění výstražných světel S 7 z obou stran uzavřeného úseku, neboť takto standardně má být označeno pracovní místo v souladu s TP 66 a to i v obci (schéma B/15). Jedná se o silnici II. třídy a uzavírka trvá i v době snížené viditelnosti. Užití výstražných světel v tomto případě je nezbytné pro zajištění bezpečnosti silničního provozu.

S pozdravem a přáním pěkného dne

por. Mgr. Lucie Valičková
dopravní inženýr



ÚZEMNÍ ODBOR PŘÍBRAM
Dopravní inspektorát

Žežická 498
261 23 Příbram



From: QUO - Štěpán Horal [REDACTED]
Sent: Friday, January 5, 2018 10:42 AM
To: VALIČKOVÁ Lucie <[REDACTED]>
Subject: most ve Velké - dodatečné potvrzení požadavku PČR

Vážená paní Valičková,


dodatečně Vás žádám o písemné potvrzení Vašeho požadavku na umístění světelné řady 3 x S7 na příčné uzávěře silnice č. II/102 obci Velká v souvislosti s opravou mostu č. ev. 102-028. Uzavírka byla povolena rozhodnutím č. j. MeUPB Uz 105357/2017/SOSH/ŠtZ.

Děkuji Vám.

S přáním hezkého dne

Štěpán Horal
technik dopravního značení

mobil: 
přímý: 
e-mail: 

Quo s.r.o., Křížíkova 2158, CZ-256 01 Benešov • Dopravní značení
tel.  • www.quo.eu

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Příbram
Dopravní inspektorát
Žežická 498, 26123 Příbram V - Zdaboř

Č. j. KRPS-349683-1/ČJ-2017-011106

Příbram 8. listopadu 2017
Počet stran: 1
Přílohy: návrhy DIO

Quo s.r.o.
KŘÍŽÍKOVA 2158
256 01 BENEŠOV

Sil. č. II/102 v obci Velká - oprava mostu ev. č. 102-028 - úplná uzavírka - stanovisko k zvláštnímu užívání komunikace a vyjádření k návrhu DIO




Dopravní inspektorát PČR Příbram na základě předložené žádosti s přílohou, jako přízvaný příslušný orgán Policie České republiky podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. d), § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. a písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

s o u h l a s í

se zvláštním užíváním komunikace a s návrhem přechodného dopravního značení pro stavbu: „Oprava mostu ev. č. 102-028 na sil. č. II/102 v obci Velká - úplná uzavírka“, dle předloženého návrhu přechodného dopravního značení (DIO) vč. vyznačení objízdné trasy, které je nedílnou součástí tohoto stanoviska a vyjádření k DIO.

Stávající DZ, které by bylo v rozporu s přechodným DZ, bude zřetelně zneplatněno. Veškeré PDZ bude v souladu s platnými normami, vyhláškou 294/2015 Sb. a bude osazeno v souladu s platnými TP subjektem oprávněným k instalaci dopravního značení. Osobou odpovědnou za PDZ bude prováděna pravidelná kontrola stavu tohoto značení a v případě zjištěné závady na PDZ bude tato závada bezodkladně odstraněna. Ihned po ukončení uzavírky bude PDZ bezodkladně odstraněno.


DI Příbram si vyhrazuje právo toto stanovisko (vyjádření k DIO) doplnit nebo činit návrhy a opatření v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na dotčených komunikacích.

Zpracovala:

por. Mgr. Lucie Valičková
komisař
tel: 
e-mail: 



por. Ing. Miroslav Ptáček
komisař

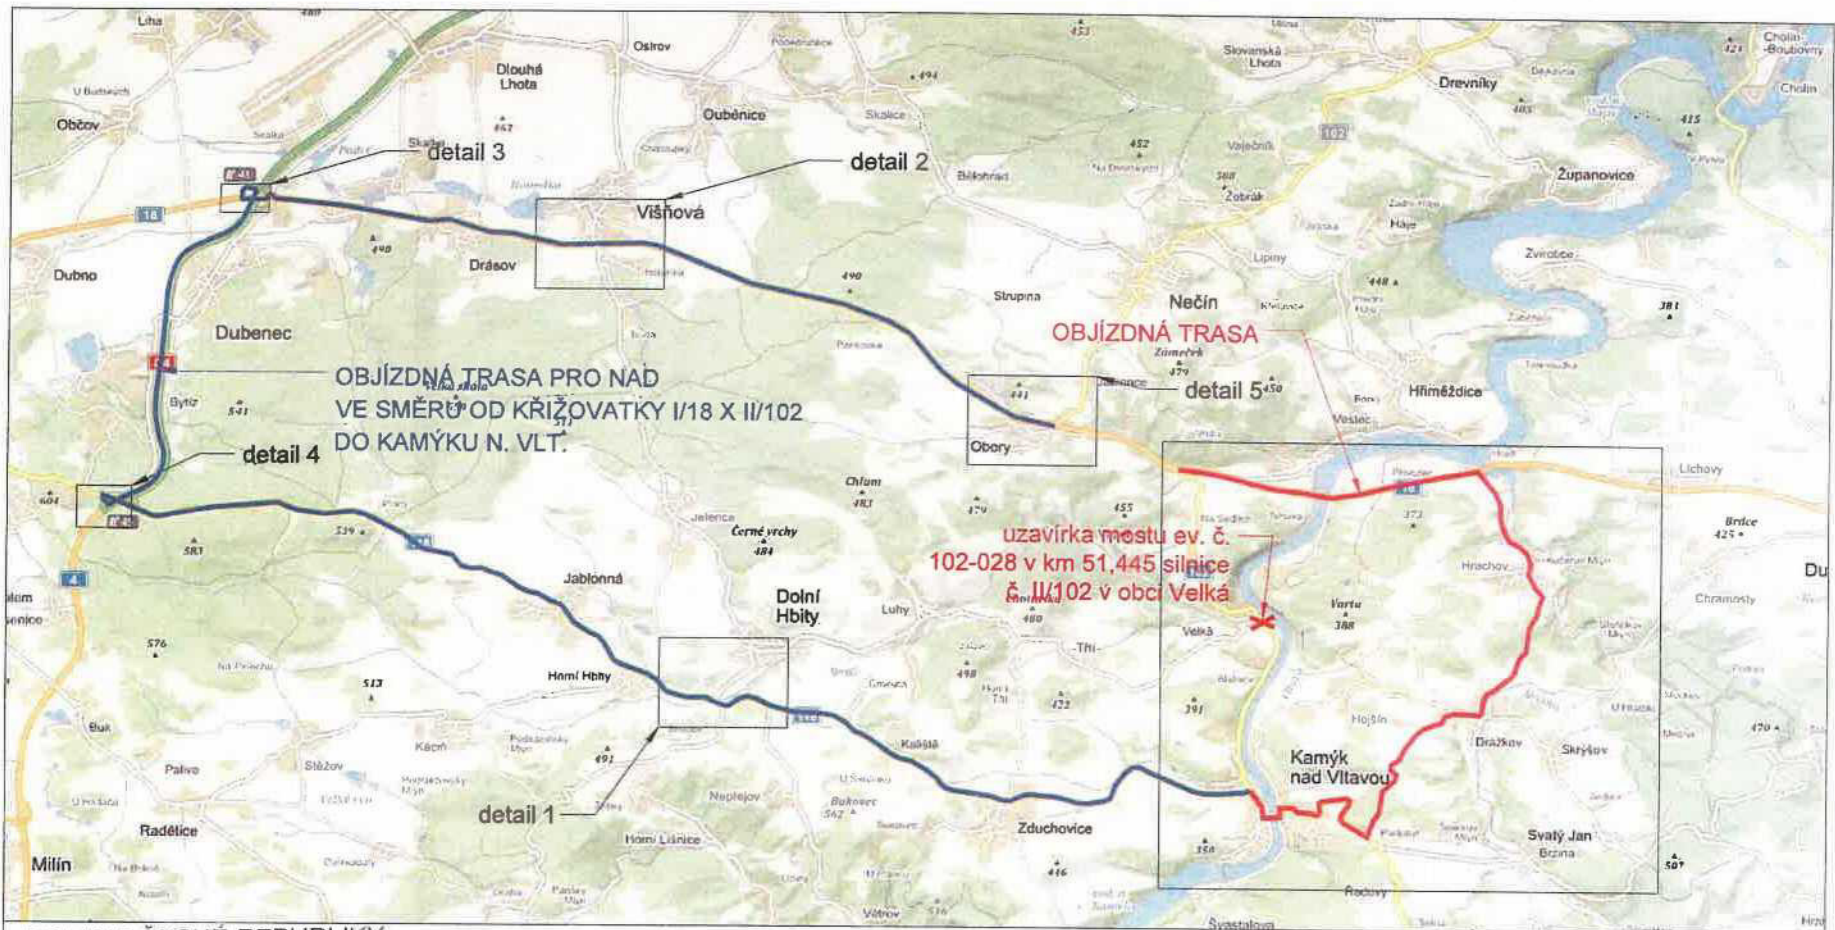



OBJÍZDNÁ TRASA PRO NAD
VE SMĚRU OD KŘIŽOVATKY I/18 X II/102
DO KAMÝKU N. VLT.

uzavírka mostu ev. č. 102-028 v km 51,445 silnice
č. II/102 v obci Velká

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT PŘÍBRAM
261 23 PŘÍBRAM V, ŽEŽICKÁ 498
8. 11. 2017

*Dle čj. KRPS-3496P3-1/01-2017-011106
a dle dalších příloh opatřeních řešitelných a podpisem.*

por. Mgr. Lucie VALÍČKOVÁ 319345



- LEGENDA:
- P6 TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 - P6 NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ DZ
 - UZAVŘENÝ ÚSEK
 - OBJÍZDNÁ TRASA PRO NAD
 - OBJÍZDNÁ TRASA PRO OS. AUTOMOBILY


Použité dopravní značení bude v základní velikosti a v režimním provedení (I, J)
K návrhu dopravního značení bylo využito: TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 66 Zásady pro směřování pracovníků míst na pozemních komunikacích

VYPRACOVAL:	Štěpán Horal	
Kontroloval:	Štěpán Horal	
OBJEDNATEL:	Společnost T.A.Q. s.r.o. Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6	
NAZEV AKCE:	Oprava mostu ev. č. 102-028 Most přes Vápenický potok ve Velké	
Obsah:	Přehledná situace	
datum:	10/2017	
Formát:	A3	



POLICE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT PŘÍBRAM
261 23 PŘÍBRAM V, ŽEŽICKÁ 498
8. 10. 2017

por. Mgr. Ludie VALÍČKOVÁ 319345
Luhy

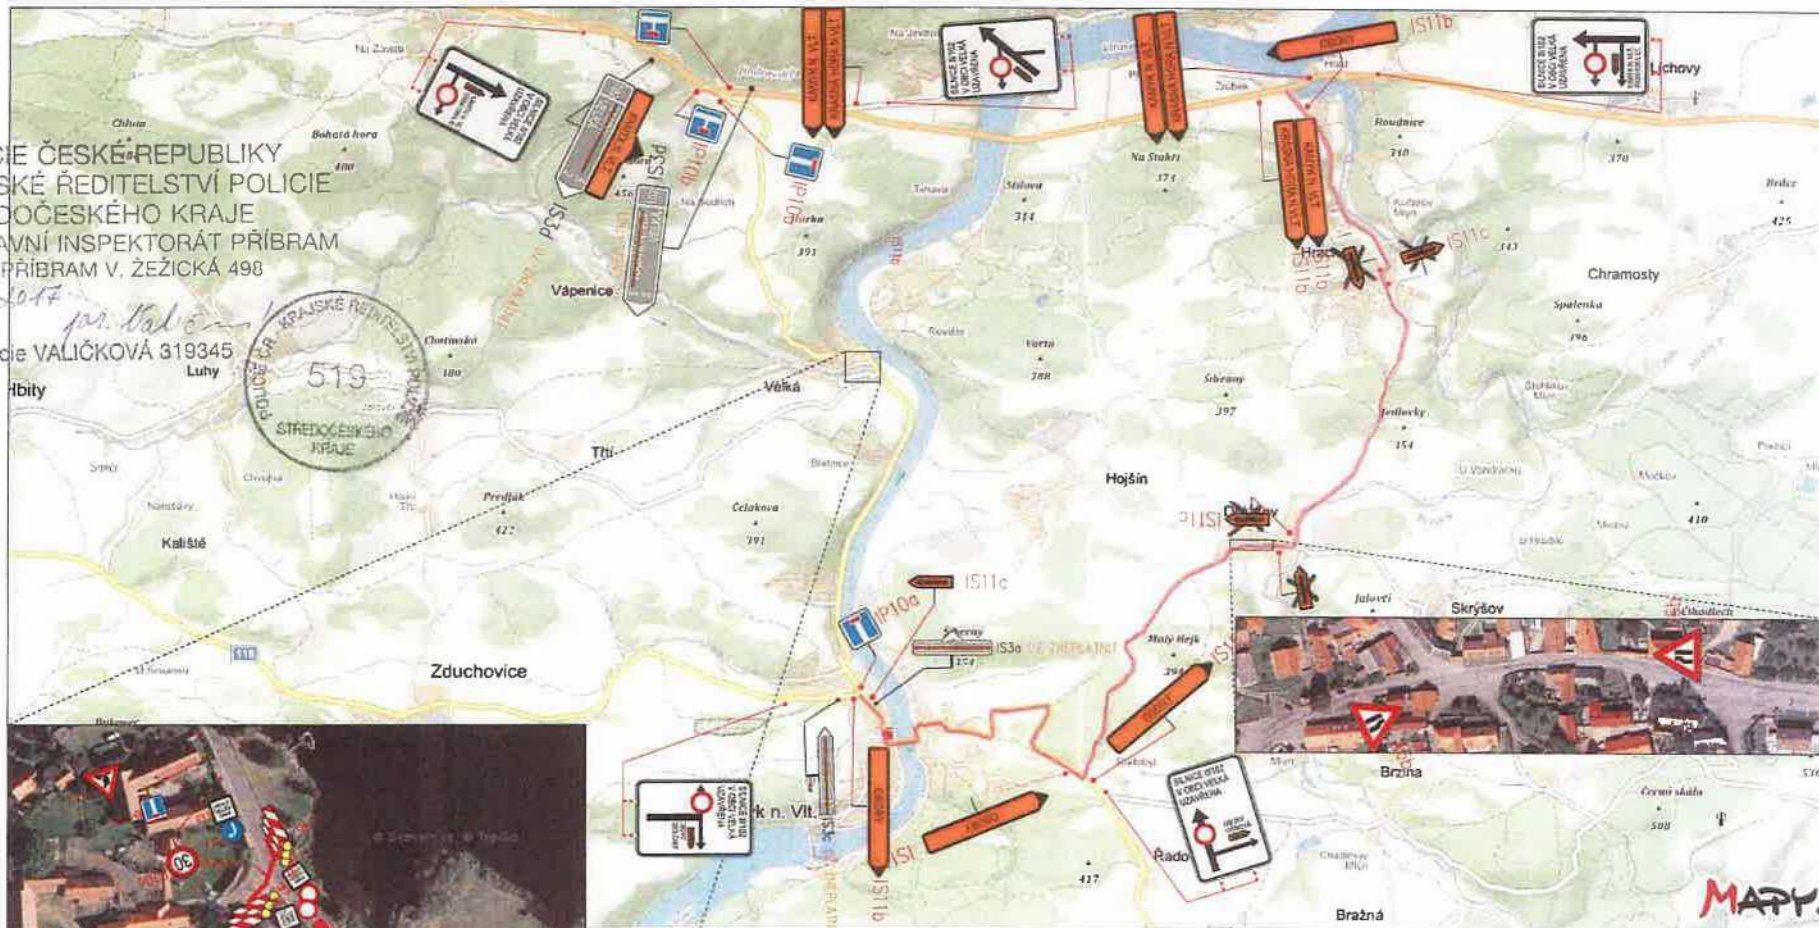

LEGENDA:

- P6 TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- P6 NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ DZ
- UZAVŘENÝ ÚSEK
- OBJÍZDNÁ TRASA


Použití dopravního značení bude v závislosti na velikosti a v reflexním provedení II.1
K návrhu dopravního značení bylo využito: IP 65 Značky pro dopravní značení na pozemních komunikacích
IP 66 Značky pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích

VYPRACOVAL:	Štěpán Horal		 POJČOVÁNÍ A PRODEJ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A ZAŘÍZENÍ
KONTROLOVAL:	Štěpán Horal		
OBJEDNATEL:	Společnost T.A.Q. s.r.o. Fetovská 1002/59, 160 00 Praha 6		
NAZEV AKCE:	Oprava mostu ev. č. 102-028 Most přes Vápenický potok ve Velké		
OBSAH:	situace 1		
	DATAUM:	10/2017	
	FORMÁT:	A3	

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
 STŘEDOČESKÉHO KRAJE
 DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT PŘÍBRAM
 261 23 PŘÍBRAM V. ŽEŽICKÁ 498

8.11.2017
 por. Mgr. Lucie VALICKOVÁ STUŠÁKOVÁ


DETAIL 1 - SILNICE II/118 U OBCE DOLNÍ HBITY

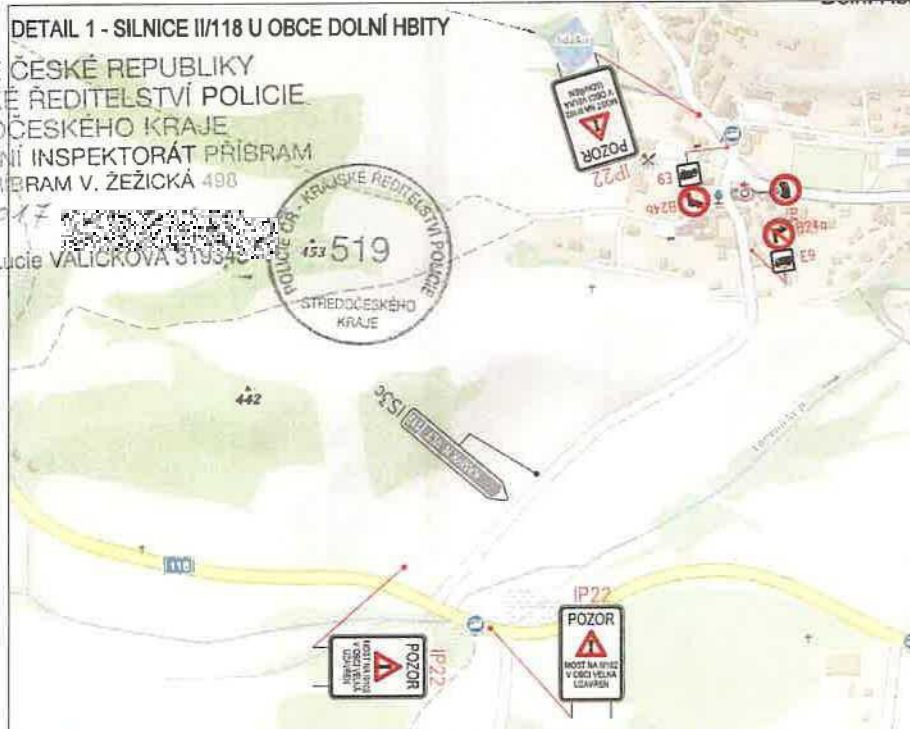

DETAIL 2 - SILNICE I/18 U OBCE VIŠŇOVÁ



DETAIL 4 - SILNICE II/118 U MŮK HÁJE

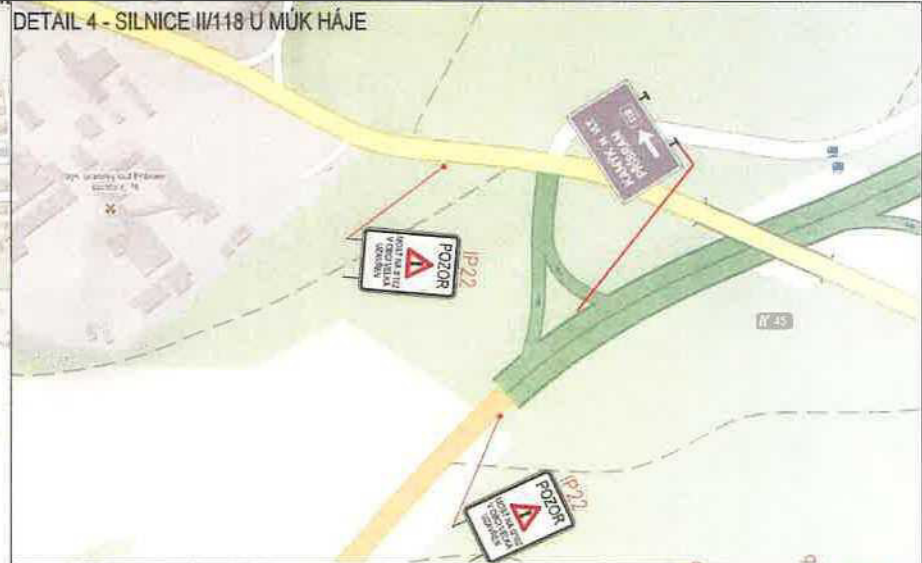

DETAIL 3 - SILNICE I/18 U MŮK SKALKA



LEGENDA:

- TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ DZ


Použití dopravního značení bude v záložní velikosti a v reflexním provedení Ú.1
 K návrhu dopravního značení bylo využito:
 IP 82: Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
 IP 84: Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích

VYPRACOVAL:	Štěpán Horal					
KONTROLOVAL:	Štěpán Horal					
OBJEDNATEL:	Společnost T.A.Q. s.r.o. Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6					
NAZEV AKCE:	Oprava mostu ev. č. 102-028 Most přes Vápenický potok ve Velké					
OBSAH:	detail 1 - 4	<table border="1"> <tr> <td>DATUM:</td> <td>10/2017</td> </tr> <tr> <td>FORMÁT:</td> <td>A3</td> </tr> </table>	DATUM:	10/2017	FORMÁT:	A3
DATUM:	10/2017					
FORMÁT:	A3					

8. 11. 2017



por. Mgr. Lucie VALIČKOVÁ 319345

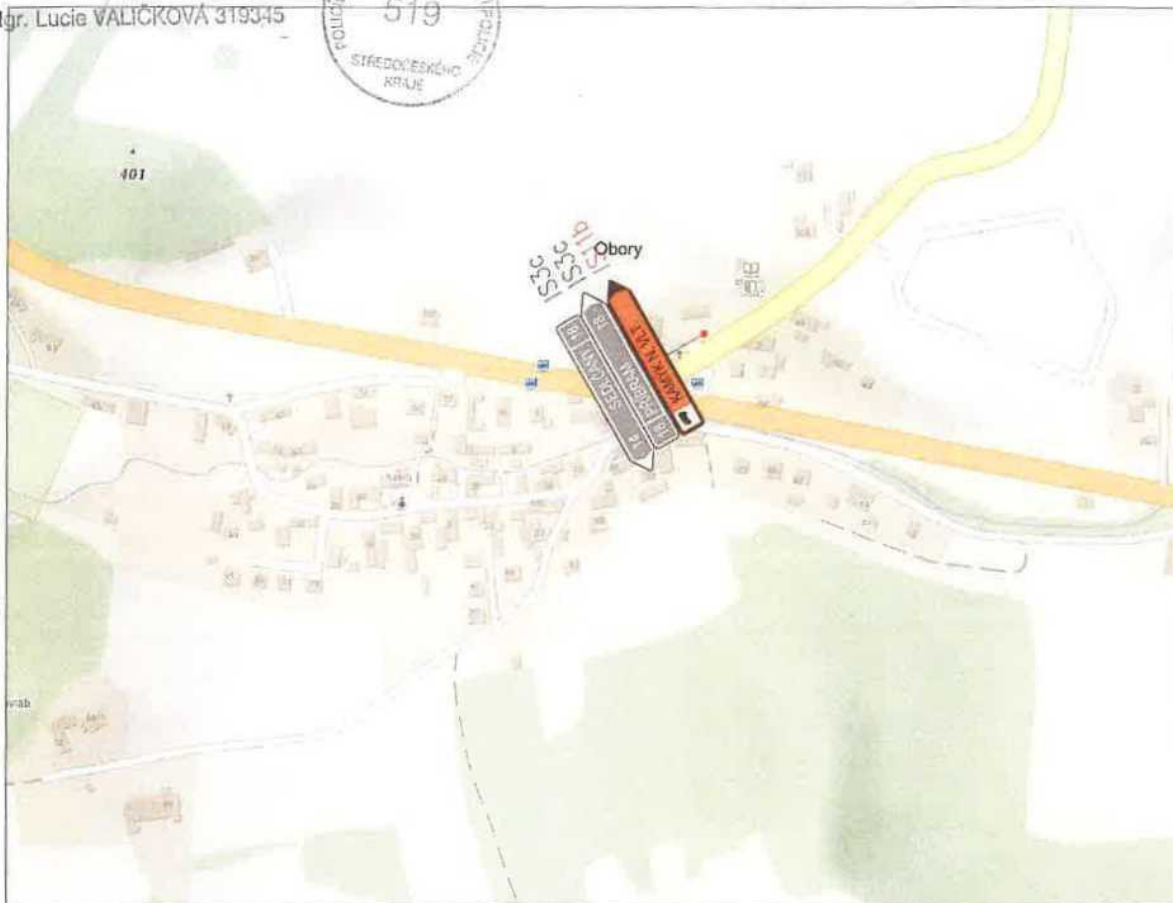


LEGENDA:

 P6 TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

 P6 NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ DZ

Použitě dopravní značení bude v základní velikosti a v reflexním provedení (P.1)
 K návrhu dopravního značení bylo využito: TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
 TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích



VYPRACOVAL:	Štěpán Horal		 PUJČOVÁNÍ A PRODEJ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A ZAŘÍZENÍ	
KONTROLOVAL:	Štěpán Horal			
OBJEDNATEL:	Společnost T.A.Q. s.r.o. Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6			
NÁZEV AKCE:	Oprava mostu ev. č. 102-028 Most přes Vápenický potok ve Velké			
OBSAH:	detail 5 (OBORY)		DATUM:	10/2017
			FORMÁT:	A4



MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel.: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail: e-podatelna@pribram.eu
ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132

VÁŠ DOPIS ZN.:
SPIS. ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ:

SZ MeUPB 104019/2017
MeUPB SI/104019/2017/SOSH/ŠTZ

EV. ČÍSLO:
VYŘIZUJE:
TEL./FAX:

305
Štěrbová


E-MAIL:
DATUM:


02.12.2017

Quo s.r.o.
Křížikova 2158
256 01 Benešov

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Příbram, samostatné oddělení silničního hospodářství, v souladu s § 124 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním provozu), jako orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Příbram

stanovuje

v souladu s ustanovením § 124 odst. 6 a na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) výše uvedeného zákona přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:

1. Druh úpravy: přechodná - osazení DZ: Podle přílohy odsouhlasené Policií ČR KŘ DI Příbram.
2. Na komunikacích: II/102, II/118, III/11816, III/11817, MK
3. Místo: viz DIO
4. Odůvodnění: oprava mostu ev.č. 102-028 Most přes Vápenický potok ve Velké
5. Za dodržení podmínek zodpovídá žadatel.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude instalováno dle grafické přílohy, odsouhlasené orgánem Policie ČR, KŘ DI Příbram pod č. j. KRPS-349683-1/ČJ-2017-011106 ze dne 08.11.2017.

Úprava provozu bude provedena v termínu: od 04.12.2017 do 30.06.2018 bezprostředně před zahájením stavebních prací. Po jejich ukončení musí být přenosné dopravní značení okamžitě odstraněno.

Úpravu provozu (instalaci doprav. značení) provede organizace: oprávněná k provádění dopravního značení.

Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., zákonem o silničním provozu, TP 66, a ČSN 12 899-1.

Jiné další podmínky: Dopravní značení bude instalováno na náklady žadatele.

Samostatné oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Příbram si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo veřejný zájem.

Orgán Policie ČR má právo kontroly a předložení dalších podmínek, zajišťujících bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

(otisk



Ing. Zuzana Štěrbová
vedoucí samostatného oddělení silničního hospodářství

Obdrží:

Quo s.r.o., Křížikova 2158, 256 01 Benešov
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Dotčený orgán:

Policie ČR, KŘ-DI Příbram, Žežická 498, 261 23 Příbram V

NAŠE ZNAČKA:
VYŘIZUJE:
DATUM: 26/01/2018

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

**Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 2 pro akci „Oprava mostu ev. č. 102-028
Most před Vápenický potok ve Velké“**

Objednatel: Středočeský kraj Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupený Krajskou správou silnic středočeského kraje
Zhotovitel: Společnost T.A.Q. – ROBSTAV stavby
TDI, koordináto BOZP: IBH spol. s.r.o. Poděbradova 3178, 272 01 Kladno
Zpracovatel PDPS: METROPROJEKT Praha a.s. I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 1

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi od zhotovitele návrh na ZBV č. 2 pro SO DIO.

Odůvodnění změny:

V projektové přípravě byl vypracován návrh DIO, ke kterému Policie ČR DI Příbram vydala dne 21.8.2015, čj. KRPS-287542-1/ČJ-2015-011106 předběžné stanovisko k návrhu DIO, ve kterém požaduje před samotnou realizací stavby předložení nového návrhu DIO. S odvoláním na toto stanovisko požaduje Policie ČR Územní odbor Příbram DI (PČR Příbram) svým emailem ze dne 26.10.2017 por. Mgr. Lucie Valičková úpravu původně navrženého DIO, kterou byla zcela pozměněna objízdná trasa. Požadavek PČR Příbram na doplnění výstražných světel S7 z obou stran uzavřeného úseku byl dodatečně písemně potvrzen mailem PČR Příbram ze dne 5.1.2018. Na základě nových požadavků tak dochází k navýšení počtu dopravních značek a doplnění výstražných světel S7. Dopravní značení a dopravní zařízení je odsouhlasené orgánem Policie ČR, KŘ DI Příbram pod č.j. KRPS-349683-1/ČJ-2017011106 ze dne 08.11.2017.

Na základě Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích, které vydalo Samostatné oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Příbram dne 2.12.2017 pod číslem jednacím MeUPB St/104019/2017/SOSH/ŠtZ, bude přechodná úprava provozu provedena v termínu od 04.12.2017 do 30.6.2018. Z tohoto důvodu dochází ke snížení délky pronájmu dopravního značení z původně uvažovaných 240 dnů na 209 dnů.

Výše uvedenou změnou dojde k navýšení ceny díla přibližně částkou 150.000,- Kč bez DPH z důvodu změny množství a doplnění dopravního značení.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, na základě požadavků orgánů veřejné správy. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Stanovisko TDI:

S předloženým ZBV č. 2 jako technický dozor souhlasím.

Petr Burger
Technický dozor investora



Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

Datum : 26.01.2018

Věc: Stanovisko AD k dokumentaci ZBV č. 2 pro akci „Oprava mostu ev. č. 102-028 Most přes Vápenický potok ve Velké“

Objednatel: Středočeský kraj Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupený Krajskou správou silnic středočeského kraje

Zhotovitel: Společnost T.A.Q. – ROBSTAV stavby

TDI, koordináto BOZP: IBH spol. s.r.o. Poděbradova 3178, 272 01 Kladno

Zpracovatel PDPS: METROPROJEKT Praha a.s. I.P.Pavlova 1786/2,
120 00 Praha 1

V rámci výkonu AD na výše uvedené stavbě jsme obdrželi od zhotovitele návrh na ZBV č. 2 pro SO DIO.

Odůvodnění změny:

Policie ČR DI Příbram vydala dne 21.8.2015, čj. KRPS-287542-1/ČJ-2015-011106 předběžné stanovisko k návrhu DIO, ve kterém požaduje před samotnou realizací stavby předložení nového návrhu DIO.

S odvoláním na toto stanovisko požaduje Policie ČR Územní odbor Příbram DI (PČR Příbram) svým emailem ze dne 26.10.2017 por. Mgr. Lucie Valíčková úpravu původně navrženého DIO, kterou byla zcela pozměněna objízdná trasa. Požadavek PČR Příbram na doplnění výstražných světel S7 z obou stran uzavřeného úseku byl dodatečně písemně potvrzen emailem PČR Příbram ze dne 5.1.2018. Na základě nových požadavků tak dochází k navýšení počtu dopravních značek a doplnění výstražných světel S7. Dopravní značení a dopravní zařízení je odsouhlasené orgánem Policie ČR, KŘ DI Příbram pod č.j. KRPS-349683-1/ČJ-2017011106 ze dne 08.11.2017.

Na základě Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích, které vydalo Samostatné oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Příbram dne 2.12.2017 pod

číslem jednacím MeUPB St/104019/2017/SOSH/ŠtZ, bude přechodná úprava provozu provedena v termínu od 04.12.2017 do 30.6.2018. Z

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, na základě požadavků orgánů veřejné správy. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Stanovisko AD:

S předloženým ZBV č. 2 jako autorský dozor souhlasím.



Ing. Tomáš Vávra
Autorský dozor investora
