

DODATEK č.2 SMLOUVY

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci pro stavbu Silnice III/48415 – Zlatník – Visalaje – rekonstrukce silnice – 4 úseky

Smluvní strany

Objednatel / příkazce:

Se sídlem:

Tel :

Fax :

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Úprkova 1, 702 23 Ostrava

00095711

CZ 00095711

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Komerční banka a.s., Karviná,

číslo účtu 86-6032100257/0100

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

a

Zhotovitel / příkazník:

Se sídlem:

Tel :

Fax :

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

42767377

CZ42767377

Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

KB a.s., č.ú.: 1022147761/0100

- 1)
- 2)
- 3)

se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje termín plnění inženýrské činnosti z důvodu dlouhodobého projednávání vlastnického práva k dotčenému pozemku (Obec Krásná, [redacted], TJ Radegast, SKOGAR, HBR WORLD, [redacted]) a získání souhlasného stanoviska společnosti CETN,a s. ke stavbě. Proto není možné zajistit podání a vydání pravomocného stavebního povolení ve stanoveném termínu. Původní smlouva z 26.11.2014 ve znění dodatku č.1 se mění takto:

V Článku IV. Doba a místo plnění se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
 - a) Zaměření, průzkumy, diagnostiky apod. dle odst. 3 čl. III této smlouvy do 8 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
 - b) Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1. této smlouvy do 13 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
 - c) projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2. této smlouvy do 18.01.2016,
 - d) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby dle čl. III. odst. 2 bod 2.3. této smlouvy do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení.

V článku VIII. Platební podmínky se odstavec 3 nahrazuje novým zněním:

1. Cena za dílo bude uhrazena takto:
 - Po předání zaměření, průzkumů a diagnostiky dle čl. III odst. 3 bude uhrazena cena za první část díla dle čl. VII. Odst. 1 této smlouvy
 - po předání pravomocného územního rozhodnutí nebo vydaného územního souhlasu, bude uhrazena cena projektovou dokumentaci dle čl. III. odst 2 bod 2,1 za druhou část díla dle čl. VII odst.1 této smlouvy,
 - po podpisu tohoto dodatku bude uhrazena cena za projektovou dokumentaci dle čl. III odst. 2 bod 2,2 za třetí část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,
 - po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena za čtvrtou část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

V článku XIV. Doba a místo plnění se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:


1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
 - žádost o vydání územního rozhodnutí do 19.07.2015,
 - předání územního rozhodnutí do 20.11.2015,
 - předání stavebního povolení do 4 měsíců od získání posledního majetkoprávního vypořádání.

Závěrečná ujednání dodatku č.2

4. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

5. Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní číslo: ...

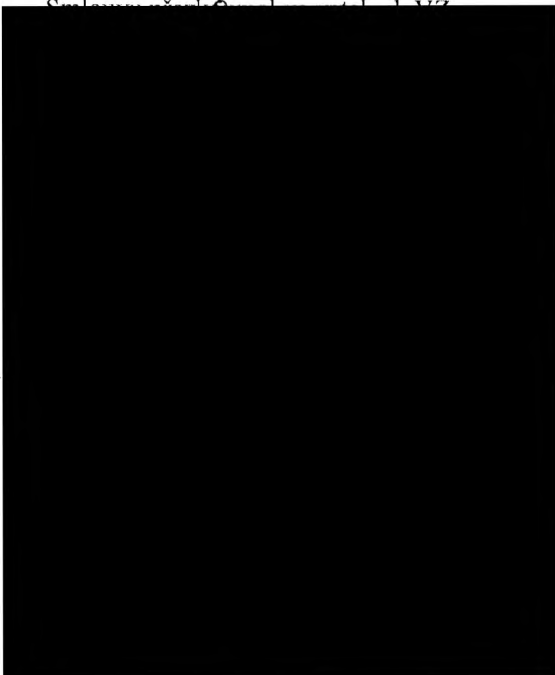

V Ostravě dne: 25.5.2016

