



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

DODATEK Č. 1 **KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SMLO-67/1028/200/20/2016**

na zhotovení díla

„Okružní křižovatka silnic II/355 a III/298 3 Černá za Bory – nová technologie silničního vodícího prvku“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zákona číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) ve znění platných novel a předpisů souvisejících a z.č.13/1997 Sb. v platném znění a předpisů souvisejících.

Smluvní strany

(A) Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

sídlo Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu : 2106299978/2700

Zastoupená: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

p. Richard Čapek, náměstek ředitele divize silniční stavby

Tel: +420 602 534 495; e-mail: richard.capek@cht-pce.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

p. David Zlesák, stavbyvedoucí

Tel: +420 602 467 886; e-mail: david.zlesak@cht-pce.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

p. David Zlesák, stavbyvedoucí

Tel: +420 602 467 886; e-mail: david.zlesak@cht-pce.cz

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu
Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiří.synek@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu,
příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – technik oddělení inženýringu,
příspěvkových a dotačních programů
Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz
Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 605 986 440, e-mail: radim.malat@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2016 dle podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), smlouvu o dílo č. SMLO-67/1028/200/20/2016, na zhotovení díla „Okružní křižovatka silnic II/355 a III/298 3 Černá za Bory – nová technologie silničního vodícího prvku“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 29.8.2016. Vzhledem k tomu, že Policie ČR DI Pardubice nesouhlasila s úplnou uzávěrou křižovatky, byl časově upravený harmonogram plnění. Současně byl projektantem a VUSTAH stanovený postup lepení silničního vodícího prvku, který požaduje pro přesné odzkoušení použitých materiálů aplikaci v různých časových úsecích.

Na základě výše uvedeného se Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo mění takto:

2. Cena díla

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku výběrového řízení a dohody smluvních stran a činí:

5 412 500,- Kč (Slovy: **Pětmiliónůčtyřistadvanácttisíc** korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **1 136 625,- Kč** (Slovy: **Jednmiliónstotřicetšesttisícšestsetdvacetpět** korun českých).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **6 549 125,- Kč** (Slovy: **Šestmiliónůpětsetčtyřicetdevěttisícstodvacetpět** korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. **Den uskutečnění zdanitelného plnění nastane v den předání a převzetí dokončeného díla, nejpozději však do 31. 5. 2017.**

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. **Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní cenu po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků, na základě Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu/faktury, který bude mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných.**
3. **Lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury je do 30. 6. 2017.**
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.
7. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání staveniště.
2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy Objednateli do: **31. 5. 2017**, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s časovým harmonogramem jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Ostatní body článku 3. se nemění.

III.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Pardubicích dne 12.10.2016

V Pardubicích dne : 4. 11. 2016

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL


Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Ing. Miroslav Němec
ředitel organizace

 **Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE
tel: +420 466 791 111
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361
info@chl-pta.cz

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

⑪

Časový harmonogram realizace díla

Veřejná zakázka:

Objednatel:


Zhotovitel:

Termin realize:

Okružní křižovatka silnic II/355 a III/298 Černá za Bory - nová technologie vodícího prvku

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Chládek a Tintěra, Pardubice a s

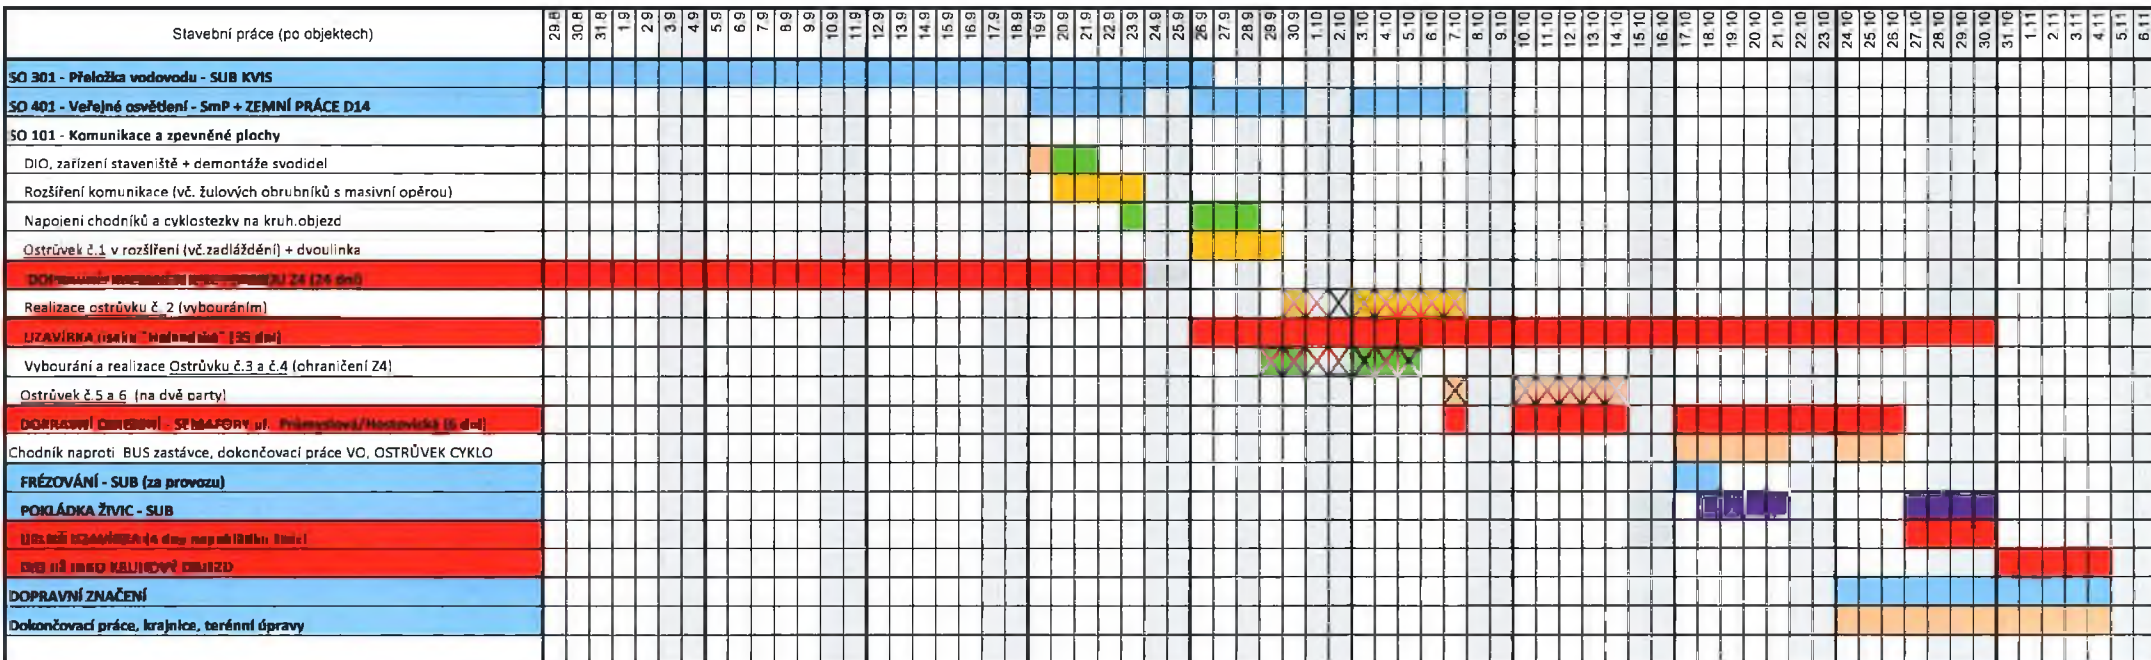

Časový harmonogram realizace - vodících prvků a vodorovného dopravního značení

Veřejná zakázka:

Objednatel:

Zhotovitel:

Termín realizace:

Okružní křižovatka silnic II/355 a III/298 Černá za Bory - nová technologie vodícího prvku

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

[illegible]
