

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 12, OSTRAVA

číslo návrhu: **41**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezska ul. Čs. legií 1236/12 701 04 Ostrava IČ: 00100528 DIČ: 00100528	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560
--	--

Popis požadované změny

Datum	14.4.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
SB	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Exteriérové dveře a výkladce uliční fasády

1. Zdůvodnění změny

Výměna stávajících výkladců z důvodu jejich špatného stavu, který spočívá v nevyhovujícím kotvením těchto výkladců, které bylo možno posoudit až po odkrytí okolních konstrukcí. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

639 999,84 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNEHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M3	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	680 152,00
2	Méněpráce	-40 152,16
Celkem		639 999,84

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce 640 000 Kč
-----	---

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

Porr a.s. -58- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		30.5.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		17.5.18	
Za TDO:		20.7.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tímto změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vř všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetele.

Věškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 41

ROZVOJ DIVADLA JIRÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M1, M3	Divadlo Jirího Myrona			
	Architektonicko-stavební řešení			
766	Truhlářské konstrukce	666 952,00	-40 152,16	626 799,84
		666 952,00	-40 152,16	626 799,84
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	13 200,00	0,00	13 200,00
		13 200,00	0,00	13 200,00
Celkem		680 152,00	-40 152,16	639 999,84

Realizované práce celkem bez DPH	639 999,84
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	639 999,84
DPH 21%	134 399,97
Realizované práce celkem včetně DPH	774 399,81

Porr a.s.

Důbečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašň
ICO: 43005560

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 41

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘIHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

Objekt: Divadlo Jiřího Myrona

Část: ZL 41 - Exteriérové dveře a výkladce účelní fasady

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 4.4.2018

SoD

VcP

MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		Cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena						

CELKEM

0,00

#####

0,00

SO 02 - Architektonicko-stavební řešení

0,00

866 952,00

0,00

Díl:	786	Konstrukce truhlářské														
1		Repase vstupních dveří M1	ks	0,00000	0,00	0,00	1,00	122 450,00	0,00	0,00	122 450,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Dodavatel + Kč 10%
2		Repase vstupních dveří M3	ks	0,00000	0,00	0,00	1,00	134 550,00	0,00	0,00	134 550,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Dodavatel + Kč 10%
3		Repase vstupních dveří "tezník"	ks	0,00000	0,00	0,00	1,00	34 852,00	0,00	0,00	34 852,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Dodavatel + Kč 10%
4		Výkladec B	ks	0,00000	0,00	0,00	1,00	223 850,00	0,00	0,00	223 850,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Dodavatel + Kč 10%
5		Výkladec C	ks	0,00000	0,00	0,00	1,00	151 250,00	0,00	0,00	151 250,00	125,00	1,00	1,00	0,00	Dodavatel + Kč 10%

OK

OVN-celk

Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM

0,00

13 200,00

0,00

Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON 22	Projektční řešení změny	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Dodavatel +10% Kč
1	ON 22	Projektční řešení změny	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Dodavatel +10% Kč
CELKEM						40 152,16		0,00		#####						

SO 02 - Architektonicko-stavební řešení

40 152,16

0,00

-40 152,16

Díl:	788	Konstrukce truhlářské														
1	172	Dveře vchodové kazetové s nadavětlíkem	ks	1,00000	40 152,16	40 152,16	0,00	0,00	-1,00	-40 152,16	40 152,16	-1,00000	1,00	0,00	-1,00000	SO 02-1

OK

Vícepráce

680 152,00

Méněpráce

-40 152,16

Celkem vícepráce - méněpráce

639 999,84

DPH 21%

134 399,97

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

774 399,81

127,05

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 12, OSTRAVA

číslo návrhu: **42**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravakoslezské**
ul. Čs. legií 1236/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	18.4.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
MS	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Upravy pro AV techniku v MS

1. Zdevodnění změny

Po odkrytí stávajících konstrukcí byla zjištěna potřeba dodatečných úprav pro řádné provedení a funkčnost dodávek AV techniky. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

17 140,00 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navyšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
MS	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	17 140,00
2	Méněpráce	0,00
Celkem		17 140,00

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	17 140 Kč
-----	---------------------------------	------------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	Porr a.s.		
	Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice	30.5.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provádění stavby		30.5.18	
Za TDO		30.5.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to včetně všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Věškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení řek, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 42

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
MS	Divadlo Jiřího Myrona			
SO 02	Architektonicko-stavební řešení			
3	Svislé a kompletní konstrukce	16 040,00	0,00	16 040,00
		16 040,00	0,00	16 040,00
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - MS			
Díl: ON	Ostatní náklady	1 100,00	0,00	1 100,00
		1 100,00	0,00	1 100,00
Celkem		17 140,00	0,00	17 140,00

Realizované práce celkem bez DPH	17 140,00
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	17 140,00
DPH 21%	3 599,40
Realizované práce celkem včetně DPH	20 739,40

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 42

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍL 14, OSTRAVA
 Objekt: Divadlo Jiřího Myrona
 Část: ZL 42 Úpravy pro AV techniku v MS

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 29.3.2018

SoD							VcP		MP					Zdroj		
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem		VcP	MP
							množství	cena	množství	cena						
CELKEM							0,00	17 140,00	0,00							
SO 03 - Architektonicko-stavební řešení							0,00	16 040,00	0,00							
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					16 040,00									
1		Nosná OK nad hledištěm	kpl	0,00000	0,00	0,00	1,00	16 040,00	0,00	0,00	16 040,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Dodavatel +10% Kč
OVN-celk							0,00	1 100,00	0,00							
Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projektční řešení změny scény, DJM	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1,000	1,000	1,000	0,000	Dodavatel +10% Kč

Vícepráce	17 140,00
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	17 140,00
DPH 21%	3 599,40
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	20 739,40



ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGLÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 43**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. leglí 1236/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	18.4.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
DJM	Malé scéna, Správní budova, Divadlo	MS - D.1.4f Zařízení slaboproudé elektrotechniky SB - D.1.4f Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Popis změny / rozsah

Doplnění a rozšíření systému EZS

1. Zdůvodnění změny

Úpravy a doplnění systému EZS jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádného fungování jako celku. Po odkrytí stávajících konstrukcí bylo zjištěno, že současný stav je nevyhovující a nefunkční.

2. Popis změny

Doplnění systému EZS do m.č. 1.16 objektu ČS. Leglí 14.
Přijetí systému EZS z m.č. B 2.17 objektu ČS. Leglí 12 na ústřednu EZS v m.č. C1.11 objektu Milíčova 1.

2.1 Původní řešení

2.2 Nové řešení

2.3 Cenové porovnání

Celkem 172 033,40 bez DPH

3. Závěr

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	DJM	
1	Vicapráce	172 033,40
2	Měněpráce	0,00
Celkem		172 033,40

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	172 033 Kč
------------	---------------------------------	-------------------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny	Ne
Vliv na celkovou dobu výstavby	Ne

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	Porr a.s. -56-	30.5.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		30.5.18	
Za TDO:		30.5.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to včetně všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tek, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

Stavba: Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě
Objekt: Správní budova, Malá scéna, Divadlo
Část: EZS

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
C	PZTS - Poplachový a tísňový zabezpečovací systém - Správní budova	- Kč	- Kč	32 569,00 Kč
D	PZTS - Poplachový a tísňový zabezpečovací systém - Malá scéna	- Kč	- Kč	31 428,00 Kč
E	PZTS - Poplachový a tísňový zabezpečovací systém - Divadlo	- Kč	- Kč	108 036,40 Kč
Celkem bez DPH				172 033,40 Kč

Tvorba ceny:

Položky s uvedeným číslem položky - jednotková cena dle SOD.

Položky bez uvedeného čísla položky - nabídka dodavatele + 10% Kč

Porr a.s.

Dubečská 323B/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Číslo položky	Číselné zařídění	Popis položky	Měrná jednotka	Počet celkem	Jednotková cena			Celková cena v Kč
					Dodávka	Montáž	Celkem	
C		PZTS - Pojistkový a tlakový zabezpečovací systém - Správní budova						
C.001	C.001	Koncentrator 8 zón a 4 tranzistorové PGM výstupy, montáž do elektroinstalační kovové krabice	ks	1	4 609,00 Kč		4 609,00 Kč	4 609,00 Kč
C.002	C.002	Společný modul systémového posilovacího zdroje 2,75 A/12VDC v kovovém krytu a koncentratorech	ks	1	8 617,00 Kč		8 617,00 Kč	8 617,00 Kč
C.005	C.005	Detektor drátový QUAD PIR, 15m/85°, 117x68x50mm, -30 až +70 °C, stojánek na stěnu a strop, vyvažovací rezistor, digitál	ks	-4	762,00 Kč		762,00 Kč	3 048,00 Kč
C.006	C.006	Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi	ks	1	1 202,00 Kč		1 202,00 Kč	1 202,00 Kč
C.011	C.011	DUAL PIR+MW, dosah 12x12 m, 2 stupeň zabezpečení, signalizace pohybu modrou LED (lze i vypnout), volitelně ochrana proti podplizení, ukrytí elektroniky v plastovém krytu - zabránění vniknutí nečistot a následným provozním problémům, dynamická teplotní kompenzace, automatická úprava citlivosti, adaptivní zpracování šumu mikrovlnné technologie - snížení falešných poplachů, pokrytí od zdi ke zdi 12x12m, flexibilní instalační věška bez zádných úprav	ks	5	1 082,00 Kč		1 082,00 Kč	5 410,00 Kč
C.015	C.015	Elektroinstalační chránička trubka 23mm, ohebná	m	40	14,00 Kč		14,00 Kč	560,00 Kč
C.016	C.016	Elektroinstalační PVC chránička/trubka 16mm, ohebná	m	0	8,00 Kč		8,00 Kč	- Kč
		Metalický datový kabel STP cat 6A LSZH, 4par. drát, 23 AWG	m	40	10,10 Kč		10,10 Kč	404,00 Kč
	HUB2 Hub and Bus Isolator	Opakovač a oddělovač sběrnice. S tímto modulem lze vytvořit dvě zcela oddělené větve sběrnice, přičemž při vzniku poruchy na jedné z nich, nemá tato porucha vliv na tu druhou větev	ks	1	2 088,00 Kč	300,00 Kč	2 388,00 Kč	2 388,00 Kč
	IP150	Ethernetový komunikační modul umožňující vzdálený přístup k ústředním Digiplex EVO, Spectra série SP a Magellan MGS000/5050 pomocí síťového rozhraní	ks	1	3 448,00 Kč	300,00 Kč	3 748,00 Kč	3 748,00 Kč
	COMCABLE CCM1	Propojovací kabel mezi internetovým modulem IP150 a GPRS modulem PCS250/PCS250G.	ks	1	73,00 Kč	60,00 Kč	133,00 Kč	133,00 Kč
	PGM4	Rozšiřující modul 4 PGM výstupů. Pomocí tohoto modulu můžete k systému připojit programovatelné výstupy, pomocí kterých můžete ovládat prvky systému (garážová vrata, zavazování, klimatizace apod.)	ks	1	1 284,00 Kč	540,00 Kč	1 824,00 Kč	1 824,00 Kč
	ESPRIT-PBOX	Plastový box pro expandéry, rozměry 170 x 155 x 22mm	ks	1	205,00 Kč	60,00 Kč	265,00 Kč	265,00 Kč
C.018	C.018	Instalační materiál	kpl	1	780,00 Kč		780,00 Kč	780,00 Kč
C.019	C.019	Kabelové tras - instalace kabelů do trubek, zlabů apod	m	40		19,00 Kč	19,00 Kč	760,00 Kč
C.020	C.020	Kabelové tras - instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchvtky apod	m	40		38,00 Kč	38,00 Kč	1 520,00 Kč
C.024	C.024	Montáž detektoru PIR a dualních	ks	1		253,00 Kč	253,00 Kč	253,00 Kč
C.025	C.025	Montáž detektoru tříštění skla	ks	1		380,00 Kč	380,00 Kč	380,00 Kč
C.026	C.026	Montáž instalační plastová krabice povrchová	ks	4		228,00 Kč	228,00 Kč	912,00 Kč
C.059	C.059	Programování ústředny	h	1		1 852,00 Kč	1 852,00 Kč	1 852,00 Kč
C.060	C.060	Oživení, zkušební provoz systému PZTS	ks	2		309,00 Kč	309,00 Kč	618,00 Kč
		SW konfigurace stávající ústředny EZS, koordinace s PCO - servisní organizace investora	klp	1	6 000,00 Kč	- Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Celkem:								32 569,00 Kč

Číslo položky	Číselné zařazení	Popis položky	Měrná jednotka	Počet celkem	Jednotková cena			Celková cena v Kč
					Dodávka	Montáž	Celkem	
C		PZTS - Poplachový a tísňový zabezpečovací systém - Malá scéna						
C.002	C.002	Expander, 8 dvojitě vyvážených vstupů, 1 reléový výstup tamper kontakt, vč. box montáž na povrch	ks	1	2 521,00 Kč		2 521,00 Kč	2 521,00 Kč
C.004	C.004	Klávesnice nástěnná plast-32 znaků, LCD, 14 tlačítek, integrovaná přístupová čtečka, vstup pro odchodové tlačítko, vstup pro monitorování dveří, výstup pro ovládání elektrického zámku	ks	1	5 420,00 Kč		5 420,00 Kč	5 420,00 Kč
C.009	C.009	Detektor drátový QUAD PIR, 15m/85°, 117x68x50mm, -30 až +70 °C, stojánek na stěnu a strop, vyvažovací rezistory, digital	ks	-4	743,00 Kč		743,00 Kč	2 972,00 Kč
C.010	C.010	DUAL PIR+MW, dosah 12x12 m, 2 stupeň zabezpečení, signalizace pohybu modrou LED (Ize i vypnout), volitelně ochrana proti podplížení, ukrytí elektroniky v plastovém krytu- zabránění vniknutí nečistot a následným provozním problémům, dynamická teplotní kompenzace, automatická úprava citlivosti, adaptivní zpracování šumu mikrovlnné technologie- snížení falešných poplachů, pokrytí od zdi ke zdi 12x12m, flexibilní montážní výška bez žádných úprav	ks	4	1 082,00 Kč		1 082,00 Kč	4 328,00 Kč
C.012	C.012	Zalohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m s majákem a akumulátorem AKU 12V/2,1Ah	ks	1	1 407,00 Kč		1 407,00 Kč	1 407,00 Kč
C.013	C.013	Bezdrátový akumulátor 12V/2,1 Ah pro venkovní sirénu	ks	1	419,00 Kč		419,00 Kč	419,00 Kč
C.006	C.006	Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s foliemi	ks	1	1 202,00 Kč		1 202,00 Kč	1 202,00 Kč
C.007	C.007	Magnetický kontakt na max. 25 mm, kabel 3m	ks	1	328,00 Kč		328,00 Kč	328,00 Kč
C.008	C.008	Sada k MK pro vnitřní montáž do kovů	ks	1	163,00 Kč		163,00 Kč	163,00 Kč
C.018	C.018	Instalační plastová krabice povrchová, 24šroubovacích svorek, tamper	ks	1	195,00 Kč		195,00 Kč	195,00 Kč
C.033	C.033	Instalační materiál	ks	1		780,00 Kč	780,00 Kč	780,00 Kč
C.037	C.037	Demontáž ústředny, vč. veškerého příslušenství provozního	ks	1		4 939,00 Kč	4 939,00 Kč	4 939,00 Kč
C.038	C.038	Montáž klávesnice, montáž na stěnu vč. příslušenství	ks	1		926,00 Kč	926,00 Kč	926,00 Kč
C.039	C.039	Demontáž klávesnice, montáž na stěnu vč. příslušenství	ks	1		494,00 Kč	494,00 Kč	494,00 Kč
C.041	C.041	Montáž sirény vnitřní/venkovní	ks	1		198,00 Kč	198,00 Kč	198,00 Kč
C.043	C.043	Montáž tísňového tlačítka, montáž do stolu, nábytku	ks	1		432,00 Kč	432,00 Kč	432,00 Kč
C.044	C.044	Montáž expanderu	ks	1		1 852,00 Kč	1 852,00 Kč	1 852,00 Kč
C.047	C.047	Montáž detektoru tříštění skla	ks	1		185,00 Kč	185,00 Kč	185,00 Kč
C.050	C.050	Montáž magnetických kontaktů	ks	1		309,00 Kč	309,00 Kč	309,00 Kč
C.051	C.051	Demontáž magnetických kontaktů	ks	1		247,00 Kč	247,00 Kč	247,00 Kč
C.059	C.059	Programování ústředny	h	1		1 852,00 Kč	1 852,00 Kč	1 852,00 Kč
C.060	C.060	Oživení, zkušební provoz systému PZTS	ks	4		309,00 Kč	309,00 Kč	1 236,00 Kč
C.062	C.062	Revize	ks	1		3 704,00 Kč	3 704,00 Kč	3 704,00 Kč
C.063	C.063	Vypracování skutečné dokumentace stavby	kpl	1		300,00 Kč	300,00 Kč	300,00 Kč
C.064	C.064	Pomocné stavební práce	ks	1		963,00 Kč	963,00 Kč	963,00 Kč
Celkem:								31 428,00 Kč

Poznámka: Použitá technologie musí být kompatibilní se stávajícím systémem PZTS osazeném v řešených prostorech, používaný uživatelem ve stávajícím objektu. Jedna se o rozšíření stávajícího systému.
Podrobnější specifikace hlavních zařízení, detektorů PZTS viz. Technická zpráva

Číslo položky	Číselné zatřídění	Popis položky	Měrná jednotka	Počet celkem	Jednotková cena			Celková cena v Kč
					Dodávka	Montáž	Celkem	
C								
PZTS - Poplachový a tísňový zabezpečovací systém - Divadlo								
C.001	C.001	Koncentrator 8 zón a 4 tranzistorové PGM výstupy, montáž do elektroinstalací kovové krabice	ks	1	4 609,00 Kč		4 609,00 Kč	4 609,00 Kč
C.002	C.002	Společný modul systémového posilovacího zdroje 2,75 A/12VDC v kovovém krytu a koncentrátoru	ks	1	8 617,00 Kč		8 617,00 Kč	8 617,00 Kč
C.003	C.003	LCD klávesnice pro ústředny, dvouřádkový displej LCD, 32 znaků, programovatelné podsvecení	ks	1	4 674,00 Kč		4 674,00 Kč	4 674,00 Kč
C.004	C.004	Bezdrátový akumulátor 12V/ 17 Ah pro systémový záložní zdroj EZ	ks	1	1 817,00 Kč		1 817,00 Kč	1 817,00 Kč
C.006	C.006	Detektor třístění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi	ks	1	1 202,00 Kč		1 202,00 Kč	1 202,00 Kč
C.007	C.007	Magnetický kontakt na max. 25 mm, kabel 3m	ks	2	328,00 Kč		328,00 Kč	656,00 Kč
C.008	C.008	Sada k MK pro vnitřní montáž do kovu	ks	2	163,00 Kč		163,00 Kč	326,00 Kč
C.009	C.009	Instalační plastová krabice povrchová, 24šroubovacích svorek, tamper	ks	2	200,00 Kč		200,00 Kč	400,00 Kč
C.010	C.010	Požární úpěvkvy, včetně náteru a instalace	m2	1	10 122,00 Kč		10 122,00 Kč	10 122,00 Kč
C.011	C.011	DUAL PIR+MW, dosah 12x12 m, 2 stupňů zabezpečení, signalizace pohybu modrou LED (lze i vypnout), volitelně ochrana proti podplázení, ukrytí elektroniky v plastovém krytu - zabránění vniknutí nečistot a následným provozním problémům, dynamická teplotní kompenzace, automatická úprava citlivosti, adaptivní zpracování sumu mikrovlnné technologie - snížení falešných poplachů, pokrytí od zdi kc zdi 12x12m, flexibilní montážní usřka bez řádkových úterv	ks	1	1 082,00 Kč		1 082,00 Kč	1 082,00 Kč
C.011	C.011	Tisňový plastový hlasicí s vyklapnou páčkou. Vyklopením páčky dojde k tiche aktivaci poplachu. Paměť poplachu	ks	3	1 052,00 Kč	300,00 Kč	1 352,00 Kč	4 056,00 Kč
C.014	C.014	Stíněný kabel 6x Cu drát Ø 0,5 mm, PVC plášť (SYFK 6x0,5) stíněný šestizáložový kabel pro EZS	m	150	9,00 Kč		9,00 Kč	1 350,00 Kč
C.015	C.015	Elektroinstalací chránička trubka 23mm, ohebná	m	125	14,00 Kč		14,00 Kč	1 750,00 Kč
	Safe Protector 950	Ofišový detektor - Paradox Safe Protector je navržen pro zabezpečení kovových trezorů, příručních pokladen a kovových dveří. Detektor lze aplikovat i na betonové zdi a jiné prostory domu i s příslušenstvím. vřžadující vysokou bezpečnostní ochranu	ks	1	2 088,00 Kč	540,00 Kč	2 628,00 Kč	2 628,00 Kč
	NV35M	IR duální detektor pohybu s úzkým paprskem 0,5 x 5m, PET imunita, antimasking, detekce "CREEP" plížení pod detektorem. dual tamper otevření a odstranění	ks	1	1 660,00 Kč	250,00 Kč	1 910,00 Kč	1 910,00 Kč
		Stíněný kabel 2x2 Cu drát Ø 0,5 mm, 2x Cu drát Ø 1 mm. PVC plášť (YCYJ 2+2P)	ks	321	9,00 Kč	14,40 Kč	23,40 Kč	7 511,40 Kč
C.018	C.018	Instalační materiál	kpl	1	780,00 Kč		780,00 Kč	780,00 Kč
C.019	C.019	Kabelové trasy - instalace kabelů do trubek, zlabů apod	m	125		19,00 Kč	19,00 Kč	2 375,00 Kč
C.020	C.020	Kabelové trasy - instalace chráničků, kabelů do zdi, na příchytky apod	m	100		38,00 Kč	38,00 Kč	3 800,00 Kč
C.022	C.022	Montáž klávesnice, montáž na stěnu ve příslušenství	ks	1		949,00 Kč	949,00 Kč	949,00 Kč
C.023	C.023	Montáž expandéru	ks	1		1 898,00 Kč	1 898,00 Kč	1 898,00 Kč
C.024	C.024	Montáž detektoru PIR a duálních	ks	1		253,00 Kč	253,00 Kč	253,00 Kč
C.025	C.025	Montáž detektoru třístění skla	ks	1		380,00 Kč	380,00 Kč	380,00 Kč
C.026	C.026	Montáž instalační plastová krabice povrchová	ks	2		228,00 Kč	228,00 Kč	456,00 Kč
C.027	C.027	Montáž podružného napájecího zdroje	ks	1		354,00 Kč	354,00 Kč	354,00 Kč
C.028	C.028	Montáž akumulátoru	ks	1		316,00 Kč	316,00 Kč	316,00 Kč
C.054	C.054	Průřaz ve zdivu betonovém tl. 20cm, plochy do 0,025m2, vř. začířtění	ks	3		119,00 Kč	119,00 Kč	357,00 Kč
C.059	C.059	Programování úřtředny	h	5		1 852,00 Kč	1 852,00 Kč	9 260,00 Kč
C.060	C.060	Oživení, zkušební provoz systému PZTS	ks	9		309,00 Kč	309,00 Kč	2 781,00 Kč
C.062	C.062	Revize	ks	1		3 704,00 Kč	3 704,00 Kč	3 704,00 Kč
C.063	C.063	Vypracování skutečné dokumentace stavby	kpl	1		2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
C.064	C.064	Pomocné stavební práce	ks	1		963,00 Kč	963,00 Kč	963,00 Kč
		Projekční změny	kpl	1		24 200,00 Kč	24 200,00 Kč	24 200,00 Kč
Celkem:								108 036,40 Kč

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 42

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
 Objekt: Divadlo Jiřího Myrona
 Část: ZL 42 Úpravy pro AV techniku v MS

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 29.3.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	SoD		VcP		MP		Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj		
							Vícepráce		Měně práce		cena jednotková	množství						množství	množství
							množství	cena	množství	cena									
CELKEM							0,00	17 140,00		0,00									
SO 03 - Architektonicko-stavební řešení							0,00	16 040,00		0,00									
Díl:	767	Konstrukce zámečnická						16 040,00											
1		Nosná OK nad hledištěm	kpl	0,00000	0,00	0,00	1,00	16 040,00	0,00	0,00	16 040,00	1,00	1,00	1,00	0,00		Dodavatel +10% Kč		
OVN-celk Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM							0,00	1 100,00		0,00									
Díl:	ON	Ostatní náklady																	
1	ON Z2	Projektční řešení změny	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1,00	1,00	1,00	0,00		Dodavatel +10% Kč		

Vícepráce	17 140,00
Měněpráce	0,00
Celkem vícepráce - měněpráce	17 140,00
DPH 21%	3 599,40
Vícepráce - měněpráce vč. DPH	20 739,40

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **45**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravoslezské**
ul. Čs. legií 1236/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR s.a.**
Duběčská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	5.4.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
M1	Divadlo Jiřího Myrona - M1	DPS

Popis změny / rozsah

Záměna pohledu SDK za minerální

1. Zdůvodnění změny

V průběhu realizace byla zjištěna potřeba pravidelného přístupu k vztl. jednotce s ohledem na její údržbu a servis požadovaný výrobcem jednotky. Provedení změny je nutné s ohledem na funkčnost díla jako celku.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

11 605,06 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M1	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	39 780,61
2	Méněpráce	-28 175,55
Celkem		11 605,06

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	11 605 Kč
-----	---------------------------------	------------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	/ Podpis
Za zhotovitele:	Porr a.s.		
	Duběčská 3238/36	30.5.18	
	100 00 Praha 10, Strašnice	30.5.18	
Za zpracovatele Dokumentace:			
		30.5.18	
Za TDC:			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 45

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M1	Čs. Legií 12 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 342	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	-28 175,55	-28 175,55
Díl: 767	Konstrukce zámečnické	39 780,61	0,00	39 780,61
		39 780,61	-28 175,55	11 605,06
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		39 780,61	-28 175,55	11 605,06

Realizované práce celkem bez DPH	11 605,06
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	11 605,06
DPH 21%	2 437,06
Realizované práce celkem včetně DPH	14 042,13

Porr a.s.

Duběčská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 45

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
 Objekt: Divadlo Jiřího Myrona
 Část: ZL 45 - Záměna podhledu SDK za minarální C2.14

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 5.4.2018

SoD

VcP

MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		Cena jednotková	Celková množství vyvolané změny	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena						
CELKEM						382 682,53	39 780,61	-28 175,55								
SO 02 - Architektonicko-stavební řešení						382 682,53	39 780,61	-28 175,55								
Díl:	342	Svislá a kompletní konstrukce														
1	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými, 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	686,71000	557,27	382 682,53	0,000	0,00	-50,56	-28 175,55	557,27	-50,56	636,15	0,00	-50,56	SO 02-2
Díl:	767	Konstrukce zámečnická														
1	767587001R00	Podhledy Thematex, rošt, kazety 60 x 60 cm	m2	0,00000	0,00	0,00	50,560	24 228,35	0,00	0,00	479,20	50,56	50,56	50,56	0,00	SO 02-2
2	595-96018.AR	Kazeta Thematex 60 GN Feinstratos	m2	0,00000	0,00	0,00	50,560	15 552,26	0,00	0,00	307,60	50,56	50,56	50,56	0,00	Rts -20%
OVN-celk ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M						0,00	0,00	0,00								
Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projektční řešení změny	kpl	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Dodavatel +10% Kč

Vícepráce

39 780,61

Méněpráce

-28 175,55

Celkem vícepráce - méněpráce

11 605,06

DPH 21%

2 437,06

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

14 042,13

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIRÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 12, OSTRAVA

číslo návrhu: **47**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legií 1236/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Duběčská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	18.4.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
M3	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Podstojkování a dodatečné úpravy I nosníků v Baletním sále

1. Zdůvodnění změny

Podstojkování a dodatečné úpravy nosníků byly realizovány dle požadavku statika. Tyto dodatečné úpravy bylo možné zjistit až po odkrytí stávajících konstrukcí. Tyto dodatečné úpravy bylo možné zjistit až po odkrytí stávajících konstrukcí.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

45 532,50 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, podle k navyšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M3	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícopráce	45 532,50
2	Méněpráce	0,00
Celkem		45 532,50

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	45 533 Kč
-----	---------------------------------	------------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	Porr a.s. Duběčská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	30.5.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		30.5.18	
Za TDO:		30.7.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslení cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechny práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 47

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M3	Čs. Legii 12 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 02	Architektonicko-stavební řešení			
4	Vodorovné konstrukce	45 532,50	0,00	45 532,50
		45 532,50	0,00	45 532,50
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		45 532,50	0,00	45 532,50

Realizované práce celkem bez DPH	45 532,50
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	45 532,50
DPH 21%	9 561,83
Realizované práce celkem včetně DPH	55 094,33

Porr a.s.

Dubecská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560




ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 47

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA
 Objekt: Divadlo Jiřího Myrona
 Část: ZL 47 Podstojkování a dodatečné úpravy i nosníků v Baletním sale

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 18.4.2018

SoD							VcP		MP						Zdroj	
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Měně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP		MP
							množství	cena	množství	cena						
CELKEM							0,00	45 532,50	0,00							
SO 02 - Architektonicko-stavební řešení							0,00	45 532,50	0,00							
Díl:	4	Vodorovné konstrukce						7 176,00								
1		Montáž stojek DOKA	kpl	0,00000	0,00	0,00	1,00	7 176,00	0,00	0,00	7 176,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Dodavatel + 10% Kč
2		Pronájem stojek DOKA	den	0,00000	0,00	0,00	55,00	14 190,00	0,00	0,00	258,00	55,00	55,00	55,00	0,00	
3		D+M ocelové konzoly pod nosníky	ks	0,00000	0,00	0,00	1,00	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
4		Dodatečné zámečnické práce průvlak	kpl	0,00000	0,00	0,00	1,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
5		Dodatečný materiál na průvlak	kg	0,00000	0,00	0,00	123,00	26,50	0,00	0,00	26,50	123,00	123,00	123,00	0,00	
6		Demontáž stojek DOKA	kpl	0,00000	0,00	0,00	1,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
7		Náklady na dopravu stojek DOKA (PV-OVA)	kpl	0,00000	0,00	0,00	1,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
OVN-celk Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM							0,00	0,00	0,00							
Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projektční řešení změny	kpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dodavatel + 10% Kč

Vícepráce	45 532,50
Měněpráce	0,00
Celkem vícepráce - měněpráce	45 532,50
DPH 21%	9 561,83
Vícepráce - měněpráce vč. DPH	55 094,33

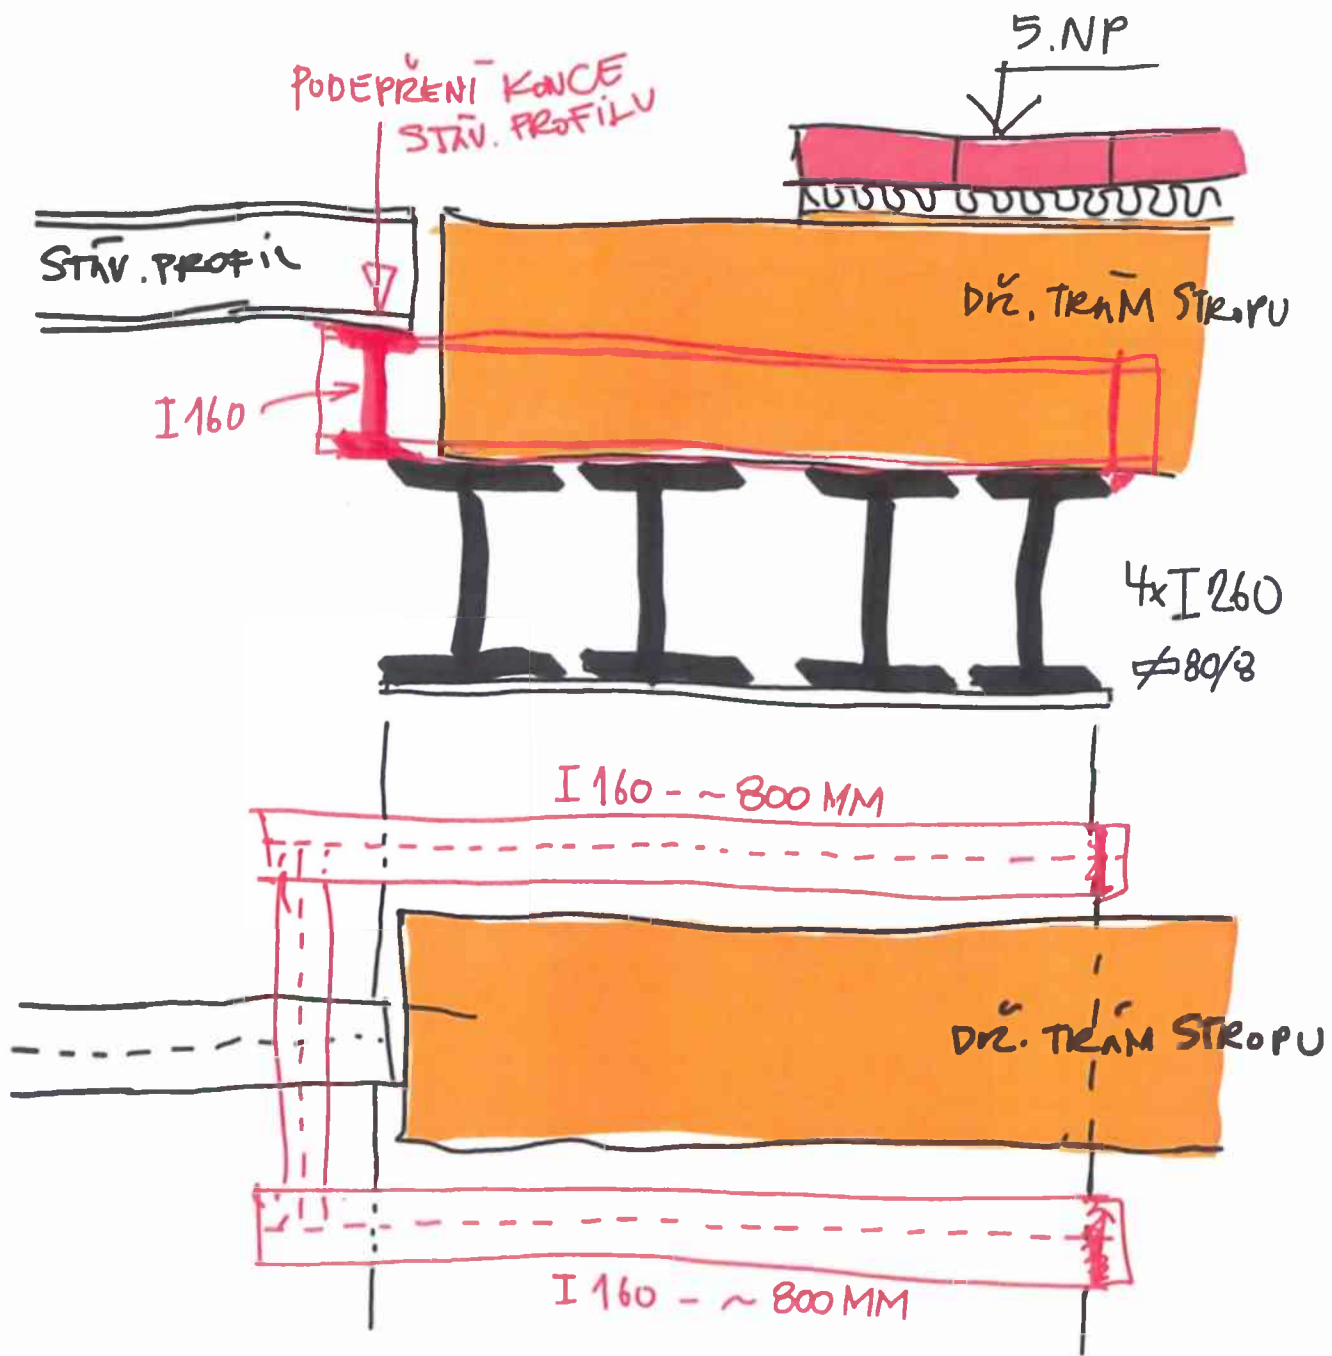

NDM - MIUČOLA 3 - 4.NP - PRŮVLAK

PODCHYCENÍ NOSNÍKŮ STĀV. STROPU
NA NOVÝ PRŮVLAK - JSOU KRÁTKĚ TĚN.,
ŽE VYCHÁZÍ NEDOSTATEČNĚ ULOŽENÍ

16.3.18

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 12, OSTRAVA

číslo návrhu: **48**
číslo revize:

Objednatel: **Narodní divadlo Moravskoslezska**
ul. Čs. legií 1236/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **FORR a.s.**
Duběčská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	5.4.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
12	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Zajištění rozvolněné části schodišťové stěny

1. Zdůvodnění změny

Ze statického důvodu bylo nutno provést zajištění rozvolněné části schodišťové stěny. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídaných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

68 165,00 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M3	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	68 165,00
2	Méněpráce	0,00
Celkem		68 165,00

Cenový dopad celkem bez DPH




ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	68 165 Kč
-----	---------------------------------	------------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	Porr a.s. Duběčská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	30.5.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.5.18	
Za TDO:		30.5.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované i zamyšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to včetně všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 48

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
12	Čs. Leglí 12 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
767	Konstrukce zámečnické	48 915,00	0,00	48 915,00
		48 915,00	0,00	48 915,00
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	19 250,00	0,00	19 250,00
		19 250,00	0,00	19 250,00
Celkem		68 165,00	0,00	68 165,00

Realizované práce celkem bez DPH	68 165,00
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	68 165,00
DPH 21%	14 314,65
Realizované práce celkem včetně DPH	82 479,65

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 48

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

Objekt: Divadlo Jiřího Myrona

Část: ZL 48 Zajištění rozvolněné části schodiškové stěny

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 5.4.2018

										SoD		VcP		MP			
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		Cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj	
							množství	cena	množství	cena							
CELKEM						0,00	68 165,00		0,00								
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						0,00	48 915,00		0,00								
Dř:	767	Konstrukce zámečnické					48 915,00										
1		Zajištění rozvolněné části schodiškové stěny	ksl	0,00000	0,00	0,00	1,00	48 915,00	0,00	0,00	48 915,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Indiv. kalkulace - R pol.	
OVN-celk						0,00	19 250,00		0,00								
Dř:	ON	Ostatní náklady															
1	ON ZZ	Projektovní řešení změny	ksl	0,00	0,00	0,00	1,00	19 250,00	0,00	0,00	19 250,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Dodavatel +10% Kč	
						Vícepráce	68 165,00										
						Méněpráce	0,00										
						Celkem vícepráce - méněpráce	68 165,00										
						DPH 21%	14 314,65										
						Vícepráce - méněpráce vč. DPH	82 479,65										

ZMĚNOVÝ LIST


ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 12, OSTRAVA

 číslo návrhu:
 číslo revize:

49

 Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezská**
 ul. Čs. legií 1236/12
 701 04 Ostrava
 IČ: 00100528
 DIČ: 00100528

 Zhotovitel: **PORR a. s.**
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10
 IČ: 43005560
 DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	27.4.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
SB	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah
Změna skladby podlah na betonových podlahách 3. a 4.NP SB
1. Závazdní změny

Vybourání betonové mezaninny podlah jejíž niveleta neumožňovala provedení čistých podlah tak, aby výškové navazovaly na stávající niveletu podest schodišť. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností po odkrytí stávajících konstrukcí.

2. Popis změny
2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

722 364,47 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:
Dílní vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	722 364,47
2	Méněpráce	0,00
Celkem		722 364,47

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	722 364 Kč
------------	--	-------------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	Porr a.s. -SB- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	30.5.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		30.5.18	
Za TDO:		30.5.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provádět požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno / předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 49

ROZVOJ DIVADLA JIŘIHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
SB	Divadlo Jiřího Myrona			
SO 02	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	653 451,09	0,00	653 451,09
Díl: 96	Bourání konstrukcí	44 761,77	0,00	44 761,77
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	23 051,61	0,00	23 051,61
		721 264,47	0,00	721 264,47
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	1 100,00	0,00	1 100,00
		1 100,00	0,00	1 100,00
Celkem		722 364,47	0,00	722 364,47

Realizované práce celkem bez DPH	722 364,47
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	722 364,47
DPH 21%	151 696,54
Realizované práce celkem včetně DPH	874 061,01

Porr a.s.

Dubecská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 49

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIL 14, OSTRAVA
 Objekt: Divadlo Jiřího Myrona
 Část: ZL 49 - Změna skladby podlah na betonových podlahách 3. a 4.NP SB

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 27.4.2018

														SoD	VcP	MP		
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj		
							množství	cena	množství	cena							množství	množství
CELKEM						0,00			0,00									
SO 02 - Architektonicko-stavební řešení						0,00	721 264,47		0,00									
Díl:	03	Podlahy a podlahové konstrukce					653 461,00											
1	632417130RT4	Podlěr Ardex samonivelační	m2	0,00000	0,00	0,00	233,22	639 955,68	0,00	0,00	2 744,00	233,22	233,22	233,22	0,00	RTS -20%		
178	776590100	Úprava podkladu vysátím	m2	138,72000	18,48	2 563,55	233,22	4 309,91	0,00	0,00	18,48	233,22	233,22	233,22	0,00	SO 01		
179	776590RO	Úprava podkladu penetracl	m2	138,72000	30,81	4 273,96	233,22	7 185,51	0,00	0,00	30,81	233,22	233,22	233,22	0,00	SO 01		
5	631 31-7105.R00	Přofezání spar - dilatace	kpl	0,00000	0,00	0,00	1,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Dodavatel +10% KČ		
Díl:	04	Bourání konstrukcí					44 761,77											
13	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	28,17160	2 559,06	72 092,76	17,49	44 761,77	0,00	0,00	2 559,06	17,49	45,66	17,49	0,00	SO02-1		
Díl:	06	Převazy sutí a vybouraných hmot					23 051,61											
3	996x111	Náklady spojené s manipulací, odvozem a likvidací, stavební sutí	t	775,03200	527,15	408 558,12	43,729	23 051,61	0,00	0,00	527,15	43,73	818,76	43,73	0,00	SO 02-1		
OVN-celk						0,00	1 100,00		0,00									
Díl:	0N	Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM																
1	ON Z2	Ostatní náklady	kpl	0,00	0,00	0,00	1,000	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1,000	1,000	1,000	0,000	Dodavatel +10% KČ		

Vícepráce	722 364,47
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	722 364,47
DPH 21%	151 696,54
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	874 061,01

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 12, OSTRAVA

číslo návrhu: **50**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legií 1236/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	25.4.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
M3	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Nová skladba podlahy 5.NP

1. Zásadovní změny

Po odkrytí stávajících konstrukcí bylo nutné změnit skladbu podlahy pro zachování funkčnosti díla jako celku. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

53 074,58 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M1	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	240 516,85
2	Méněpráce	-187 442,27
Celkem		53 074,58

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	53 075 Kč
-----	---------------------------------	------------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Porr a.s. -58-			
Za zhotovitele: Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560		20.5.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		21.5.18	
Za TDO:		20.5.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 50

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M1	Čs. Legii 12 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 02	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	240 516,85	-187 442,27	53 074,58
		240 516,85	-187 442,27	53 074,58
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		240 516,85	-187 442,27	53 074,58

Realizované práce celkem bez DPH	53 074,58
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	53 074,58
DPH 21%	11 145,66
Realizované práce celkem včetně DPH	64 220,24

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 50

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA
 Objekt: Divadlo Jiřího Myrona
 Část: ZL 50 - Nova skladba podlahy 5.NP

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 25.4.2018

						SoD	VcP		MP						Zdroj		
P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celková množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP		
							množství	cena	množství	cena							množství
CELKEM						0,00	240 516,85		0,00								
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						0,00	240 516,85		0,00								
Díl:	63	Podlahy a podlahová konstrukce															
1	632411110RT3	Samonivelační sterka ruční zpracování 10 mm	m2	0,00000	0,00	0,00	254,36	110 902,05	0,00	0,00	436,00	254,36	254,36	254,36	0,00		RTS -20%
2	632 41-1240.RT1	Potěr Cemix, strojní zpracování, tl. 40 mm	m2	0,00000	0,00	0,00	254,36	107 441,66	0,00	0,00	422,40	254,36	254,36	254,36	0,00		RTS -20%
3	632 44-1432.R00	Potěr Anhyment FE 30, přes 500 m2, přípl.zkd 5 mm	m2	0,00000	0,00	0,00	508,73	11 721,02	0,00	0,00	23,04	508,73	508,73	508,73	0,00		RTS -20%
4	632 44-1491.R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	0,00000	0,00	0,00	254,36	7 936,11	0,00	0,00	31,20	254,36	254,36	254,36	0,00		RTS -20%
5	631 31-7105.R00	Přofezání spar - dilatace	m	0,00000	0,00	0,00	50,00	2 516,00	0,00	0,00	50,32	125,00	50,00	50,00	0,00		RTS -20%
OVN-celk																	
Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM						0,00	0,00		0,00								
Díl:	ON	Ostatní náklady															
1	ON Z2	Projekční řešení změny	kpl	0,00	500,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000		Dodavatel +10% Kč
CELKEM						187 442,27	0,00		-187 442,27								
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						187 442,27	0,00		-187 442,27								
Díl:	63	Podlahy a podlahová konstrukce															
66	635111031R00	Suchá podlaha sádrováknitá deska + dřevovlákn	m2	254,36250	736,91	187 442,27	0,00	0,00	-254,36	-187 442,27	736,91	-203,42000	-254,36	0,00	-254,36250		

Vícepráce 240 516,85
 Méněpráce -187 442,27
 Celkem vícepráce - méněpráce 53 074,58
 DPH 21% 11 145,66
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH 64 220,24
