

D o d a t e k č.1
S M L O U V A O D Í L O
č. S928/2018/151

I.
Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice

(dále jen „objednatel“)

a

STRIX Chomutov, a.s.

IČO: 27274535

DIČ: CZ27274535

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 1620
sídlo: 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov
zastoupený: panem Dušanem Dufkou – předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tuto smlouvu o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **5.946 305,- Kč Kč bez DPH**, slovy pět milionů devět set čtyřicet šest tisíc třicet pět korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou tohoto dodatku smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

Původní cena díla :	9 965 683,00, - Kč
Snížení ceny:	- 1 140 128,26, - Kč
Zvýšení ceny:	1 120 750,00,- Kč
Konečná cena díla	5 946 304,74,- Kč

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena


odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy-cr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.


6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Č. KRONOVĚ, dne: 22-06-2018

22-06-2018
V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:

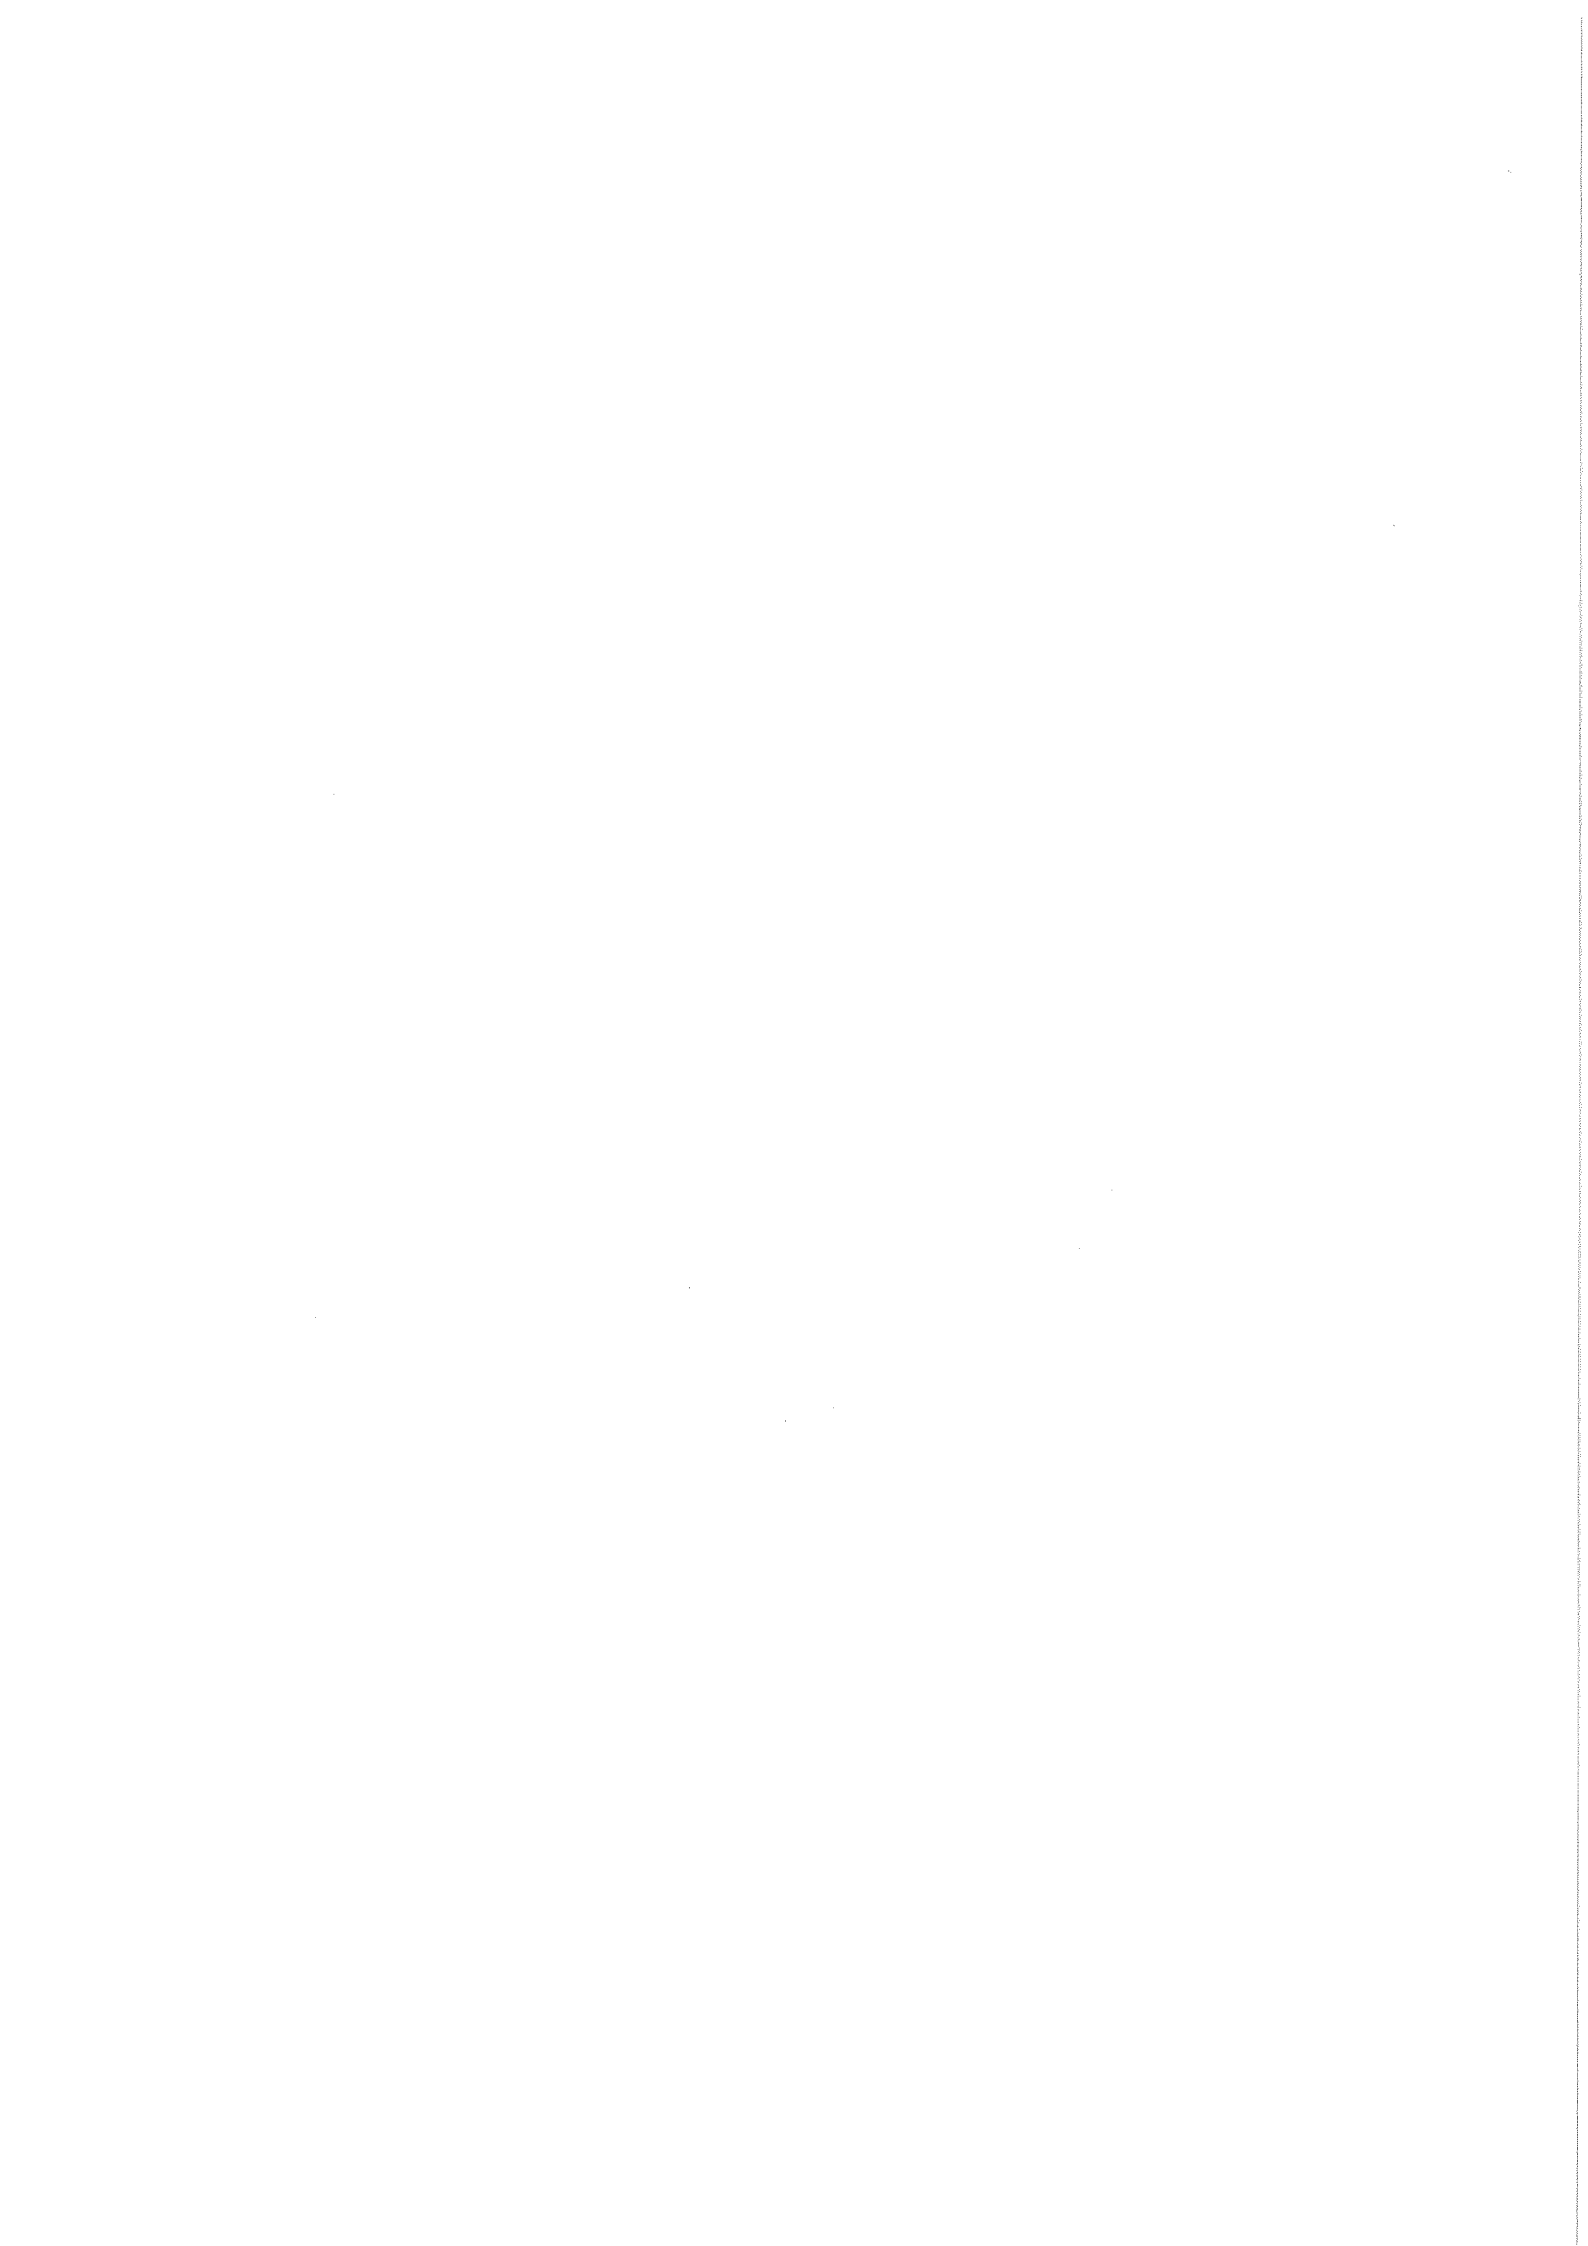

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1	
			Datum změny: 18.6.2018	
Název veř. zakázky: Odstranění havarijního stavu – sanace Barevné skály				
Zhotovitel: Strix Chomutov, a.s.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): Sanace Barevné skály	Charakter akce: N	Číslo objektů:	Stavební díly:	
<p>Popis změny: Méněpráce: poplatek za skládku, příplatek ZKD přemístění sutí a vybouraných hmot, odtěžení hornin pomocí hydraulických klínů, vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot, nakládání sutí a vybouraných hmot. Vícepráce: Druhotné rozpojení balvanů nadměrné velikosti, odtěžení hornin tlakovými poduškami</p>				
<p>Zdůvodnění změny: Dohodou s Městem Český Krumlov se podařilo najít vhodnou deponii odtěženého materiálu na pozemcích Města, čímž se zkrátila i odvozní vzdálenost pod 1 km a nebylo potřeba použít příplatků za další km. Druhotné rozpojení hornin bylo navýšeno z toho důvodu, že při odtěžování se uvolňovaly celé skalní bloky, které pak bylo nutno upravit z důvodu nakládky. Dále došlo k přesunu množství mezi jednotlivými použitými technologiemi.</p>				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			Datum: 18.6.2018	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ne, DSPS):			
	do časového plánu:		NE	Termín dokončení do: 30.6.2018
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 1.140.128,-	Bilance: -19.378,- Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 1.120.750,-	
	Konečná celková cena akce po změně			5.946.305,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			5.946.305,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Dušan Dufka	Datum: 22.6.2018	Po	
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Ivan Votýpka	Datum: 22.6.2018	Po	
Přílohy: položkový výkaz výměr na vícepráce a méněpráce				
Poznámka:				



**KRYCÍ LIST ROZPOČTU****Stavba:** Odstranění havarijního stavu Barevné skály v Novém Spolí, Český Krumlov - vícepráce

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nové Spolí	Datum:	10. 5. 2018
Objednatel:		IČ:	
Lesy České republiky, s.p.		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	27274535
STRIX Chomutov a.s.		DIČ:	CZ27274535
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Jaroslav Savkov		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu		1 120 750,00
Ostatní náklady		0,00
Cena bez DPH		1 120 750,00
DPH základní	21,00%	ze 1 120 750,00
		235 357,50
DPH snížená	15,00%	ze 0,00
		0,00
Cena s DPH	v CZK	1 356 107,50

Projektant

Zpracovatel

REKAPITULACE ROZPOČTU**Stavba:** Odstranění havarijního stavu Barevné skály v Novém Spolí, Český Krumlov - vícepráce

Místo:	Nové Spolí	Datum:	10. 5. 2018
Objednatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	
Zhotovitel:	STRIX Chomutov a.s.	Zpracovatel:	Jaroslav Savkov

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 120 750,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 120 750,00
1 - Zemní práce	1 120 750,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 120 750,00

ROZPOČET

Stavba: Odstranění havarijního stavu Barevné skály v Novém Spolí, Český Krumlov - vícepráce

Místo: Nové Spolí **Datum:** 10. 5. 2018

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. **Projektant:**
Zhotovitel: STRIX Chomutov a.s. **Zpracovatel:** Jaroslav Savkov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 120 750,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **1 120 750,00**

1 - Zemní práce **1 120 750,00**

10	K	100001903	Druhotné rozpojení batvanů nadměrné velikosti včetně potřebné manipulace s balvany a rozpojenou sypaninou a s případnými nutnými bezpečnostními opatřeními v hornině tř. VII	m3	193,000	2 200,00	424 600,00
4	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm	kus	0,000	590,00	0,00
5	K	112211252	Odstranění pařezů ručně Ø do 0,3 m ve svahu do 1:1 + odklizení a zasypaní	kus	0,000	2 950,00	0,00
11	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	0,000	770,00	0,00
6	K	155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (mokykami, páčidly) horolezeckou technikou	m3	0,000	5 150,00	0,00
7	K	155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou sbíječkou	m3	0,000	6 500,00	0,00
8	K	155211312	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou tlakovými poduškami	m3	91,000	7 650,00	696 150,00
9	K	155211313	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou hydraulickými klíny	m3	0,000	10 600,00	0,00
16	K	155213613	Trny z Injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zaljeťované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kládami na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 3 do 4 m	kus	0,000	6 500,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **0,00**

1	K	944511111.R	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken vč.dodávky materiálu, lešení a jeho montáže	m2	0,000	29,50	0,00
2	K	944511211.R	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	0,000	2,95	0,00
3	K	944511811.R	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken a lešení	m2	0,000	12,00	0,00

997 - Přesun sutě **0,00**

13	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t		120,00	0,00
14	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	0,000	18,00	0,00
12	K	997002611.R	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	m3		180,00	0,00
15	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	0,000	250,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení **0,00**

17	K	789321120.R	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednostranného krycího (vrchního), tloušťky do 40 µm vč.dodávky materiálu	m2		89,00	0,00
----	---	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	-------	------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **0,00**

VRN3 - Zařízení staveniště **0,00**

18	K	032002000	Vybavení staveniště, gumové pláty, ochrana Jezu, svodidla, nutné opravy	m2		1 100,00	0,00
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------	----	--	----------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění havarijního stavu Barevné skály v Novém Spolí, Český Krumlov - méněpráce

JKSO:

Místo: Nové Spolí

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2018

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRIX Chomutov a.s.

IČ:

27274535

DIČ:

CZ27274535

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jaroslav Savkov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-1 140 128,26

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-1 140 128,26

DPH základní

21,00%

ze

-1 140 128,26

-239 426,93

DPH snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-1 379 555,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Odstranění havarijního stavu Barevné skály v Novém Spolí, Český Krumlov - méněpráce

Místo:

Nové Spolí

Datum:

10. 5. 2018

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Jaroslav Savkov

Zhotovitel:

STRIX Chomutov a.s.

Zpracovatel:

Jaroslav Savkov

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-1 140 128,26

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 140 128,26

1 - Zemní práce

-376 300,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

-763 828,26

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-1 140 128,26

ROZPOČET

Stavba: Odstranění havarijního stavu Barevné skály v Novém Spolí, Český Krumlov - méněpráce

Místo: Nové Spolí

Datum: 10. 5. 2018

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: STRIX Chomutov a.s.

Zpracovatel: Jaroslav Savkov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 140 128,26

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 140 128,26

1 - Zemní práce

-376 300,00

10	K	100001903	Druhotné rozpojení balvanů nadměrné velikosti včetně potřebné manipulace s balvany a rozpojenou sypaninou a s případnými nutnými bezpečnostními opatřeními v hornině tř. VII	m3		2 200,00	0,00
4	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm	kus	0,000	590,00	0,00
5	K	112211252	Odstranění pařezů ručně D do 0,3 m ve svahu do 1:1 + odklizení a zasypání	kus	0,000	2 950,00	0,00
11	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	0,000	770,00	0,00
6	K	155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	m3	0,000	5 150,00	0,00
7	K	155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou sbíječkou	m3	0,000	6 500,00	0,00
8	K	155211312	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou tlakovými poduškami	m3		7 650,00	0,00
9	K	155211313	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou hydraulickými klíny	m3	-35,500	10 600,00	-376 300,00
16	K	155213613	Trny z Injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou za injektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtačmi kladivly na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 3 do 4 m	kus	0,000	6 500,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

1	K	944511111.R	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken vč.dodávky materiálu, lešení a jeho montáže	m2	0,000	29,50	0,00
2	K	944511211.R	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	0,000	2,95	0,00
3	K	944511811.R	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken a lešení	m2	0,000	12,00	0,00

997 - Přesun sutě

-763 828,26

13	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	-164,898	120,00	-19 787,76
14	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	-23 907,000	18,00	-430 326,00
12	K	997002611.R	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	m3	-82,650	180,00	-14 877,00
15	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	-1 195,350	250,00	-298 837,50

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

0,00

17	K	789321120.R	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového krycího (vrchního), tloušťky do 40 µm vč.dodávky materiálu	m2		89,00	0,00
----	---	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	-------	------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

18	K	032002000	Vybavení staveniště, gumové pláty, ochrana Jezu, svodidla, nutné opravy	m2		1 100,00	0,00
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------	----	--	----------	------
