

Agendové číslo: 22/04/2018/Bro/1

Evidenční číslo: d201800382

výtisk č. 1

DODATEK Č. 1 **ke smlouvě o dílo č. d201800088**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

FRK s. r. o.

sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
adresa pro doručování: [REDACTED]
IČO: 61324817
DIČ: CZ61324817
zastoupený/á: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaný/á: ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad
Labem spisová značka C6897
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 4. 2018 smlouvu o dílo č. d201800088 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla realizace stavebních prací v odborných učebnách, školních poradenských pracovištích a bezbariérová opatření ve školách zahrnující rampy, plošiny a WC v základních školách v Chomutově.
1. Předmětem tohoto dodatku je změna dílčích termínů pro provádění díla tak, že ve školách budou ve zkrácených termínech postupně dokončeny veškeré stavební úpravy (části díla A a B), a to za účelem lepší koordinace prací všech zhotovitelů v dotčených školách, neboť postupné kompletní dokončování stavebních úprav umožní ostatním zhotovitelům volný pohyb na uvolněných staveništích a kompletní stavební připravenost. Za účelem uvolnění kapacit zhotovitele pro toto dřívější dokončení stavebních úprav byly naopak prodlouženy termíny pro bezbariérová opatření



Agendové číslo: 22/04/2018/Bro/1

Evidenční číslo: d201800382

výtisk č.

(části díla C), jejichž provedení bylo přesunuto do pozdější fáze provádění díla, neboť mají na koordinaci prací jen zanedbatelný vliv.

II. Změna termínů provádění díla

1. Čl. II. odst. 2 body 23 až 30 smlouvy se ruší a nahrazují se novým bodem, který zní:

23. harmonogram provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy

2. Čl. V. odst. 4 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

4. Zhotovitel je povinen řádně dílo kompletně dokončit a předat objednateli v následujících termínech:

a) Dílo A – STAVEBNÍ ÚPRAVY V ODBORNÝCH UČEBNÁCH

1. část A1 – ZŠ Akademika Heyrovského - **do 33 týdnů** od předání a převzetí staveniště
2. část A2 - ZŠ Březenecká - **do 43 týdnů** od předání a převzetí staveniště
3. část A3 - ZŠ Hornická - **do 28 týdnů** od předání a převzetí staveniště
4. část A4 - ZŠ Kadaňská - **do 32 týdnů** od předání a převzetí staveniště
5. část A5 - ZŠ Na Příkopěch - **do 27 týdnů** od předání a převzetí staveniště
6. část A6 - ZŠ Písečná - **do 43 týdnů** od předání a převzetí staveniště
7. část A7 - ZŠ Školní (ul. Beethovenova) - **do 23 týdnů** od předání a převzetí staveniště
8. část A8 - ZŠ Školní (ul. Školní) - **do 26 týdnů** od předání a převzetí staveniště
9. část A9 - ZŠ Zahradní - **do 43 týdnů** od předání a převzetí staveniště

b) Dílo B – STAVEBNÍ ÚPRAVY VE ŠKOLNÍCH PORADENSKÝCH PRACOVÍŠTÍCH

1. část B1 – ZŠ Akademika Heyrovského - **do 30 týdnů** od předání a převzetí staveniště
2. část B2 - ZŠ Březenecká - **do 35 týdnů** od předání a převzetí staveniště
3. část B3 - ZŠ Kadaňská - **do 41 týdnů** od předání a převzetí staveniště
4. část B4 - ZŠ Na Příkopěch - **do 27 týdnů** od předání a převzetí staveniště
5. část B5 - ZŠ Písečná - **do 33 týdnů** od předání a převzetí staveniště
6. část B6 - ZŠ Školní (ul. Beethovenova) - **do 33 týdnů** od předání a převzetí staveniště

d) Dílo C – BEZBARIÉROVÁ OPATŘENÍ

1. část C1 – ZŠ Akademika Heyrovského - **do 30 týdnů** od předání a převzetí staveniště
2. část C2 - ZŠ Březenecká - **do 33 týdnů** od předání a převzetí staveniště
3. část C3 - ZŠ Hornická - **do 33 týdnů** od předání a převzetí staveniště
4. část C4 - ZŠ Kadaňská - **do 41 týdnů** od předání a převzetí staveniště
5. část C5 - ZŠ Na Příkopěch - **do 27 týdnů** od předání a převzetí staveniště
6. část C6 - ZŠ Písečná - **do 43 týdnů** od předání a převzetí staveniště
7. část C7 - ZŠ Školní (ul. Beethovenova) - **do 33 týdnů** od předání a převzetí staveniště
8. část C8 - ZŠ Školní (ul. Školní) - **do 38 týdnů** od předání a převzetí staveniště
9. část C9 - ZŠ Zahradní - **do 43 týdnů** od předání a převzetí staveniště

3. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2 – harmonogram provádění díla, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

4. Čl. XIV. odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:



Agendové číslo: 22/04/2018/Bro/1


Evidenční číslo: d201800382

výtisk č.


3. *Za smluvní strany jsou oprávněni jednat:*

a) *za objednatele:*

Osoba zmocněná jednat ve věcech technických bez oprávnění měnit smlouvu:



Osoba zmocněná jednat ve věcech organizačních bez oprávnění měnit smlouvu:



Kontrola dokladů k realizaci díla podle podmínek vyplývajících z poskytnuté dotace a uzavřené smlouvy o dílo:



Kontrola probíhajících stavebních úprav vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo, harmonogramů:

Statutární zástupce Základní školy Akademika Heyrovského, Hornická, Kadaňská, Na Příkopech, Školní, Brezenecká, Zahradní a Písečná

b) *za zhotovitele:*

Osoba zmocněná jednat ve věcech smluvních:



Osoba zmocněná jednat ve věcech technických:



Stavbyvedoucí:



Technik pro prostředí staveb (elektrotechnická zařízení):





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Agendové číslo: 22/04/2018/Bro/1

Evidenční číslo: d201800382

výtisk č.

III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 586/18 ze dne 26. 6. 2018.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Chomutově dne ~~9.~~ 07. 2018

V Kadani dne ~~2.~~ 07. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

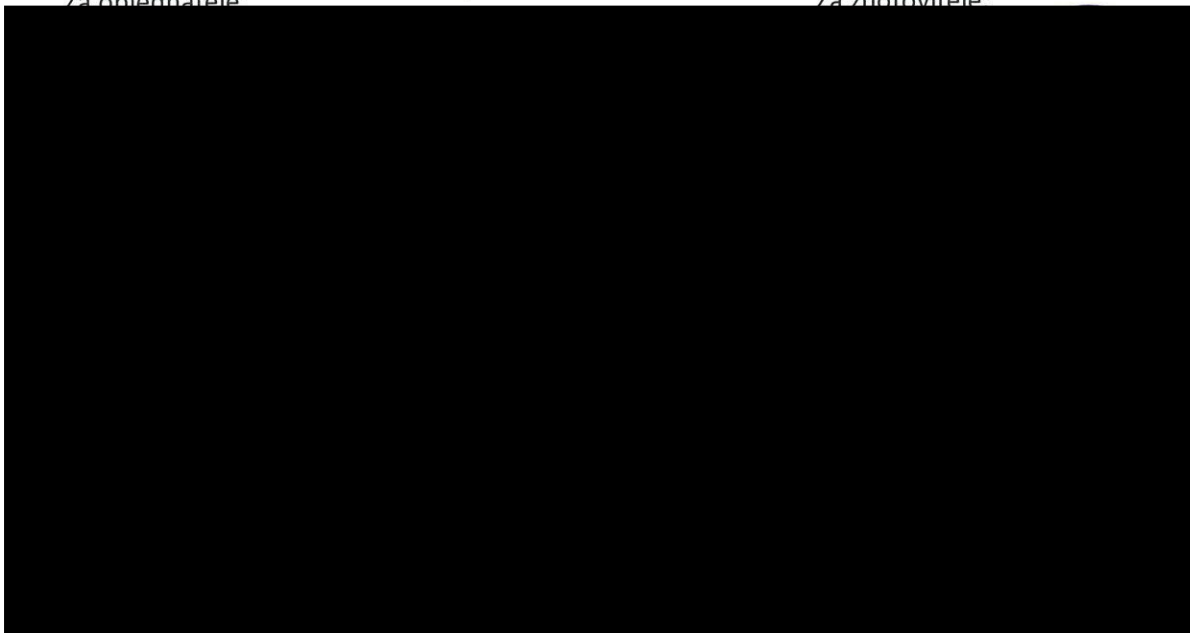

část díla	Měsíc, rok	květen 2018							červen 2018							červenec 2018							srpen 2018							září 2018							říjen 2018							listopad 2018							prosince 2018							leden 2019							únor 2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		kalendářní týden							kalendářní týden							kalendářní týden							kalendářní týden							kalendářní týden							kalendářní týden							kalendářní týden							kalendářní týden							kalendářní týden								kalendářní týden							kalendářní týden																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
7.5. - 13.5. 2018	14.5. - 20.5. 2018	21.5. - 27.5. 2018	28.5. - 3.6. 2018	4.6. 10.6. 2018	11.6. 17.6. 2018	18.6. 24.6. 2018	25.6. 1.7. 2018	02.7. 8.7. 2018	09.7. 15.7. 2018	16.7. 22.7. 2018	23.7. 29.7. 2018	30.7. 5.8. 2018	6.8. 12.8. 2018	13.8. 19.8. 2018	20.8. 26.8. 2018	27.8. 3.9. 2018	03.9. 9.9. 2018	10.9. 16.9. 2018	17.9. 23.9. 2018	24.9. 30.9. 2018	1.10. 7.10. 2018	8.10. 14.10. 2018	15.10. 21.10. 2018	22.10. 28.10. 2018	29.10. 4.11. 2018	5.11. 11.11. 2018	12.11. 18.11. 2018	19.11. 25.11. 2018	26.11. 3.12. 2018	23.12. 30.12. 2018	31.12. 6.1. 2019	7.1. 13.1. 2019	14.1. 20.1. 2019	21.1. 27.1. 2019	28.1. 3.2. 2019	4.2. 10.2. 2019	11.2. 17.2. 2019	18.2. 24.2. 2019	25.2. 3.3. 2019	3.3. 10.3. 2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ZŠ Na Příkopěch	- učebna cizích jazyků	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
