

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325
se sídlem: Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov
IČO 601 53 237
zástupce Mgr. Petr Skokan, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel BAK stavební společnost, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 14336

se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
IČO 284 02 758
DIČ CZ28402758
zastoupený Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 11. 2017 na základě výsledku podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov – stavební práce II“, smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 4. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a s ohledem na vzniklé vícepráce zároveň dochází k prodloužení lhůty pro dokončení díla.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 3 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo (stavbu) objednateli do 14. 10. 2018.
3. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

celková cena 20 394 841,60 Kč bez DPH (slovy: dvacet milionů tři sta devadesát čtyři tisíc osm set čtyřicet jedna korun českých a šedesát haléřů);

celková výše DPH 4 282 916,74 Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě osmdesát dva tisíc devět set šestnáct korun českých a sedmdesát čtyři haléřů);

celková cena 24 677 758,34 Kč s DPH (slovy: dvacet čtyři tisíc šest set sedmdesát sedm tisíc sedm set padesát osm korun českých a třicet čtyři haléřů).



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

a) **dílo dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy, tedy stavební práce činí:**

celková cena 20 393 591,60Kč bez DPH (slovy: dvacet milionů tři sta devadesát tři tisíc pět set devadesát jedna korun českých a šedesát haléřů);

celková výše DPH 4 282 654,24 Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě osmdesát dva tisíc šest set padesát čtyři korun českých a dvacet čtyři haléřů);

celková cena 24 676 245,84 Kč s DPH (slovy: dvacet čtyři milionů šest set sedmdesát šest tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých a osmdesát čtyři haléřů);

b) **dílo dle čl. 5 odst. 3 této smlouvy, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:**

celková cena 1 250,00 Kč bez DPH (slovy: tisíc dvě stě padesát korun českých);

celková výše DPH 262,50 Kč (slovy: dvě stě šedesát dva korun českých a padesát haléřů);

celková cena 1 512,50 Kč s DPH (slovy: jeden tisíc pět set dvanáct korun českých a padesát haléřů);

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami, v případě, kdy jiný právní předpis vyžaduje uveřejnění smlouvy ve veřejném registru (např. registru smluv), nabývá smlouva účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1 – změnové listy č. 1 - 2

za objednatele v Trutnově dne 10. 7. 2018

za zhotovitele v Trutnově dne

Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325
Jiráskovo náměstí 325
541 01 TRUTNOV



Mgr. Petr Skokan
ředitel

Ing. Radek Mrázek, MBA
místopředseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1			
Zhotovitel:	BAK stavební společnost; a.s. IČ: 284 02 758				
Investor:	Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 IČ: 601 53237			Datum: 29. 5. 2018	
Název akce:	Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov – stavební práce II				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: 1. Bourání stávající betonové mazaniny – předpokládaná tl. 55 mm, skutečný stav 80 mm					
Popis a zdůvodnění změny: Ad 1) Bourání stávající betonové mazaniny – předpokládaná tl. 55 mm, skutečný stav 80 mm					
Po demontáži palubové podlahy a následném provádění bouracích prací pro odstranění betonové mazaniny bylo zjištěno, že tloušťka betonové mazaniny neodpovídá předpokladu projektové dokumentace. Skutečná tloušťka stávající betonové mazaniny je proměnlivá – v některých místech cca 50 mm, v jiných až 100 mm. Průměrná tloušťka byla stanovena na 80 mm.					
Vzhledem k tomu, že je nutné provést novou skladbu podlahy včetně zateplení, bylo nutné navýšit rozsah bouracích prací a s tím související přesuny a likvidace suti.					
Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění stavebních prací. Provedení výše uvedených prací je technicky neoddělitelné od původní veřejné zakázky a nezbytné pro její dokončení.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>



Oznámení vydává:

Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325
Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov
IČ: 601 53 237

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlas se změnami, bez připomínek.

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlas se změnami, bez připomínek.

Stanovisko energetického specialisty:

Netýká se, nemá vliv na energeticky úsporný projekt.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Položkový rozpočet „Změna 1 – bourání podlah“
- Příloha č. 2: Fotodokumentace změny



ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 1</i>
Zhotovitel:	BAK stavební společnost; a.s. IČ: 284 02 758	
Změnový list vystavil:	BAK stavební společnost; a.s. IČ: 284 02 758	
Datum:	29. 5. 2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>2. Bourání stávající betonové mazaniny – předpokládaná tl. 55 mm, skutečný stav 80 mm</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p><u>Ad 1) Bourání stávající betonové mazaniny – předpokládaná tl. 55 mm, skutečný stav 80 mm</u></p> <p>Po demontáži palubové podlahy a následném provádění bouracích prací pro odstranění betonové mazaniny bylo zjištěno, že tloušťka betonové mazaniny neodpovídá předpokladu projektové dokumentace. Skutečná tloušťka stávající betonové mazaniny je proměnlivá – v některých místech cca 50 mm, v jiných až 100 mm. Průměrná tloušťka byla stanovena na 80 mm.</p> <p>Vzhledem k tomu, že je nutné provést novou skladbu podlahy včetně zateplení, bylo nutné navýšit rozsah bouracích prací a s tím související přesuny a likvidace sutí.</p> <p>Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění stavebních prací. Provedení výše uvedených prací je technicky neoddelitelné od původní veřejné zakázky a nezbytné pro její dokončení.</p>		



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: + 109 660,60 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: + 109 660,60 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 14. 5. 2014	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1602/I_BAK

Stavba: Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov

JKSO: 802

Místo: Trutnov

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1

Datum: 8. 7. 2018

CZ-CPA: 41

Objednatel:

Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov

IČ: 60153237

DIČ:

Zhotovitel:

BAK stavební společnost, a.s.

IČ: 28402758

DIČ: CZ28402758

Projektant:

DABONA s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou

IČ: 64826996

DIČ: CZ64826996

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

109 660,60

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

109 660,60

DPH základní 21,00%

ze

109 660,60

23 028,73

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

132 689,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1602/I_BAK

Stavba:

**Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia
Trutnov**

Místo: Trutnov

Datum: 8. 7. 2018

Objednatel: Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov
Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s.

Projektant: DABONA s.r.o., Sokolovská 68
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		109 660,60	132 689,33
ZL1	Bourání podlah	109 660,60	132 689,33
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		109 660,60	132 689,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov

Objekt: ZL1 - Bourání podlah

JKSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 8. 7. 2018

Objednatel:

Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov

IČ: 60153237

DIČ:

Zhotovitel:

BAK stavební společnost, a.s.

IČ: 28402758

DIČ: CZ28402758

Projektant:

DABONA s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou

IČ: 64826996

DIČ: CZ64826996

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

109 660,60

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

109 660,60

DPH základní

21,00%

ze

109 660,60

23 028,73

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

132 689,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov

Objekt: ZL1 - Bourání podlah

Místo: Trutnov

Datum:

8. 7. 2018

Objednatel: Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Tru

Projektant: DABONA s.r.o., Sokolovská 682,

Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	109 660,60
HSV - Práce a dodávky HSV	109 660,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	60 114,87
997 - Přesun sutě	49 545,88
OST - Ostatní	-0,15
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	109 660,60

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov

Objekt: ZL1 - Bourání podlah

Místo: Trutnov

Datum:

8. 7. 2018

Objednatel: Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Tru

Projektant: DABONA s.r.o., Sokolovská 682,

Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s.


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							109 660,60
HSV - Práce a dodávky HSV							109 660,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							60 114,87
1	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 "vyšší tl. betonové mazaniny" (78,025/0,055)*0,08-78,025	m3	35,466	1 695,00	60 114,87
997 - Přesun sutě							49 545,88
2	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	78,025	274,50	21 417,86
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	78,025	157,50	12 288,94
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	780,250	6,80	5 305,70
					78,025*10 "Přepočtené koeficientem množství	780,250	
					Součet	780,250	
5	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	78,025	135,00	10 533,38
OST - Ostatní							-0,15
6	K	R001	Zaokrouhlení ZL1	kpl	1,000	-0,15	-0,15







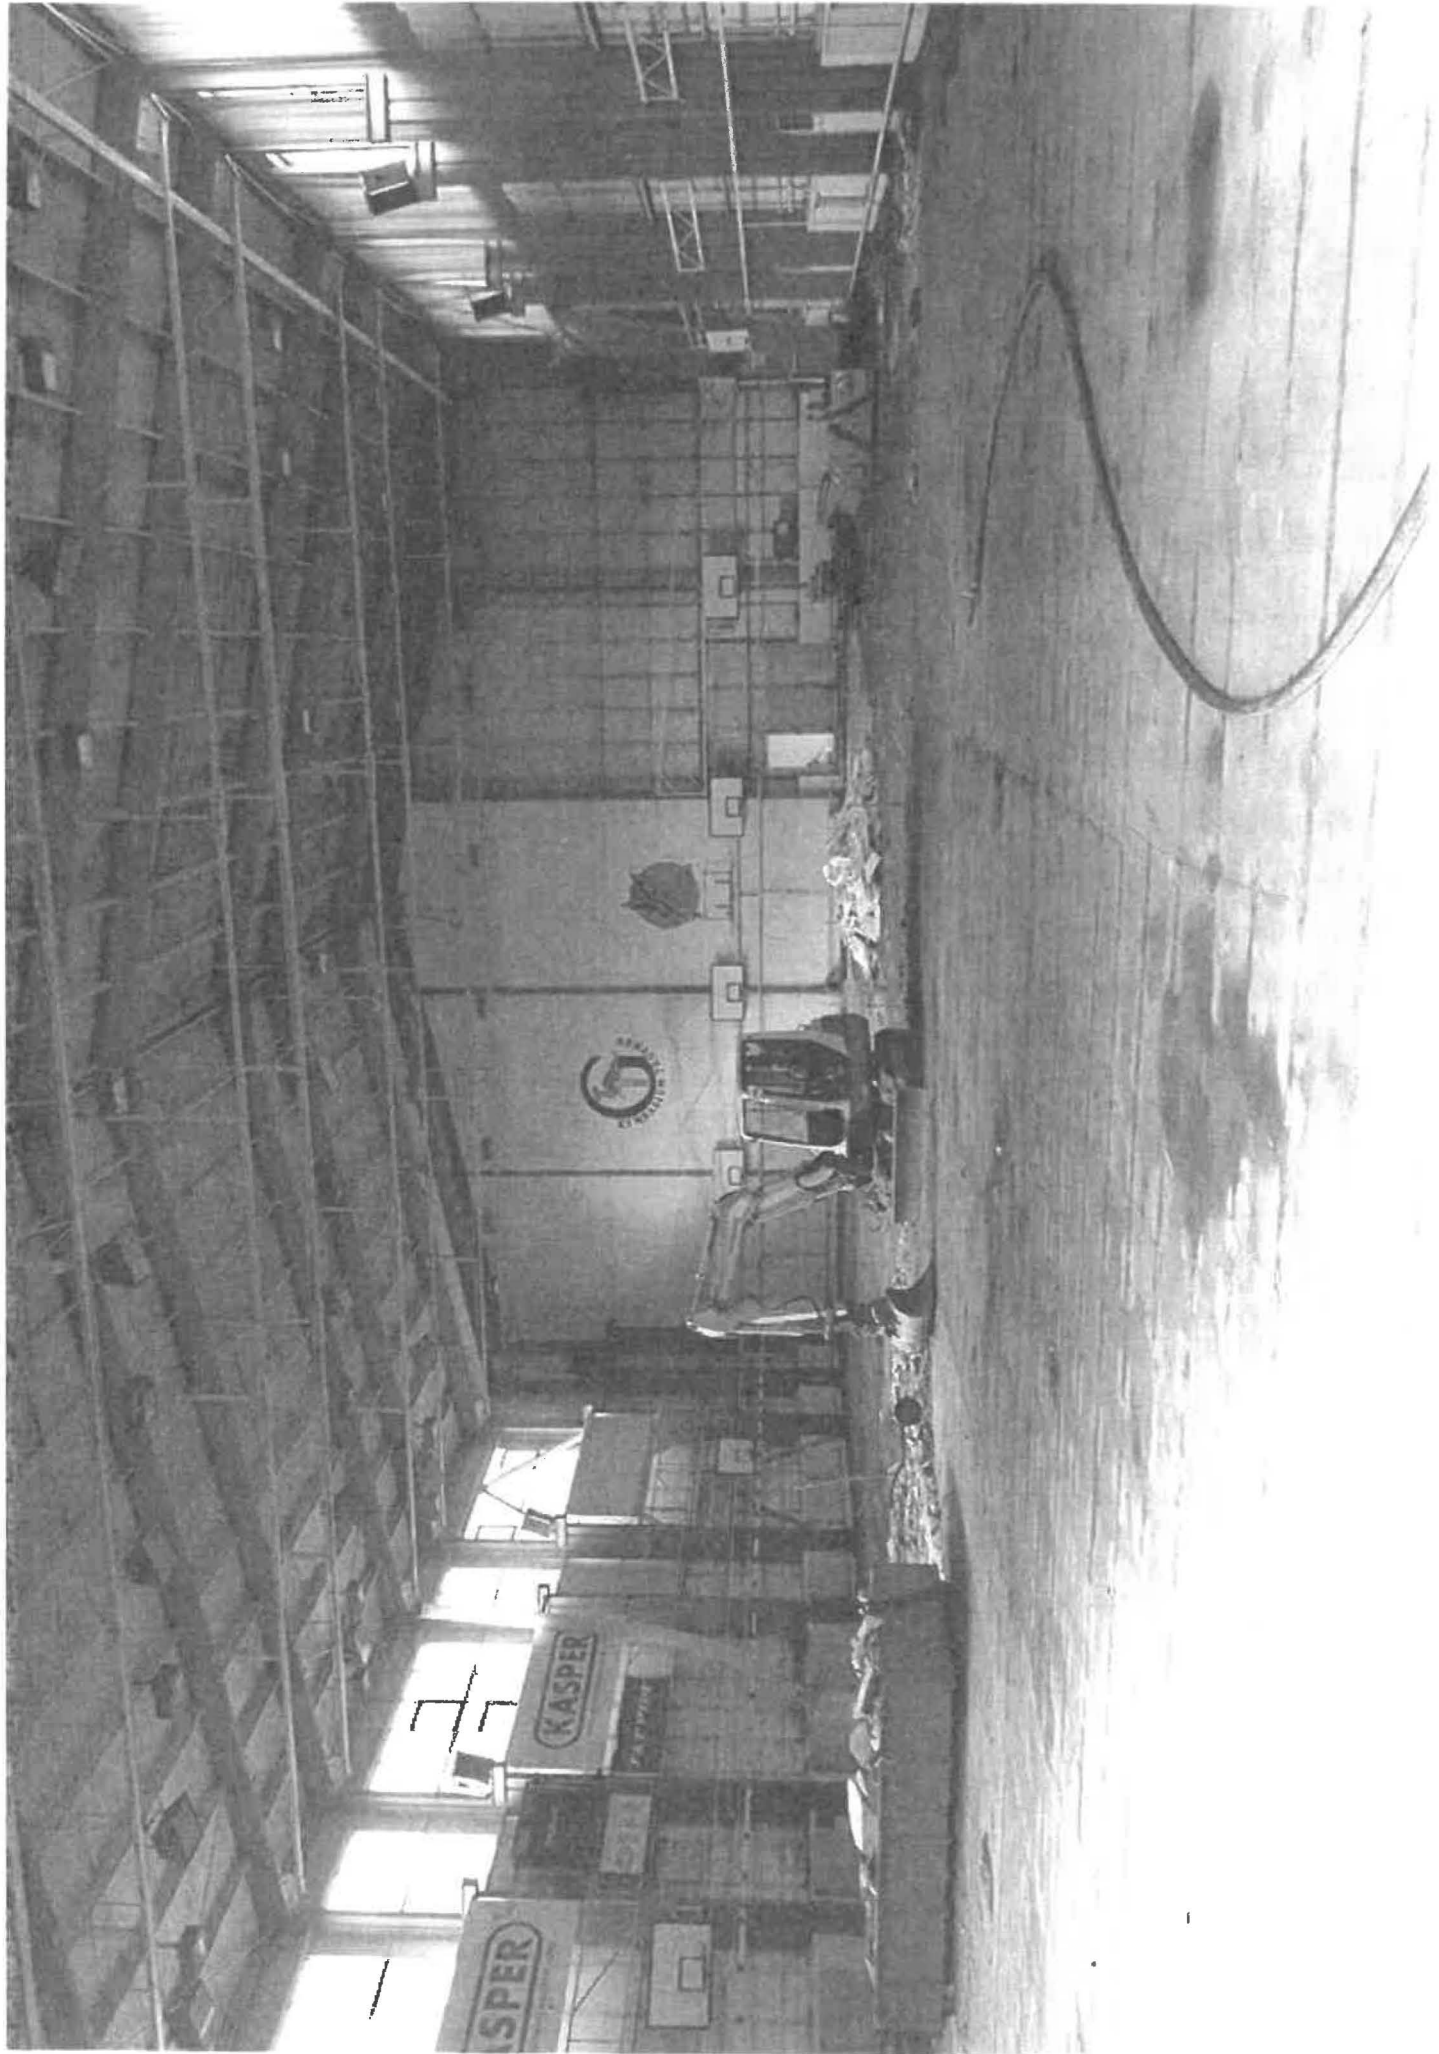



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2			
Zhotovitel:	BAK stavební společnost; a.s. IČ: 284 02 758				
Investor:	Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 IČ: 601 53237			Datum: 29. 5. 2018	
Název akce:	Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov – stavební práce II				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny:					
1. Doplnění požárního obkladu nosné ocelové konstrukce					
Popis a zdůvodnění změny:					
Ad 1) Doplnění požárního obkladu nosné ocelové konstrukce					
<p>Po demontáži opláštění haly byly odkryty nosné ocelové konstrukce a byl ověřen jejich stav z hlediska oprav stávajících nátěrů. Vzhledem k lokálnímu poškození intumescentních (zpeňujících) protipožárních nátěrů byl přizván odborník na tuto problematiku pro stanovení postupu oprav. Výsledkem šetření bylo konstatování, že stávající protipožární nátěry jsou již zastaralé a chemická reakce pro vytvoření izolační vrstvy protipožární pěny neprobíhá. Lokální opravy nátěrů tak nejsou možné.</p> <p>Vzhledem k tomu, že v souladu s platným požárně bezpečnostním řešením musí nosné ocelové konstrukce sportovní haly vykazovat dobu požární odolnosti minimálně 15 minut, není možné stávající stav považovat za vyhovující a je nezbytné provést nové ošetření ocelových konstrukcí.</p> <p>Na základě možností nabízených poddodavatelem (J Seidl a spol., s.r.o. IČ: 00484016) generálního zhotovitele bylo rozhodnuto o aplikaci požárních lepených obkladů ORDEXAL tl. 20 mm. Obklady budou aplikovány přímo na stávající ocelové konstrukce a nebude nutné odstranění stávajících nefunkčních protipožárních nátěrů.</p> <p>Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění stavebních prací. Provedení výše uvedených prací je technicky neoddělitelné od původní veřejné zakázky a nezbytné pro její dokončení.</p>					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>					



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Oznámení vydává:

Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325
Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov
IČ: 601 53 237

Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlas se změnami, bez připomínek.

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlas se změnami, bez připomínek.

.....

Stanovisko energetického specialisty:

Netýká se, nemá vliv na energeticky úsporný projekt.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Položkový rozpočet „Změna 2 – protipožární obklad“
- Příloha č. 2: Fotodokumentace změny



ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 2</i>
Zhotovitel:	BAK stavební společnost; a.s. IČ: 284 02 758	
Změnový list vystavil:	BAK stavební společnost; a.s. IČ: 284 02 758	
Datum:	29. 5. 2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1. Doplnění požárního obkladu nosné ocelové konstrukce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Ad 1) <u>Doplnění požárního obkladu nosné ocelové konstrukce</u></p> <p>Po demontáži opláštění haly byly odkryty nosné ocelové konstrukce a byl ověřen jejich stav z hlediska oprav stávajících nátěrů. Vzhledem k lokálnímu poškození intumescentních (zpěňujících) protipožárních nátěrů byl přizván odborník na tuto problematiku pro stanovení postupu oprav. Výsledkem šetření bylo konstatování, že stávající protipožární nátěry jsou již zastaralé a chemická reakce pro vytvoření izolační vrstvy protipožární pěny neprobíhá. Lokální opravy nátěrů tak nejsou možné.</p> <p>Vzhledem k tomu, že v souladu s platným požárně bezpečnostním řešením musí nosné ocelové konstrukce sportovní haly vykazovat dobu požární odolnosti minimálně 15 minut, není možné stávající stav považovat za vyhovující a je nezbytné provést nové ošetření ocelových konstrukcí.</p> <p>Na základě možností nabízených poddodavatelem (J Seidl a spol., s.r.o. IČ: 00484016) generálního zhotovitele bylo rozhodnuto o aplikaci požárních lepených obkladů ORDEXAL tl. 20 mm. Obklady budou aplikovány přímo na stávající ocelové konstrukce a nebude nutné odstranění stávajících nefunkčních protipožárních nátěrů.</p> <p>Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění stavebních prací. Provedení výše uvedených prací je technicky neoddělitelné od původní veřejné zakázky a nezbytné pro její dokončení.</p>		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1602/I_BAK

Stavba: Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov

JKSO: 802

Místo: Trutnov

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1

Datum: 8. 7. 2018

CZ-CPA: 41

Objednatel:

Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov

IČ: 60153237

DIČ:

Zhotovitel:

BAK stavební společnost, a.s.

IČ: 28402758

DIČ: CZ28402758

Projektant:

DABONA s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou

IČ: 64826996

DIČ: CZ64826996

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

1 895 181,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

1 895 181,00

DPH základní 21,00% ze 1 895 181,00

397 988,01

snížená 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 293 169,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1602/I_BAK
Stavba: Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov
Místo: Trutnov Datum: 8. 7. 2018
Objednatel: Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov Projektant: DABONA s.r.o., Sokolovská 68
Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 895 181,00	2 293 169,01
ZL2	Požární obklad	1 895 181,00	2 293 169,01
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 895 181,00	2 293 169,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov

Objekt: ZL2 - Požární obklad

JKSO:
Místo: Trutnov

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2018

Objednatel:
Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov

IČ: 60153237
DIČ:

Zhotovitel:
BAK stavební společnost, a.s.

IČ: 28402758
DIČ: CZ28402758

Projektant:
DABONA s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou

IČ: 64826996
DIČ: CZ64826996

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 895 181,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 895 181,00

DPH základní 21,00% ze 1 895 181,00 397 988,01
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 293 169,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov

Objekt: ZL2 - Požární obklad

Místo: Trutnov

Datum:

8. 7. 2018

Objednatel: Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Tru

Projektant: DABONA s.r.o., Sokolovská 682,

Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 895 181,00
ORDEXAL OK R 15 - R3 -	1 895 181,00
NOSNÍKY -	1 228 776,48
ŠTÍTOVÁ STĚNA 1 -	128 115,43
ŠTÍTOVÁ STĚNA 2 -	136 717,63
BOČNÍ STĚNY -	117 499,68
OSTATNÍ -	284 071,78
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 895 181,00

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov

Objekt: ZL2 - Požární obklad

Místo: Trutnov

Datum:

8. 7. 2018

Objednatel: Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Tru

Projektant: DABONA s.r.o., Sokolovská 682,

Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							1 895 181,00
ORDEXAL OK R 15 - R3 -							1 895 181,00
NOSNÍKY -							1 228 776,48
1	K	R001	střešní nosníky "profil 4 stranný, 550x160" 300*1,5 Součet	m2	450,000 450,000 450,000	1 062,00	477 900,00
2	K	R002	sloupy nad rozšířením "profil 3 stranný, 450x160" 73,92 Součet	m2	73,920 73,920 73,920	1 062,00	78 503,04
3	K	R003	široké sloupy "profil 3 stranný, 950x160" 294 Součet	m2	294,000 294,000 294,000	1 062,00	312 228,00
4	K	R004	ukončení širokých sloupů "profil 4 stranný, 300x200" 14*1,08 Součet	m2	15,120 15,120 15,120	1 062,00	16 057,44
5	K	R005	vazníky pod střešními nosníky - 100x200 "profil 4 stranný, 100x200" 354*0,68 Součet	m2	240,720 240,720 240,720	1 062,00	255 644,64
6	K	R006	vazníky pod střešními nosníky - 160x60 "profil 4 stranný, 160x60" 114*0,52 Součet	m2	59,280 59,280 59,280	1 062,00	62 955,36
7	K	R007	plechy 24 Součet	m2	24,000 24,000 24,000	1 062,00	25 488,00
ŠTÍTOVÁ STĚNA 1 -							128 115,43
8	K	R008	střešní nosníky "profil 4 stranný, 550x160" 30*1,5 Součet	m2	45,000 45,000 45,000	1 062,00	47 790,00
9	K	R009	sloupy ve štít. stěně	m2	44,616	1 062,00	47 382,19
10	K	R010	sloupy nad rozšířením	m2	7,920	1 062,00	8 411,04
11	K	R011	široké sloupy "profil 3 stranný, 950x160" 23,1 Součet	m2	23,100 23,100 23,100	1 062,00	24 532,20
ŠTÍTOVÁ STĚNA 2 -							136 717,63
12	K	R012	střešní nosníky "profil 3 stranný, 550x160" 39 Součet	m2	39,000 39,000 39,000	1 062,00	41 418,00
13	K	R013	sloupy ve štít. stěně	m2	52,416	1 062,00	55 665,79
14	K	R014	sloupy nad rozšířením	m2	7,920	1 062,00	8 411,04
15	K	R015	široké sloupy "profil 3 stranný, 950x160" 29,4 Součet	m2	29,400 29,400 29,400	1 062,00	31 222,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
BOČNÍ STĚNY -							117 499,68
16	K	R016	zavětrování sloupů "profil 4 stranný, 150x120" 172*0,62 Součet	m2	106,640 106,640 106,640	1 062,00	113 251,68
17	K	R017	plechy 4 Součet	m2	4,000 4,000 4,000	1 062,00	4 248,00
OSTATNÍ -							284 071,78
18	K	R018	Nátěr podobný RAL 7037	m2	1 377,472	130,00	179 071,36
19	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	40,541	2 590,00	105 001,19
20	K	R019	Zaokrouhlení ZL2	kpl	1,000	-0,77	-0,77









