


NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Rekonstrukce Oddělení nukleární medicíny – II. etapa, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce“		Číslo změny: 6
SoD: ze dne 09.01.2018		Datum: 29.03.2018
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:		
<u>Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce</u>		
příloha_č..2 SOD		
1) Mazanina z betonu C25/30 vč. úpravy povrchu		1 355,-Kč
2) Výztuž betonu		2 952,-Kč
3) Bourání betonu		894,-Kč
4) Odvoz a likvidace sutí		2 426,-Kč
<u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u>		<u>7 628,- Kč</u>
<u>Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce</u>		
Příloha č.2 SOD		
1) Žádné nejsou		
<u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u>		<u>-0,- Kč</u>
Rozdíl přípočtu víceprací a odpočtu méněprací		<u>7 628,- Kč</u>
Viz přílohy: nabídkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva		
<u>Původní cena díla</u>		
1. Cena díla bez DPH		5 445 296,- Kč
2. Cena díla vč. DPH		6 588 808,16Kč
<u>Návrh ceny díla včetně ZL č.6</u>		
1. Cena díla bez DPH		5 452 924,- Kč
2. Cena díla vč. DPH		6 598 038,04Kč
<u>Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:</u>		6 598 038,04 Kč
zvýšení ceny o	Základ:	7 628,- Kč
	DPH 21%:	1 601,88 Kč
	Cena včetně DPH:	9 229,88 Kč
snížení ceny o	Základ:	0,00 Kč
	DPH 21 %:	0,00 Kč
	Cena včetně DPH:	0,00 Kč
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		Datum dokončení: 06.05.2018
Prodloužení lhůty o		0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o		0 kalendářních dní
Za zhotovitele: Tomáš Roža		
Za objednatele: Jiří Šenkerík		

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky 2017 / 031	Zakázka Změna užívání a stavební úpravy ONM – 2.část - KZ a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.		
Komentář	ZL č. 6 - zesílení podlahy v m.č.116.2		
Popis verze			
Komentář verze			
Adresa	Datum zahájení		
Rok	Datum dokončení		
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_01	1NP		
SO_02	1PP		
SO_03	UT		
SO_04	VZT		
SO_05	elektroinstalace		
SO_06	ZTI		
VON	vedlejší a ostatní náklady		
		Celkem (bez DPH)	7 628
		DPH	1 602
		Celkem (včetně DPH)	9 230



--	--

Zakázka:

Změna užívání a stavební úpravy ONM – 2.část - KZ a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
S: Změna užívání a stavební úpravy ONM – 2.část - KZ a.s. - Nemocnice Chorr	7 628	1 602	9 230
SO_01: 1NP	7 628	1 602	9 230
006: Úpravy povrchu	4 308	905	5 212
009: Ostatní konstrukce a práce	3 320	697	4 017
Celkem (bez DPH)	7 628		
DPH		1 602	
Celkem (včetně DPH)			9 230

Zakázka:

Změna užívání a stavební úpravy ONM – 2.část - KZ a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena		
S: Změna užívání a stavební úpravy ONM – 2.část - KZ a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.							7 628		
SO_01: 1NP							7 628		
006: Úpravy povrchu							4 308		
1.	SP	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,432	–	0,432	2 920,00	1 261
Plný popis: Mazanina z betonu									
2.	SP	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	0,432	–	0,432	167,00	72
Plný popis: Příplatek k cenám mazanin									
3.	SP	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,432	–	0,432	50,80	22
Plný popis: Příplatek k cenám mazanin									
4.	SP	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 *	t	0,08	–	0,08	36 900,00	2 952
Plný popis: Výztuž mazanin									
Výkaz výměr: R12 dl. 3800 - 8ks							0,03		
R8 dl. 1150 - 12ks							0,05		
009: Ostatní konstrukce a práce							3 320		
43.	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,432	–	0,432	2 070,00	894
Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin									
47.	SP	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,95	–	0,95	1 020,00	969
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot									
48.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,9	–	1,9	48,60	92
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot									
Výkaz výměr: 0,95*2							1,9		
49.	SP	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,95	–	0,95	294,00	279
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku									
50.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,55	–	8,55	9,16	78
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku									
Výkaz výměr: odvoz 10 km							–		
0,95*9							8,55		
51.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,95	–	0,95	1 060,00	1 007
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)									

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.6 K PŘÍLOZE Č. 2 K SOD

PROJEKT:

„Rekonstrukce Oddělení nukleární medicíny – II.etapa, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce “

SoD ze dne 09.01.2018

Podrobný popis změn :

Nárůst ceny díla:

- 1) Mazanina z betonu C25/30 vč. úpravy povrchu – zbětná betonáž vyztužené podlahy
- 2) Výztuž betonu – vyztužení betonu pod přístrojem
- 3) Bourání betonu – vybourání části betonové podlahy pro zesílení
- 4) Odvoz a likvidace sutí – odvoz a likvidace vybourané betonové podlahy

Snížení ceny díla:
není

Nezbytnost vyvolaných změn :

Výše uvedené změny oproti projektu byl vyvolány:
- požadavek budoucího uživatele

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Jiří Šenke

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko: Ing.Karel Šafařík

Podpis zhotovitele, datum, razítko: Tomáš Roža



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Rekonstrukce Oddělení nukleární medicíny – II.etapa, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce“			Číslo změny: 7	
SoD: ze dne 09.01.2018			Datum: 29.03.2018	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	Objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:				
<u>Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce</u> příloha_č..2 SOD				
1) Podlahový kanálek 150x70mm				22 500,-Kč
2) Podlahový kanálek 100x70mm				1 940,-Kč
3) Montáž podlahových kanálků				10 880,-Kč
Přípočtové položky celkem – vícepráce				35 320,- Kč
<u>Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce</u> Příloha č.2 SOD				
1) Žádné nejsou				
Odpočtové položky celkem – méněpráce				-0,- Kč
Rozdíl přípočtu víceprací a odpočtu méněprací			35 320,- Kč	
Viz přílohy: nabídkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva				
Původní cena díla				
1. Cena díla bez DPH				5 452 924,- Kč
2. Cena díla vč. DPH				6 598 038,04Kč
Návrh ceny díla včetně ZL č.7				
1. Cena díla bez DPH				5 488 244,- Kč
2. Cena díla vč. DPH				6 640 775,24Kč
Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:			6 640 775,24 Kč	
zvýšení ceny o	Základ:			35 320,- Kč
	DPH 21%:			7 417,20 Kč
	Cena včetně DPH:			39 737,20 Kč
snížení ceny o	Základ:			0,00 Kč
	DPH 21 %:			0,00 Kč
	Cena včetně DPH:			0,00 Kč
Celková cena po změně				
Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ			5 488 244,- Kč
	DPH 21%:			1 152 531,24 Kč
	Cena včetně DPH:			6 640 775,24 Kč
Prodloužení lhůty:				8 kalendářních dnů
Zkrácení lhůty:				0 kalendářních dnů
Celková lhůta po změně				Datum dokončení: 14.05.2018
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky		<input type="checkbox"/>	
	rozdílem mezi PD a skutečností		<input type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby:
„Rekonstrukce Oddělení nukleární medicíny – II. etapa, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce“

Číslo změny: **7**

SoD: ze dne 09.01.2018

Datum: **29.03.2018**

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny

dohodnuté lhůty ukončení díla

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

příloha_č..2 SOD

1) Podlahový kanálek 150x70mm

22 500,-Kč

2) Podlahový kanálek 100x70mm

1 940,-Kč

3) Montáž podlahových kanálků

10 880,-Kč

Přípočtové položky celkem – vícepráce

35 320,- Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

Příloha č.2 SOD

1) Žádné nejsou

Odpočtové položky celkem – méněpráce

-0,- Kč

Rozdíl přípočtu víceprací a odpočtu méněprací

Viz přílohy: nabídkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

35 320,- Kč

Původní cena díla

1. Cena díla bez DPH

5 452 924,- Kč

2. Cena díla vč. DPH

6 598 038,04Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.7

1. Cena díla bez DPH

5 488 244,- Kč

2. Cena díla vč. DPH

6 640 775,24Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

6 640 775,24 Kč

zvýšení ceny o

Základ:

35 320,- Kč

DPH 21%:

7 417,20 Kč

Cena včetně DPH:

39 737,20 Kč

snížení ceny o

Základ:

0,00 Kč

DPH 21 %:

0,00 Kč

Cena včetně DPH:

0,00 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Datum dokončení: 14.05.2018

Prodloužení lhůty o

8 kalendářních dní

Zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky

2017 / 031

Zakázka

Změna užívání a stavební úpravy ONM – 2.část - KZ a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.

Komentář

ZL č. 7 - kabelové kanály

Popis verze

Komentář verze

Adresa

Rok

Datum zahájení

Datum dokončení

Typ Firmy

Název

Kontaktní osoba

Telefon

Význam (funkce)

Jméno

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_01	1NP		
		Celkem (bez DPH)	35 320
		DPH	7 417
		Celkem (včetně DPH)	42 737

Za zhotovitele

PPR

Zakázka:

Změna užívání a stavební úpravy ONM – 2.část - KZ a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
S: Změna užívání a stavební úpravy ONM – 2.část - KZ a.s. - Nemocnice Chorr	35 320	7 417	42 737
SO_01: 1NP	35 320	7 417	42 737
767: Konstrukce zámečnické	35 320	7 417	42 737
Celkem (bez DPH)	35 320		
DPH		7 417	
Celkem (včetně DPH)			42 737

Zakázka:

Změna užívání a stavební úpravy ONM – 2.část - KZ a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: Změna užívání a stavební úpravy ONM – 2.část - KZ a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.									35 320
SO_01: 1NP									35 320
767: Konstrukce zámečnické									35 320
1.	M	XK1	Kovový podlahový kanálek 150 x 70mm	m	18,0	-	18,0	1 250,00	22 500
<i>Plný popis:</i>									
2.	M	XK2	Kovový podlahový kanálek 100 x 70mm	m	2,0	-	2,0	970,00	1 940
<i>Plný popis:</i>									
3.	SP	XK3	Montáž podlahových kanálků	m	16,0	-	16,0	680,00	10 880
<i>Plný popis:</i>									

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.7 K PŘÍLOZE Č. 2 K SOD

PROJEKT:

„Rekonstrukce Oddělení nukleární medicíny – II.etapa, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce“

SoD ze dne 09.01.2018

Podrobný popis změn :

Nárůst ceny díla:

- 1) Podlahový kanálek 150x70mm – požadavek na vedení ovládacích a silových kabelů od dodavatele přístroje
- 2) Podlahový kanálek 100x70mm – požadavek na vedení ovládacích a silových kabelů od dodavatele přístroje
- 3) Montáž podlahových kanálků – požadavek na vedení ovládacích a silových kabelů od dodavatele přístroje

Snížení ceny díla:

není

Prodloužení lhůty provedení díla:

- 1) Z důvodu termínu pro výrobu a dodání kabelových kanálů a následné návaznosti na technologické procesy provedení podlah

Nezbytnost vyvolaných změn :


Výše uvedené změny oproti projektu byl vyvolány:

- požadavky dodavatele přístroje na přípravu kabelových tras

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Jiří Šenkeřík

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko: Ing.Karel Šafařík

Podpis zhotovitele, datum, razítko: Tomáš Roža

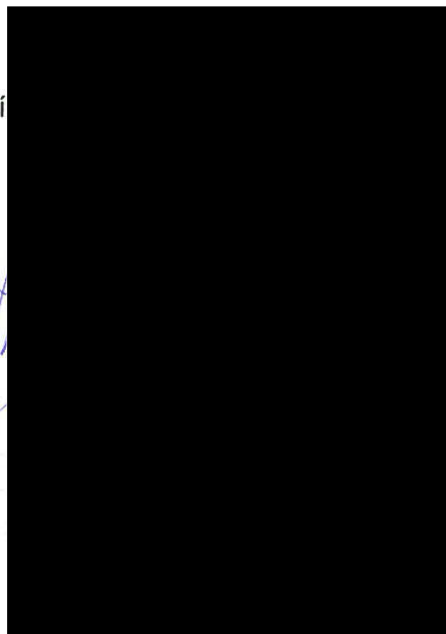

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby:
 „Rekonstrukce Oddělení nukleární medicíny – II. etapa, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce“

Číslo změny: **8**

SoD: ze dne 09.01.2018

Datum: 29.03.2018

Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	Objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

příloha_č..2 SOD

1) D+M vodiče s Cu jádrem H07V-R 6 mm ²	2 728,-Kč
2) D+M silového kabelu CYKY 5x6 mm	5 645,-Kč
3) D+M Kabelu KK 110-70 koax.	2 235,-Kč
4) D+M datové skříně RACK vč. vybavení	23 540,-Kč
Přípočtové položky celkem – vícepráce	34 148,- Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

Příloha č.2 SOD

1) D+M kabelu UTP 4x2x0,5 cat.6	- 63 840,- Kč
2) D+M šňůry s Cu jádrem stíněná CMFM 2x0,50 mm ²	- 6 350,- Kč
3) D+M čtečky magnetických karet	- 7 577,40Kč
4) D+M interkomu vč. konzoly pro reproduktor	- 12 387,82Kč
5) D+M kamery – 3ks	- 37 767,30Kč
Odpočtové položky celkem – méněpráce	- 127 922,52,- Kč

Rozdíl přípočtu víceprací a odpočtu méněprací (zaokrouhleno)

- 93 775,- Kč

Viz přílohy: nabídkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla

1. Cena díla bez DPH	5 488 244,- Kč
2. Cena díla vč. DPH	6 640 775,24Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.9

1. Cena díla bez DPH	5 394 469,- Kč
2. Cena díla vč. DPH	6 527 307,49Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

6 527 307,49Kč

zvýšení ceny o	Základ: 0,00 Kč
	DPH 21 %: 0,00 Kč
	Cena včetně DPH: 0,00 Kč
snížení ceny o	Základ: 93 775,- Kč
	DPH 21 %: 19 692,75 Kč
	Cena včetně DPH: 113 467,75 Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ: 5 394 469,- Kč
	DPH 21%: 1 132 838,49 Kč
	Cena včetně DPH: 6 527 307,49 Kč

Prodloužení lhůty:	0 kalendářních dnů
Zkrácení lhůty:	0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně Datum dokončení: **14.05.2018**

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: _____ Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: _____

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby:
„Rekonstrukce Oddělení nukleární medicíny – II. etapa, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce“

Číslo změny: 8

SoD: ze dne 09.01.2018

Datum: 29.03.2018

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny

dohodnuté lhůty ukončení díla

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

příloha_č..2 SOD

- | | |
|--|------------|
| 1) D+M vodiče s Cu jádrem H07V-R 6 mm ² | 2 728,-Kč |
| 2) D+M silového kabelu CYKY 5x6 mm | 5 645,-Kč |
| 3) D+M Kabelu KK 110-70 coax. | 2 235,-Kč |
| 4) D+M datové skříně RACK vč. vybavení | 23 540,-Kč |

Přípočtové položky celkem – vícepráce

34 148,- Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

Příloha č.2 SOD

- | | |
|--|---------------|
| 1) D+M kabelu UTP 4x2x0,5 cat.6 | - 63 840,- Kč |
| 2) D+M šňůry s Cu jádrem stíněná CMFM 2x0,50 mm ² | - 6 350,- Kč |
| 3) D+M čtečky magnetických karet | - 7 577,40Kč |
| 4) D+M interkomu vč. konzoly pro reproduktor | - 12 387,82Kč |
| 5) D+M kamery – 3ks | - 37 767,30Kč |

Odpočtové položky celkem – méněpráce

- 127 922,52,- Kč

Rozdíl přípočtu víceprací a odpočtu méněprací (zaokrouhleno)

Viz přílohy: nabídkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

- 93 775,- Kč

Původní cena díla

1. Cena díla bez DPH
2. Cena díla vč. DPH

5 488 244,- Kč
6 640 775,24Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.9

1. Cena díla bez DPH
2. Cena díla vč. DPH

5 394 469,- Kč
6 527 307,49Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

6 527 307,49Kč

zvýšení ceny o

Základ:	0,00 Kč
DPH 21 %:	0,00 Kč
Cena včetně DPH:	0,00 Kč

snížení ceny o

Základ:	93 775,- Kč
DPH 21 %:	19 692,75 Kč
Cena včetně DPH:	113 467,75 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Datum dokončení: 14.05.2018

Prodloužení lhůty o


0 kalendářních dní

Zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za zhotovitele: Tomáš Roža

Za objednatele: Jiří Šenkeřík



Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky

2017 / 031

Zakázka

Změna užívání a stavební úpravy ONM – 2.část - KZ a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.

Komentář

ZL č. 8 - elektro

Popis verze

Komentář verze

Adresa

Rok

Datum zahájení

Typ Firmy

Název

Datum dokončení

Význam (funkce)

Jméno

Kontaktní osoba

Telefon

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_05	Elektroinstalace		
		Celkem (bez DPH)	- 93 775
		DPH	- 19 693
		Celkem (včetně DPH)	- 113 467
Za zhotovitele	RRR spol. s r.o.	Za objednatele	

Zakázka:

Změna užívání a stavební úpravy ONM – 2.část - KZ a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
S: Změna užívání a stavební úpravy ONM – 2.část - KZ a.s. - Nemocnice Chorr	- 93 775	- 19 693	- 113 467
SO_05 Elektroinstalace	- 93 775	- 19 693	- 113 467
021: Silnoproud	- 93 775	- 19 693	- 113 467
Celkem (bez DPH)	- 93 775		
DPH		- 19 693	
Celkem (včetně DPH)			- 113 467

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Chomutov, SÚ 1.NP pavilon L, nukleární medicína

Objekt:

16140 - Nemocnice Chomutov, 1.NP pavilon L, nukleární medicína, Elektroinstalace

Místo:

Chomutov

Datum:

28.03.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

RRR spol. s r.o., 17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov

Projektant:

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-93 774,52	
D	PSV		Práce a dodávky PSV						
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž					8 373,00	
1	K	743619241	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omtku	m	80,000	0,00	14,10	2 728,00	
			FF: Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek dopříkú ochranného pospojování ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omtku					1 128,00	CS ÚRS 2016 02
2	M	341408440	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm2	m	80,000	20,00	0	1 600,00	CS ÚRS 2016 02
			FF: vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm2						
			F: Poznámka k položce: oběh kovu [kg/m]: Cu -0,059; Al -0						
D	744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných						
3	K	744431200	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený volně	m	50,000	0,00	17,60	5 645,00	
			FF: Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených volně sk. 1 - CYKY, NYM, NYL, YSLY, počtu a průřezu žil 3x10 mm2, 4x6 mm2, 5x4 až 6 mm2, 7x4 mm2, 12x1,5 mm2					880,00	CS ÚRS 2016 02
4	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	50,000	95,30	0	4 765,00	CS ÚRS 2016 02
			FF: kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2						
			F: Poznámka k položce: oběh kovu [kg/m]: Cu -0,294; Al -0						
D	M		Práce a dodávky M						
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					-102 147,52	
5	K	220061532	Montáž kabel návěstní volně uložený s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 4 P	m	-1 600,000	0,00	23,50	-37 600,00	CS ÚRS 2016 02
			FF: Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně přípravy kabelového bubnu a přistávení na místo tažení, rozvinutí, vytážení, odřezání, uložení kabelu do kabelového lože nebo šlaku, protažení překážkami, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKPF, TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 1,00 mm Cu 4 P						
6	M	10.918.538	UTP 4x2x0,5 cat.6 bal.500m	M	-1 600,000	16,40	0	-26 240,00	
			FF: Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Datové kabely UTP 4x2x0,5 cat.6 bal.500m						
			F: Poznámka k položce: Připojení datových zásovek, čteček přístupového systému, kamery do datového rozvaděče RD3.2						
7	K	220280851	Montáž kabelu na lávku do 0,5 kg/m	m	-50,000	0,00	29,40	-1 470,00	CS ÚRS 2016 02
			FF: Montáž kabelu volně uloženého na kabelovou lávku při zatažení do objektu včetně uložení a uchycení kabelu o váze do 0,5 kg/m						
			PSC: Poznámka k součinné ceně: 1. V cenách 220280851 až -0659 není započten materiál na výrobu kabelu.						
8	M	10.862.927	Kabel KK 110-70 koax.	M	50,000	15,30	0	765,00	
			FF: Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Koaxiální kabely Kabel KK 110-70 koax.						
			F: Poznámka k položce: Při připojení k telefonní soustavě v objektech						
9	M	341431500	šňůra s Cu jádrem stíněná CMFM 2x0,50 mm2	m	-100,000	34,10	0	-3 410,00	CS ÚRS 2016 02
			FF: šňůra s Cu jádrem stíněná CMFM 2x0,50 mm2						
			F: Poznámka k položce: šňůra pro napojení mikrofonu a reproduktoru přepřizávkového interkomu soustavy se zesilovačem v objektu						
10	K	220310001	Montáž zařízení pro magnetické karty - snímače magnetické karty na stěnu	kus	-1,000	0,00	529,60	-529,60	CS ÚRS 2016 02
			FF: Montáž zařízení pro magnetické karty snímače magnetické karty na stěnu						
11	M	vstup1	čtečka magnetických karet	ks	-1,000	7 047,80	0	-7 047,80	
			FF: Typ zařízení musí být kompatibilní s ostatními systémy v objektu a musí být schválen investorem. Připojení přes LAN do datového rozvaděče RD3.2.						
12	K	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku	kus	-2,000	0,00	411,90	-823,80	CS ÚRS 2016 02
			FF: Montáž elektronicky ovládaného zámku do připraveného otvoru dveří, včetně zapojení přívodu a přezkoušení						
13	K	220370546	Montáž konzoly pro reproduktor do stěny - montáž interkomu	kus	-10,000	0,00	353,10	-3 531,00	CS ÚRS 2016 02
			FF: Montáž konzoly pro reproduktor včetně zhotovení konzoly s vyvrátáním otvorů, nátěru a upevnění do stěny. Montáž zařízení interkomu						
			F: Poznámka k položce: Zařízení kompatibilní se stávajícími systémy v objektu.						
14	M	ikom1	interkom - domací telefon od vstupu	kpl	-1,000	8 033,02	0	-8 033,02	

		zařízení domácího video telefonu 1 vstup 2 účastníci							
		Poznámka k položce: domácí hlasový telefon, místní ústředna bez vazby do centrálních systémů nemocnice							
15	K	220731022	Montáž kamery v krytu	kus	-3,000	0,00	588,50	-1 765,50	CS ÚRS 2016 02
			Montáž kamery v krytu včetně posazení na konzoli, přišroubování, připojení sítě 220 V, zapojení ovládacího konektoru, mechanického nastavení, utěsnění šroubů, přívodů, úpravy a zaizolování na konzoli nebo stativ						
16	M	10.500.483	BTL CCTV BAR. KAM-MIC	KS	-3,000	11 412,10	0	-34 236,30	
			Komunikační zařízení, alarmy a výstražné systémy Komunikační technologie / systémy a komponenty Kamery pro dveře / video systém Intercom BTL CCTV BAR. KAM-MIC IP kamera napájená z PoE sítě.						
			Poznámka k položce: Typ a parametry kamery je nutné odsouhlasit provozovatelem dle stavu sítě.						
17	K	220731042	Nastavení kamery otočné a pevné v krytu	kus	-3,000	0,00	588,50	-1 765,50	CS ÚRS 2016 02
			Nastavení kamery včetně odkrytování a vysunutí z krytu, připojení do sítě a připojení koaxiálního kabelu, připojení zkušebního monitoru, rozmontování kamery, připevnění objektivu, mechanického nastavení, elektrického nastavení dílů, proudu geomet., odpojení zkušebního monitoru a zapojení kamery otočné a pevné v krytu						
18	K	220450007	Montáž datové skříně rack	kus	1,000	0,00	1 630,00	1 630,00	CS ÚRS 2016 02
			Skřín RACK 19" 42U/600x800mm (glass door) 19" Patch panel SIEMON 24 port, Cat. 5e, nestíněný, 1U, plně osazený - černý Solarix DIN lišta s držákem do 19" rozvaděče, 1U černá RAL 9005 Equip 19" vyřazovací panel s 5 úchyty 1U černý Zásuvková lišta Digitus 19", 1U, 7 zásuvek, 16A/250V/4000W Optická vana - příslušenství Patch kabely - příslušenství						
19	M	220450007X		KS	1,000	12 550,00	0	12 550,00	
20	M	220450007X	UPS APC Smart-UPS SC 450VA 1U Rackmount / Tower	KS	1,000	9 360,00	0	9 360,00	

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.8 K PŘÍLOZE Č. 2 K SOD

PROJEKT:

„Rekonstrukce Oddělení nukleární medicíny – II. etapa, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce“

SoD ze dne 09.01.2018

Podrobný popis změn :

Nárůst ceny díla:

- 1) D+M vodiče s Cu jádrem H07V-R 6 mm² 80m – rozdíl mezi PD a skutečností
- 2) D+M silového kabelu CYKY 5x6 mm 50m – přívod pro kompresory na chlazení krve
- 3) D+M Kabelu KK 110-70 koax. 50m – propojení mezi datovými skříněmi
- 4) D+M datové skříně RACK vč. vybavení – nová datová skříň na patře

Snížení ceny díla:

- 1) D+M kabelu UTP 4x2x0,5 cat.6 1600m – úspora kabelů přesunutím doplněním datové skříně na patro a po odečtení 3 kamer
- 2) D+M šňůry s Cu jádrem stíněná CMFM 2x0,50 mm 100m – přívodní kabel pro čtečky karet a interkom
- 3) D+M čtečky magnetických karet – uživatel nepožaduje její dodání
- 4) D+M interkomu vč. konzoly pro reproduktor – uživatel nepožaduje jeho dodání
- 5) D+M kamery – 3ks – uživatel nepožaduje kamery na chodbě


Nezbytnost vyvolaných změn :

- Výše uvedené změny oproti projektu byl vyvolány:
- požadavky budoucích uživatelů
 - zjištění skutečného stavu v průběhu provádění prací

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Jiří Šenke

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko: Ing.Karel Šafařík

Podpis zhotovitele, datum, razítko: Tomáš Roža

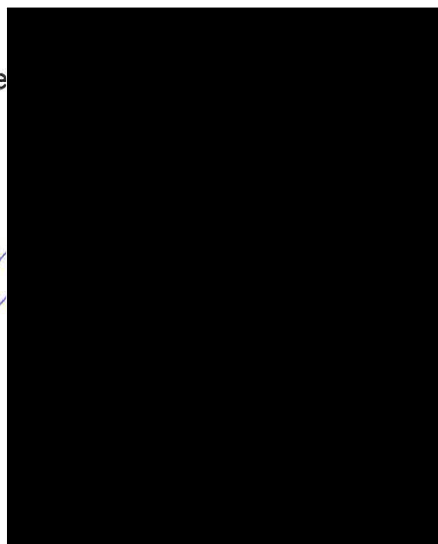

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Rekonstrukce Oddělení nukleární medicíny – II.etapa, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce“		Číslo změny: 9
SoD: ze dne 09.01.2018		Datum: 29.03.2018
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:		
<u>Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce</u>		
příloha_č..2 SOD		
žádné nejsou		
Přípočtové položky celkem – vícepráce		0,- Kč
<u>Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce</u>		
Příloha č.2 SOD		
1) Příčky tl 150 mm z pórobetonových příčekovek		- 6 909,- Kč
2) Úpravy povrchu stěn		- 4 068,-Kč
3) Demontáž a zpětná montáž okna		- 1 126,-Kč
4) Bourání příček		- 829,-Kč
5) Podchycení stropů		- 9 520,-Kč
Odpočtové položky celkem – méněpráce		- 22 452,- Kč
Rozdíl přípočtu víceprací a odpočtu méněprací (zaokrouhleno)		- 22 452,- Kč
Viz přílohy: nabídkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva		
<u>Původní cena díla</u>		
1. Cena díla bez DPH		5 394 469,- Kč
2. Cena díla vč. DPH		6 527 307,49Kč
<u>Návrh ceny díla včetně ZL č.9</u>		
1. Cena díla bez DPH		5 372 017,- Kč
2. Cena díla vč. DPH		6 500 140,57Kč
Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:		6 500 140,57Kč
zvýšení ceny o		
	Základ:	0,00 Kč
	DPH 21 %:	0,00 Kč
	Cena včetně DPH:	0,00 Kč
snížení ceny o		
	Základ:	22 452,- Kč
	DPH 21 %:	4 714,92 Kč
	Cena včetně DPH:	27 166,92 Kč
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		Datum dokončení: 14.05.2018
Prodloužení lhůty o		0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o		0 kalendářních dní
Za zhotovitele: Tomáš Roža		
Za objednatele: Jiří Šenkeřík		

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby:
 „Rekonstrukce Oddělení nukleární medicíny – II. etapa, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce“

Číslo změny: 9

SoD: ze dne 09.01.2018

Datum: 29.03.2018

Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	Objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

příloha_č..2 SOD

žádné nejsou

Přípočtové položky celkem – vícepráce

0,- Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

Příloha č.2 SOD

- | | |
|---|--------------|
| 1) Příčky tl 150 mm z pórobetonových příčekovek | - 6 909,- Kč |
| 2) Úpravy povrchu stěn | - 4 068,-Kč |
| 3) Demontáž a zpětná montáž okna | - 1 126,-Kč |
| 4) Bourání příček | - 829,-Kč |
| 5) Podchycení stropů | - 9 520,-Kč |

Odpočtové položky celkem – méněpráce

- 22 452,- Kč

Rozdíl přípočtu víceprací a odpočtu méněprací (zaokrouhleno)

- 22 452,- Kč

Viz přílohy: nabídkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Cena díla bez DPH | |
| 2. Cena díla vč. DPH | 5 394 469,- Kč |
| | 6 527 307,49Kč |

Návrh ceny díla včetně ZL č.9

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Cena díla bez DPH | |
| 2. Cena díla vč. DPH | 5 372 017,- Kč |
| | 6 500 140,57Kč |

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

6 500 140,57Kč

zvýšení ceny o	Základ:	0,00 Kč
	DPH 21 %:	0,00 Kč
	Cena včetně DPH:	0,00 Kč
snížení ceny o	Základ:	22 452,- Kč
	DPH 21 %:	4 714,92 Kč
	Cena včetně DPH:	27 166,92 Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ	5 372 017,- Kč
	DPH 21%:	1 128 123,57 Kč
	Cena včetně DPH:	6 500 140,57 Kč

Prodloužení lhůty:	0 kalendářních dnů
Zkrácení lhůty:	0 kalendářních dnů
Celková lhůta po změně	Datum dokončení: 14.05.2018
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky <input type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností <input checked="" type="checkbox"/>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky

2017 / 031

Zakázka

Změna užívání a stavební úpravy ONM – 2.část - KZ a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.

Komentář

ZL č. 9 - otvor pro přepravu OK

Popis verze

Komentář verze

Adresa

Rok

Datum zahájení

Datum dokončení

Typ Firmy

Název

Kontaktní osoba

Telefon

Význam (funkce)

Jméno

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_01	1NP		
SO_02	1PP		
SO_03	UT		
SO_04	VZT		
SO_05	elektroinstalace		
SO_06	ZTI		
VON	vedlejší a ostatní náklady		
Celkem (bez DPH)			- 22 452
DPH			- 4 715
Celkem (s DPH)			- 27 167

Za zhotovitele

Jméno :

Datum :

Podpis:

Poznámka :

- Zakázka:

Změna užívání a stavební úpravy ONM – 2.část - KZ a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
S: Změna užívání a stavební úpravy ONM – 2.část - KZ a.s. - Nemocnice Chom	- 22 452	- 4 715	- 27 167
SO_02: 1PP	- 22 452	- 4 715	- 27 167
003: Svislé konstrukce	- 6 909	- 1 451	- 8 360
006: Úpravy povrchu	- 4 068	- 854	- 4 922
009: Ostatní konstrukce a práce	- 10 494	- 2 204	- 12 698
766: Konstrukce truhlářské	- 981	- 206	- 1 187
Celkem (bez DPH)	- 22 452		
DPH		- 4 715	
Celkem (včetně DPH)			- 27 167

Zakázka:

Změna užívání a stavební úpravy ONM – 2.část - KZ a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: Změna užívání a stavební úpravy ONM – 2.část - KZ a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.							- 22 452
SO_02: 1PP							- 22 452
003: Svislé konstrukce							- 6 909
188.	SP	342272523	Příčky tl 150 mm z párobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	- 9,718	-	- 9,718 711,00 - 6 909
Plný popis: Příčky z párobetonových přesných příčkovek (YTONG)							
Výkaz výměr: zpětná zazdívkva otvoru po montáži nosníků 2,99*3,25							- 9,718
006: Úpravy povrchu							- 4 068
195.	SP	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	- 19,436	-	- 19,436 118,00 - 2 293
Plný popis: Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch							
Výkaz výměr: omítky na dozdiváném otvoru 9,718*2							- 19,436
196.	SP	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	- 19,436	-	- 19,436 91,30 - 1 775
Plný popis: Potažení vnitřních ploch štukem							
Výkaz výměr: omítky na dozdiváném otvoru 9,718*2							- 19,436
009: Ostatní konstrukce a práce							- 10 494
199.	SP	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	- 1,08	-	- 1,08 134,00 - 145
Plný popis: Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů							
Výkaz výměr: demontáž okna pro dopravu ocelových nosníků, bude zpětně osazeno 1,8*0,6							- 1,08
200.	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	- 9,718	-	- 9,718 85,30 - 829
Plný popis: Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkovek							
#REF! vybourání otvoru v příčce - pro přesuny nosníků #REF! 2,99*3,25							- 9,718
208.	SP	975053151	Víceřadové podchytní stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 1500 kg/m2	m	- 25,8	-	- 25,8 369,00 - 9 520
Plný popis: Víceřadové podchytní stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou							
Výkaz výměr: podepření stropů pro dopravu a montáž stroje - servisní chodba 4,3*6							- 25,8
766: Konstrukce truhlářské							- 981
220.	SP	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	- 1,0	-	- 1,0 46,60 - 47
Plný popis: Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových							
Výkaz výměr: demontáž pro montáž nosníků 1							- 1,0
221.	SP	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2	kus	- 4,0	-	- 4,0 23,30 - 93
Plný popis: Ostatní práce							
222.	SP	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	- 1,0	-	- 1,0 281,00 - 281
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí							
Výkaz výměr: zpětná montáž stávajícího 1							- 1,0
223.	SP	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	- 1,08	-	- 1,08 509,00 - 550
Plný popis: Montáž oken dřevěných							
Výkaz výměr: zpětná montáž stávajícího 1,08							- 1,08
224.	SP	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	- 1,08	-	- 1,08 9,70 - 10
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské							

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.9 K PŘÍLOZE Č. 2 K SOD

PROJEKT:

„Rekonstrukce Oddělení nukleární medicíny – II.etapa, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce“

SoD ze dne 09.01.2018

Podrobný popis změn :

Nárůst ceny díla:

není

Snížení ceny díla:

- 1) Příčky tl 150 mm z pórobetonových příčkových – není nutno bourat otvor, přístroj bude přepraven jinou cestou
- 2) Úpravy povrchu stěn – není nutno bourat otvor, přístroj bude přepraven jinou cestou
- 3) Demontáž a zpětná montáž okna – okno není nutno demontovat, přístroj bude přepraven jinou cestou
- 4) Bourání příček – není nutno bourat otvor, přístroj bude přepraven jinou cestou
- 5) Podchycení stropů – podchycení není nutné, přístroj bude přepraven jinou cestou

Nezbytnost vyvolaných změn :


Výše uvedené změny oproti projektu byl vyvolány:

- změna trasy přesunu přístroje v rámci zjednodušení a úspor

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Jiří Šenke

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko: Ing.Karel Šafařík

Podpis zhotovitele, datum, razítko: Tomáš Roža

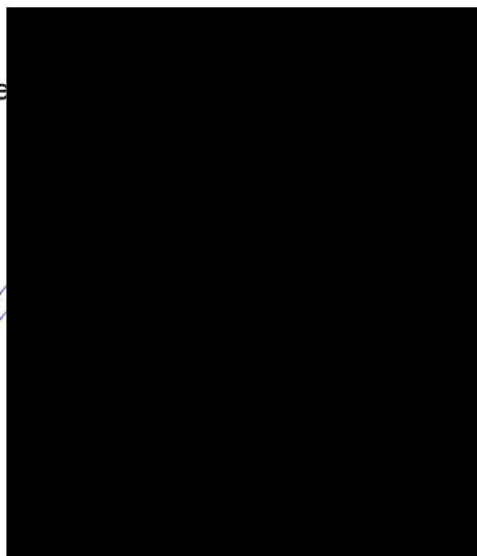

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Rekonstrukce Oddělení nukleární medicíny – II. etapa, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce“	Číslo změny: 10
SoD: ze dne 09.01.2018	Datum: 09.04.2018
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:	
Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce	
příloha_č..2 SOD	
1) D+M kabelu pro komunikaci řídicího systému s velínem	17 775,-Kč
2) D+M kabelu pro komunikaci s ústřednou EPS	22 100,-Kč
<u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u>	<u>39 875,- Kč</u>
Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce	
Příloha č.2 SOD	
1) Žádné nejsou	-0,- Kč
<u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u>	<u>-0,- Kč</u>
Rozdíl přípočtu víceprací a odpočtu méněprací	
Viz přílohy: nabídkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva	
<u>Původní cena díla</u>	
1. Cena díla bez DPH	5 372 017,- Kč
2. Cena díla vč. DPH	6 500 140,57Kč
<u>Návrh ceny díla včetně ZL č.10</u>	
1. Cena díla bez DPH	5 411 892,- Kč
2. Cena díla vč. DPH	6 548 389,32Kč
<u>Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:</u>	6 548 389,32 Kč
zvýšení ceny o	Základ: 39 875,- Kč DPH 21%: 8 373,75 Kč Cena včetně DPH: 48 248,75 Kč
snížení ceny o	Základ: 0,00 Kč DPH 21 %: 0,00 Kč Cena včetně DPH: 0,00 Kč
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
Datum dokončení: 14.05.2018	
Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele: Tomáš Roža	
Za objednatele: Jiří Šenkeřík	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Rekonstrukce Oddělení nukleární medicíny – II. etapa, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce“		Číslo změny: 10	
SoD: ze dne 09.01.2018		Datum: 09.04.2018	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
	Objednatele <input checked="" type="checkbox"/>		
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input type="checkbox"/>		

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

příloha_č..2 SOD

- | | |
|---|------------|
| 1) D+M kabelu pro komunikaci řídicího systému s velínem | 17 775,-Kč |
| 2) D+M kabelu pro komunikaci s ústřednou EPS | 22 100,-Kč |

Přípočtové položky celkem – vícepráce

39 875,- Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

Příloha č.2 SOD

- 1) Žádné nejsou

Odpočtové položky celkem – méněpráce

-0,- Kč

Rozdíl přípočtu víceprací a odpočtu méněprací

39 875,- Kč

Viz přílohy: nabídkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Cena díla bez DPH | 5 372 017,- Kč |
| 2. Cena díla vč. DPH | 6 500 140,57Kč |

Návrh ceny díla včetně ZL č.10

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Cena díla bez DPH | 5 411 892,- Kč |
| 2. Cena díla vč. DPH | 6 548 389,32Kč |

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

6 548 389,32 Kč

zvýšení ceny o	Základ:	39 875,- Kč
	DPH 21%:	8 373,75 Kč
	Cena včetně DPH:	48 248,75 Kč
snížení ceny o	Základ:	0,00 Kč
	DPH 21 %:	0,00 Kč
	Cena včetně DPH:	0,00 Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ	5 411 892,- Kč
	DPH 21%:	1 136 497,32 Kč
	Cena včetně DPH:	6 548 389,32 Kč

Prodloužení lhůty:	0 kalendářních dnů	
Zkrácení lhůty:	0 kalendářních dnů	
Celková lhůta po změně	Datum dokončení: 14.05.2018	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
---	---



Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
2017 / 031	Změna užívání a stavební úpravy ONM – 2.část - KZ a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.		
Komentář	ZL č. 10 - kabel MaR		
Popis verze			
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok		Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_05	Elektroinstalace		
		Celkem (bez DPH)	39 875
		DPH	8 374
		Celkem (včetně DPH)	48 249
Za zhotovitele	RRR spol. s r.o.	Za objednatele	
Jméno :	[REDACTED]		
Datum :	[REDACTED]		
Podpis:	[REDACTED]		
Poznámka :	<p style="text-align: center; font-size: small;"> RRR spol. s r.o. IČ: 250122011, DIČ: CZ250122011 </p>		

Zakázka:

Změna užívání a stavební úpravy ONM – 2.část - KZ a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
S: Změna užívání a stavební úpravy ONM – 2.část - KZ a.s. - Nemocnice Chorr	39 875	8 374	48 249
SO_05 Elektroinstalace	39 875	8 374	48 249
021: Silnoproud	39 875	8 374	48 249
Celkem (bez DPH)	39 875		
DPH		8 374	
Celkem (včetně DPH)			48 249

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Chomutov, SÚ 1.NP pavilon L, nukleární medicína

Objekt:

**16140 - Nemocnice Chomutov, 1.NP pavilon L, nukleární medicína,
Elektroinstalace**

Místo:

Chomutov

Datum:

09.04.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

RRR spol. s r.o., 17.lístopadu 5349, 430 04 Chomutov

Projektant:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								39 875,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV					39 875,00	
D		744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných					39 875,00	
1	K	744X2	Montáž kabelu pro komunikaci řídicího systému s velinem LAM DATAPAR 3x2x0,8	m	150,000	0,00	75,00	11 250,00	
2	M	Mat2	Kabel pro komunikaci řídicího systému s velinem LAM DATAPAR 3x2x0,8	m	150,000	43,50	0	6 525,00	
3	K	744X3	Montáž kabelu pro komunikaci s ústřednou EPS LAM DATAPAR 2x2x0,8	m	200,000	0,00	75,00	15 000,00	
4	M	Mat3	Kabel pro komunikaci s ústřednou EPS LAM DATAPAR 2x2x0,8	m	200,000	35,50	0	7 100,00	

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.10 K PŘÍLOZE Č. 2 K SOD

PROJEKT:

„Rekonstrukce Oddělení nukleární medicíny – II.etapa, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce“

SoD ze dne 09.01.2018

Podrobný popis změn :

Nárůst ceny díla:

- 1) D+M kabelu pro komunikaci řídicího systému s velínem – doplnění kabelu pro správné fungování MaR v rekonstruovaných prostorách
- 2) D+M kabelu pro komunikaci s ústřednou EPS - doplnění kabelu pro správné fungování MaR v rekonstruovaných prostorách

Snížení ceny díla:

není


Nezbytnost vyvolaných změn :

Výše uvedené změny oproti projektu byl vyvolány:
- zjištěním stavu stávajících rozvodů EPS

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Jiří Šenkeř

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko: Ing.Karel Šafařík

Podpis zhotovitele, datum, razítko: Tomáš Roža

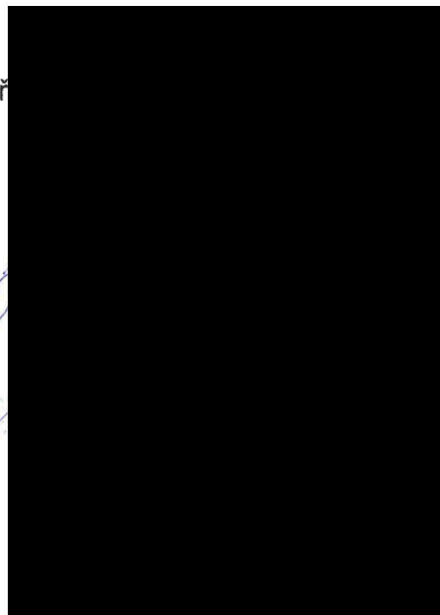

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Rekonstrukce Oddělení nukleární medicíny – II.etapa, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce“		Číslo změny: 11
SoD: ze dne 09.01.2018		Datum: 10.04.2018
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:		
<u>Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce</u>		
příloha_č..2 SOD		
1) Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem		38 282,-Kč
2) Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem		14 446,-Kč
3) Montáž SDK kazetového podhledu		20 900,-Kč
Přípočtové položky celkem – vícepráce		73 628,- Kč
<u>Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce</u>		
Příloha č.2 SOD		
1) Montáž kazet SDK kazetového podhledu		- 2 630,-Kč
Odpočtové položky celkem – méněpráce		- 2 630,- Kč
Rozdíl přípočtu víceprací a odpočtu méněprací		70 998,- Kč
Viz přílohy: nabídkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva		
Původní cena díla		
1. Cena díla bez DPH		5 411 892,- Kč
2. Cena díla vč. DPH		6 548 389,32Kč
Návrh ceny díla včetně ZL č.11		
1. Cena díla bez DPH		5 482 890,- Kč
2. Cena díla vč. DPH		6 634 296,90Kč
Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:		6 634 296,90Kč
zvýšení ceny o	Základ:	70 998,- Kč
	DPH 21%:	14 909,58 Kč
	Cena včetně DPH:	85 907,58 Kč
snížení ceny o	Základ:	0,00 Kč
	DPH 21 %:	0,00 Kč
	Cena včetně DPH:	0,00 Kč
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		Datum dokončení: 14.05.2018
Prodloužení lhůty o		0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o		0 kalendářních dní
Za zhotovitele: Tomáš Roža		
Za objednatele: Jiří Šenkeřík		

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Rekonstrukce Oddělení nukleární medicíny – II. etapa, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce“		Číslo změny: 11	
SoD: ze dne 09.01.2018		Datum: 10.04.2018	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> Objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:			
<u>Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce</u> příloha_č..2 SOD			
1) Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem			38 282,-Kč
2) Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem			14 446,-Kč
3) Montáž SDK kazetového podhledu			20 900,-Kč
<u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u>			<u>73 628,- Kč</u>
<u>Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce</u> Příloha č.2 SOD			
1) Montáž kazet SDK kazetového podhledu			- 2 630,-Kč
<u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u>			<u>- 2 630,- Kč</u>
Rozdíl přípočtu víceprací a odpočtu méněprací			<u>70 998,- Kč</u>
Viz přílohy: nabídkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva			
<u>Původní cena díla</u>			
1. Cena díla bez DPH			5 411 892,- Kč
2. Cena díla vč. DPH			6 548 389,32Kč
<u>Návrh ceny díla včetně ZL č.11</u>			
1. Cena díla bez DPH			5 482 890,- Kč
2. Cena díla vč. DPH			6 634 296,90Kč
<u>Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:</u>			<u>6 634 296,90Kč</u>
zvýšení ceny o	Základ:		70 998,- Kč
	DPH 21%:		14 909,58 Kč
	Cena včetně DPH:		85 907,58 Kč
snížení ceny o	Základ:		0,00 Kč
	DPH 21 %:		0,00 Kč
	Cena včetně DPH:		0,00 Kč
Celková cena po změně			
Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ		5 482 890,- Kč
	DPH 21%:		1 151 406,90 Kč
	Cena včetně DPH:		6 634 296,90 Kč
Prodloužení lhůty:			0 kalendářních dnů
Zkrácení lhůty:			0 kalendářních dnů
Celková lhůta po změně			Datum dokončení: 14.05.2018
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky		<input type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností		<input type="checkbox"/>
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	

Zakázka:

Změna užívání a stavební úpravy ONM – 2.část - KZ a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena		
S: Změna užívání a stavební úpravy ONM – 2.část - KZ a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.							70 998		
SO_01: 1NP							70 998		
006: Úpravy povrchu							52 728		
1.	SP	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	95,04	-	95,04	118,00	11 215
2.	SP	612135095	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	760,32	-	760,32	35,60	27 067
					95,04*8		760,32		
3.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	95,04	-	95,04	152,00	14 446
763: Konstrukce montované							18 269		
2.	SP	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	73,85	-	73,85	283,00	20 900
<i>Plný popis: Montáž sádkartonového podhledu</i>									
					LN 100		-		
					41,75		41,75		
					VM 6.100		-		
					32,10		32,1		
							73,85		
4.	SP	763135611	Montáž kazet SDK kazetového podhledu	m2	- 57,18	-	- 57,18	46,00	- 2 630
					LN 100		-		
					41,75		- 41,75		
					VM 6.100		-		
					15,43		- 15,43		

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.11 K PŘÍLOZE Č. 2 K SOD

PROJEKT:

„Rekonstrukce Oddělení nukleární medicíny – II.etapa, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce“

SoD ze dne 09.01.2018

Podrobný popis změn :

Nárůst ceny díla:

- 1) Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem – úplné srovnání stěn na chodbě
- 2) Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem – vyztužení stovnaných stěn
- 3) Montáž SDK kazetového podhledu – zpětná montáž demontovaného kazetového podhledu vč. rastru

Snížení ceny díla:

- 1) Montáž kazet SDK kazetového podhledu – původně uvažované zpětné doplnění kazet na rastr

Nezbytnost vyvolaných změn :

Výše uvedené změny oproti projektu byl vyvolány:
- požadavek budoucího uživatele

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Jiří Še

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko: Ing.Karel Šafa

Podpis zhotovitele, datum, razítko: Tomáš Roža

