

**Dodatek č. 1****ke Smlouvě o dílo**

č. Smp-O 0031422018/Na Staré poště uzavřeně podle § 2586 a násl. občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)  
(dále jen „dodatek č. 1“)

Níže uvedené smluvní strany:

Objednatel:

**Smp - Odpady a.s.**

se sídlem 530 12 Pardubice, Bílé Předměstí, Hůrka 1803,  
zastoupená ve věcech smluvních:

Romanem Šušlíkem, předsedou představenstva

Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva

ve věcech technických:

Ing. Jiřím Strouhalem, výkonným ředitelem

IČ: 27 54 72 30

CZ 27 54 72 30

Obchodní rejstřík KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 2804

na straně jedné, dále jen "objednatel"

a

Zhotovitel:

**PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.**

se sídlem Tovární 1130, Chrudim IV, 537 01 Chrudim,

zastoupená ve věcech smluvních:

Ing. Michalem Hejzlarem, členem představenstva

zastoupená ve věcech technických:

Lubomírem Mutňanským, členem představenstva

IČ: 46504621

DIČ: CZ46504621

Obchodní rejstřík KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 600

na straně druhé, dále jen "zhotovitel"

uzavírají v souladu s ustanovením čl. II. odst. 11 Smlouvy tento dodatek č. 1 ke Smlouvě.

**I.****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že se mění znění přílohy č. 4 Smlouvy, která nově zní tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že odstavec 2. článku V. Doba provedení, místo provádění díla, kontrola provádění díla se mění tak, že nově zní:  
*„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smyslu § 2604 občanského zákoníku nejpozději do 19.10.2018. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle časového harmonogramu prací, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 4.“*

**II.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 Smlouvy včetně přílohy č. 1 řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

3. Tento dodatek č. 1 nabyvá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 odešle k uveřejnění do registru smluv Objednatel.
5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.


Příloha: 1. Harmonogram prací

13 -07- 2018

V Pardubicích dne .....

V *PARUBICÍCH* dne *16.7.2018*


Za objednatele



Roman Suslík

předseda představenstva

Za zhotovitele



Ing. Michal Hejzlar

člen představenstva

.....  
Ing. Aleš Kopecký

místopředseda představenstva

**SMP – Odpady a.s.**  
Hůrka 1803, Bílé Předměstí  
530 12 Pardubice  
IČ: 275 47 230





PRAVNÍ  
STAVBAŘI  
s.r.o.

akce: Separáčnii dvůr


místo: ulice Na Staré poště, Pardubice

investor: StP - Odpady a.s., Hluka 1803, Pardubice PSČ-530 13

datum: 18.1.2018 (převzetí stavění) - 19.10.2018 (předání stavby)

Časový harmonogram prací

	rok													
	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42														

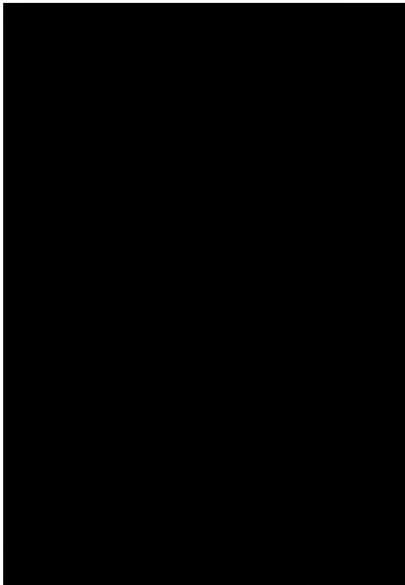

2018. 8. 10.  
11:51  
KOLÍNKA  
1000-26 1000-26

2018

SmP-Odpady a.s.  
Hůrka 1803  
530 12 Pardubice

vyřizuje: [REDAKCE] Chrudim 9.7.2018

Věc:

**Žádost o změnu termínu dodání stavby Separační dvůr v ulici Na Staré poště v Pardubicích 2018**

Vážený objednateli,

žádáme Vás o prodloužení termínu dodání stavby **Separační dvůr Na Staré poště v Pardubicích 2018**

Původní termín provedení díla byl 31. 7. 2018. Staveniště bylo předáno 18. 4. 2018.

Tim, že stavba nebyla odpojena od elektrické energie ( k odpojení správcem sítí firmou ČEZ došlo až 29.6.2018 ) nebylo možné provést úplnou demolici objektu a následně práce na zpevněných plochách.

Dále bylo při výkopu základových patek nového objektu nalezeno neznámé vodovodní potrubí. Po zjištění majitele byl uvedený problém vyřešen opět až koncem června.

Při bouracích pracích bylo nalezeno plynové potrubí, které bylo pod tlakem. Toto potrubí bylo nutné odpojit na hranicích staveniště. První odpojovací bod, určený správcem se ukázal jako nesprávný. Tudíž bylo nutné vykopat druhou sondu, která již splnila účel a to odpojení plynu od staveniště. Vše opět proběhlo až koncem června. Tim byl vyřešen již třetí problém ohledně energií. Z těchto důvodů došlo k posunutí jednotlivých termínů dle původního harmonogramu .  
Nový harmonogram prací je uveden v příloze

S přátelským pozdravem



**PRVNÍ  
STAVEBNÍ  
CHRUDIM**  
aktivní společnost

Továrna 1130, 537 23 Chrudim  
IČ: 66504621 DIČ: CZ66504621

[REDAKCE]  
Ing. Michal Hejzlar  
člen představenstva a.s.
