

DODATEK č. 1**ke smlouvě o dílo**

Podolí u Mohelnice – oprava fasády a interiéru kaple Nejsvětější Trojice
dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.**Smluvní strany**

Objednatel: Město Mohelnice
zastoupený : Ing. Pavel Kuba, starosta
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
IČ : 003 03 038
DIČ: CZ 00303038
Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Mohelnice, č.ú. 27-1905690389/0800

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : PRUKON s. r. o
Jateční 169, 760 01 Zlín
IČ : 476 74 237
DIČ: CZ 47674237
tel: 778 064 040
Bankovní spojení: 4601124349/0800

(dále jen „zhotovitel“)

II.**Předmět dodatku**

Dne 23.05.2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Podolí u Mohelnice – oprava fasády a interiéru kaple Nejsvětější Trojice“. Výše uvedené smluvní strany se z důvodu vzniklého na straně objednatele, kdy se v průběhu realizace ukázalo, že pod betonovou stěrkou se nachází původní poškozené pískovcové schodnice, které zástupci státní památkové péče požadovali zrestaurovat. Po očištění byly z hlediska bezpečnosti schodnice shledány ve stavu nevhodném pro opravu a opětovné osazení. Z důvodu nutné výroby nových pískovcových schodnic, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu tímto dodatkem č.1 takto:

Článek 3. odst. 2 se nahrazuje tímto textem:

3. Místo a termín plnění

2. Termín plnění:

- | | |
|--|-------------------|
| - zahájení prací: | 02.06.2018 |
| - dokončení prací a předání díla objednateli | 15.09.2018 |

III.
Ostatní ujednání

Tento dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo beze změn.


V Mohelnici dne 19.08.2018



.....
objednatel



V Mohelnici dne 19.08.2018

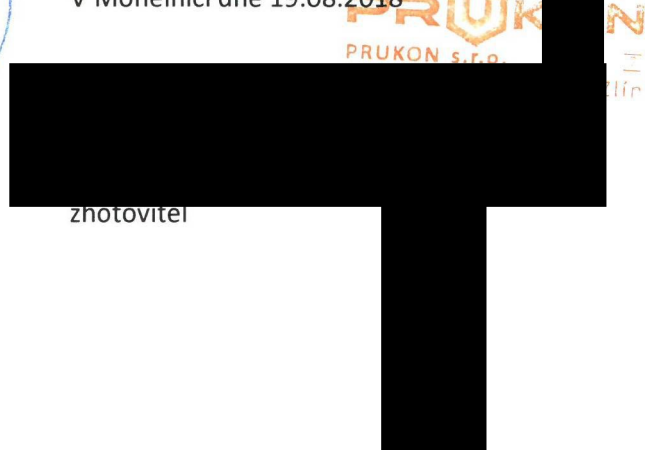

zhotovitel
