

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 49,628 trati Týniště nad Orlicí-Broumov“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1434/2018

ISPROFIN: 327 321 4993

a

„Společnost most Týniště – Broumov“

Společník 1 nebo Správce:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka č. 1561

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva

a Ing. Erika Kohoutová, člen představenstva

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, na základě plné moci

a

Společník 2:

OK Třebestovice, a.s.

se sídlem: Tovární 164, 289 12 Třebestovice

IČ: 03094251, DIČ: CZ03094251

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19808

Jejímiž jménem jedná: Ing. Tomáš Chlasták, předseda představenstva

a Ing. Petr Popsimov, člen představenstva

Kontaktní a doručovací adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty,
závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále všichni společně jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1524.8120406RFI

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 49,628 trati Týniště nad Orlicí-Broumov“ ze dne 4.5.2018.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele ze dne 8. 8. 2018 dohodly na změně termínů plnění z důvodu nutné úpravy plánu organizace výstavby, kterou vyvolala změna termínu kolejové výluky na související stavbě „Revitalizace trati Týniště n. O. – Broumov“, rozkazem o výluce č. 53175 definitivně potvrzeném na měsíční výlukové poradě dne 7.8.2018. S ohledem na výše uvedené se nově stanovuje **lhůta pro dokončení stavebních prací do 6. prosince 2018 a celková lhůta pro dokončení díla do 6. března 2019.**

1.2 Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 9. 8. 2018 Objednatel souhlasí s rozšířením seznamu poddodavatelů o obchodní společnost Chládek a Tintěra Pardubice a.s., IČ: 252 53 361. Zhotovitel prohlašuje, že nově doplněný poddodavatel nenahrazuje žádného z poddodavatelů, jejichž prostřednictvím Zhotovitel v rámci zadávacího řízení prokazoval chybějící část kvalifikace.

2. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3 bod 3.6. zní nově takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem nabytí účinnosti Smlouvy

Celková lhůta pro provedení Díla: do **6. března 2019** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací: do **6. prosince 2018** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. §49b zákona 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **6. března 2019**.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací - změna dle dodatku č. 1, který tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

Změna Přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 8 Smlouvy – Seznamem poddodavatelů - změna dle dodatku č. 1, který tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejněním v registru smluv.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

- 3.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací – změna dle dodatku č. 1.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří Příloha č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů – změna dle dodatku č. 1.
- 3.5 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.


V Olomouci dne 10.9.2018

V Pardubicích dne 12.9.2018

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast
Železniční stavby a mosty
EUROVIA CS, a.s. za společnost
„Společnost most Týniště – Broumov“
na základě plné moci

Příloha č. 5
Harmonogram postupu prací
- změna dle dodatku č. 1

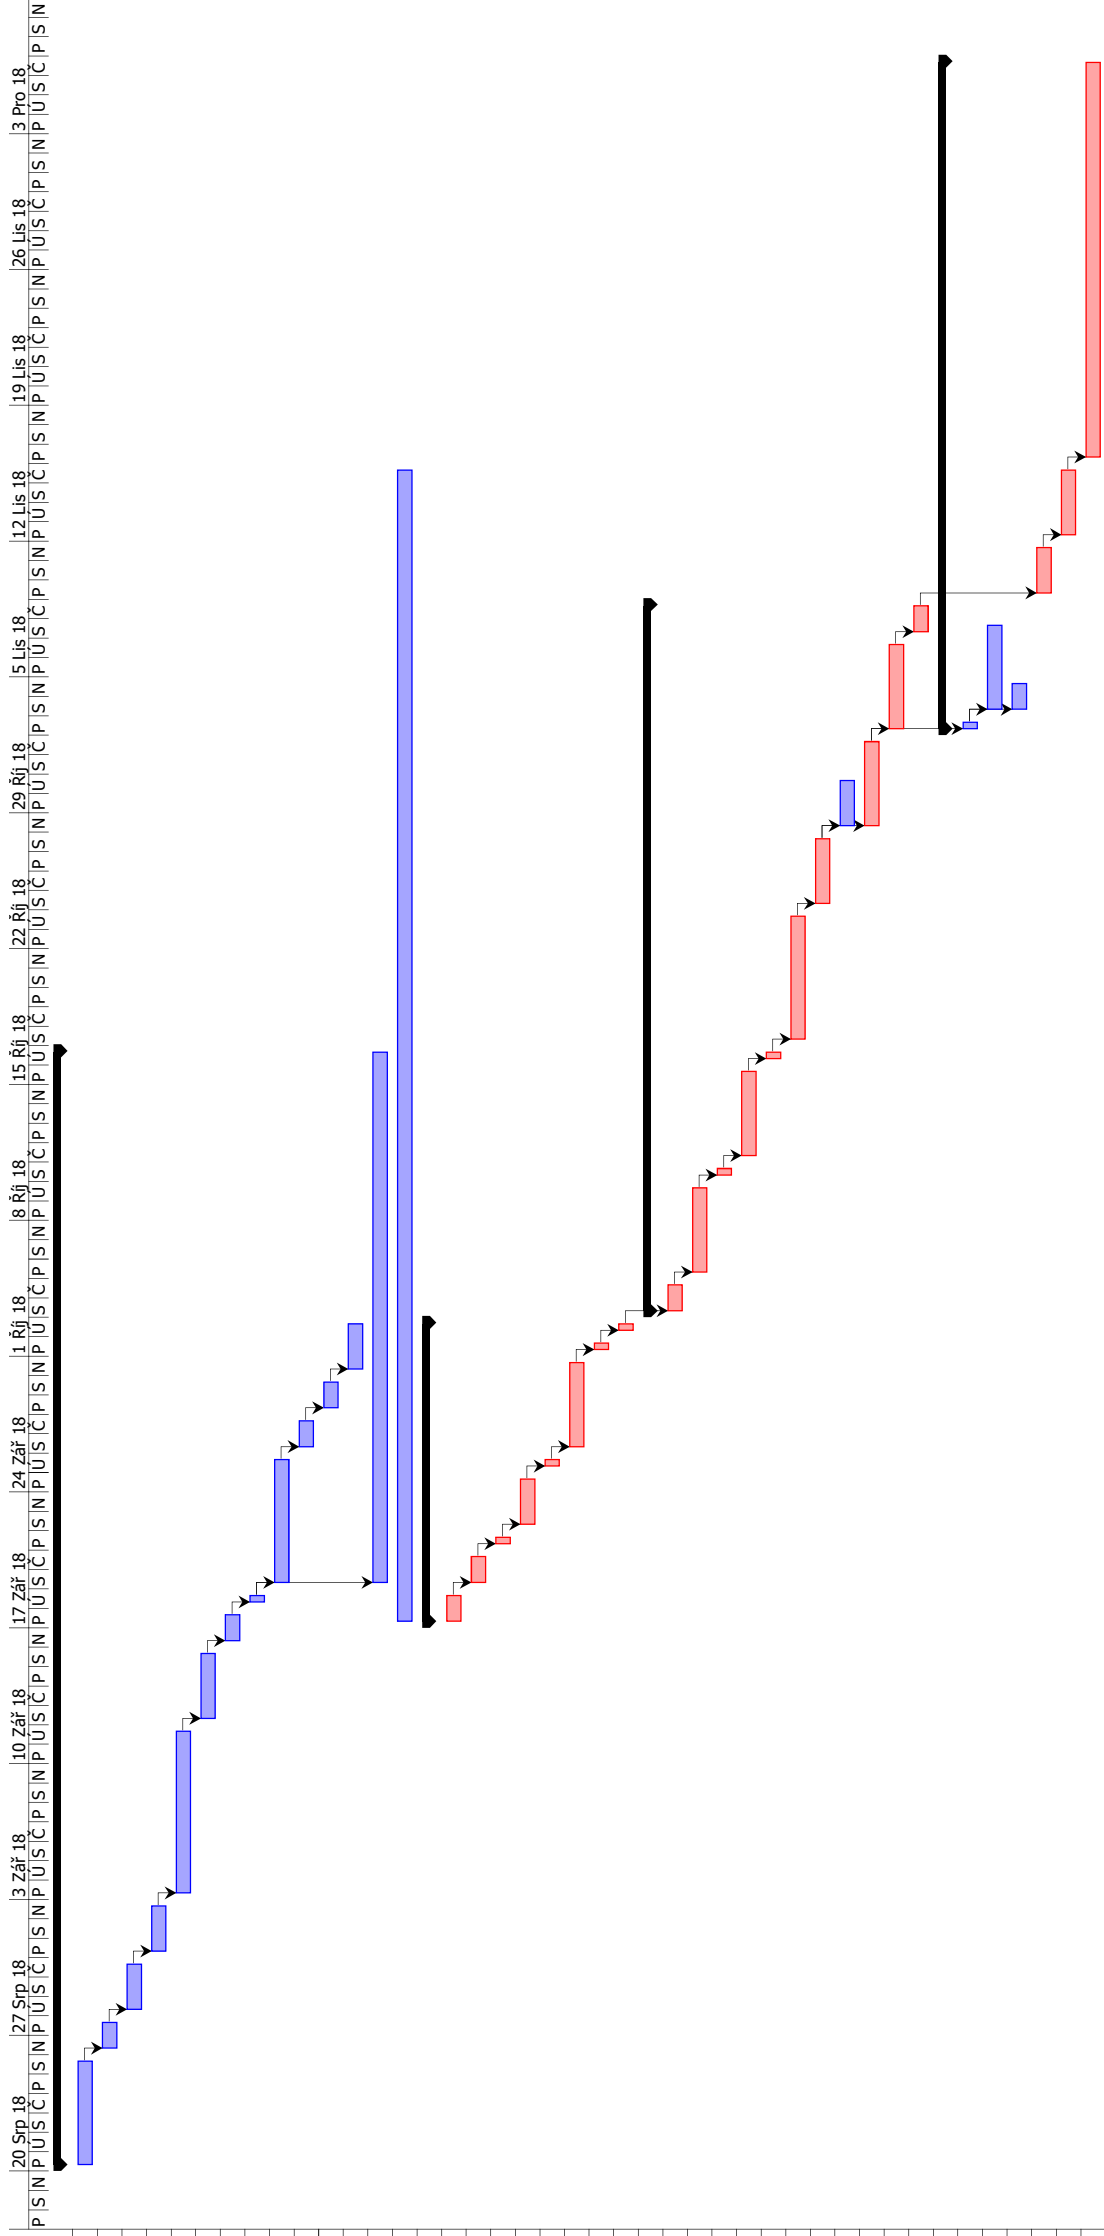

Jméno	Trvání	Začátek	Konec
ENosná konstrukce	58 dní	20.8.18 8:00	16.10.18 17:00
1 Příprava zařízení staveniště	6 dní	20.8.18 8:00	25.8.18 17:00
2 Podklad pod Pířmo	2 dní	26.8.18 8:00	27.8.18 17:00
3 Stavba Pířmo pod konstrukcí	3 dní	28.8.18 8:00	30.8.18 17:00
4 Bednění podlahy	3 dní	31.8.18 8:00	2.9.18 17:00
5 Bednění NK	9 dní	3.9.18 8:00	11.9.18 17:00
6 Vázání armatury	4 dní	12.9.18 8:00	15.9.18 17:00
7 Příprava betonáže	2 dní	16.9.18 8:00	17.9.18 17:00
8 Betonáž NK	1 den	18.9.18 8:00	18.9.18 17:00
9 Bednění říms	7 dní	19.9.18 8:00	25.9.18 17:00
10 Vázání výztuže říms	2 dní	26.9.18 8:00	27.9.18 17:00
11 Betonáž říms	2 dní	28.9.18 8:00	29.9.18 17:00
12 Odbednění říms a NK	3 dní	30.9.18 8:00	2.10.18 17:00
13 Tvrdnutí betonu pro přesun	28 dní	19.9.18 8:00	16.10.18 17:00
14 Výlukové práce	60 dní	17.9.18 8:00	15.11.18 17:00
EDemolice <input type="checkbox"/> základy	16 dní	17.9.18 8:00	2.10.18 17:00
17 Demontáž koleje a výkop	2 dní	17.9.18 8:00	18.9.18 17:00
18 Bourání opěr	2 dní	19.9.18 8:00	20.9.18 17:00
19 Pažení komunikace	1 den	21.9.18 8:00	21.9.18 17:00
20 Bourání základu a výkop	3 dní	22.9.18 8:00	24.9.18 17:00
21 Podkladní beton	1 den	25.9.18 8:00	25.9.18 17:00
22 Bednění základu a výztuž	5 dní	26.9.18 8:00	30.9.18 17:00
23 Betonáž základu	1 den	1.10.18 8:00	1.10.18 17:00
24 Odbednění základů	1 den	2.10.18 8:00	2.10.18 17:00
EOpěry <input type="checkbox"/> NK	37 dní	3.10.18 8:00	8.11.18 17:00
26 Nátěr základu a zásyp	2 dní	3.10.18 8:00	4.10.18 17:00
27 Bednění a vázání opěry 1. fáze	5 dní	5.10.18 8:00	9.10.18 17:00
28 Betonáž 1. fáze	1 den	10.10.18 8:00	10.10.18 17:00
29 Bednění a vázání opěry 2. fáze	5 dní	11.10.18 8:00	15.10.18 17:00
30 Betonáž 2. fáze	1 den	16.10.18 8:00	16.10.18 17:00
31 Bednění a vázání opěry 3. fáze	7 dní	17.10.18 8:00	23.10.18 17:00
32 Betonáž 3. fáze a odbednění	4 dní	24.10.18 8:00	27.10.18 17:00
33 Zásyp přechodové oblasti	3 dní	28.10.18 8:00	30.10.18 17:00
34 Přesun NK	5 dní	28.10.18 8:00	1.11.18 17:00
35 Bednění a vázání opěry 4. fáze	5 dní	2.11.18 8:00	6.11.18 17:00
36 Betonáž římsy a odbednění	2 dní	7.11.18 8:00	8.11.18 17:00
EOstřeni	35 dní	2.11.18 8:00	6.12.18 17:00
38 Podlití NK	1 den	2.11.18 8:00	2.11.18 17:00
39 Demontáž skruže	5 dní	3.11.18 8:00	7.11.18 17:00
40 Izolace NK	2 dní	3.11.18 8:00	4.11.18 17:00
41 Izolace předpolí	3 dní	9.11.18 8:00	11.11.18 17:00
42 Odvodnění, zásypy a rovnání	4 dní	12.11.18 8:00	15.11.18 17:00
43 Dokončovací práce po výluce	21 dní	16.11.18 8:00	6.12.18 17:00

Příloha č. 8

Seznam poddodavatelů

- změna dle dodatku č. 1

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, 106 17 Praha, IČ: 48029483	SO 08-10-01 Ochrana mimodrážních sítí	
Chládek a Tintěra Pardubice a.s. K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 252 53 361	SO 08-19-02 Most v km 49,628; demontáž koleje	
CELKEM %		
