


ČASOVÝ HARMONOGRAM

PŘÍLOHA č.3



Úkol [Dotted pattern] Rozdělení [Hatched pattern] Milník [Diamond] Souhrnný [Hatched pattern] Souhrn projektu [Thick black bar]

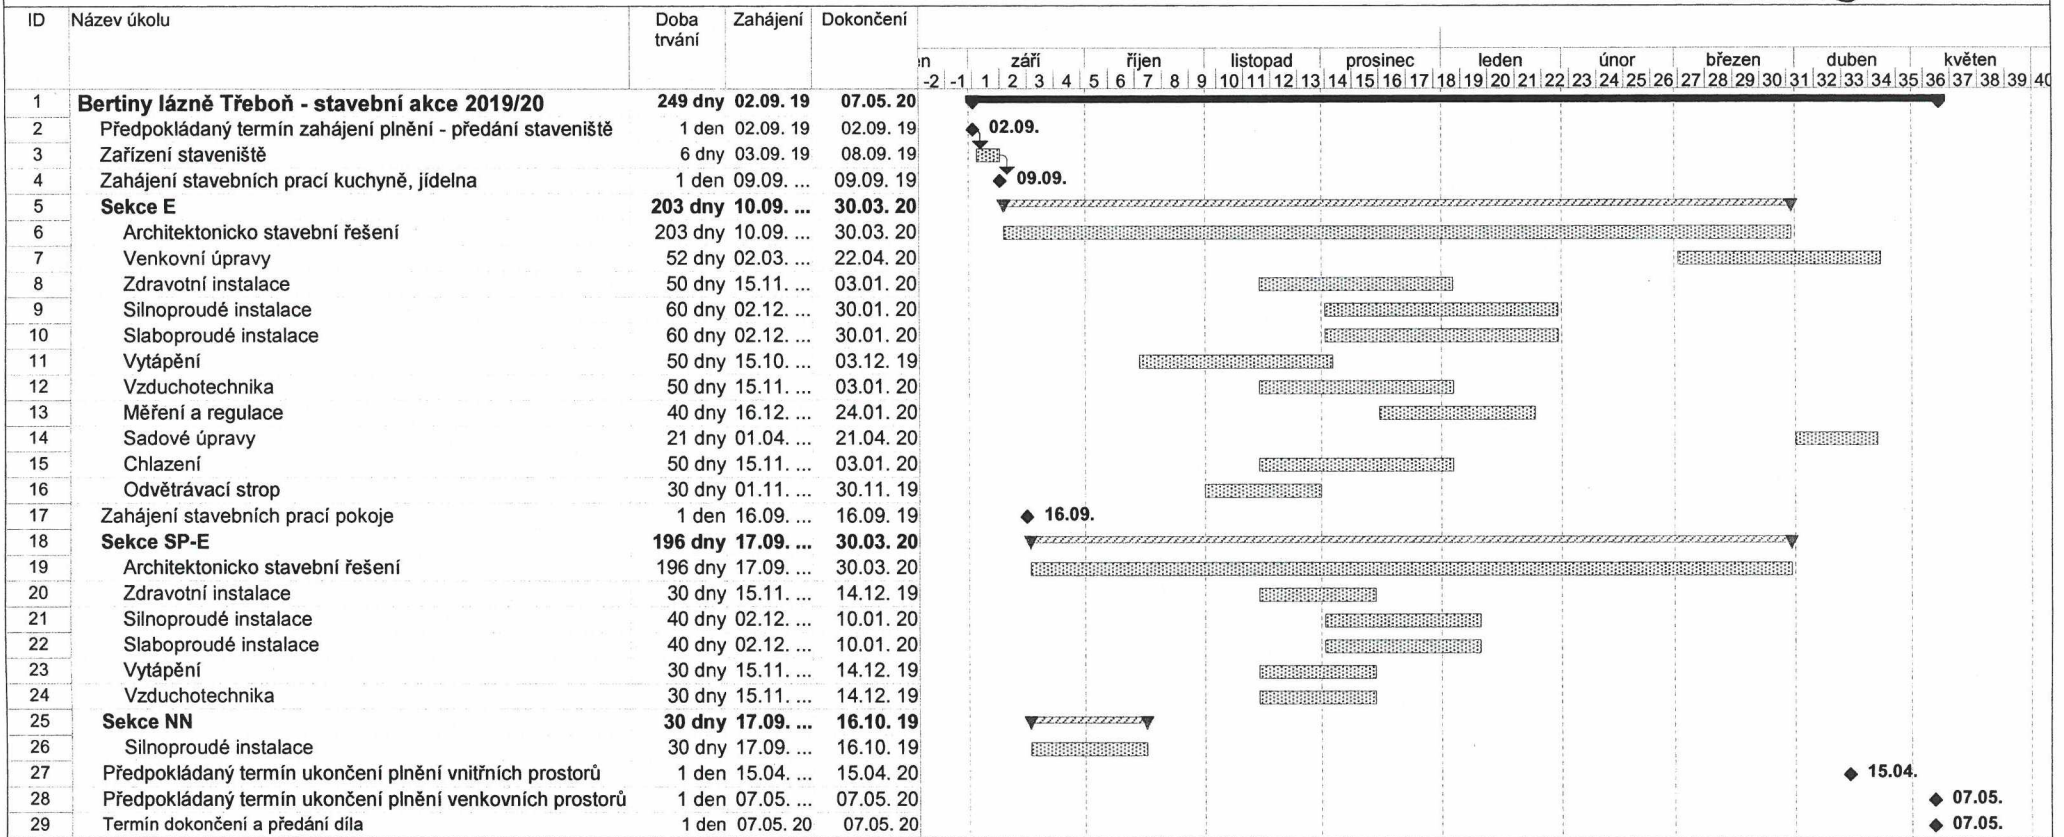

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20																	
Předpokládaný termín zahájení plnění - předání staveniště																	
Zařízení staveniště																	
Zahájení stavebních prací kuchyně, jídelna																	
Sekce E																	
Architektonicko stavební řešení		1 691 773 Kč	1 973 735 Kč	1 973 735 Kč	1 973 735 Kč	1 973 735 Kč	1 973 735 Kč	1 973 735 Kč	1 973 735 Kč	1 973 735 Kč	1 973 735 Kč	1 973 735 Kč	1 973 735 Kč	1 973 735 Kč	1 973 735 Kč	1 973 735 Kč	1 973 735 Kč
Venkovní úpravy											184 159 Kč	453 037 Kč	453 037 Kč	453 037 Kč	453 037 Kč	453 037 Kč	453 037 Kč
Zdravotní instalace												453 037 Kč	453 037 Kč	453 037 Kč	453 037 Kč	453 037 Kč	453 037 Kč
Silnoproudá instalace												549 045 Kč	549 045 Kč	549 045 Kč	549 045 Kč	549 045 Kč	549 045 Kč
Slaboproudá instalace												502 368 Kč	502 368 Kč	502 368 Kč	502 368 Kč	502 368 Kč	502 368 Kč
Vytápění							183 721 Kč	214 341 Kč	214 341 Kč	214 341 Kč	214 341 Kč	214 341 Kč	214 341 Kč	214 341 Kč	214 341 Kč	214 341 Kč	214 341 Kč
Vzduchotechnika											478 989 Kč	1 117 640 Kč	1 117 640 Kč	1 117 640 Kč	1 117 640 Kč	1 117 640 Kč	1 117 640 Kč
Měření a regulace																195 823 Kč	195 823 Kč
Sadové úpravy																	
Chlazení											326 383 Kč	781 513 Kč	781 513 Kč	781 513 Kč	781 513 Kč	781 513 Kč	781 513 Kč
Odvětrávací strop									299 413 Kč	698 631 Kč	698 631 Kč	698 631 Kč	698 631 Kč	698 631 Kč	698 631 Kč	698 631 Kč	698 631 Kč
Zahájení stavebních prací pokoje																	
Sekce SP-E																	
Architektonicko stavební řešení			299 135 Kč	348 991 Kč	348 991 Kč	348 991 Kč	348 991 Kč	348 991 Kč	348 991 Kč	348 991 Kč	348 991 Kč	348 991 Kč	348 991 Kč	348 991 Kč	348 991 Kč	348 991 Kč	348 991 Kč
Zdravotní instalace											348 991 Kč	348 991 Kč	348 991 Kč	348 991 Kč	348 991 Kč	348 991 Kč	348 991 Kč
Silnoproudá instalace											299 928 Kč	699 828 Kč	699 828 Kč	699 828 Kč	699 828 Kč	699 828 Kč	699 828 Kč
Slaboproudá instalace												681 679 Kč	681 679 Kč	681 679 Kč	681 679 Kč	681 679 Kč	681 679 Kč
Vytápění											36 150 Kč	84 351 Kč	84 351 Kč	84 351 Kč	84 351 Kč	72 301 Kč	72 301 Kč
Vzduchotechnika											24 960 Kč	58 240 Kč	58 240 Kč	58 240 Kč	58 240 Kč	49 920 Kč	49 920 Kč
Sekce NN																	
Silnoproudá instalace			610 577 Kč	712 340 Kč	712 340 Kč	712 340 Kč	712 340 Kč	305 289 Kč									
Předpokládaný termín ukončení plnění vnitřních prostorů																	
Předpokládaný termín ukončení plnění venkovních prostorů																	
Termín dokončení a předání díla																	
CELKEM		1 691 773 Kč	2 883 447 Kč	3 035 085 Kč	3 035 085 Kč	3 035 085 Kč	2 811 735 Kč	2 537 067 Kč	2 836 480 Kč	3 235 697 Kč	4 596 244 Kč	6 410 307 Kč	6 310 502 Kč	7 894 507 Kč	7 712 921 Kč	7 186 671 Kč	7 186 671 Kč

Seznam oprávněných osob jednat za smluvní strany

Seznam oprávněných osob jednat za Město Třeboň, jako objednatele stavby „Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20“:

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních:

Mgr. Terezie Jenisová, tel.:

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

Seznam osob oprávněných jednat za společnost OHL ŽS, a.s., jako dodavatele stavby „Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20“:

Osoba oprávněná jednat za dodavatele ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat za dodavatele ve věcech technických:

Osoba oprávněná jednat za dodavatele ve věcech stavby:
