



DODATEK Č. 5

č. dodatku E617-S-3541/2017/5

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 28.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3541/2017

ISPROFOND: 581 371 0006

a

účastníci Společnosti „**ČET-DET**“

založené Společenskou smlouvou ze dne 19. 12. 2016

Společník - správce: **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1383

zastoupena Ing. Ondřejem Fuchsem, místopředsedou představenstva a

Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva



a

společník: **OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupena Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Paolem Bee, MBA,
2. místopředsedou představenstva

a

společník: **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 138/10, 110 Praha 1 Nové Město

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupena Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty

a

společník: **GJW Praha spol. s r.o.**

se sídlem: Mezitraťová 137/46, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

zastoupena Ing. Milanem Koudelkou, jednatelem společnosti
Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem společnosti

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 19. 12. 2016, kdy správcem Společnosti „**ČET-DET**“ je
S u b t e r r a a.s., se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 45309612, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383, která je na základě
Plné moci ze dne 19. 12. 2016 oprávněna jednat za všechny společníky,

jehož bankovní spojení je:, IBAN:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1703153//SOD00200043//

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7.8.2017 na zhotovení
stavby s názvem „**Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice**“

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 5 obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem č. 5 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 5:**



1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 5

- 1.1 Smluvní strany projednaly a schválily změnu rozsahu předmětu plnění z důvodu schválení změnového listu stavby (dále též „ZL“) č. 7 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a z důvodu vynětí části SO 31-27-01 (Český Těšín – Louky nad Olší, přeložky vodovodů a kanalizací) a části SO 35-27-01 (Karviná – Dětmárovice, přeložky vodovodů a kanalizací) ze Smlouvy a jejich samostatné realizace prostřednictvím jejich vlastníka na základě samostatné smlouvy o dílo, a s tím související úpravu nákladů Zhotovitele.

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
7	5.167.751,81 Kč	- 63.829,29 Kč	5.103.922,52 Kč

Označení SO	Název	Snížení ceny
SO 31-27-01	Český Těšín – Louky nad Olší, přeložky vodovodů a kanalizací	- 211.371,29 Kč
SO 35-27-01	Karviná – Dětmárovice, přeložky vodovodů a kanalizací	- 493.192,60 Kč

- 1.2 Smluvní strany dále projednaly a schválily opravu položek deagregovaných dodatkem č. 2. V dodatku č. 2 došlo u stavebních objektů uvedených v tabulce k chybnému zaokrouhlení. Po opravě dochází ke snížení cen stavebních objektů tak, jak je uvedeno v tabulce:

SO	Název	Snížení Ceny SO
SO 31-17-01	Český Těšín – Louky nad Olší, úsek Český Těšín – Odb. Chotěbuz, železniční svršek	- 51,76 Kč
SO 31-17-02	Český Těšín – Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz – Louky nad Olší, železniční svršek	- 27,60 Kč
SO 35-17-02	Karviná – Dětmárovice, úsek Odb. Koukolná – Dětmárovice, železniční svršek	- 28,07 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 5 je Rozklad položek SO 31-17-01, SO 31-17-02 a SO 35-17-02 s vyznačením oprav.

V souvislosti s body 1.1 a 1.2 se upravuje článek 3, odst. 3.3. Smlouvy.

- 1.3 Smluvní strany dále projednaly a schválily aktualizaci přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Lhůty uvedené v čl. 3.6 Smlouvy zůstávají v platnosti. K úpravě Harmonogram postupu prací dochází z důvodu, že při realizaci SO 35-19-04 – Karviná-Dětmárovice, most v km 335,441 bylo zjištěno, že musí být provedena přeložka plynového vedení, se kterou nepočítala projektová dokumentace stavby.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna článku 3. „PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY“

V článku 3. se odstavec 3.3 ruší a nahrazuje takto:



„3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

Cena Díla bez DPH po dodatcích č. 1, 2, 3 a 4: 2.057.235.821,41 Kč

Změna Ceny Díla dle ZL č. 7: 5.103.922,52 Kč

Snížení Ceny Díla SO 31-27-01 a SO 35-27-01 - 704.563,89 Kč

Snížení ceny Díla SO 31-17-01, SO 31-17-02 a SO 35-17-02 - 107,43 Kč

Cena Díla bez DPH po dodatku č. 5 celkem 2.061.635.072,61Kč

Slovy: dvěmiliardyšedesátjednamilionůšestsetřicetpěttisícšedesát dva korun českých a 0,61.

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 Smlouvy, ve znění dodatku č. 5 ke Smlouvě.“

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 5

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění jejích Dodatků č. 1, 2, 3 a 4 nedotčená tímto Dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

2.2 Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 3 – Přehled změn dle ZL č. 7, přehled snížení Ceny Díla o části nerealizovaných stavebních objektů a rozklad oprav deagregovaných položek, které doplňují Přílohu č. 3 Smlouvy: Související dokumenty
- Příloha č. 4 - Rekapitulace Ceny Díla ve znění dle dodatku č. 5, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 ve znění dle dodatku č. 4 Smlouvy
- Příloha č. 5. - Harmonogram postupu prací ve znění dle dodatku č. 5, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy ve znění dle dodatku č. 3

2.4 Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve **dvanácti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **osm** vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 20.9.2018

V dne 25.10.2018

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Ondřej Fuchs
místopředseda představenstva
S u b t e r r a a.s.



Ing. Jiří Tesař

člen představenstva

S u b t e r r a a.s.

Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva

OHL ŽS, a.s.

Paolo Bee, MBA

2. místopředseda představenstva

OHL ŽS, a.s.

Ing. Miroslav Trnka

ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby
a mosty

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Milan Koudelka

jednatel společnosti

GJW Praha spol. s r.o.

Ing. Miroslav Trnka

jednatel společnosti

GJW Praha spol. s r.o.

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

SO/PS	č.OBJEKTU	NÁZEV OBJEKTU	VLASTNÍK	CENA bez DPH (Kč)	Cena dle dodatku č. 4	Vícepráce ZL č. 7	Móněpráce ZL č. 7 a přílohy vodovodů	Cena dle dodatku č. 5
E.		STAVEBNÍ ČÁST						
E.1		Inženýrské objekty						
E.1.1		Kolejový svršek a spodek						
E.1.1.1		Železniční svršek						
SO	31-17-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb.Chotěbuz, železniční svršek	SŽDC	81 620 123,64	81 620 123,64			81 620 123,64
SO	31-17-02	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční svršek	SŽDC	50 039 066,55	50 039 066,55			50 039 066,55
SO	32-17-01	Žst. Louky nad Olší, železniční svršek	SŽDC	116 564 318,03	116 564 318,03			116 564 318,03
SO	33-17-01	Louky nad Olší - Karviná, železniční svršek	SŽDC	3 296 577,33	3 296 577,33			3 296 577,33
SO	34-17-01	Žst. Karviná, železniční svršek	SŽDC	117 656 956,48	117 870 070,46			117 870 070,46
SO	35-17-01	Karviná - Dětmarovice, úsek Karviná - Odb. Koukolná, železniční svršek	SŽDC	73 943 985,75	73 943 985,75			73 943 985,75
SO	35-17-02	Karviná - Dětmarovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmarovice, železniční svršek	SŽDC	57 552 306,12	57 552 306,12			57 552 306,12
SO	36-17-01	Žst. Dětmarovice, železniční svršek	SŽDC	66 256 466,17	68 492 493,37			68 492 493,37
SO	50-17-01	Český Těšín - Dětmarovice, výstroj tratě	SŽDC	1 110 531,88	1 110 531,88			1 110 531,88
E.1.1.2		Železniční spodek						
SO	31-16-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb.Chotěbuz, železniční spodek	SŽDC	34 464 134,61	34 464 134,61			34 464 134,61
SO	31-16-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb.Chotěbuz, železniční spodek	OSTATNÍ	0,00				
SO	31-16-02	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční spodek	SŽDC	18 180 795,93	18 180 795,93			18 180 795,93
SO	31-16-02	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční spodek	OSTATNÍ	0,00				
SO	32-16-01	Žst. Louky nad Olší, železniční spodek	SŽDC	18 954 513,27	18 954 513,27			18 954 513,27
SO	34-16-01	Žst. Karviná, železniční spodek	SŽDC	28 833 138,37	28 833 138,37			28 833 138,37
SO	35-16-01	Karviná - Dětmarovice, úsek Karviná - Odb. Koukolná, železniční spodek	SŽDC	50 990 707,23	50 990 707,23			50 990 707,23
SO	35-16-02	Karviná - Dětmarovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmarovice, železniční spodek	SŽDC	16 638 022,36	16 638 022,36			16 638 022,36
SO	36-16-01	Žst. Dětmarovice, železniční spodek	SŽDC	13 461 159,29	26 396 104,41			26 396 104,41
SO	50-34-01	Český Těšín - Dětmarovice, kácení zeleně a náhradní výsadba	SŽDC	3 928 154,00	3 928 154,45			3 928 154,45
E.1.2		Nástupiště						
SO	31-16-03	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, nástupiště	SŽDC	8 474 896,26	8 474 896,26			8 474 896,26
SO	32-16-02	Žst. Louky nad Olší, nástupiště	SŽDC	4 892 981,55	4 892 981,55			4 892 981,55
SO	34-16-02	Žst. Karviná, nástupiště	SŽDC	16 907 162,38	16 907 162,38			16 907 162,38
SO	36-16-02	Žst. Dětmarovice, nástupiště	SŽDC	2 687 994,85	4 729 820,12			4 729 820,12
E.1.3		Železniční přejezdy						
SO	31-17-03	Český Těšín - Louky nad Olší, přejezd v km 321,069	SŽDC	2 888 361,47	2 888 361,47			2 888 361,47
SO	36-17-02	Žst. Dětmarovice, přejezd v km 285,003	SŽDC	1 036 622,39	1 036 622,39			1 036 622,39
E.1.4		Mosty, propustky, zdi						
SO	31-19-01	Český Těšín - Louky nad Olší, propustek v km 320,425	SŽDC	2 075 978,01	2 075 978,01			2 075 978,01
SO	31-19-02	Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 320,589	SŽDC	3 997 888,67	3 997 888,67			3 997 888,67
SO	31-19-03	Český Těšín - Louky nad Olší, propustek v km 321,060	SŽDC	1 339 164,31	1 339 164,31			1 339 164,31
SO	31-19-04	Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 321,463	SŽDC	3 738 144,63	3 738 144,63			3 738 144,63
SO	31-19-05	Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 322,181	SŽDC	1 843 214,32	1 843 214,32			1 843 214,32
SO	31-19-06	Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 322,477	SŽDC	2 493 656,45	2 493 656,45			2 493 656,45
SO	31-19-07	Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 323,862 - podchod	SŽDC	9 699 535,51	9 699 535,51			9 699 535,51
SO	31-19-08	Český Těšín - Louky nad Olší, silniční nadjezd v km 324,424	OSTATNÍ	128 321,94	128 321,94			128 321,94
SO	32-19-01	Žst. Louky nad Olší, propustek v km 325,060	SŽDC	1 097 463,15	1 097 463,15			1 097 463,15
SO	32-19-03	Žst. Louky nad Olší, most v km 325,633 - podchod	SŽDC	5 653 604,58	5 653 604,58			5 653 604,58
SO	32-19-04	Žst. Louky nad Olší, most v km 326,000	SŽDC	2 974 520,55	2 974 520,55			2 974 520,55
SO	34-19-01	Žst. Karviná, silniční nadjezd v km 333,268	OSTATNÍ	583 149,21	583 149,21			583 149,21
SO	34-19-02	Žst. Karviná, most v km 333,721 - podchod	SŽDC	21 751 374,14	21 751 374,14			21 751 374,14
SO	34-19-03	Žst. Karviná, most v km 333,894	SŽDC	4 546 108,14	4 546 108,14			4 546 108,14
SO	34-19-04	Žst. Karviná, silniční nadjezd v km 334,577	OSTATNÍ	914 344,32	914 344,32			914 344,32
SO	35-19-02	Karviná - Dětmarovice, most v km 334,965	SŽDC	5 842 102,54	5 842 102,57			5 842 102,57
SO	35-19-03	Karviná - Dětmarovice, propustek v km 335,146	SŽDC	1 056 950,43	1 056 950,43			1 056 950,43
SO	35-19-04	Karviná - Dětmarovice, most v km 335,441	SŽDC	4 634 762,46	4 634 762,46			4 634 762,46
SO	35-19-05	Karviná - Dětmarovice, silniční nadjezd v km 335,735	OSTATNÍ	583 240,98	583 240,98			583 240,98
SO	35-19-06	Karviná - Dětmarovice, propustek v km 335,986	SŽDC	1 542 616,57	1 542 616,57			1 542 616,57

SO	35-19-07	Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,115	SŽDC	3 505 201,24	3 505 201,24			3 505 201,24
SO	35-19-08	Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,496	SŽDC	3 993 883,94	3 993 883,94			3 993 883,94
SO	35-19-09	Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,635	SŽDC	318 000,76	318 000,76			318 000,76
SO	35-19-10	Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,641	SŽDC	90 577,52	90 577,52			90 577,52
SO	35-19-11	Karviná - Dětmarovice, most v km 337,751	SŽDC	4 716 194,09	4 716 194,13			4 716 194,13
SO	35-19-12	Karviná - Dětmarovice, silniční nadjezd v km 338,226	OSTATNÍ	20 853 316,24	20 853 316,24			20 853 316,24
SO	35-19-13	Karviná - Dětmarovice, most v km 338,337	SŽDC	135 568 305,83	135 568 305,83			135 568 305,83
SO	35-19-14	Karviná - Dětmarovice, propustek v km 338,975	SŽDC	105 408,42	105 408,42			105 408,42
SO	36-19-01	Žst. Dětmarovice, most v km 339,577	OSTATNÍ	760 352,71	760 352,71			760 352,71
SO	36-19-02	Žst. Dětmarovice, most v km 339,643	SŽDC	371 168,66	371 168,66			371 168,66
E.1.6		Potrubi vedení (voda, plyn, kanalizace)						
SO	31-21-01	Český Těšín - Louky nad Olší, ochrana plynovodů a produktovodů	OSTATNÍ	2 816,56	2 816,56			2 816,56
SO	31-21-02	Český Těšín - Louky nad Olší, ochrana vodovodů a kanalizací	OSTATNÍ	381 609,00	381 608,90			381 608,90
SO	31-27-01	Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky vodovodů a kanalizací	OSTATNÍ	2 323 514,00	2 323 514,14	211 371,29		2 112 142,85
SO	31-27-02	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rekonstrukce dešť. kanalizace do Olše	SŽDC	554 089,68	554 089,68			554 089,68
SO	32-27-01	Žst. Louky nad Olší, přeložky vodovodů a kanalizací	SŽDC	3 264 773,13	3 264 773,13			3 264 773,13
SO	33-21-02	Louky nad Olší - Karviná, ochrana vodovodů a kanalizací	OSTATNÍ	66 495,55	66 495,55			66 495,55
SO	34-21-01	Žst. Karviná, ochrana plynovodů a produktovodů	OSTATNÍ	4 704 997,63	4 704 997,63			4 704 997,63
SO	34-27-01	Žst. Karviná, přeložky vodovodů a kanalizací	SŽDC	4 836 560,88	4 836 560,88			4 836 560,88
SO	35-21-01	Karviná - Dětmarovice, ochrana plynovodů a produktovodů	OSTATNÍ	18 009,23	18 009,23			18 009,23
SO	35-21-02	Karviná - Dětmarovice, ochrana vodovodů a kanalizací	OSTATNÍ	151 841,01	151 841,01			151 841,01
SO	35-27-01	Karviná - Dětmarovice, přeložky vodovodů a kanalizací	OSTATNÍ	572 108,00	572 108,49	493 192,60		78 915,89
SO	36-21-01	Žst. Dětmarovice, ochrana vodovodů a kanalizací	OSTATNÍ	1 773,52	1 773,52			1 773,52
E.1.8		Pozemní komunikace						
SO	31-18-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, zpevněné plochy (SŽDC)	SŽDC	702 958,41	702 958,41			702 958,41
SO	32-18-01	Žst. Louky nad Olší, zpevněné plochy	OSTATNÍ	861 062,72	861 062,72			861 062,72
SO	35-18-01	Karviná - Dětmarovice, úprava komunikace III/4681 na silničním nadjezdu v km 338,226	OSTATNÍ	8 097 944,96	8 097 944,96			8 097 944,96
E.1.9		Kabelovody, kolektory						
SO	32-15-07	Žst. Louky nad Olší, kabelovod	SŽDC	3 323 467,64	3 323 467,64			3 323 467,64
SO	34-15-03	Žst. Karviná, kabelovod	SŽDC	4 717 727,45	4 717 727,45	5 167 751,81	63 829,29	9 821 649,97
SO	36-15-01	Žst. Dětmarovice, úprava šachet kabelovodu	SŽDC	80 360,43	80 360,43			80 360,43
E.1.10		Protihlukové objekty, individuální protihluková opatření						
SO	31-15-02	Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna	SŽDC	44 669 715,21	44 669 715,21			44 669 715,21
SO	34-15-05	Žst. Karviná, protihluková stěna	SŽDC	2 667 174,16	2 667 174,16			2 667 174,16
SO	35-15-04	Karviná - Dětmarovice, protihluková stěna	SŽDC	8 744 703,04	8 744 703,04			8 744 703,04
E.2		Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stav.obj.						
E.2.1		Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)						
SO	32-15-01	Žst. Louky nad Olší, technologická budova	SŽDC	6 629 502,19	6 766 729,38			6 766 729,38
SO	32-15-02	Žst. Louky nad Olší, stavební úpravy VB	OSTATNÍ	414 146,30	414 146,30			414 146,30
SO	32-15-06	Žst. Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206	SŽDC	305 237,99	305 237,99			305 237,99
SO	33-15-01	Louky nad Olší - Karviná, úprava terénu u přej. km 328,666	SŽDC	5 322,05	5 322,05			5 322,05
SO	34-15-01	Žst. Karviná, stavební úpravy VB	OSTATNÍ	2 726 808,00	2 726 808,00			2 726 808,00
SO	35-15-02	Karviná - Dětmarovice, ochrana migračního biokoridoru	SŽDC	124 862,60	124 862,61			124 862,61
SO	36-15-02	Žst. Dětmarovice, stavební úpravy MR	SŽDC	73 299,83	73 299,82			73 299,82
E.2.2		Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích						
SO	31-15-01	Český Těšín - Louky nad Olší, nástupištní přístřešky v Odb. Chotěbuz	SŽDC	1 950 974,34	1 950 974,34			1 950 974,34
SO	32-15-04	Žst. Louky nad Olší, zastřešení výstupních objektů	SŽDC	872 988,28	872 988,27			872 988,27
SO	34-15-02	Žst. Karviná, úprava zastřešení nástupišť	SŽDC	15 817 685,87	15 817 685,89			15 817 685,89
E.2.3		Individuální protihluková opatření						
SO	31-15-03	Český Těšín - Louky nad Olší, individuální protihluková opatření	OSTATNÍ	286 705,69	286 705,69			286 705,69
SO	34-15-06	Žst. Karviná, individuální protihluková opatření	OSTATNÍ	394 640,00	394 640,00			394 640,00
E.3		Trakční a energetická zařízení						
E.3.1		Trakční vedení						
SO	31-01-01	Český Těšín - Louky nad Olší, trakční vedení	SŽDC	87 106 087,55	87 106 087,55			87 106 087,55
SO	31-01-03	Český Těšín - Louky nad Olší, zavěšení kabelu 22kV	SŽDC	895 484,06	895 484,06			895 484,06
SO	31-01-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, připojení SpS na TV	SŽDC	21 000 442,48	21 000 442,48			21 000 442,48
SO	32-01-01	Žst. Louky nad Olší, trakční vedení	SŽDC	45 419 036,74	45 419 036,75			45 419 036,75
SO	32-01-04	Žst. Louky nad Olší, zavěšení kabelu 22kV	SŽDC	363 119,94	363 119,95			363 119,95
SO	33-01-01	Louky nad Olší - Karviná, trakční vedení	SŽDC	3 987 978,57	3 987 978,57			3 987 978,57

SO	33-01-03	Louky nad Olší - Karviná, zavěšení kabelu 22kV	SŽDC	445 401,11	445 401,11		445 401,11
SO	34-01-01	Žst. Karviná, trakční vedení	SŽDC	48 865 687,21	48 865 687,21		48 865 687,21
SO	34-01-03	Žst. Karviná, zavěšení kabelu 22kV	SŽDC	640 259,07	640 259,07		640 259,07
SO	35-01-01	Karviná - Dětmarovice, trakční vedení	SŽDC	64 569 300,69	64 569 300,70		64 569 300,70
SO	35-01-03	Karviná - Dětmarovice, zavěšení kabelu 22kV	SŽDC	749 296,24	749 296,24		749 296,24
SO	36-01-01	Žst. Dětmarovice, úprava trakčního vedení	SŽDC	3 779 064,01	3 779 064,01		3 779 064,01
SO	36-01-03	Žst. Dětmarovice, zavěšení kabelu 22kV	SŽDC	224 313,81	224 313,81		224 313,81
SO	50-01-01	Český Těšín - Dětmarovice, převěšení ZOK na nové trakční podpěry	SŽDC	607 781,42	607 781,42		607 781,42
E.3.2		Napájecí stanice (měnirna, transformovna) - stavební část					
SO	31-15-04	Český Těšín - Louky nad Olší, trafostanice Chotěbuz	SŽDC	1 585 574,38	1 585 574,38		1 585 574,38
SO	35-15-03	Karviná - Dětmarovice, trafostanice Koukolná	SŽDC	987 524,61	987 524,61		987 524,61
E.3.3		Spínací stanice - stavební část					
SO	31-15-05	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, spínací stanice	SŽDC	2 751 132,93	2 826 406,04		2 826 406,04
E.3.4		Ohřev výměn (EOV)					
SO	31-06-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, EOV	SŽDC	1 798 619,45	1 798 619,45		1 798 619,45
SO	32-06-01	Žst. Louky nad Olší, EOV	SŽDC	5 266 256,83	5 266 256,83		5 266 256,83
SO	34-06-01	Žst. Karviná, EOV	SŽDC	6 237 546,02	6 237 546,02		6 237 546,02
SO	35-06-01	Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, EOV	SŽDC	1 650 756,98	1 650 756,98		1 650 756,98
SO	36-06-01	Žst. Dětmarovice, úprava EOV	SŽDC	2 419 727,73	2 560 222,66		2 560 222,66
SO	50-06-01	Český Těšín - Dětmarovice, Odb. Závada, úprava EOV	SŽDC	282 750,36	282 750,36		282 750,36
E.3.6		Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání ovladačů					
SO	31-04-01	Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky kabelu 6 kV	SŽDC	3 016 826,19	3 016 826,19		3 016 826,19
SO	31-06-02	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava venkovního osvětlení	SŽDC	1 585 127,42	1 585 127,42		1 585 127,42
SO	31-06-03	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava osvětlení podchodu a nástupišť	SŽDC	2 068 324,29	2 068 324,29		2 068 324,29
SO	31-06-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava rozvodů nn	SŽDC	294 896,96	294 896,97		294 896,97
SO	31-06-05	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, DOÚO a ON 50	SŽDC	1 467 541,07	1 467 541,07		1 467 541,07
SO	31-06-06	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC	SŽDC	637 619,32	637 619,32		637 619,32
SO	31-12-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Chotěbuz, závěsný kabel 22kV	SŽDC	7 862 392,77	7 862 392,77		7 862 392,77
SO	31-12-02	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Chotěbuz - Louky nad Olší, závěsný kabel 22kV	SŽDC	2 547 803,62	2 547 803,62		2 547 803,62
SO	32-06-02	Žst. Louky nad Olší, úprava venkovního osvětlení	SŽDC	6 009 988,03	6 009 988,03		6 009 988,03
SO	32-06-03	Žst. Louky nad Olší, osvětlení podchodu a nástupišť	SŽDC	1 682 361,83	1 682 361,83		1 682 361,83
SO	32-06-04	Žst. Louky nad Olší, úprava rozvodů nn	SŽDC	706 055,88	706 055,88		706 055,88
SO	32-06-05	Žst. Louky nad Olší, DOÚO	SŽDC	3 477 001,70	3 477 001,70		3 477 001,70
SO	32-06-06	Žst. Louky nad Olší, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC	SŽDC	1 880 611,13	1 880 611,13		1 880 611,13
SO	33-04-01	Louky nad Olší - Karviná, přeložky kabelu 6kV	SŽDC	2 504 020,58	2 504 020,58		2 504 020,58
SO	33-06-01	Louky nad Olší - Karviná, úprava rozvodů nn	SŽDC	454 318,12	454 318,12		454 318,12
SO	33-06-02	Louky nad Olší - Karviná, úprava DOÚO	SŽDC	3 161 524,02	3 161 524,02		3 161 524,02
SO	33-12-01	Louky nad Olší - Karviná, závěsný kabel 22kV	SŽDC	4 316 854,75	4 316 854,75		4 316 854,75
SO	34-06-02	Žst. Karviná, úprava venkovního osvětlení	SŽDC	5 937 631,93	5 937 631,93		5 937 631,93
SO	34-06-03	Žst. Karviná, úprava osvětlení podchodu a nástupišť	SŽDC	9 489 679,74	9 708 428,14		9 708 428,14
SO	34-06-04	Žst. Karviná, úprava rozvodů nn	SŽDC	3 353 196,22	3 353 196,24		3 353 196,24
SO	34-06-05	Žst. Karviná, DOÚO	SŽDC	2 326 264,10	2 326 264,10		2 326 264,10
SO	34-06-06	Žst. Karviná, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC	SŽDC	2 271 612,06	2 271 612,06		2 271 612,06
SO	35-04-01	Karviná - Dětmarovice, přeložky kabelu 6kV	SŽDC	1 074 291,85	1 074 291,86		1 074 291,86
SO	35-06-02	Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, úprava rozvodů nn a osvětlení	SŽDC	777 055,06	777 055,06		777 055,06
SO	35-06-03	Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC	SŽDC	443 881,67	443 881,67		443 881,67
SO	35-12-01	Karviná - Dětmarovice, závěsný kabel 22kV	SŽDC	8 334 547,74	8 334 547,74		8 334 547,74
SO	36-06-02	Žst. Dětmarovice, přeložky rozvodů nn a osvětlení	SŽDC	2 275 567,86	2 275 567,86		2 275 567,86
SO	36-06-03	Žst. Dětmarovice, úprava DOÚO	SŽDC	868 398,21	868 398,21		868 398,21
E.3.7		Ukolejnění kovových konstrukcí					
SO	31-01-02	Český Těšín - Louky nad Olší, ukolejnění	SŽDC	3 227 104,89	3 227 104,89		3 227 104,89
SO	32-01-02	Žst. Louky nad Olší, ukolejnění	SŽDC	858 668,09	858 668,09		858 668,09
SO	33-01-02	Louky nad Olší - Karviná, ukolejnění	SŽDC	2 470 419,54	2 470 419,54		2 470 419,54
SO	34-01-02	Žst. Karviná, ukolejnění	SŽDC	937 127,98	937 127,98		937 127,98
SO	35-01-02	Karviná - Dětmarovice, ukolejnění	SŽDC	3 256 063,98	3 256 063,98		3 256 063,98
SO	36-01-02	Žst. Dětmarovice, ukolejnění	SŽDC	1 056 506,61	1 056 506,61		1 056 506,61
E.3.8		Vnější uzemnění .					
SO	31-06-07	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	SŽDC	286 034,42	286 034,42		286 034,42
SO	31-06-08	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, uzemnění SpS	SŽDC	172 266,60	172 266,60		172 266,60

SO	32-06-08	Žst. Louky nad Olší, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	SŽDC	210 434,72	210 434,72		210 434,72
SO	33-06-03	Louky nad Olší - Karviná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	SŽDC	283 457,53	283 457,53		283 457,53
SO	34-06-07	Žst. Karviná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	SŽDC	283 559,97	283 559,97		283 559,97
SO	35-06-04	Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	SŽDC	182 479,48	182 479,48		182 479,48
E.3.9		Přeložky silnoproudých zařízení					
SO	31-06-41	Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu nn v km 320,948 - NENACEŇOVAT práce hrazeny	OSTATNÍ	0,00	0,00		0,00
SO	31-06-42	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava veřejného osvětlení obce	SŽDC	310 221,97	310 221,97		310 221,97
SO	31-06-43	Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu nn v km 323,783 - NENACEŇOVAT práce hrazeny	OSTATNÍ	0,00	0,00		0,00
SO	31-06-44	Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu nn v km 324,203 - NENACEŇOVAT práce hrazeny	OSTATNÍ	0,00	0,00		0,00
SO	31-06-45	Český Těšín - Louky nad Olší, Zast. Chotěbuz, přeložky silnoproudých rozvodů ČD	SŽDC	152 963,44	152 963,44		152 963,44
SO	32-06-41	Žst. Louky nad Olší, přeložky silnoproudých rozvodů ČD	OSTATNÍ	124 914,32	124 914,32		124 914,32
SO	34-06-41	Žst. Karviná, přeložky silnoproudých rozvodů ČD	OSTATNÍ	499 174,49	499 172,55		499 172,55
SO	34-12-41	Žst. Karviná, přeložka kabelu 22kV ČEZ v km 333,346; - NENACEŇOVAT práce hrazeny	OSTATNÍ	0,00	0,00		0,00
SO	34-12-42	Žst. Karviná, úprava kabelů 22kV ČEZ v km 333,830; - NENACEŇOVAT práce hrazeny	OSTATNÍ	0,00	0,00		0,00
SO	35-06-41	Karviná - Dětmarovice, přeložka kabelu nn ČEZ v km 337,720; - NENACEŇOVAT práce hrazeny	OSTATNÍ	0,00	0,00		0,00
SO	35-12-41	Karviná - Dětmarovice, přeložka kabelu 22kV ČEZ v km 335,755; - NENACEŇOVAT práce hrazeny	OSTATNÍ	0,00	0,00		0,00
E.3.10		Přeložky a ochrany sdělovacích vedení					
SO	31-10-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úpravy a přeložky DK SŽDC	SŽDC	2 226 826,30	2 226 826,30		2 226 826,30
SO	31-10-02	Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; - NENACEŇOVAT práce hrazeny	OSTATNÍ	0,00	0,00		0,00
SO	32-10-01	Žst. Louky nad Olší, úpravy a přeložky DK SŽDC	SŽDC	426 810,77	426 810,77		426 810,77
SO	32-10-02	Žst. Louky nad Olší, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; - NENACEŇOVAT práce hrazeny	OSTATNÍ	0,00	0,00		0,00
SO	34-10-01	Žst. Karviná, úpravy a přeložky DK SŽDC	SŽDC	36 047,16	36 047,16		36 047,16
SO	34-10-02	Žst. Karviná, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; - NENACEŇOVAT práce hrazeny	OSTATNÍ	0,00	0,00		0,00
SO	35-10-01	Karviná - Dětmarovice, úpravy a přeložky DK a TK SŽDC	SŽDC	1 473 776,10	1 473 776,10		1 473 776,10
SO	35-10-02	Karviná - Dětmarovice, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; - NENACEŇOVAT práce hrazeny	OSTATNÍ	0,00	0,00		0,00
SO	36-10-01	Žst. Dětmarovice, přeložky a ochrany MK	SŽDC	140 474,22	140 474,22		140 474,22
SO	36-10-02	Žst. Dětmarovice, přeložka rozhlasu pro cestující	SŽDC	131 502,20	131 502,20		131 502,20
SO	36-10-03	Žst. Dětmarovice, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců	OSTATNÍ	21 264,37	21 264,37		21 264,37
SO	50-10-01	Český Těšín - Dětmarovice, úsek Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu ČD-T	OSTATNÍ	5 267 873,42	5 267 873,42		5 267 873,42
SO	50-10-02	Český Těšín - Dětmarovice, úsek Louky nad Olší - Karviná, přeložka ZOK ČD-T, montáž	OSTATNÍ	449 842,89	449 842,89		449 842,89
SO	50-10-03	Český Těšín - Dětmarovice, úsek Karviná - Dětmarovice, přeložka kabelu ČD-T	OSTATNÍ	7 630 450,90	7 630 450,90		7 630 450,90
D.		TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
D.1		Železniční zabezpečovací zařízení					
D.1.1		Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)					
PS	32-28-01	Žst. Louky nad Olší, staniční zabezpečovací zařízení	SŽDC	135 232 595,13	153 165 388,43		153 165 388,43
PS	32-28-02	Žst. Louky nad Olší, traťové zabezpečovací zařízení Louky nad Olší – Darkov	SŽDC	4 997 572,10	4 997 572,11		4 997 572,11
PS	34-28-01	Žst. Karviná, staniční zabezpečovací zařízení	SŽDC	94 147 732,73	94 147 732,73		94 147 732,73
PS	36-28-01	Žst. Dětmarovice, úprava zabezpečovacího zařízení	SŽDC	23 867 507,21	23 867 507,21		23 867 507,21
D.1.2		Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)					0,00
PS	31-28-01	Český Těšín – Louky nad Olší, úprava traťového zabezpečovacího zařízení	SŽDC	3 236 831,79	3 236 831,79		3 236 831,79
PS	31-28-02	Český Těšín – Louky nad Olší, odb. Chotěbuz, úprava zabezpečovacího zařízení	SŽDC	1 444 123,17	1 444 123,17		1 444 123,17
PS	33-28-01	Louky nad Olší - Karviná, traťové zabezpečovací zařízení	SŽDC	29 975 474,91	29 975 474,90		29 975 474,90
PS	35-28-01	Karviná - Dětmarovice, traťové zabezpečovací zařízení	SŽDC	24 781 620,76	24 781 620,76		24 781 620,76
D.2		Železniční sdělovací zařízení					
D.2.1		Místní kabelizace					
PS	31-14-03	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, místní kabelizace	SŽDC	440 307,45	440 307,45		440 307,45
PS	32-14-01	Žst. Louky nad Olší, místní kabelizace	SŽDC	3 724 554,93	3 724 554,93		3 724 554,93
PS	34-14-01	Žst. Karviná, místní kabelizace	SŽDC	3 184 193,53	3 184 193,53		3 184 193,53
PS	36-14-01	Žst. Dětmarovice, místní optický kabel	SŽDC	171 484,53	171 484,53		171 484,53
D.2.2		Rozhlasové zařízení					
PS	31-14-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rozhlasové zařízení	SŽDC	497 070,57	497 070,57		497 070,57
PS	32-14-02	Žst. Louky nad Olší, rozhlasové zařízení	SŽDC	320 290,51	320 290,51		320 290,51
PS	34-14-02	Žst. Karviná, rozhlasové zařízení	SŽDC	511 646,81	511 646,81		511 646,81
D.2.3		Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)					
PS	31-14-08	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, dispoziční zapojovač	SŽDC	204 222,50	204 222,50		204 222,50
PS	31-14-09	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, sdělovací zařízení	SŽDC	179 882,25	179 882,25		179 882,25
PS	31-14-10	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, sdělovací zařízení	SŽDC	34 722,12	34 722,12		34 722,12
PS	32-14-06	Žst. Louky nad Olší, dispoziční zapojovač	SŽDC	987 454,51	987 454,51		987 454,51
PS	32-14-07	Žst. Louky nad Olší, sdělovací zařízení	SŽDC	254 476,23	254 476,23		254 476,23

PS	34-14-06	Žst. Karviná, dispoziční zapojovač	SŽDC	2 124 013,94	2 124 013,94		2 124 013,94
PS	34-14-07	Žst. Karviná, sdělovací zařízení	SŽDC	655 609,32	655 609,32		655 609,32
PS	50-14-03	Český Těšín - Dětmárovice, přenosový systém	SŽDC	5 033 582,27	5 033 582,27		5 033 582,27
PS	50-14-04	Český Těšín - Dětmárovice, dispečerské spoje	SŽDC	251 951,21	251 951,21		251 951,21
D.2.4		Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)					
PS	31-14-06	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, ASHS	SŽDC	536 291,31	536 291,31		536 291,31
PS	31-14-07	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, EZS	SŽDC	415 379,34	415 379,34		415 379,34
PS	31-14-11	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, EPS	SŽDC	37 694,98	37 694,98		37 694,98
PS	31-14-12	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, EZS	SŽDC	148 997,95	148 997,95		148 997,95
PS	32-14-04	Žst. Louky nad Olší, ASHS	SŽDC	501 945,29	501 945,29		501 945,29
PS	32-14-05	Žst. Louky nad Olší, EZS	SŽDC	367 898,09	367 898,09		367 898,09
PS	34-14-04	Žst. Karviná, ASHS	SŽDC	732 450,88	732 450,88		732 450,88
PS	34-14-05	Žst. Karviná, EZS	SŽDC	310 324,74	310 324,74		310 324,74
D.2.5		Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)					
PS	31-14-01	Český Těšín - Louky nad Olší, traťový kabel	SŽDC	529 582,40	529 582,40		529 582,40
PS	33-14-01	Louky nad Olší - Karviná, traťový kabel	SŽDC	9 577 562,94	9 577 562,94		9 577 562,94
PS	35-14-01	Karviná - Dětmárovice, traťový kabel	SŽDC	5 736 719,60	5 736 719,60		5 736 719,60
PS	50-14-01	Český Těšín - Dětmárovice, úsek Český Těšín - Karviná, diagnostický optický kabel	SŽDC	2 075 118,99	2 075 118,99		2 075 118,99
PS	50-14-02	Český Těšín - Dětmárovice, úsek Karviná - Dětmárovice, diagnostický optický kabel	SŽDC	1 863 524,07	1 863 524,07		1 863 524,07
D.2.6		Zapojení dálkového kabelu (DK), dálkového optického kabelu (DOK) a závěsného optického kabelu (ZOK) do provozu					
PS	31-14-02	Český Těšín - Louky nad Olší, zapojení TK do provozu	SŽDC	86 149,36	86 149,36		86 149,36
PS	33-14-02	Louky nad Olší - Karviná, zapojení TK do provozu	SŽDC	172 141,84	172 141,84		172 141,84
PS	35-14-02	Karviná - Dětmárovice, zapojení TK do provozu	SŽDC	287 844,51	287 844,51		287 844,51
D.2.7		Informační systém pro cestující					
PS	31-14-05	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, informační zařízení	SŽDC	2 204 667,27	2 204 667,27		2 204 667,27
PS	32-14-03	Žst. Louky nad Olší, informační zařízení	SŽDC	1 067 243,56	1 067 243,56		1 067 243,56
PS	34-14-03	Žst. Karviná, informační zařízení	SŽDC	4 943 022,21	4 943 022,21		4 943 022,21
D.2.8		Traťové rádiové spojení					
PS	50-14-05	Český Těšín - Dětmárovice, TRS	SŽDC	1 835 757,31	1 835 757,31		1 835 757,31
D.3		Sílnoproudá technologie včetně DŘT					
D.3.1.		Dispečerská řídicí technika (DŘT) a dálková diagnostika technologických systémů žel. dopravní cesty					
D.3.1.1		Dispečerská řídicí technika (DŘT)					
PS	31-05-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz - zařízení DŘT	SŽDC	446 969,57	446 969,57		446 969,57
PS	31-05-03	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - zařízení DŘT	SŽDC	845 511,97	845 511,97		845 511,97
PS	31-05-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - místní řídicí systém	SŽDC	837 817,09	837 817,09		837 817,09
PS	32-05-01	Žst. Louky nad Olší, zařízení DŘT	SŽDC	900 583,93	900 583,93		900 583,93
PS	34-05-01	Žst. Karviná, zařízení DŘT	SŽDC	1 001 422,87	1 001 422,87		1 001 422,87
PS	35-05-01	Karviná - Dětmárovice, Odb. Koukolná - zařízení DŘT	SŽDC	779 921,89	779 921,89		779 921,89
PS	36-05-01	Žst. Dětmárovice, TM Dětmárovice - úprava DŘT a MŘS	SŽDC	4 841 356,93	4 841 356,93		4 841 356,93
PS	50-05-01	Doplnění DŘT a řídicího systému na ED Ostrava	SŽDC	2 203 465,30	2 203 465,30		2 203 465,30
PS	50-05-03	Český Těšín - Dětmárovice, TM Český Těšín, NS 22kV - úprava DŘT a MŘS	SŽDC	37 883,56	37 883,56		37 883,56
D.3.1.2		Dálková diagnostika technologických systémů žel. dopravní cesty					
PS	31-05-02	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, dálková diagnostika TS ŽDC	SŽDC	937 100,01	937 100,01		937 100,01
PS	32-05-04	Žst. Louky nad Olší, dálková diagnostika TS ŽDC	SŽDC	851 403,42	851 403,42		851 403,42
PS	34-05-02	Žst. Karviná, dálková diagnostika TS ŽDC	SŽDC	865 121,49	865 121,49		865 121,49
PS	35-05-02	Karviná - Dětmárovice, úsek Koukolná - Dětmárovice, dálková diagnostika TS ŽDC	SŽDC	768 990,51	768 990,51		768 990,51
PS	36-05-02	Žst. Dětmárovice, dálková diagnostika TS ŽDC	SŽDC	823 819,06	823 819,06		823 819,06
PS	50-05-04	Doplnění DD TS ŽDC a řídicího systému na ED ČD Ostrava	SŽDC	775 736,92	775 736,92		775 736,92
D.3.3		Sílnoproudá technologie trakčních napájecích stanic					
PS	36-09-01	Žst. Dětmárovice, TM - technologie - úprava vazby napáječů	SŽDC	729 808,46	729 808,46		729 808,46
D.3.4		Sílnoproudá technologie trakčních spínacích stanic					
PS	31-09-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - stejnosměrná část 3kV DC	SŽDC	12 343 523,43	12 343 523,43		12 343 523,43
PS	31-09-02	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - vlastní spotřeba	SŽDC	1 126 833,59	1 126 833,59		1 126 833,59
PS	31-09-03	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - systém kontroly a řízení	SŽDC	2 955 056,35	2 955 056,35		2 955 056,35
PS	31-09-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - vazba napáječů	SŽDC	989 663,38	989 663,38		989 663,38
D.3.5		Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)					
PS	31-13-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, TS 2021 22/0,4kV	SŽDC	2 829 755,29	2 829 755,29		2 829 755,29
PS	32-13-01	Žst. Louky nad Olší, TS 2022 22/0,4kV	SŽDC	3 412 227,75	3 412 227,75		3 412 227,75
PS	33-13-01	Louky nad Olší - Karviná, TS 2023 22/0,4kV	SŽDC	2 063 500,02	2 063 500,02		2 063 500,02

PS	34-13-01	Žst. Karviná, TS 2024 22/0,4kV	SŽDC	3 565 150,88	3 565 150,88			3 565 150,88
PS	35-13-01	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, TS 2025 22/0,4kV	SŽDC	1 560 964,33	1 560 964,33			1 560 964,33
PS	36-13-01	Žst. Dětmorovice, měnírna Dětmorovice, NS 2030 22kV	SŽDC	3 908 155,79	3 908 155,79			3 908 155,79
PS	36-13-02	Žst. Dětmorovice, měnírna Dětmorovice, transformátor 22/0,4kV pro napájení EOV	SŽDC	611 075,30	611 075,30			611 075,30
D.3.6		Sílnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zab. zařízení (NTS, STS, TTS)						
PS	36-08-01	Žst. Dětmorovice, měnírna Dětmorovice, úprava NS 6kV	SŽDC	2 452 470,21	2 452 470,21			2 452 470,21
D.3.7		Provozní rozvod sílnoproudu						
PS	31-07-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rozvodna nn	SŽDC	2 370 961,04	2 370 961,04			2 370 961,04
PS	32-07-01	Žst. Louky nad Olší, rozvodna nn	SŽDC	2 468 040,84	2 468 040,84			2 468 040,84
PS	34-07-01	Žst. Karviná, rozvodna nn	SŽDC	2 030 779,72	2 030 779,72			2 030 779,72
PS	34-07-02	Žst. Karviná, úprava rozvodny nn ve VB	SŽDC	228 163,92	228 163,92			228 163,92
PS	35-07-01	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, rozvodna nn	SŽDC	1 352 805,38	1 352 805,38			1 352 805,38
D.4		Ostatní technologická zařízení						
D.4.1		Osobní výtahy, schodišťové výtahy			0,00			0,00
PS	31-29-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, technologie výtahů	SŽDC	1 025 580,22	1 025 580,22			1 025 580,22
PS	32-29-01	Žst. Louky nad Olší, technologie výtahů	SŽDC	1 025 580,22	1 025 580,22			1 025 580,22
PS	34-29-01	Žst. Karviná, technologie výtahů	SŽDC	1 506 301,01	1 506 301,01			1 506 301,01
X.		VŠEOBECNÁ ČÁST						
SO	98-98	Všeobecné položky/objekt	SŽDC	12 064 430,70	12 064 430,70			12 064 430,70
CENA CELKEM bez DPH				2 021 305 373,71	2 057 235 821,41	5 167 751,81	768 393,18	2 061 635 180,04

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018											
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
1		TECHNOLOGICKÁ ČÁST	10.9. 17	25.7. 19	TECHNOLOGICKÁ ČÁST											
2		Železniční zabezpečovací zařízení	13.9. 17	25.7. 19	Železniční zabezpečovací zařízení											
3		Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	13.9. 17	23.11. 18	Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)											
4	32-28-01	Žst. Louky nad Olší, staniční zabezpečovací zařízení	15.10. 17	23.11. 18	Žst. Louky nad Olší, staniční zabezpečovací zařízení											
5		kabelové trasy , kabelizace + provizorní	15.10. 17	31.8. 18	kabelové trasy , kabelizace + provizorní 31.8.											
6		montáž, zapojení funkční zkoušky aktivace prov. ZZ	15.12. 17	25.5. 18	2. montáž, zapojení funkční zkoušky aktivace prov. ZZ 25.5.											
7		1-stavební postup TBZ	12.7. 18	12.7. 18	1-stavební postup TBZ 12.7. ◆ 12.7.											
8		montáž ZZ do nové budovy	1.5. 18	31.8. 18	1.5. montáž ZZ do nové budovy 31.8.											
9		aktivace, funkční zkoušky def ZZ	31.8. 18	30.10. 18	31.8. aktivace, funkční zkoušky def ZZ 30.10.											
10		Definitivní ZZ - aktivace 1. část	15.11. 18	15.11. 18	15.11. Definitivní ZZ - aktivace 1. část 15.11. ◆ 15.11.											
11		Definitivní ZZ - aktivace výh. 23 - konečná TBZ	23.11. 18	23.11. 18	23.11. Definitivní ZZ - aktivace výh. 23 - konečná TBZ 23.11. ◆ 23.11.											
12	32-28-02	Žst. Louky nad Olší, traťové zabezpečovací zařízení Louky nad Olší – Darkov	1.4. 18	15.11. 18	Žst. Louky nad Olší, traťové zabezpečovací zařízení Louky nad Olší – Darkov											
13		kabelové trasy , kabelizace	1.4. 18	31.8. 18	1.4. kabelové trasy , kabelizace 31.8.											
14		2-stavební postup realizace	31.8. 18	15.11. 18	31.8. 2-stavební postup realizace 15.11.											
15		2-stavební postup realizace TBZ	15.11. 18	15.11. 18	15.11. 2-stavební postup realizace TBZ 15.11. ◆ 15.11.											

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018											
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
16	34-28-01	Žst. Karviná, staniční zabezpečovací zařízení	15.9. 17	25.10. 18	Žst. Karviná, staniční zabezpečovací zařízení 25.10.											
17		kabelové trasy , kabelizace	15.9. 17	15.5. 18	kabelové trasy , kabelizace 15.5.											
18		montáž ZZ do nové budovy	15.12. 17	31.5. 18	2. montáž ZZ do nové budovy 31.5.											
20		aktivace, funkční zkoušky	31.3. 18	4.7. 18	aktivace, funkční zkoušky 31.3. 4.7.											
21		aktivace	20.6. 18	4.7. 18	aktivace 20.6. 4.7.											
22		2-stavební postup realizace TBZ	4.7. 18	4.7. 18	2-stavební postup realizace TBZ 4.7. 4.7.											
23		montáž ZZ vjezdové výhybky + vlečka CECOMET	21.7. 18	24.7. 18	montáž ZZ vjezdové výhybky + vlečka CECOMET 21.7. 24.7.											
24		3-stavební postup realizace TBZ	30.7. 18	30.7. 18	3-stavební postup realizace TBZ 30.7. 30.7.											
25		montáž a aktivace sudá sk. kolejí	24.9. 18	4.10. 18	montáž a aktivace sudá sk. kolejí 24.9. 4.10.											
26		3-stavební postup realizace TBZ	25.10. 18	25.10. 18	3-stavební postup realizace TBZ 25.10. 25.10.											
34		Trat'ové zabezpečovací zařízení (TZZ)	15.9. 17	25.7. 19	Trat'ové zabezpečovací zařízení (TZZ)											
35	31-28-01	Český Těšín – Louky nad Olší, úprava trat'ového zabezpečovacího zařízení	15.1. 18	22.12. 18	Český Těšín – Louky nad Olší, úprava trat'ového zabezpečovacího zařízení 15.1. 22.12.											
36		kabelizace, trasy, spojování, vybavení přejezdů apod	15.1. 18	15.6. 18	kabelizace, trasy, spojování, vybavení přejezdů apod 15.1. 15.6.											
37		1-stavební postup aktivace	15.6. 18	22.6. 18	1-stavební postup aktivace 15.6. 22.6.											
38		1-stavební postup TBZ	12.7. 18	12.7. 18	1-stavební postup TBZ 12.7. 12.7.											

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018															
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden		
39		2-stavební postup realizace	20.9. 18	2.10. 18																2-stavební postup realizace 20.9. 2.10.
40		2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT	20.9. 18	2.10. 18																2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT 20.9. 2.10.
41		2-stavební postup TBZ	15.10. 18	15.10. 18																2-stavební postup TBZ 15.10. 15.10.
42		dokončovací práce, def. úprava	15.10. 18	22.12. 18																dokončovací práce, def. úprava 15.10. 22.12.
43	31-28-02	Český Těšín – Louky nad Olší, odb. Chotěbuz, úprava zabezpečovacího zařízení	1.3. 18	15.12. 18																Český Těšín – Louky nad Olší, odb. Chotěbuz, úprava zabezpečovacího zařízení 1.3. 15.12.
44		kabelizace, trasy, spojování, vybavení přejezdů apod	1.3. 18	31.5. 18																kabelizace, trasy, spojování, vybavení přejezdů apod 1.3. 31.5.
45		2-stavební postup realizace	22.9. 18	30.9. 18																2-stavební postup realizace 22.9. 30.9.
46		2-stavební postup TBZ	15.10. 18	15.10. 18																2-stavební postup TBZ 15.10. 15.10.
47		dokončovací práce, def. úprava	15.10. 18	15.12. 18																dokončovací práce, def. úprava 15.10. 15.12.
48	33-28-01	Louky nad Olší - Karviná, traťové zabezpečovací zařízení	15.5. 18	30.4. 19																Louky nad Olší - Karviná, traťové zabezpečovací 15.5.
49		kabelizace, trasy, spojování, vybavení přejezdů apod	15.5. 18	15.11. 18																kabelizace, trasy, spojování, vybavení přejezdů apod 15.5. 15.11.
50		aktivace nového AB	20.11. 18	27.11. 18																aktivace nového AB 20.11. 27.11.
52		dokončovací práce, def. úprava	29.11. 18	15.12. 18																dokončovací práce, def. úprava 29.11. 15.12.
53	35-28-01	Karviná - Dětmarovice, traťové zabezpečovací zařízení	15.9. 17	25.7. 19																Karviná - Dětmarovice, traťové zabezpečovací zařízení
55		kabelizace, trasy, spojování, apod	15.9. 17	1.7. 19																kabelizace, trasy, spojování, apod



Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice realizační HMG na rok 2018 - aktualizace k 20.5.2018

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018														
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec		
56		1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK	26.6. 18	4.7. 18															1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK 26.6. █ 4.7.
57		1-stavební postup TBZ	4.7. 18	4.7. 18															1-stavební postup TBZ 4.7. ◆ 4.7.
58		2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmarovice TK1	13.8. 18	20.8. 18															2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmarovice TK1 13.8. █ 20.8.
59		2-stavební postup TBZ	30.8. 18	30.8. 18															2-stavební postup TBZ 30.8. ◆ 30.8.
60		3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2	1.12. 18	7.12. 18															3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2 1.12. █ 7.12.
61		3-stavební postup TBZ	7.12. 18	7.12. 18															3-stavební postup TBZ 7.12. ◆ 7.12.
64		Železniční sdělovací zařízení	10.9. 17	25.7. 19															Železniční sdělovací zařízení
65		Místní kabelizace	15.10. 17	7.12. 18															Místní kabelizace
66	31-14-03	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, místní kabelizace	15.11. 17	7.12. 18															Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, místní kabelizace
67		kabelizace, trasy, spojování, vybavení přejezdů apod	15.11. 17	15.6. 18															kabelizace, trasy, spojování, vybavení přejezdů apod 15.6.
68		aktivace 1SP	2.7. 18	9.7. 18															aktivace 1SP 2.7. █ 9.7.
69		1-stavební postup TBZ	12.7. 18	12.7. 18															1-stavební postup TBZ 12.7. ◆ 12.7.
70		aktivace 2SP	25.9. 18	2.10. 18															aktivace 2SP 25.9. █ 2.10.
71		2-stavební postup TBZ	15.10. 18	15.10. 18															2-stavební postup TBZ 15.10. ◆ 15.10.
72		dokončovací práce, def. úprava	7.9. 18	7.12. 18															dokončovací práce, def. úprava 7.9. █ 7.12.

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018											
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
73	32-14-01	Žst. Louky nad Olší, místní kabelizace	15.11. 17	7.12. 18	Žst. Louky nad Olší, místní kabelizace											
74		kabelové trasy , kabelizace	15.11. 17	15.5. 18	kabelové trasy , kabelizace 15.5.											
75		aktivace	15.5. 18	15.11. 18	aktivace 15.5. 15.11.											
76		TBZ	15.11. 18	15.11. 18	TBZ 15.11. 15.11.											
77		dokončovací práce	30.10. 18	7.12. 18	dokončovací práce 30.10. 7.12.											
78	34-14-01	Žst. Karviná, místní kabelizace	15.10. 17	15.11. 18	Žst. Karviná, místní kabelizace											
79		kabelové trasy , kabelizace	15.10. 17	15.6. 18	kabelové trasy , kabelizace 15.6.											
80		aktivace	20.6. 18	4.7. 18	aktivace 20.6. 4.7.											
81		TBZ	4.7. 18	4.7. 18	TBZ 4.7. 4.7.											
82		dokončovací práce	4.7. 18	15.11. 18	dokončovací práce 4.7. 15.11.											
86		Rozhlasové zařízení	16.3. 18	15.11. 18	Rozhlasové zařízení 16.3. 15.11.											
87	31-14-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rozhlasové zařízení	7.4. 18	15.10. 18	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rozhlasové zařízení 7.4. 15.10.											
88		Demnotáže, montáže, kabelizace, výkopy	7.4. 18	20.9. 18	Demnotáže, montáže, kabelizace, výkopy 7.4. 20.9.											
89		1-stavební postup TBZ	12.7. 18	12.7. 18	12.7.											
90		2-stavební postup TBZ	15.10. 18	15.10. 18	2-stavební postup TBZ 15.10. 15.10.											

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018												
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
91	32-14-02	Žst. Louky nad Olší, rozhlasové zařízení	7.4. 18	15.11. 18							7.4.	Žst. Louky nad Olší, rozhlasové zařízení					15.11.
92		Demnotáže, montáže, kabelizace, výkopy	7.4. 18	15.11. 18							7.4.	Demnotáže, montáže, kabelizace, výkopy					15.11.
93		TBZ	15.11. 18	15.11. 18													TBZ 15.11. ◆ 15.11.
94	34-14-02	Žst. Karviná, rozhlasové zařízení	16.3. 18	25.10. 18							16.3.	Žst. Karviná, rozhlasové zařízení					25.10.
95		Demnotáže, montáže, kabelizace, výkopy	16.3. 18	4.10. 18							16.3.	Demnotáže, montáže, kabelizace, výkopy					4.10.
96		TBZ lichá	4.7. 18	4.7. 18													◆ 4.7.
97		TBZ sudá	25.10. 18	25.10. 18													TBZ sudá 25.10. ◆ 25.10.
98		Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)	15.2. 18	25.7. 19							15.2.	Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)					
99	31-14-08	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, dispoziční zapojovač	7.4. 18	15.10. 18							7.4.	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, dispoziční zapojovač					15.10.
100		montáže, kabelizace, výkopy	7.4. 18	2.10. 18							7.4.	montáže, kabelizace, výkopy					2.10.
101		1-stavební postup TBZ	12.7. 18	12.7. 18													◆ 12.7.
102		2-stavební postup TBZ	15.10. 18	15.10. 18													2-stavební postup TBZ 15.10. ◆ 15.10.
103	31-14-09	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, sdělovací zařízení	7.4. 18	15.10. 18							7.4.	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, sdělovací zařízení					15.10.
104		montáže, kabelizace, výkopy	7.4. 18	2.10. 18							7.4.	montáže, kabelizace, výkopy					2.10.
105		1-stavební postup TBZ	12.7. 18	12.7. 18													◆ 12.7.

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018															
					prosince	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec			
106		2-stavební postup TBZ	15.10. 18	15.10. 18																2-stavební postup TBZ 15.10. ♦ 15.10.
107	31-14-10	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, sdělovací zařízení	7.4. 18	12.7. 18															Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, sdělovací zařízení 7.4. — 12.7.	
108		montáže, kabelizace, výkopy	7.4. 18	9.7. 18															montáže, kabelizace, výkopy 7.4. — 9.7.	
109		1-stavební postup TBZ	12.7. 18	12.7. 18															♦ 12.7.	
110	32-14-06	Žst. Louky nad Olší, dispoziční zapojovač	20.4. 18	15.11. 18															Žst. Louky nad Olší, dispoziční zapojovač 20.4. — 15.11.	
111		kabelové trasy , kabelizace	20.4. 18	30.10. 18															kabelové trasy , kabelizace 20.4. — 30.10.	
112		3-stavební postup realizace TBZ	15.11. 18	15.11. 18															3-stavební postup realizace TBZ 15.11. ♦ 15.11.	
113	32-14-07	Žst. Louky nad Olší, sdělovací zařízení	1.3. 18	15.11. 18															Žst. Louky nad Olší, sdělovací zařízení 1.3. — 15.11.	
114		kabelové trasy , kabelizace + provizorní	15.3. 18	15.11. 18															kabelové trasy , kabelizace + provizorní 15.3. — 15.11.	
115		provizorní sděl. zař.	1.3. 18	30.7. 18															provizorní sděl. zař. 1.3. — 30.7.	
116		TBZ - provizorní	30.7. 18	30.7. 18															TBZ - provizorní 30.7. ♦ 30.7.	
117		TBZ - definitivní	15.11. 18	15.11. 18															TBZ - definitivní 15.11. ♦ 15.11.	
118	34-14-06	Žst. Karviná, dispoziční zapojovač	15.2. 18	15.11. 18															Žst. Karviná, dispoziční zapojovač 15.2. — 15.11.	
119		kabelové trasy , kabelizace	15.2. 18	4.7. 18															kabelové trasy , kabelizace 15.2. — 4.7.	
120		2-stavební postup realizace TBZ	4.7. 18	4.7. 18															2-stavební postup realizace TBZ 4.7. ♦ 4.7.	

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018																	
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden				
121		dokončovací práce, def. úprava	4.7. 18	15.11. 18																		
122	34-14-07	Žst. Karviná, sdělovací zařízení	15.2. 18	6.12. 18																		
123		kabelové trasy , kabelizace	15.2. 18	15.5. 18																		
124		aktivace	20.6. 18	4.7. 18																		
125		2-stavební postup realizace TBZ	4.7. 18	4.7. 18																		
126		3-stavební postup realizace sudá skupina	25.9. 18	4.10. 18																		
127		3-stavební postup realizace TBZ	25.10. 18	25.10. 18																		
128		dokončovací práce, def. úprava	25.10. 18	6.12. 18																		
129	50-14-03	Český Těšín - Dětmarovice, přenosový systém	15.6. 18	25.7. 19																		
130		kabelové trasy , kabelizace	15.6. 18	15.12. 18																		
133	50-14-04	Český Těšín - Dětmarovice, dispečerské spoje	15.6. 18	25.7. 19																		
134		kabelové trasy , kabelizace	15.6. 18	15.12. 18																		
137		Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)	16.4. 18	15.11. 18																		
138	31-14-06	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, ASHS	15.5. 18	15.10. 18																		
139		kabelové trasy , kabelizace, montáž	15.5. 18	30.9. 18																		

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018																		
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden						
140		aktivace	25.9. 18	2.10. 18												aktivace 25.9. ■ 2.10.							
141		TBZ	15.10. 18	15.10. 18												TBZ 15.10. ◆ 15.10.							
142	31-14-07	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, EZS	1.6. 18	15.10. 18												Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, EZS 1.6. ◆ 15.10.							
143		kabelové trasy , kabelizace, montáž	1.6. 18	25.9. 18												kabelové trasy , kabelizace, montáž 1.6. ■ 25.9.							
144		aktivace	25.9. 18	1.10. 18												aktivace 25.9. ■ 1.10.							
145		TBZ	15.10. 18	15.10. 18												TBZ 15.10. ◆ 15.10.							
146	31-14-11	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, EPS	15.5. 18	15.10. 18												Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, EPS 15.5. ◆ 15.10.							
147		kabelové trasy , kabelizace, montáž	15.5. 18	25.9. 18												kabelové trasy , kabelizace, montáž 15.5. ■ 25.9.							
148		aktivace	26.9. 18	2.10. 18												aktivace 26.9. ■ 2.10.							
149		TBZ	15.10. 18	15.10. 18												TBZ 15.10. ◆ 15.10.							
150	31-14-12	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, EZS	15.5. 18	2.10. 18												Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, EZS 15.5. ◆ 2.10.							
151		kabelové trasy , kabelizace, montáž	15.5. 18	26.9. 18												kabelové trasy , kabelizace, montáž 15.5. ■ 26.9.							
152		aktivace	26.9. 18	2.10. 18												aktivace 26.9. ■ 2.10.							
153		TBZ	7.9. 18	7.9. 18												TBZ 7.9. ◆ 7.9.							
154	32-14-04	Žst. Louky nad Olší, ASHS	15.7. 18	15.11. 18												Žst. Louky nad Olší, ASHS 15.7. ◆ 15.11.							



Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice
realizační HMG na rok 2018 - aktualizace k 20.5.2018

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018														
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	
155		kabelové trasy , kabelizace	15.7. 18	30.10. 18															kabelové trasy , kabelizace 15.7. 30.10.
156		aktivace	1.11. 18	15.11. 18														aktivace 1.11. 15.11.	
157		TBZ	15.11. 18	15.11. 18														TBZ 15.11. 15.11.	
158	32-14-05	Žst. Louky nad Olší, EZS	15.7. 18	15.11. 18														Žst. Louky nad Olší, EZS 15.7. 15.11.	
159		kabelové trasy , kabelizace	15.7. 18	15.11. 18														kabelové trasy , kabelizace 15.7. 15.11.	
160		aktivace	23.10. 18	15.11. 18														aktivace 23.10. 15.11.	
161		TBZ	15.11. 18	15.11. 18														TBZ 15.11. 15.11.	
162	34-14-04	Žst. Karviná, ASHS	16.4. 18	4.7. 18														Žst. Karviná, ASHS 16.4. 4.7.	
163		kabelové trasy , kabelizace	16.4. 18	4.7. 18														kabelové trasy , kabelizace 16.4. 4.7.	
164		aktivace	20.6. 18	4.7. 18														aktivace 20.6. 4.7.	
165		TBZ	4.7. 18	4.7. 18														TBZ 4.7. 4.7.	
166	34-14-05	Žst. Karviná, EZS	16.4. 18	4.7. 18														Žst. Karviná, EZS 16.4. 4.7.	
167		kabelové trasy , kabelizace	16.4. 18	4.7. 18														kabelové trasy , kabelizace 16.4. 4.7.	
168		aktivace	20.6. 18	4.7. 18														aktivace 20.6. 4.7.	
169		TBZ	4.7. 18	4.7. 18														TBZ 4.7. 4.7.	

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018																	
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden				
170		Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)	10.9. 17	15.11. 18																		
171	31-14-01	Český Těšín - Louky nad Olší, traťový kabel	10.9. 17	15.10. 18																		
172		kabelové trasy , kabelizace	10.9. 17	20.9. 18																		
173		TBZ	15.10. 18	15.10. 18																		
174	33-14-01	Louky nad Olší - Karviná, traťový kabel	15.2. 18	15.11. 18																		
175		kabelové trasy , kabelizace	15.2. 18	15.11. 18																		
176		TBZ	15.11. 18	15.11. 18																		
177	35-14-01	Karviná - Dětmarovice, traťový kabel	10.9. 17	30.8. 18																		
178		kabelové trasy , kabelizace	10.9. 17	20.8. 18																		
179		TBZ	30.8. 18	30.8. 18																		
180	50-14-01	Český Těšín - Dětmarovice, úsek Český Těšín - Karviná, diagnostický optický kabel	15.3. 18	15.10. 18																		
181		montáž, spojky, pokládka	15.3. 18	20.9. 18																		
182		TBZ	15.10. 18	15.10. 18																		
183	50-14-02	Český Těšín - Dětmarovice, úsek Karviná - Dětmarovice, diagnostický optický kabel	15.10. 17	30.10. 18																		
184		kabelové trasy , kabelizace	15.10. 17	20.8. 18																		



Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice
realizační HMG na rok 2018 - aktualizace k 20.5.2018

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018																
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	srpen	září	říjen	listopad	prosinec					
200		TBZ 2SP	15.10. 18	15.10. 18																	TBZ 2SP 15.10. ♦ 15.10.
201	32-14-03	Žst. Louky nad Olší, informační zařízení	7.4. 18	15.11. 18																	7.4. — 15.11. Žst. Louky nad Olší, informační zařízení
202		demontáž, kabelizace, montáž zapojení	7.4. 18	15.11. 18																	7.4. — 15.11. demontáž, kabelizace, montáž zapojení
203		TBZ provizorní	30.7. 18	30.7. 18																	♦ 30.7.
204		TBZ definitivní	15.11. 18	15.11. 18																	TBZ definitivní 15.11. ♦ 15.11.
205	34-14-03	Žst. Karviná, informační zařízení	16.3. 18	25.10. 18																	16.3. — 25.10. Žst. Karviná, informační zařízení
206		demontáž, kabelizace, montáž zapojení	16.3. 18	4.10. 18																	16.3. — 4.10. demontáž, kabelizace, montáž zapojení
207		2-stavební postup realizace TBZ	4.7. 18	4.7. 18																	2-stavební postup realizace TBZ 4.7. ♦ 4.7.
208		3-stavební postup realizace TBZ	25.10. 18	25.10. 18																	3-stavební postup realizace TBZ 25.10. ♦ 25.10.
209		Trat'ové radiové spojení	1.6. 18	25.7. 19																	1.6. — 25.7. 19 Trat'ové radiové spojení
210	50-14-05	Český Těšín - Dětmarovice, TRS	1.6. 18	25.7. 19																	1.6. — 25.7. 19 Český Těšín - Dětmarovice
211		realizace	1.6. 18	25.7. 19																	1.6. — 25.7. 19 realizace
213		Sílnoproudá technologie včetně DŘT	1.10. 17	25.7. 19																	1.10. 17 — 25.7. 19 Sílnoproudá technologie včetně DŘT
214		Dispečerská řídicí technika (DŘT) a dálková diagnostika technologických systémů žel. dopravní cesty	1.10. 17	25.7. 19																	1.10. 17 — 25.7. 19 Dispečerská řídicí technika (DŘT) a dálková diagnostika technologických systémů žel. dopravní cesty
215		Dispečerská řídicí technika (DŘT)	1.10. 17	25.7. 19																	1.10. 17 — 25.7. 19 Dispečerská řídicí technika (DŘT)

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018											
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
231	35-05-01	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná - zařízení DŘT	11.4. 18	12.7. 18	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná - zařízení DŘT 11.4. ▾ 12.7. ▾											
232		realizace	11.4. 18	20.6. 18	realizace 11.4. ▬ 20.6. ▬											
233		TBZ9	12.7. 18	12.7. 18	TBZ9 12.7. ◆ 12.7. ◆											
234	36-05-01	Žst. Dětmorovice, TM Dětmorovice - úprava DŘT a MŘS	15.1. 18	12.7. 18	Žst. Dětmorovice, TM Dětmorovice - úprava DŘT a MŘS 15.1. ▾ 12.7. ▾											
235		realizace	15.1. 18	20.6. 18	realizace 15.1. ▬ 20.6. ▬											
236		TBZ	12.7. 18	12.7. 18	TBZ 12.7. ◆ 12.7. ◆											
237	50-05-01	Doplnění DŘT a řídicího systému na ED Ostrava	1.10. 17	25.7. 19	Doplnění DŘT a řídicího systému na ED Ostrava											
238		realizace	1.10. 17	25.7. 19	realizace											
241		TBZ3	25.5. 18	25.5. 18	TBZ3 25.5. ◆ 25.5. ◆											
242		TBZ4	4.7. 18	4.7. 18	TBZ4 4.7. ◆ 4.7. ◆											
243		TBZ5	30.7. 18	30.7. 18	TBZ5 30.7. ◆ 30.7. ◆											
244		TBZ6	30.8. 18	30.8. 18	TBZ6 30.8. ◆ 30.8. ◆											
245		TBZ7	15.10. 18	15.10. 18	TBZ7 15.10. ◆ 15.10. ◆											
246		TBZ8	25.10. 18	25.10. 18	TBZ8 25.10. ◆ 25.10. ◆											
247		TBZ9	15.11. 18	15.11. 18	TBZ9 15.11. ◆ 15.11. ◆											

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018											
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
249	50-05-03	Český Těšín - Dětmorovice, TM Český Těšín, NS 22kV - úprava DŘT a MŘS	1.11. 17	15.10. 18	Český Těšín - Dětmorovice, TM Český Těšín, NS 22kV - úprava DŘT a MŘS											
250		realizace	1.11. 17	7.9. 18	realizace											
251		TBZ	15.10. 18	15.10. 18	TBZ											
252		Dálková diagnostika technologických systémů žel. dopravní cesty	1.11. 17	25.7. 19	Dálková diagnostika technologických systémů žel. dopravní cesty											
253	31-05-02	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, dálková diagnostika TS ŽDC	23.6. 18	15.10. 18	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, dálková diagnostika TS ŽDC											
254		realizace	23.6. 18	7.9. 18	realizace											
255		TBZ	15.10. 18	15.10. 18	TBZ											
256	32-05-04	Žst. Louky nad Olší, dálková diagnostika TS ŽDC	15.5. 18	15.11. 18	Žst. Louky nad Olší, dálková diagnostika TS ŽDC											
257		kabelové trasy , kabelizace	15.5. 18	15.8. 18	kabelové trasy , kabelizace											
258		realizace	23.6. 18	15.11. 18	realizace											
259		TBZ	15.11. 18	15.11. 18	TBZ											
260	34-05-02	Žst. Karviná, dálková diagnostika TS ŽDC	4.3. 18	4.7. 18	Žst. Karviná, dálková diagnostika TS ŽDC											
261		realizace	4.3. 18	4.7. 18	realizace											
262		TBZ	4.7. 18	4.7. 18	TBZ											
263	35-05-02	Karviná - Dětmorovice, úsek Koukolná - Dětmorovice, dálková diagnostika TS ŽDC	15.3. 18	20.8. 18	Karviná - Dětmorovice, úsek Koukolná - Dětmorovice, dálková diagnostika TS ŽDC											

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018											
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
282	36-09-01	Žst. Dětmorovice, TM - technologie - úprava vazby napáječů	15.1. 18	4.7. 18	st. Dětmorovice, TM - technologie - úprava vazby napáječů 15.1. 4.7.											
283		realizace	15.1. 18	20.6. 18	15.1. realizace 20.6.											
284		TBZ	4.7. 18	4.7. 18	TBZ 4.7. 4.7.											
285		Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic	1.5. 18	15.10. 18	Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic 1.5. 15.10.											
286	31-09-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - stejnosměrná část 3kV DC	1.5. 18	15.10. 18	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - stejnosměrná část 3kV 1.5. 15.10.											
287		realizace	1.5. 18	7.9. 18	1.5. realizace 7.9.											
288		TBZ	15.10. 18	15.10. 18	TBZ 15.10. 15.10.											
289	31-09-02	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - vlastní spotřeba	1.5. 18	15.10. 18	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - vlastní spotřeba 1.5. 15.10.											
290		realizace	1.5. 18	7.9. 18	1.5. realizace 7.9.											
291		TBZ	15.10. 18	15.10. 18	TBZ 15.10. 15.10.											
292	31-09-03	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - systém kontroly a řízení	1.5. 18	15.10. 18	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - systém kontroly a řízení 1.5. 15.10.											
293		realizace	1.5. 18	7.9. 18	1.5. realizace 7.9.											
294		TBZ	15.10. 18	15.10. 18	TBZ 15.10. 15.10.											
295	31-09-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - vazba napáječů	1.5. 18	15.10. 18	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - vazba napáječů 1.5. 15.10.											
296		realizace	1.5. 18	7.9. 18	1.5. realizace 7.9.											




ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018													
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	
297		TBZ	15.10. 18	15.10. 18														TBZ 15.10. ♦ 15.10.
298		Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)	15.12. 17	15.10. 18	Technology transformačních stanic VN/NN (energetika) 15.10.													
299	31-13-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, TS 2021 22/0,4kV	1.5. 18	15.10. 18	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, TS 2021 22/0,4kV 1.5. 7.9. 15.10.													
300		realizace	1.5. 18	7.9. 18	realizace 1.5. 7.9.													
301		TBZ	15.10. 18	15.10. 18														TBZ 15.10. ♦ 15.10.
302	32-13-01	Žst. Louky nad Olší, TS 2022 22/0,4kV	1.5. 18	15.10. 18	Žst. Louky nad Olší, TS 2022 22/0,4kV 1.5. 15.10.													
303		montáž	1.5. 18	15.8. 18	montáž 1.5. 15.8.													
304		postupna aktivace	15.8. 18	7.9. 18	postupna aktivace 15.8. 7.9.													
305		TBZ	15.10. 18	15.10. 18														TBZ 15.10. ♦ 15.10.
306	33-13-01	Louky nad Olší - Karviná, TS 2023 22/0,4kV	1.4. 18	15.10. 18	Louky nad Olší - Karviná, TS 2023 22/0,4kV 1.4. 15.10.													
307		montáž	1.4. 18	15.8. 18	montáž 1.4. 15.8.													
308		postupna aktivace	23.6. 18	7.9. 18	postupna aktivace 23.6. 7.9.													
309		TBZ	15.10. 18	15.10. 18														TBZ 15.10. ♦ 15.10.
310	34-13-01	Žst. Karviná, TS 2024 22/0,4kV	15.12. 17	4.7. 18	Žst. Karviná, TS 2024 22/0,4kV 2. 4.7.													
311		montáž	15.12. 17	15.5. 18	montáž 2. 15.5.													

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018																				
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden							
312		postupna aktivace	25.5. 18	4.7. 18																					
313		TBZ	4.7. 18	4.7. 18																					
314	35-13-01	Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, TS 2025 22/0,4kV	15.12. 17	4.7. 18																					
315		montáž	15.12. 17	15.5. 18																					
316		postupna aktivace	25.5. 18	4.7. 18																					
317		TBZ	4.7. 18	4.7. 18																					
318	36-13-01	Žst. Dětmarovice, měniřna Dětmarovice, NS 2030 22kV	1.2. 18	4.7. 18																					
319		realizace	1.2. 18	20.6. 18																					
320		TBZ	4.7. 18	4.7. 18																					
321	36-13-02	Žst. Dětmarovice, měniřna Dětmarovice, transformátor 22/0,4kV pro napájení EOV	1.2. 18	4.7. 18																					
322		realizace	1.2. 18	20.6. 18																					
323		TBZ	4.7. 18	4.7. 18																					
324		Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zab. zařízení (NTS, STS, TTS)	1.2. 18	4.7. 18																					
325	36-08-01	Žst. Dětmarovice, měniřna Dětmarovice, úprava NS 6kV	1.2. 18	4.7. 18																					
326		realizace	1.2. 18	20.6. 18																					

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018											
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
342		montáž	15.12. 17	1.6. 18	montáž 2. 1.6.											
343		postupna aktivace	15.5. 18	4.7. 18	postupna aktivace 15.5. 4.7.											
344		TBZ	4.7. 18	4.7. 18	TBZ 4.7. ◆ 4.7.											
345	35-07-01	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, rozvodna nn	1.12. 17	4.7. 18	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, rozvodna nn 4.7. ◆ 4.7.											
346		montáž	1.12. 17	1.6. 18	montáž 1.6.											
347		postupna aktivace	15.5. 18	20.6. 18	postupna aktivace 15.5. 20.6.											
348		TBZ	4.7. 18	4.7. 18	TBZ 4.7. ◆ 4.7.											
349		Ostatní technologická zařízení	15.5. 18	15.11. 18	Ostatní technologická zařízení 15.5. 15.11.											
350		Osobní výtahy, schodišťové výtahy	15.5. 18	15.11. 18	Osobní výtahy, schodišťové výtahy 15.5. 15.11.											
351	31-29-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, technologie výtahů	15.5. 18	15.10. 18	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, technologie výtahů 15.5. 15.10.											
352		realizace	15.5. 18	7.9. 18	realizace 15.5. 7.9.											
353		TBZ1	12.7. 18	12.7. 18	TBZ1 12.7. ◆ 12.7.											
354		TBZ2	15.10. 18	15.10. 18	TBZ2 15.10. ◆ 15.10.											
355	32-29-01	Žst. Louky nad Olší, technologie výtahů	15.9. 18	15.11. 18	Žst. Louky nad Olší, technologie výtahů 15.9. 15.11.											
356		realizace	15.9. 18	15.11. 18	realizace 15.9. 15.11.											

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018													
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	
357		TNZ	15.11. 18	15.11. 18														TNZ 15.11. ♦ 15.11.
358	34-29-01	Žst. Karviná, technologie výtahů	1.6. 18	25.10. 18													Žst. Karviná, technologie výtahů 1.6. — 25.10.	
359		realizace	1.6. 18	4.10. 18													realizace 1.6. — 4.10.	
360		TBZ lichá	4.7. 18	4.7. 18													TBZ lichá 4.7. ♦ 4.7.	
361		TBZ sudá	25.10. 18	25.10. 18													♦ 25.10.	
362		STAVEBNÍ ČÁST	11.8. 17	7.12. 19													3-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O TK1 15.7. — 6.12.	
363		Inženýrské objekty	1.9. 17	30.11. 19													3-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O TK1 15.7. — 6.12.	
364		Kolejový svršek a spodek	13.9. 17	30.11. 19													Kolejový svršek a spodek	
365		Železniční svršek	1.10. 17	30.11. 19													Železniční svršek	
366	31-17-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb.Chotěbuz, železniční svršek	7.4. 18	15.5. 19													Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb.Chotěbuz 7.4. — 15.5.	
367		1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1	7.4. 18	22.6. 18													1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1 7.4. — 22.6.	
368		1-stavební postup TBZ	12.7. 18	12.7. 18													1-stavební postup TBZ 12.7. ♦ 12.7.	
369		2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2	12.7. 18	4.10. 18													2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2 12.7. — 4.10.	
370		2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT	10.7. 18	2.10. 18													2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT 10.7. — 2.10.	
371		2-stavební postup realizace	2.10. 18	2.10. 18													2-stavební postup realizace 2.10. ♦ 2.10.	

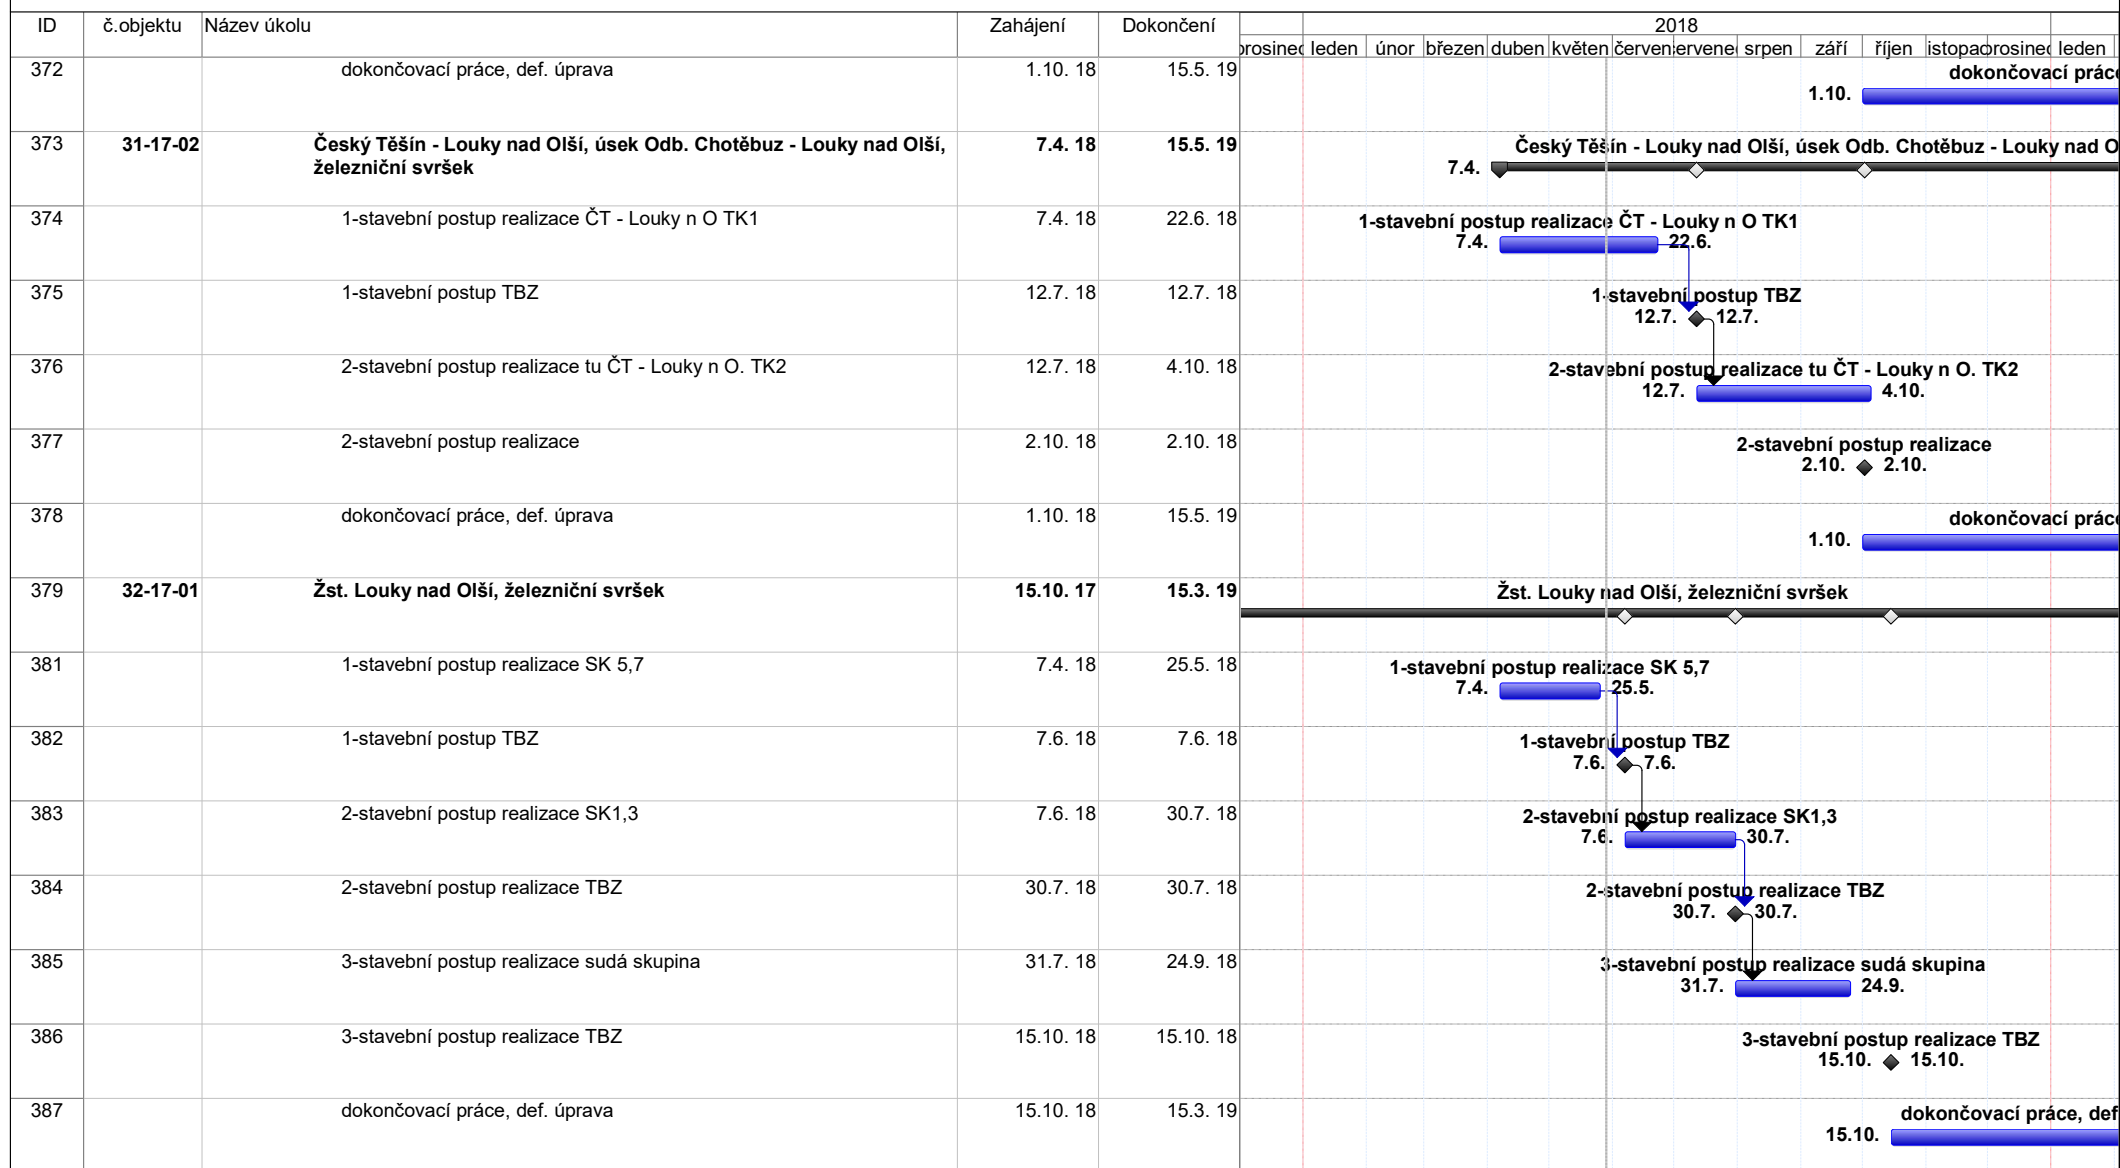

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018											
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
388	33-17-01	Louky nad Olší - Karviná, železniční svršek	1.10. 17	20.7. 18	Louky nad Olší - Karviná, železniční svršek 20.7.											
390		dokončovací práce, def. úprava	20.4. 18	20.7. 18	dokončovací práce, def. úprava 20.4. 20.7.											
391	34-17-01	Žst. Karviná, železniční svršek	25.11. 17	15.5. 19	Žst. Karviná, železniční svršek											
397		2-stavební postup realizace SK1,3	16.3. 18	20.6. 18	2-stavební postup realizace SK1,3 16.3. 20.6.											
398		2-stavební postup realizace TBZ	4.7. 18	4.7. 18	2-stavební postup realizace TBZ 4.7. 4.7.											
399		3-stavební postup realizace sudá skupina	4.7. 18	4.10. 18	3-stavební postup realizace sudá skupina 4.7. 4.10.											
400		3-stavební postup realizace TBZ	25.10. 18	25.10. 18	3-stavební postup realizace TBZ 25.10. 25.10.											
401		dokončovací práce, def. úprava	11.11. 18	15.5. 19	dokončovací práce, def. úprava 11.11.											
402	35-17-01	Karviná - Dětmarovice, úsek Karviná - Odb. Koukolná, železniční svršek	16.3. 18	30.9. 19	Karviná - Dětmarovice, úsek Karviná - Odb. K 16.3.											
403		1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK	16.3. 18	4.7. 18	1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK 16.3. 4.7.											
404		1-stavební postup TBZ	4.7. 18	4.7. 18	1-stavební postup TBZ 4.7. 4.7.											
405		3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2	4.7. 18	7.12. 18	3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2 4.7. 7.12.											
406		3-stavební postup TBZ	7.12. 18	7.12. 18	3-stavební postup TBZ 7.12. 7.12.											
408	35-17-02	Karviná - Dětmarovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmarovice, železniční svršek	16.3. 18	30.11. 19	Karviná - Dětmarovice, úsek Odb. Kouko 16.3.											
409		2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmarovice TK1	16.3. 18	20.8. 18	2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmarovice TK1 16.3. 20.8.											

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018											
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
437		Železniční spodek	13.9. 17	15.9. 19												
438	31-16-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb.Chotěbuz, železniční spodek	7.4. 18	1.4. 19												
439		1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1	7.4. 18	22.6. 18												
440		1-stavební postup TBZ	12.7. 18	12.7. 18												
441		2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2	12.7. 18	4.10. 18												
442		2-stavební postup realizace	2.10. 18	2.10. 18												
443		dokončovací práce, def. úprava	1.10. 18	1.4. 19												
444	31-16-02	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční spodek	7.4. 18	30.4. 19												
445		1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1	7.4. 18	22.6. 18												
446		1-stavební postup TBZ	12.7. 18	12.7. 18												
447		2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2	12.7. 18	4.10. 18												
448		2-stavební postup realizace	2.10. 18	2.10. 18												
449		dokončovací práce, def. úprava	1.10. 18	30.4. 19												
450	32-16-01	Žst. Louky nad Olší, železniční spodek	7.4. 18	15.3. 19												
451		1-stavební postup realizace SK 5,7	7.4. 18	25.5. 18												




Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice realizační HMG na rok 2018 - aktualizace k 20.5.2018

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018																		
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden					
452		1-stavební postup TBZ	7.6. 18	7.6. 18								1-stavební postup TBZ 7.6.	7.6.										
453		2-stavební postup realizace SK1,3	7.6. 18	25.7. 18								2-stavební postup realizace SK1,3 7.6.	25.7.										
454		2-stavební postup realizace TBZ	30.7. 18	30.7. 18									2-stavební postup realizace TBZ 30.7.	30.7.									
455		3-stavební postup realizace sudá skupina	30.7. 18	15.11. 18									3-stavební postup realizace sudá skupina 30.7.	15.11.									
456		3-stavební postup realizace TBZ	15.11. 18	15.11. 18										3-stavební postup realizace TBZ 15.11.	15.11.								
457		dokončovací práce, def. úprava	15.10. 18	15.3. 19																			15.10. dokončovací práce, def
458	34-16-01	Žst. Karviná, železniční spodek	1.3. 18	1.3. 19																			1.3. Žst. Karviná, železniční spodek
461		2-stavební postup realizace SK1,3	16.3. 18	20.6. 18								2-stavební postup realizace SK1,3 16.3.	20.6.										
462		2-stavební postup realizace TBZ	4.7. 18	4.7. 18								2-stavební postup realizace TBZ 4.7.	4.7.										
463		3-stavební postup realizace sudá skupina	4.7. 18	4.10. 18								3-stavební postup realizace sudá skupina 4.7.	4.10.										
464		3-stavební postup realizace TBZ	25.10. 18	25.10. 18										3-stavební postup realizace TBZ 25.10.	25.10.								
465		dokončovací práce, def. úprava	11.11. 18	1.3. 19																			11.11. dokončovací práce, de
466	35-16-01	Karviná - Dětmarovice, úsek Karviná - Odb. Koukolná, železniční spodek	16.3. 18	31.8. 19																			16.3. Karviná - Dětmarovice, úsek Karviná - Odb. Koukolná, železniční spodek
467		1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK	16.3. 18	4.7. 18								1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK 16.3.	4.7.										
468		1-stavební postup TBZ	4.7. 18	4.7. 18								1-stavební postup TBZ 4.7.	4.7.										





ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018											
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
495		0-stavební postup realizace provizorní nástupiště	15.10. 17	13.7. 18	0-stavební postup realizace provizorní nástupiště 13.7.											
496		1-stavební postup realizace provizorní nástupiště u SK6 TBZ	7.6. 18	7.6. 18	1-stavební postup realizace provizorní nástupiště u SK6 TBZ 7.6.											
497		TBZ prov. nástupiště u SK 5 a 7	30.7. 18	30.7. 18	TBZ prov. nástupiště u SK 5 a 7 30.7.											
498		3-stavební postup realizace sudá skupina	30.7. 18	15.11. 18	3-stavební postup realizace sudá skupina 30.7. 15.11.											
499		3-stavební postup realizace TBZ	15.10. 18	15.10. 18	3-stavební postup realizace TBZ 15.10. 15.10.											
500	34-16-02	Žst. Karviná, nástupiště	16.3. 18	25.10. 18	Žst. Karviná, nástupiště 16.3. 25.10.											
501		2-stavební postup realizace SK1,3	16.3. 18	20.6. 18	2-stavební postup realizace SK1,3 16.3. 20.6.											
502		2-stavební postup realizace TBZ	4.7. 18	4.7. 18	2-stavební postup realizace TBZ 4.7. 4.7.											
503		3-stavební postup realizace sudá skupina	4.7. 18	4.10. 18	3-stavební postup realizace sudá skupina 4.7. 4.10.											
504		3-stavební postup realizace TBZ	25.10. 18	25.10. 18	3-stavební postup realizace TBZ 25.10. 25.10.											
508		Železniční přejezdy	13.9. 17	31.7. 19	Železniční přejezdy											
509	31-17-03	Český Těšín - Louky nad Olší, přejezd v km 321,069	15.5. 18	31.7. 19	Český Těšín - Louky nad Olší, přejezd 15.5.											
510		1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1	15.5. 18	22.6. 18	1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1 15.5. 22.6.											
511		1-stavební postup TBZ	12.7. 18	12.7. 18	1-stavební postup TBZ 12.7. 12.7.											
512		2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2	15.7. 18	7.9. 18	2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2 15.7. 7.9.											

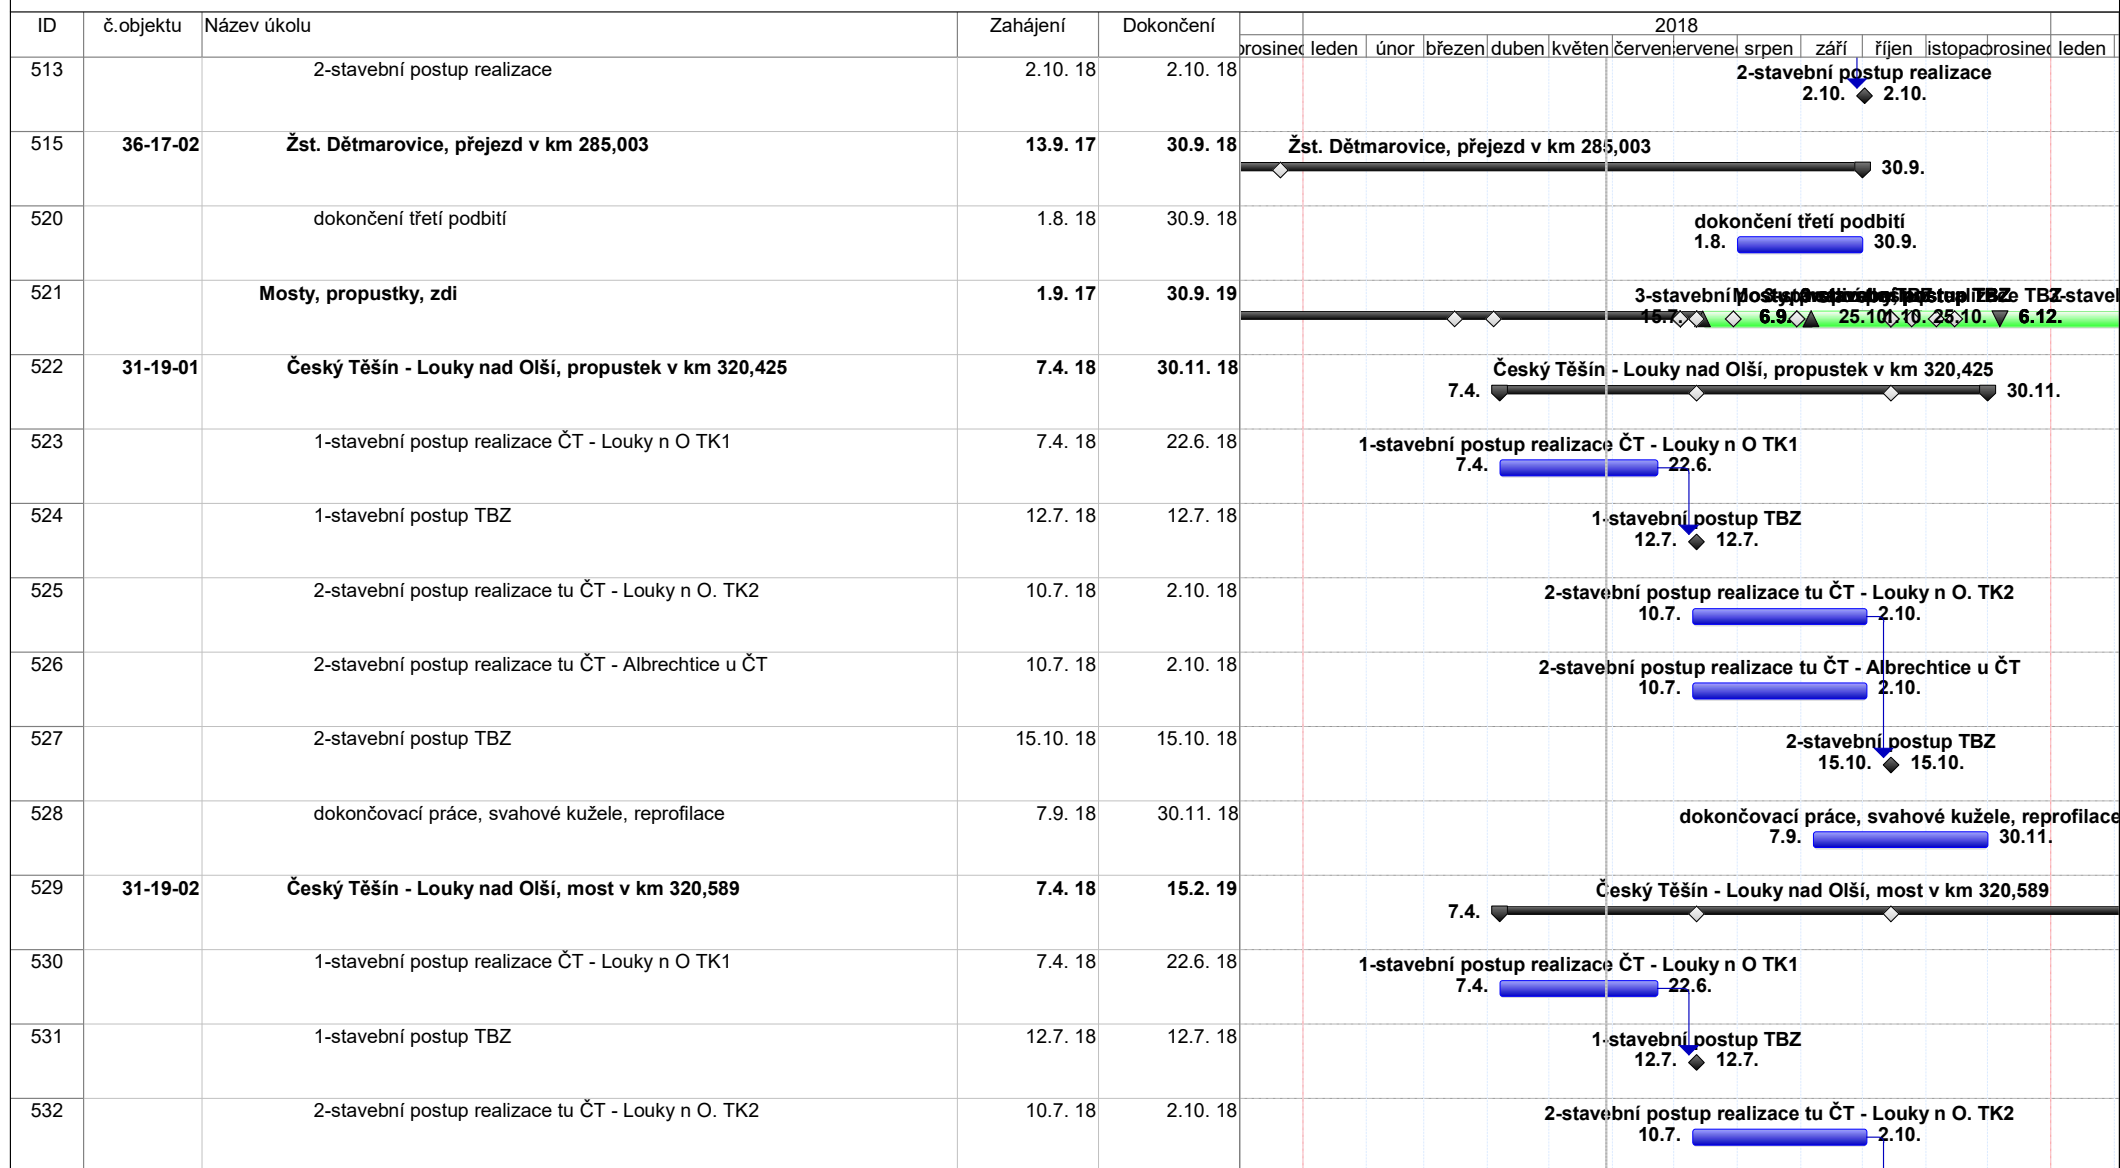

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice
realizační HMG na rok 2018 - aktualizace k 20.5.2018



ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018																	
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec					
533		2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT	10.7. 18	2.10. 18													2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT	10.7.			2.10.	
534		2-stavební postup TBZ	15.10. 18	15.10. 18														2-stavební postup TBZ	15.10.			15.10.
535		dokončovací práce, svahové kužele, reprofilace	7.9. 18	15.2. 19														dokončovací práce, svahové kužele, re	7.9.			
536	31-19-03	Český Těšín - Louky nad Olší, propustek v km 321,060	7.4. 18	30.11. 18														Český Těšín - Louky nad Olší, propustek v km 321,060	7.4.			30.11.
537		1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1	7.4. 18	22.6. 18														1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1	7.4.			22.6.
538		1-stavební postup TBZ	12.7. 18	12.7. 18														1-stavební postup TBZ	12.7.			12.7.
539		2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2	10.7. 18	2.10. 18														2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2	10.7.			2.10.
540		2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT	10.7. 18	2.10. 18														2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT	10.7.			2.10.
541		2-stavební postup TBZ	15.10. 18	15.10. 18														2-stavební postup TBZ	15.10.			15.10.
542		dokončovací práce, svahové kužele, reprofilace	7.9. 18	30.11. 18														dokončovací práce, svahové kužele, reprofilace	7.9.			30.11.
543	31-19-04	Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 321,463	7.4. 18	15.2. 19														Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 321,463	7.4.			
544		1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1	7.4. 18	22.6. 18														1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1	7.4.			22.6.
545		1-stavební postup TBZ	12.7. 18	12.7. 18														1-stavební postup TBZ	12.7.			12.7.
546		2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2	10.7. 18	2.10. 18														2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2	10.7.			2.10.
547		2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT	10.7. 18	2.10. 18														2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT	10.7.			2.10.

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018																		
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden					
548		2-stavební postup TBZ	15.10. 18	15.10. 18																			2-stavební postup TBZ 15.10. ◊ 15.10.
549		dokončovací práce, svahové kužele, reprofilace	7.9. 18	15.2. 19																			dokončovací práce, svahové kužele, re 7.9. 
550	31-19-05	Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 322,181	7.4. 18	10.7. 18																			Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 322,181 7.4. 
551		1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1	7.4. 18	22.6. 18																			1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1 7.4. 
552		1-stavební postup TBZ	12.7. 18	12.7. 18																			1-stavební postup TBZ 12.7. ◊ 12.7.
553		2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2	22.6. 18	2.10. 18																			2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2 22.6. 
554		2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT	30.7. 18	2.10. 18																			2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT 30.7. 
555		2-stavební postup TBZ	15.10. 18	15.10. 18																			2-stavební postup TBZ 15.10. ◊ 15.10.
556		dokončovací práce, svahové kužele, reprofilace	7.9. 18	15.2. 19																			dokončovací práce, svahové kužele, re 7.9. 
557	31-19-06	Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 322,477	7.4. 18	15.2. 19																			Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 322,477 7.4. 
558		1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1	7.4. 18	22.6. 18																			1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1 7.4. 
559		1-stavební postup TBZ	12.7. 18	12.7. 18																			1-stavební postup TBZ 12.7. ◊ 12.7.
560		2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2	30.7. 18	2.10. 18																			2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2 30.7. 
561		2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT	30.7. 18	2.10. 18																			2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT 30.7. 
562		2-stavební postup TBZ	15.10. 18	15.10. 18																			2-stavební postup TBZ 15.10. ◊ 15.10.
563		dokončovací práce, svahové kužele, reprofilace	7.9. 18	15.2. 19																			dokončovací práce, svahové kužele, re 7.9. 

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018											
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
564	31-19-07	Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 323,862 - podchod	7.4. 18	15.2. 19	Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 323,862 - podchod 7.4.											
565		1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1	7.4. 18	22.6. 18	1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1 7.4.											
566		1-stavební postup TBZ	12.7. 18	12.7. 18	1-stavební postup TBZ 12.7.											
567		2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2	30.7. 18	2.10. 18	2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2 30.7.											
568		2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT	30.7. 18	2.10. 18	2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT 30.7.											
569		2-stavební postup TBZ	15.10. 18	15.10. 18	2-stavební postup TBZ 15.10.											
570		dokončovací práce, svahové kužele, reprofilace	7.9. 18	15.2. 19	dokončovací práce, svahové kužele, re 7.9.											
571	31-19-08	Český Těšín - Louky nad Olší, silniční nadjezd v km 324,424	7.4. 18	15.2. 19	Český Těšín - Louky nad Olší, silniční nadjezd v km 324,424 7.4.											
572		1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1	7.4. 18	22.6. 18	1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1 7.4.											
573		1-stavební postup TBZ	12.7. 18	12.7. 18	1-stavební postup TBZ 12.7.											
574		2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2	30.7. 18	2.10. 18	2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2 30.7.											
575		2-stavební postup TBZ	15.10. 18	15.10. 18	2-stavební postup TBZ 15.10.											
576		dokončovací práce, svahové kužele, reprofilace	7.9. 18	15.2. 19	dokončovací práce, svahové kužele, re 7.9.											
577	32-19-01	Žst. Louky nad Olší, propustek v km 325,060	7.4. 18	30.11. 18	Žst. Louky nad Olší, propustek realizace 2018 7.4.											
578		1-stavební postup realizace SK5a	7.4. 18	25.5. 18	1-stavební postup realizace SK5a 7.4.											



Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

realizační HMG na rok 2018 - aktualizace k 20.5.2018

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018													
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden
579		TBZ SK 5a	30.7. 18	30.7. 18														◆ 30.7.
580		1-stavební postup realizace SK1	7.6. 18	30.7. 18														1-stavební postup realizace SK1 7.6. — 30.7.
581		TBZ SK 1	30.7. 18	30.7. 18														TBZ SK 1 30.7. ◆ 30.7.
582		3-stavební postup realizace sudá skupina	8.8. 18	2.10. 18														3-stavební postup realizace sudá skupina 8.8. — 2.10.
583		3-stavební postup realizace TBZ	15.7. 18	1.10. 18														3-stavební postup realizace TBZ 15.7. — 1.10.
584		dokončovací práce, svahové kužele, reprofilace	7.9. 18	30.11. 18														dokončovací práce, svahové kužele, reprofilace 7.9. — 30.11.
585	32-19-03	Žst. Louky nad Olší, most v km 325,633 - podchod	13.7. 18	15.3. 19														13.7. — 15.3. 19 Žst. Louky nad Olší, most v km 325,633 - podchod
586		3-stavební postup realizace sudá skupina	13.7. 18	15.11. 18														3-stavební postup realizace sudá skupina 13.7. — 15.11.
587		3-stavební postup realizace TBZ	15.11. 18	15.11. 18														3-stavební postup realizace TBZ 15.11. ◆ 15.11.
588		dokončovací práce	30.10. 18	15.3. 19														30.10. — 15.3. 19 dokončovací práce
589	32-19-04	Žst. Louky nad Olší, most v km 326,000	15.11. 17	15.3. 19														15.11. 17 — 15.3. 19 Žst. Louky nad Olší, most v km 326,000
591		1-stavební postup realizace SK5,7	7.4. 18	25.5. 18														1-stavební postup realizace SK5,7 7.4. — 25.5.
592		TBZ SK 5,7	7.6. 18	7.6. 18														◆ 7.6.
593		1-stavební postup realizace SK1,3	7.6. 18	30.7. 18														1-stavební postup realizace SK1,3 7.6. — 30.7.
594		TBZ SK 1,3	30.7. 18	30.7. 18														TBZ SK 1,3 30.7. ◆ 30.7.

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018															
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden		
595		3-stavební postup realizace sudá skupina	13.7. 18	15.11. 18																3-stavební postup realizace sudá skupina 13.7. 15.11.
596		TBZ sudá	15.11. 18	15.11. 18																TBZ sudá 15.11. 15.11.
597		dokončovací práce, svahové kužele, reprofilace	30.10. 18	15.3. 19																dokončovací práce, svahové k 30.10. 15.3.
598	34-19-01	Žst. Karviná, silniční nadjezd v km 333,268	1.3. 18	31.8. 18																Žst. Karviná, silniční nadjezd v km 333,268 1.3. 31.8.
603		dokončovací práce	4.4. 18	31.8. 18																dokončovací práce 4.4. 31.8.
604	34-19-02	Žst. Karviná, most v km 333,721 - podchod	16.3. 18	15.12. 18																Žst. Karviná, most v km 333,721 - podchod 16.3. 15.12.
605		2-stavební postup realizace SK1,3	16.3. 18	20.6. 18																2-stavební postup realizace SK1,3 16.3. 20.6.
606		2-stavební postup realizace TBZ	4.7. 18	4.7. 18																2-stavební postup realizace TBZ 4.7. 4.7.
607		3-stavební postup realizace sudá skupina	4.7. 18	4.10. 18																3-stavební postup realizace sudá skupina 4.7. 4.10.
608		3-stavební postup realizace TBZ	25.10. 18	25.10. 18																3-stavební postup realizace TBZ 25.10. 25.10.
609		dokončovací práce,	4.10. 18	15.12. 18																dokončovací práce, 4.10. 15.12.
610	34-19-03	Žst. Karviná, most v km 333,894	16.3. 18	15.12. 18																Žst. Karviná, most v km 333,894 16.3. 15.12.
611		2-stavební postup realizace SK1,3	16.3. 18	20.6. 18																2-stavební postup realizace SK1,3 16.3. 20.6.
612		2-stavební postup realizace TBZ	4.7. 18	4.7. 18																2-stavební postup realizace TBZ 4.7. 4.7.
613		3-stavební postup realizace sudá skupina	4.7. 18	4.10. 18																3-stavební postup realizace sudá skupina 4.7. 4.10.

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018																			
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	srpen	září	říjen	listopad	prosinec								
614		3-stavební postup realizace TBZ	25.10. 18	25.10. 18																				3-stavební postup realizace TBZ 25.10. ◆ 25.10.
615		dokončovací práce,	4.10. 18	15.12. 18																				dokončovací práce, 4.10. [] 15.12.
616	34-19-04	Žst. Karviná, silniční nadjezd v km 334,577	4.4. 18	30.11. 18																				Žst. Karviná, silniční nadjezd v km 334,577 4.4. [] 30.11.
617		2-stavební postup realizace SK1,3	4.4. 18	20.6. 18																				2-stavební postup realizace SK1,3 4.4. [] 20.6.
618		2-stavební postup realizace TBZ	4.7. 18	4.7. 18																				2-stavební postup realizace TBZ 4.7. ◆ 4.7.
619		3-stavební postup realizace sudá skupina	5.7. 18	24.7. 18																				3-stavební postup realizace sudá skupina 5.7. [] 24.7.
620		3-stavební postup realizace TBZ	25.10. 18	25.10. 18																				3-stavební postup realizace TBZ 25.10. ◆ 25.10.
621		dokončovací práce, apod	20.9. 18	30.11. 18																				dokončovací práce, apod 20.9. [] 30.11.
622	35-19-02	Karviná - Dětmarovice, most v km 334,965	16.3. 18	5.8. 19																				Karviná - Dětmarovice, most v km 334,965 16.3. [] 5.8. 19
623		1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK	16.3. 18	4.7. 18																				1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK 16.3. [] 4.7.
624		1-stavební postup TBZ	4.7. 18	4.7. 18																				1-stavební postup TBZ 4.7. ◆ 4.7.
625		3-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná TK2	4.7. 18	7.12. 18																				3-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná TK2 4.7. [] 7.12.
626		3-stavební postup TBZ	6.9. 18	5.8. 19																				3-stavební postup TBZ 6.9. [] 5.8. 19
628	35-19-03	Karviná - Dětmarovice, propustek v km 335,146	16.3. 18	6.8. 19																				Karviná - Dětmarovice, propustek v km 335,146 16.3. [] 6.8. 19
629		1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK	16.3. 18	4.7. 18																				1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK 16.3. [] 4.7.

ID	č. objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018												
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
630		1-stavební postup TBZ	4.7. 18	4.7. 18							1-stavební postup TBZ	4.7. ◆ 4.7.					
631		3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2	4.7. 18	7.12. 18							3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2	4.7. [] 7.12.					
634	35-19-04	Karviná - Dětmorovice, most v km 335,441	16.3. 18	6.8. 19													Karviná - Dětmorovice, most v km 335,441
635		1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK	16.3. 18	4.7. 18						1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK	16.3. [] 4.7.						
636		1-stavební postup TBZ	6.11. 18	6.11. 18													1-stavební postup TBZ
637		3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2	4.7. 18	7.12. 18							3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2	4.7. [] 7.12.					
640	35-19-05	Karviná - Dětmorovice, silniční nadjezd v km 335,735	16.3. 18	6.8. 19													Karviná - Dětmorovice, silniční nadjezd v km 335,735
641		1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK	16.3. 18	4.7. 18						1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK	16.3. [] 4.7.						
642		1-stavební postup TBZ	4.7. 18	4.7. 18							1-stavební postup TBZ	4.7. ◆ 4.7.					
643		3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2	4.7. 18	7.12. 18							3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2	4.7. [] 7.12.					
646	35-19-06	Karviná - Dětmorovice, propustek v km 335,986	16.3. 18	31.7. 19													Karviná - Dětmorovice, propustek v km 335,986
647		1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK	16.3. 18	4.7. 18						1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK	16.3. [] 4.7.						
648		1-stavební postup TBZ	4.7. 18	4.7. 18							1-stavební postup TBZ	4.7. ◆ 4.7.					
649		3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2	4.7. 18	7.12. 18							3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2	4.7. [] 7.12.					
650		3-stavební postup TBZ	6.9. 18	6.12. 18													3-stavební postup TBZ

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018																					
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden								
652	35-19-07	Karviná - Dětmárovice, propustek v km 337,115	16.3. 18	31.7. 19																						
653		1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK	16.3. 18	4.7. 18																						
654		1-stavební postup TBZ	4.7. 18	4.7. 18																						
655		3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2	4.7. 18	7.12. 18																						
656		3-stavební postup TBZ	6.9. 18	6.12. 18																						
658	35-19-08	Karviná - Dětmárovice, propustek v km 337,496	16.3. 18	31.7. 19																						
659		1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK	16.3. 18	4.7. 18																						
660		1-stavební postup TBZ	4.7. 18	4.7. 18																						
661		3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2	4.7. 18	7.12. 18																						
662		3-stavební postup TBZ	6.9. 18	6.12. 18																						
664	35-19-09	Karviná - Dětmárovice, propustek v km 337,635	16.3. 18	31.7. 19																						
665		1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK	16.3. 18	4.7. 18																						
666		1-stavební postup TBZ	4.7. 18	4.7. 18																						
667		3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2	4.7. 18	7.12. 18																						
668		3-stavební postup TBZ	6.9. 18	6.12. 18																						

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018											
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
670	35-19-10	Karviná - Dětmorovice, propustek v km 337,641	16.3. 18	6.8. 19	Karviná - Dětmorovice, propustek v km 337,641 16.3.											
671		1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK	16.3. 18	4.7. 18	1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK 16.3.											
672		1-stavební postup TBZ	6.11. 18	6.11. 18	1-stavební postup TBZ 6.11.											
673		3-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná TK2	4.7. 18	7.12. 18	3-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná TK2 4.7.											
676	35-19-11	Karviná - Dětmorovice, most v km 337,751	16.3. 18	6.8. 19	Karviná - Dětmorovice, most v km 337,751 16.3.											
677		1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK	16.3. 18	4.7. 18	1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK 16.3.											
678		1-stavební postup TBZ	4.7. 18	4.7. 18	1-stavební postup TBZ 4.7.											
679		3-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná TK2	4.7. 18	7.12. 18	3-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná TK2 4.7.											
682	35-19-12	Karviná - Dětmorovice, silniční nadjezd v km 338,226	1.9. 17	25.7. 18	Dětmorovice, silniční nadjezd v km 338,226 1.9.											
684		dokončovací práce,	30.4. 18	25.7. 18	dokončovací práce, 30.4.											
685	35-19-13	Karviná - Dětmorovice, most v km 338,337	16.3. 18	30.9. 19	Karviná - Dětmorovice, most v km 338,337 16.3.											
686		2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmorovice TK1	16.3. 18	20.8. 18	2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmorovice TK1 16.3.											
687		2-stavební postup TBZ	30.8. 18	30.8. 18	2-stavební postup TBZ 30.8.											
691	35-19-14	Karviná - Dětmorovice, propustek v km 338,975	16.3. 18	25.7. 19	Karviná - Dětmorovice, propustek v km 338,975 16.3.											
692		2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmorovice TK1	16.3. 18	20.8. 18	2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmorovice TK1 16.3.											



Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

realizační HMG na rok 2018 - aktualizace k 20.5.2018

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018												
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
693		2-stavební postup TBZ	30.8. 18	30.8. 18													2-stavební postup TBZ 30.8. ♦ 30.8.
696	36-19-01	Žst. Dětmorovice, most v km 339,577	1.5. 18	25.7. 19						1.5.	Žst. Dětmorovice, most v km 339,577						
697		2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmorovice TK1	1.5. 18	15.6. 18						1.5.	15.6.						2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmorovice TK1 1.5. 15.6.
698		2-stavební postup TBZ	30.8. 18	30.8. 18													2-stavební postup TBZ 30.8. ♦ 30.8.
701	36-19-02	Žst. Dětmorovice, most v km 339,643	10.10. 17	30.8. 18	Žst. Dětmorovice, most v km 339,643												30.8.
703		TBZ	30.8. 18	30.8. 18													TBZ 30.8. ♦ 30.8.
705		Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)	13.9. 17	25.7. 19	Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)												
706	31-21-01	Český Těšín - Louky nad Olší, ochrana plynovodů a produktovodů	7.4. 18	7.9. 18	Český Těšín - Louky nad Olší, ochrana plynovodů a produktovodů												
707		realizace	7.4. 18	7.9. 18	realizace												
708	31-21-02	Český Těšín - Louky nad Olší, ochrana vodovodů a kanalizací	7.4. 18	7.9. 18	Český Těšín - Louky nad Olší, ochrana vodovodů a kanalizací												
709		realizace	7.4. 18	7.9. 18	realizace												
710	31-27-01	Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky vodovodů a kanalizací	7.4. 18	7.9. 18	Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky vodovodů a kanalizací												
711		realizace	7.4. 18	7.9. 18	realizace												
712	31-27-02	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rekonstrukce dešť. kanalizace do Olše	7.4. 18	7.9. 18	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rekonstrukce dešť. kanalizace do Olše												
713		realizace	7.4. 18	7.9. 18	realizace												


ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018																	
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden				
714	32-27-01	Žst. Louky nad Olší, přeložky vodovodů a kanalizací	7.4. 18	7.9. 18																		
715		realizace	7.4. 18	7.9. 18																		
716	33-21-02	Louky nad Olší - Karviná, ochrana vodovodů a kanalizací	7.4. 18	15.11. 18																		
717		realizace	7.4. 18	15.11. 18																		
718	34-21-01	Žst. Karviná, ochrana plynovodů a produktovodů	15.1. 18	4.10. 18																		
719		2-stavební postup realizace SK1,3	15.1. 18	31.7. 18																		
722		přepojení produktovodu	1.7. 18	31.7. 18																		
723		TBZ KONEČNÁ	4.10. 18	4.10. 18																		
724	34-27-01	Žst. Karviná, přeložky vodovodů a kanalizací	4.4. 18	4.10. 18																		
725		realizace	4.4. 18	4.10. 18																		
726	35-21-01	Karviná - Dětmarovice, ochrana plynovodů a produktovodů	16.3. 18	25.7. 19																		
727		realizace	16.3. 18	25.7. 19																		
728	35-21-02	Karviná - Dětmarovice, ochrana vodovodů a kanalizací	16.3. 18	25.7. 19																		
729		realizace	16.3. 18	25.7. 19																		
734		Pozemní komunikace	1.4. 18	15.12. 18																		

ID	č. objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018																	
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden				
735	31-18-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, zpevněné plochy (SZDC)	15.9. 18	15.12. 18																		
736		realizace	15.9. 18	15.12. 18																		
737	32-18-01	Žst. Louky nad Olší, zpevněné plochy	15.9. 18	15.12. 18																		
738		realizace	15.9. 18	15.12. 18																		
741		Kabelovody, kolektory	13.9. 17	15.12. 18																		
742	32-15-07	Žst. Louky nad Olší, kabelovod	15.2. 18	15.12. 18																		
743		0-příprava, vystavba mimo kolejiště	15.2. 18	25.5. 18																		
744		1-stavební postup realizace	21.4. 18	31.5. 18																		
745		3-stavební postup realizace sudá skupina	14.7. 18	30.10. 18																		
746		3-stavební postup realizace TBZ	15.11. 18	15.11. 18																		
747		dokončovací práce, protipožární ucpávka a pod	10.9. 18	15.12. 18																		
748	34-15-03	Žst. Karviná, kabelovod	10.12. 17	30.11. 18																		
751		2-stavební postup realizace SK1,3	4.3. 18	3.6. 18																		
752		TBZ celková	4.7. 18	4.7. 18																		
753		dokončovací práce, protipožární ucpávka a pod	20.6. 18	30.11. 18																		

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018											
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
757		Protihlukové objekty, individuální protihluková opatření	15.1. 18	15.3. 19	15.1.											
758	31-15-02	Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna	15.1. 18	15.3. 19	15.1.											
759		vystavba mimo kolejiště	15.1. 18	25.5. 18	15.1.											
760		1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1	15.5. 18	22.6. 18	15.5.											
761		1-stavební postup TBZ	12.7. 18	12.7. 18	12.7.											
762		2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2 a ČT - Albrechtice T	30.7. 18	2.10. 18	30.7.											
763		2-stavební postup realizace	2.10. 18	2.10. 18	2.10.											
764		dokončovací práce, nástřik, konečná úprava svahů	20.9. 18	15.3. 19	20.9.											
765	34-15-05	Žst. Karviná, protihluková stěna	15.2. 18	15.11. 18	15.2.											
767		2-stavební postup realizace	16.3. 18	20.6. 18	16.3.											
768		TBZ	4.7. 18	4.7. 18	4.7.											
769		dokončovací práce, nástřik, konečná úprava svahů	15.6. 18	15.11. 18	15.6.											
770	35-15-04	Karviná - Dětmorovice, protihluková stěna	16.3. 18	15.12. 18	16.3.											
771		1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK	16.3. 18	20.8. 18	16.3.											
772		TBZ - část Koukolná - Karviná	4.7. 18	4.7. 18	4.7.											

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018													
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden
773		TBZ - část Koukolná - Dětmrovice	30.8. 18	30.8. 18														TBZ - část Koukolná - Dětmrovice 30.8. ◆ 30.8.
774		dokončovací práce, nástřik, konečná úprava svahů	25.8. 18	15.12. 18														dokončovací práce, nástřik, konečná úprava sva 25.8. ◆ 15.12.
775		Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stav.obj.	15.9. 17	31.7. 19														Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stav.obj.
776		Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)	15.9. 17	15.12. 18														Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové) 15.12.
777	32-15-01	Žst. Louky nad Olší, technologická budova	15.9. 17	15.12. 18														Žst. Louky nad Olší, technologická budova 15.12.
778		realizace	15.9. 17	30.6. 18														realizace 30.6.
780		TBZ	15.11. 18	15.11. 18														TBZ 15.11. ◆ 15.11.
781		dokončovací práce	30.6. 18	15.12. 18														30.6. dokončovací práce 15.12.
782	32-15-02	Žst. Louky nad Olší, stavební úpravy VB	15.1. 18	15.11. 18														Žst. Louky nad Olší, stavební úpravy VB 15.1. ◆ 15.11.
783		realizace	15.1. 18	30.10. 18														realizace 15.1. ◆ 30.10.
784		SP pro montáž technologie	30.6. 18	30.6. 18														SP pro montáž technologie 30.6. ◆ 30.6.
785		TBZ	15.11. 18	15.11. 18														TBZ 15.11. ◆ 15.11.
786	32-15-06	Žst. Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206	15.1. 18	15.11. 18														Žst. Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206 15.1. ◆ 15.11.
787		realizace	15.1. 18	22.6. 18														realizace 15.1. ◆ 22.6.
788		TBZ	15.11. 18	15.11. 18														TBZ 15.11. ◆ 15.11.

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018																		
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden					
789	33-15-01	Louky nad Olší - Karviná, úprava terénu u přej. km 328,666	15.4. 18	15.11. 18																			
790		realizace	15.4. 18	30.8. 18																			
791		TBZ	15.11. 18	15.11. 18																			
792	34-15-01	Žst. Karviná, stavební úpravy VB	1.10. 17	4.7. 18																			
793		realizace	1.10. 17	20.6. 18																			
795		TBZ	4.7. 18	4.7. 18																			
796	35-15-02	Karviná - Dětmrovice, ochrana migračního biokoridoru	16.3. 18	7.12. 18																			
797		1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK	16.3. 18	4.7. 18																			
798		3-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná TK2	4.7. 18	7.12. 18																			
799	36-15-02	Žst. Dětmrovice, stavební úpravy MR	15.1. 18	4.7. 18																			
800		realizace	15.1. 18	15.6. 18																			
802		TBZ	4.7. 18	4.7. 18																			
803		Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích	16.3. 18	15.11. 18																			
804	31-15-01	Český Těšín - Louky nad Olší, nástupištní přístřešky v Odb. Chotěbuz	7.4. 18	2.10. 18																			
805		1-stavební postup realizace	7.4. 18	22.6. 18																			

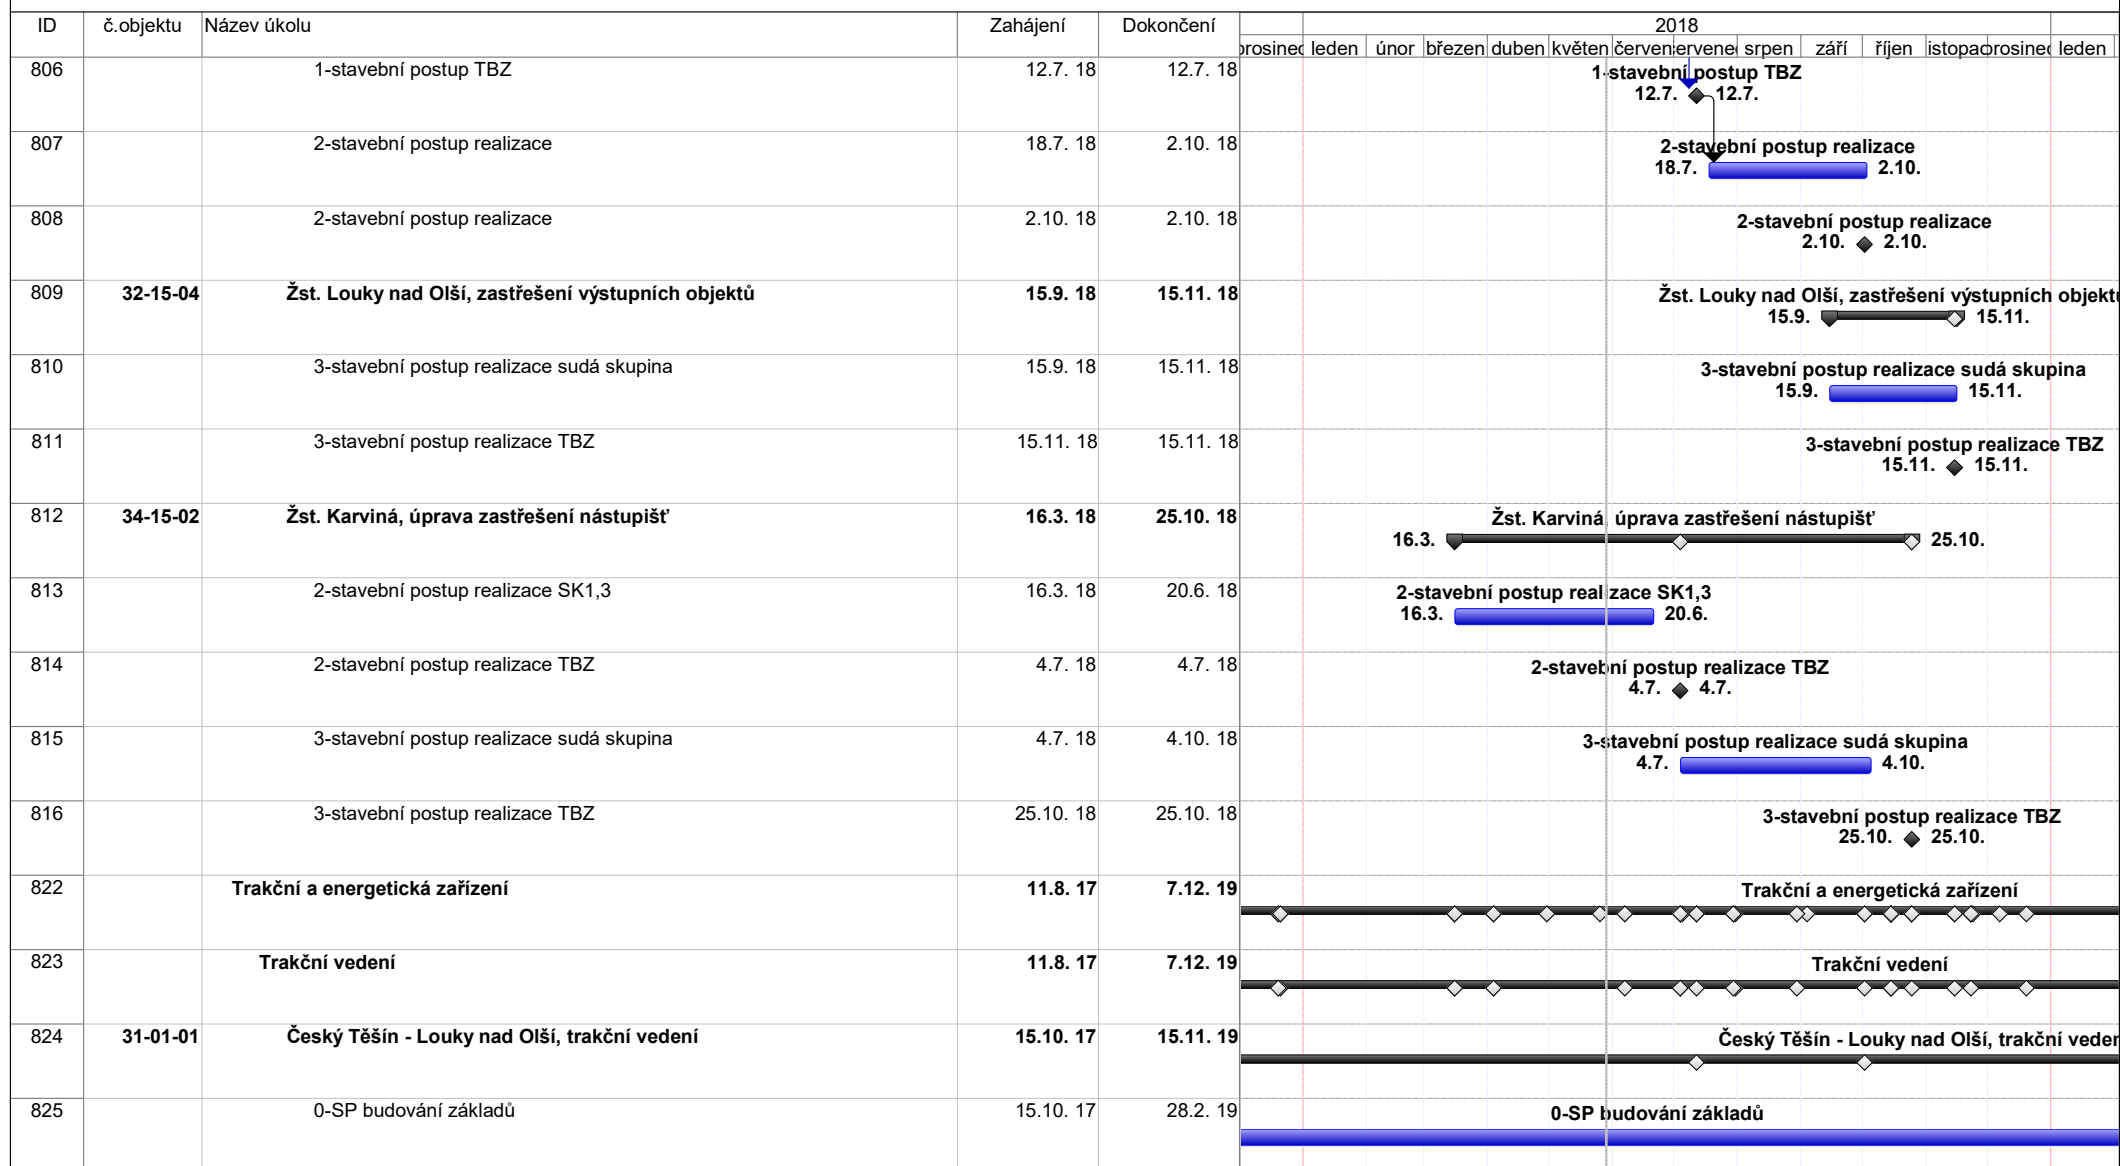



Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

realizační HMG na rok 2018 - aktualizace k 20.5.2018

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018																
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden			
828		1-stavební postup realizace	7.4. 18	22.6. 18							7.4.					22.6.					
829		1-stavební postup TBZ	12.7. 18	12.7. 18								12.7.				12.7.					
830		2-stavební postup realizace	16.7. 18	30.9. 18								16.7.									30.9.
831		2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT	10.7. 18	30.9. 18								10.7.									30.9.
832		2-stavební postup realizace	2.10. 18	2.10. 18												2.10.					2.10.
834	31-01-03	Český Těšín - Louky nad Olší, zavěšení kabelu 22kV	15.1. 18	15.10. 18																	15.10.
837		zprovoznění zkoušky	7.4. 18	2.10. 18							7.4.										2.10.
838		TBZ	15.10. 18	15.10. 18																	15.10.
839	31-01-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, připojení SpS na TV	1.5. 18	15.10. 18																	15.10.
840		montáž, zavěšení	1.5. 18	9.7. 18							1.5.										9.7.
841		zprovoznění zkoušky	25.6. 18	31.8. 18							25.6.										31.8.
842		TBZ	15.10. 18	15.10. 18																	15.10.
843	32-01-01	Žst. Louky nad Olší, trakční vedení	1.10. 17	15.11. 19																	
847		1-stavební postup realizace SK 5,7	7.4. 18	25.5. 18							7.4.										25.5.
848		1-stavební postup TBZ	7.6. 18	7.6. 18								7.6.									7.6.


ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018														
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	
849		2-stavební postup realizace SK1,3	7.6. 18	30.7. 18							2-stavební postup realizace SK1,3 7.6. 30.7.								
850		2-stavební postup realizace TBZ	30.7. 18	30.7. 18							2-stavební postup realizace TBZ 30.7. 30.7.								
851		3-stavební postup realizace sudá skupina	21.9. 18	15.11. 18							3-stavební postup realizace sudá skupina 21.9. 15.11.								
852		Výhybky 1/2 a 3/4 TBZ	15.10. 18	15.10. 18							15.10.								
853		3-stavební postup realizace TBZ	15.11. 18	15.11. 18							3-stavební postup realizace TBZ 15.11. 15.11.								
854		Výhybka 23X	15.11. 18	23.11. 18							Výhybka 23X 15.11. 23.11.								
855		Výhybk23X TBZ	23.11. 18	23.11. 18							23.11.								
857	32-01-04	Žst. Louky nad Olší, zavěšení kabelu 22kV	15.2. 18	30.7. 18							Žst. Louky nad Olší, zavěšení kabelu 22kV 15.2. 30.7.								
858		montáž, zavěšení	15.2. 18	15.6. 18							montáž, zavěšení 15.2. 15.6.								
859		zprovoznění zkoušky	1.7. 18	30.7. 18							zprovoznění zkoušky 1.7. 30.7.								
860		TBZ	30.7. 18	30.7. 18							30.7.								
861	33-01-01	Louky nad Olší - Karviná, trakční vedení	15.10. 17	15.8. 18							Louky nad Olší - Karviná, trakční vedení 15.8.								
868		dokončovací práce, def. úprava	20.4. 18	15.8. 18							dokončovací práce, def. úprava 20.4. 15.8.								
872	34-01-01	Žst. Karviná, trakční vedení	11.8. 17	30.11. 19							Žst. Karviná, trakční vedení 								
878		2-stavební postup realizace SK1,3	16.3. 18	20.6. 18							2-stavební postup realizace SK1,3 16.3. 20.6.								



Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice
realizační HMG na rok 2018 - aktualizace k 20.5.2018

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018																	
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden				
879		2-stavební postup realizace TBZ	4.7. 18	4.7. 18																		
880		3-stavební postup realizace sudá skupina	4.7. 18	4.10. 18																		
881		3-stavební postup realizace TBZ	25.10. 18	25.10. 18																		
887	35-01-01	Karviná - Dětmorovice, trakční vedení	11.8. 17	7.12. 19																		
891		1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK	16.3. 18	4.7. 18																		
892		1-stavební postup TBZ	4.7. 18	4.7. 18																		
893		2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmorovice TK1	16.3. 18	20.8. 18																		
894		2-stavební postup TBZ	30.8. 18	30.8. 18																		
895		3-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná TK2	4.7. 18	20.12. 18																		
896		3-stavební postup TBZ	20.12. 18	20.12. 18																		
904	36-01-01	Žst. Dětmorovice, úprava trakčního vedení	13.9. 17	15.1. 19																		
909		dokončovací práce, def. úprava	25.5. 18	15.1. 19																		
914	50-01-01	Český Těšín - Dětmorovice, převěšení ZOK na nové trakční podpěry	15.10. 17	25.7. 19																		
915		montáž, zavěšení	15.10. 17	25.7. 19																		
916		Napájecí stanice (měnirna, transformovna) - stavební část	15.9. 17	15.10. 18																		

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018											
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
917	31-15-04	Český Těšín - Louky nad Olší, trafostanice Chotěbuz	1.11. 17	15.10. 18	Český Těšín - Louky nad Olší, trafostanice Chotěbuz											
918		realizace	1.11. 17	15.10. 18	realizace											
920		TBZ	15.10. 18	15.10. 18	TBZ											
925		Spínací stanice - stavební část	1.11. 17	15.10. 18	Spínací stanice - stavební část											
926	31-15-05	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, spínací stanice	1.11. 17	15.10. 18	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, spínací stanice											
927		realizace	1.11. 17	15.10. 18	realizace											
929		TBZ	15.10. 18	15.10. 18	TBZ											
930		Ohřev výměn (EOV)	1.9. 17	16.8. 19	Ohřev výměn (EOV)											
931	31-06-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, EOV	7.4. 18	15.12. 18	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, EOV											
932		realizace výkopy, kabelizace a DMT stávajícího	7.4. 18	22.6. 18	realizace výkopy, kabelizace a DMT stávajícího											
933		realizace	18.7. 18	2.10. 18	realizace											
934		TBZ	15.10. 18	15.10. 18	TBZ											
935		dokončovací práce, def. úprava	15.9. 18	15.12. 18	dokončovací práce, def. úprava											
936	32-06-01	Žst. Louky nad Olší, EOV	7.4. 18	31.3. 19	Žst. Louky nad Olší, EOV											
937		Demontáže SK 5,7 + kabelizace	7.4. 18	25.5. 18	Demontáže SK 5,7 + kabelizace											

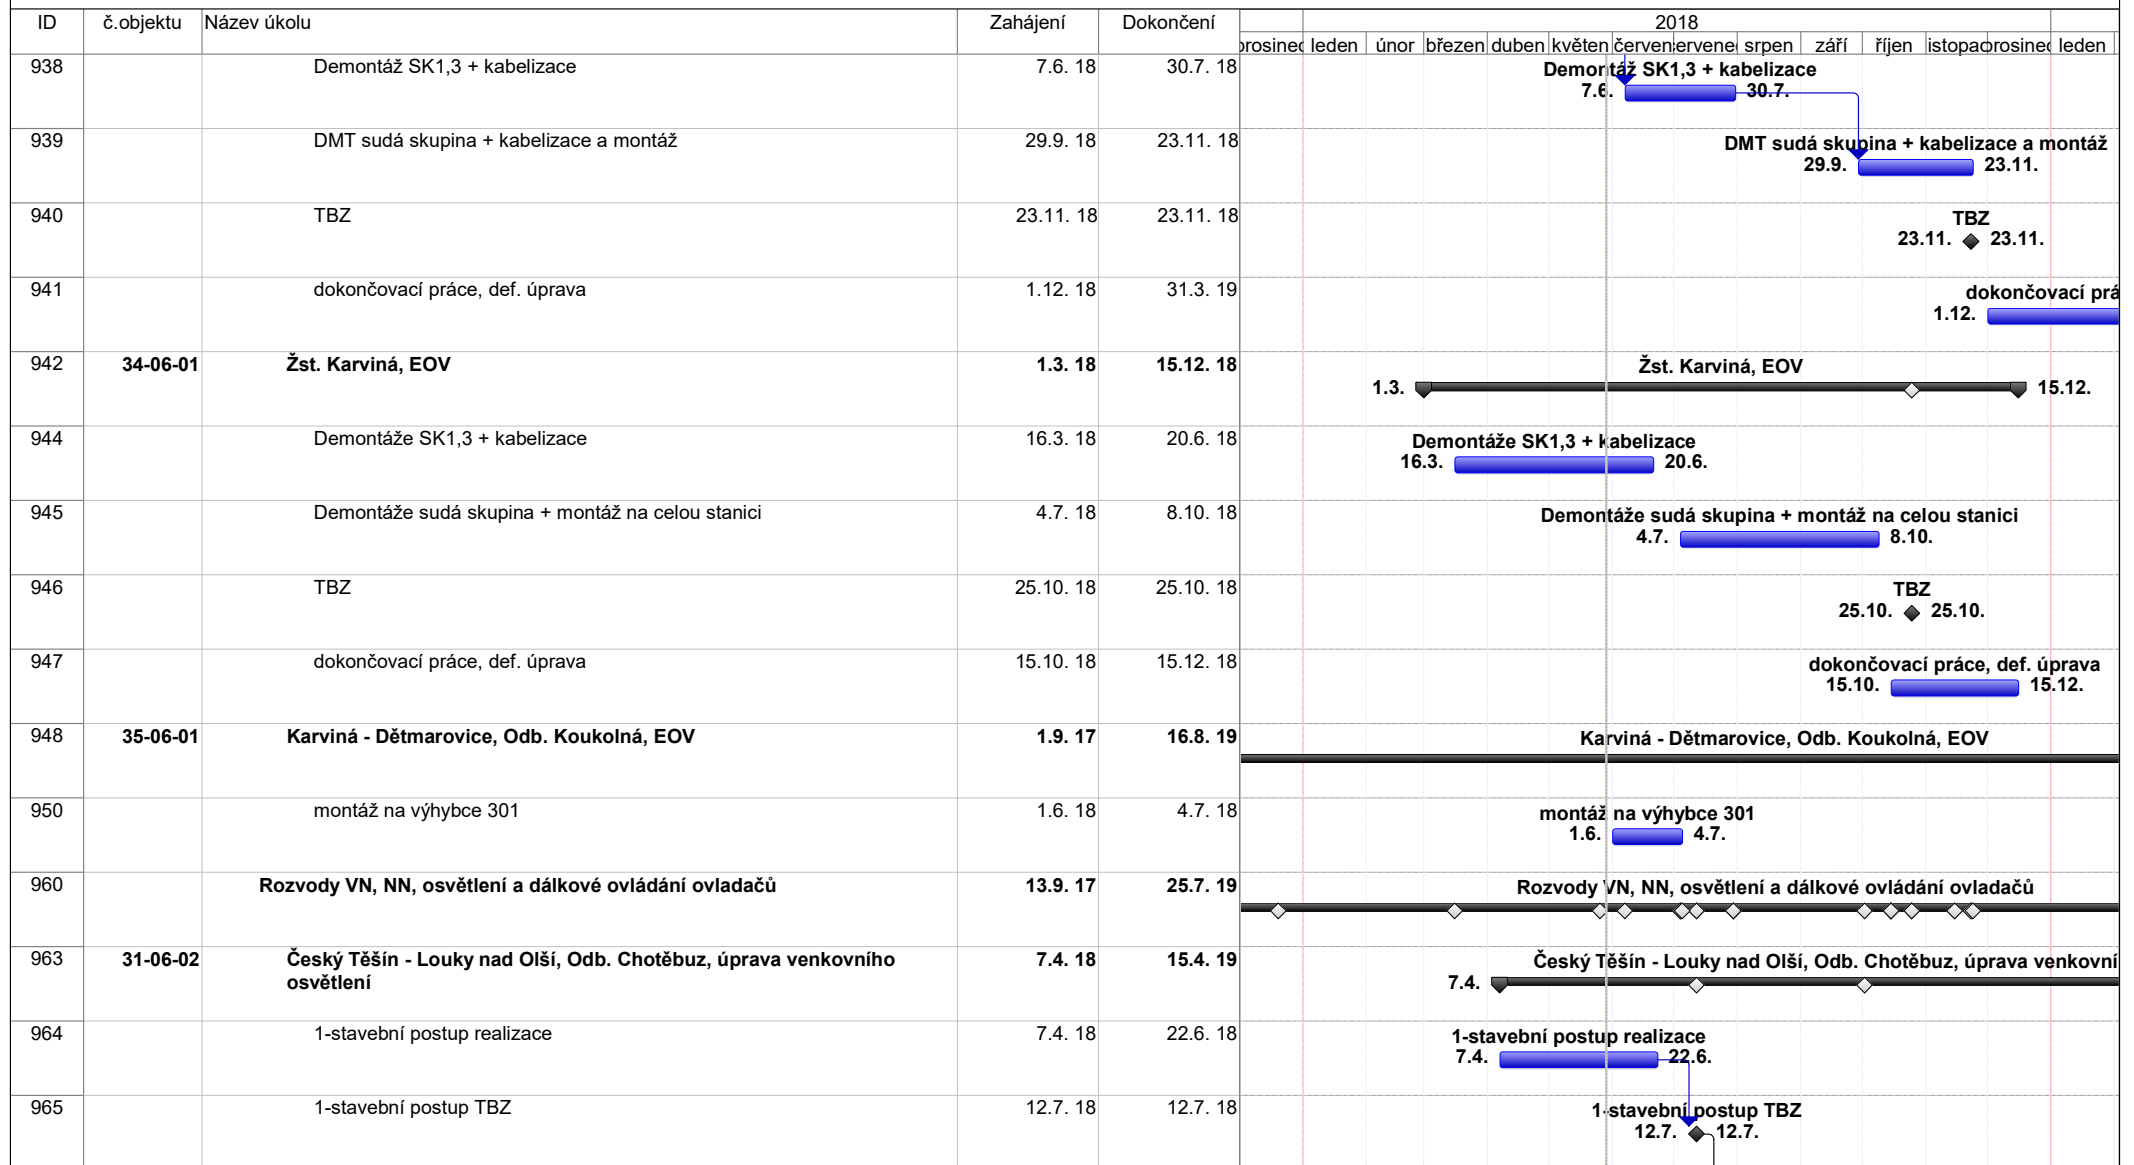

ID	č. objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018																	
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec					
966		2-stavební postup realizace	18.7. 18	2.10. 18									2-stavební postup realizace 18.7. - 2.10.									
967		2-stavební postup realizace	2.10. 18	2.10. 18										2-stavební postup realizace 2.10. - 2.10.								
968		dokončovací práce	15.9. 18	15.4. 19											15.9.		dokončovací práci					
969	31-06-03	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava osvětlení podchodu a nástupišť	7.4. 18	15.4. 19									Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava osvětlení podchodu a nástupišť 7.4. - 15.4.									
970		1-stavební postup realizace	7.4. 18	22.6. 18									1-stavební postup realizace 7.4. - 22.6.									
971		1-stavební postup TBZ	12.7. 18	12.7. 18										1-stavební postup TBZ 12.7. - 12.7.								
972		2-stavební postup realizace	18.7. 18	2.10. 18									2-stavební postup realizace 18.7. - 2.10.									
973		2-stavební postup TBZ	15.10. 18	15.10. 18											2-stavební postup TBZ 15.10. - 15.10.							
974		dokončovací práce	15.9. 18	15.4. 19											15.9.		dokončovací práci					
975	31-06-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava rozvodů nn	1.3. 18	15.10. 18									Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava rozvodů nn 1.3. - 15.10.									
976		výkpy, kabelizace - přípravné práce	1.3. 18	7.5. 18									výkpy, kabelizace - přípravné práce 1.3. - 7.5.									
977		1-stavební postup realizace	21.4. 18	9.7. 18									1-stavební postup realizace 21.4. - 9.7.									
978		2-stavební postup realizace	10.7. 18	2.10. 18									2-stavební postup realizace 10.7. - 2.10.									
979		TBZ	15.10. 18	15.10. 18											TBZ 15.10. - 15.10.							
980	31-06-05	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, DOÚO a ON 50	23.6. 18	23.11. 18									Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, DOÚO a ON 50 23.6. - 23.11.									

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018																																																																														
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden																																																																	
981		realizace	23.6. 18	23.11. 18																	23.6.	realizace																				23.11.																																									
982		TBZ	15.10. 18	15.10. 18																																																							TBZ																					15.10.	◆	15.10.	
983	31-06-06	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC	1.12. 17	30.5. 18																																																								Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC																					30.5.		
984		realizace	1.12. 17	30.5. 18																																																								realizace																				30.5.			
985	31-12-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Chotěbuz, závěsný kabel 22kV	15.1. 18	15.10. 18																																																								Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Chotěbuz, závěsný kabel 22kV																					15.1.	◆	15.10.
987		montáž kabelu	20.2. 18	2.10. 18																																																								montáž kabelu																				20.2.	◆	2.10.	
988		TBZ	15.10. 18	15.10. 18																																																								TBZ																				15.10.	◆	15.10.	
989	31-12-02	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Chotěbuz - Louky nad Olší, závěsný kabel 22kV	15.1. 18	15.10. 18																																																								Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Chotěbuz - Louky nad Olší, závěsný kabel 22kV																				15.1.	◆	15.10.	
991		montáž kabelu	20.2. 18	2.10. 18																																																								montáž kabelu																				20.2.	◆	2.10.	
992		TBZ	15.10. 18	15.10. 18																																																								TBZ																				15.10.	◆	15.10.	
993	32-06-02	Žst. Louky nad Olší, úprava venkovního osvětlení	7.4. 18	15.12. 18																																																								Žst. Louky nad Olší, úprava venkovního osvětlení																				7.4.	◆	15.12.	
994		1-stavební postup realizace SK 5,7	7.4. 18	25.5. 18																																																							1-stavební postup realizace SK 5,7																				7.4.	◆	25.5.		
995		1-stavební postup TBZ	7.6. 18	7.6. 18																																																								1-stavební postup TBZ																				7.6.	◆	7.6.	
996		2-stavební postup realizace SK1,3	7.6. 18	30.7. 18																																																								2-stavební postup realizace SK1,3																				7.6.	◆	30.7.	
997		2-stavební postup realizace TBZ	30.7. 18	30.7. 18																																																								2-stavební postup realizace TBZ																				30.7.	◆	30.7.	

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018														
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	
998		3-stavební postup realizace sudá skupina	21.9. 18	15.11. 18															3-stavební postup realizace sudá skupina 21.9. 15.11.
999		3-stavební postup realizace TBZ	15.11. 18	15.11. 18															3-stavební postup realizace TBZ 15.11. 15.11.
1000		aktivace a konečná úprava	30.10. 18	15.12. 18															aktivace a konečná úprava 30.10. 15.12.
1001	32-06-03	Žst. Louky nad Olší, osvětlení podchodu a nástupišť	7.4. 18	15.12. 18															Žst. Louky nad Olší, osvětlení podchodu a nástupišť 7.4. 15.12.
1002		1-stavební postup realizace SK 5,7	7.4. 18	25.5. 18															1-stavební postup realizace SK 5,7 7.4. 25.5.
1003		1-stavební postup TBZ	25.5. 18	25.5. 18															1-stavební postup TBZ 25.5. 25.5.
1004		2-stavební postup realizace SK1,3	7.6. 18	30.7. 18															2-stavební postup realizace SK1,3 7.6. 30.7.
1005		2-stavební postup realizace TBZ	30.7. 18	30.7. 18															2-stavební postup realizace TBZ 30.7. 30.7.
1006		3-stavební postup realizace sudá skupina	5.9. 18	15.11. 18															3-stavební postup realizace sudá skupina 5.9. 15.11.
1007		3-stavební postup realizace TBZ	15.11. 18	15.11. 18															3-stavební postup realizace TBZ 15.11. 15.11.
1008		aktivace a konečná úprava	30.10. 18	15.12. 18															aktivace a konečná úprava 30.10. 15.12.
1009	32-06-04	Žst. Louky nad Olší, úprava rozvodů nn	1.2. 18	30.7. 18															Žst. Louky nad Olší, úprava rozvodů nn 1.2. 30.7.
1010		výkopy, kabelizace	1.2. 18	13.7. 18															výkopy, kabelizace 1.2. 13.7.
1011		TBZ	30.7. 18	30.7. 18															TBZ 30.7. 30.7.
1012	32-06-05	Žst. Louky nad Olší, DOÚO	31.3. 18	23.11. 18															Žst. Louky nad Olší, DOÚO 31.3. 23.11.

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018																
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden			
1013		realizace	31.3. 18	23.11. 18																	realizace 31.3. ————— 23.11.
1014		TBZ 3,5 a 7	30.7. 18	30.7. 18																	TBZ 3,5 a 7 30.7. ◆ 30.7.
1015		TBZ konečna	23.11. 18	23.11. 18																	TBZ konečna 23.11. ◆ 23.11.
1016	32-06-06	Žst. Louky nad Olší, přeložky silнопroudých rozvodů SŽDC	1.2. 18	25.5. 18																	Louky nad Olší, přeložky silнопroudých rozvodů SŽDC 1.2. ————— 25.5.
1017		realizace	1.2. 18	25.5. 18																	realizace 1.2. ————— 25.5.
1018	33-04-01	Louky nad Olší - Karviná, přeložky kabelu 6kV	1.2. 18	25.5. 18																	Louky nad Olší - Karviná, přeložky kabelu 6kV 1.2. ————— 25.5.
1019		realizace	1.2. 18	25.5. 18																	realizace 1.2. ————— 25.5.
1020	33-06-01	Louky nad Olší - Karviná, úprava rozvodů nn	1.3. 18	15.11. 18																	Louky nad Olší - Karviná, úprava rozvodů nn 1.3. ————— 15.11.
1021		výkopy, kabelizace	1.3. 18	15.11. 18																	výkopy, kabelizace 1.3. ————— 15.11.
1022	33-06-02	Louky nad Olší - Karviná, úprava DOÚO	1.3. 18	23.11. 18																	Louky nad Olší - Karviná, úprava DOÚO 1.3. ————— 23.11.
1023		realizace	1.3. 18	15.11. 18																	realizace 1.3. ————— 15.11.
1024		TBZ	23.11. 18	23.11. 18																	TBZ 23.11. ◆ 23.11.
1025	33-12-01	Louky nad Olší - Karviná, závěsný kabel 22kV	1.3. 18	23.11. 18																	Louky nad Olší - Karviná, závěsný kabel 22kV 1.3. ————— 23.11.
1026		vysřtrojení stožárů	1.3. 18	30.6. 18																	vysřtrojení stožárů 1.3. ————— 30.6.
1027		montáž kabelu	15.3. 18	30.10. 18																	montáž kabelu 15.3. ————— 30.10.

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018																														
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden																	
1028		aktivace a konečná úprava	23.11. 18	23.11. 18																															◆ 23.11.
1029	34-06-02	Žst. Karviná, úprava venkovního osvětlení	16.3. 18	15.12. 18																															16.3. Žst. Karviná, úprava venkovního osvětlení
1030		2-stavební postup realizace SK1,3	16.3. 18	20.6. 18																															2-stavební postup realizace SK1,3 16.3. 20.6.
1031		2-stavební postup realizace TBZ	4.7. 18	4.7. 18																															2-stavební postup realizace TBZ 4.7. 4.7.
1032		3-stavební postup realizace sudá skupina	4.7. 18	4.10. 18																															3-stavební postup realizace sudá skupina 4.7. 4.10.
1033		3-stavební postup realizace TBZ	25.10. 18	25.10. 18																															3-stavební postup realizace TBZ 25.10. 25.10.
1034		aktivace a konečná úprava	5.10. 18	15.12. 18																															aktivace a konečná úprava 5.10. 15.12.
1035	34-06-03	Žst. Karviná, úprava osvětlení podchodu a nástupišť	16.3. 18	15.12. 18																															16.3. Žst. Karviná, úprava osvětlení podchodu a nástupišť
1036		2-stavební postup realizace SK1,3	16.3. 18	20.6. 18																															2-stavební postup realizace SK1,3 16.3. 20.6.
1037		2-stavební postup realizace TBZ	4.7. 18	4.7. 18																															2-stavební postup realizace TBZ 4.7. 4.7.
1038		3-stavební postup realizace sudá skupina	4.7. 18	4.10. 18																															3-stavební postup realizace sudá skupina 4.7. 4.10.
1039		3-stavební postup realizace TBZ	25.10. 18	25.10. 18																															3-stavební postup realizace TBZ 25.10. 25.10.
1040		aktivace a konečná úprava	5.10. 18	15.12. 18																															aktivace a konečná úprava 5.10. 15.12.
1041	34-06-04	Žst. Karviná, úprava rozvodů nn	15.12. 17	20.6. 18																															1. Žst. Karviná, úprava rozvodů nn
1042		výkopy, kabelizace	15.12. 17	20.6. 18																															2. výkopy, kabelizace



Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice
realizační HMG na rok 2018 - aktualizace k 20.5.2018

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018														
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	
1043	34-06-05	Žst. Karviná, DOÚO	15.5. 18	15.3. 19							15.5.								
1044		3-stavební postup realizace sudá skupina	15.5. 18	4.10. 18							15.5.								4.10.
1045		2-stavební postup realizace TBZ	4.7. 18	4.7. 18							4.7.								4.7.
1046		3-stavební postup realizace TBZ	25.10. 18	25.10. 18															25.10.
1047		aktivace a konečná úprava	15.10. 18	15.3. 19														15.10.	
1052	35-06-02	Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, úprava rozvodů nn a osvětlení	16.3. 18	25.7. 19							16.3.								
1053		2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmarovice TK1	16.3. 18	4.7. 18							16.3.								4.7.
1054		2-stavební postup TBZ	4.7. 18	4.7. 18							4.7.								4.7.
1068		Ukolejnění kovových konstrukcí	13.11. 17	25.7. 19															
1069	31-01-02	Český Těšín - Louky nad Olší, ukolejnění	7.4. 18	4.10. 18							7.4.								4.10.
1070		1-stavební postup realizace	7.4. 18	22.6. 18							7.4.								22.6.
1071		1-stavební postup TBZ	12.7. 18	12.7. 18															12.7.
1072		2-stavební postup realizace	12.7. 18	4.10. 18															4.10.
1073		2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT	10.7. 18	2.10. 18															2.10.
1074		2-stavební postup realizace	2.10. 18	2.10. 18															2.10.

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018																				
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden							
1075	32-01-02	Žst. Louky nad Olší, ukolejnění	7.4. 18	23.11. 18																					7.4. 23.11.
1076		1-stavební postup realizace SK 5,7	7.4. 18	25.5. 18																					1-stavební postup realizace SK 5,7 7.4. 25.5.
1077		1-stavební postup TBZ	12.7. 18	12.7. 18																					1-stavební postup TBZ 12.7. 12.7.
1078		2-stavební postup realizace SK1,3	12.7. 18	3.9. 18																					2-stavební postup realizace SK1,3 12.7. 3.9.
1079		2-stavební postup realizace TBZ	3.9. 18	3.9. 18																					2-stavební postup realizace TBZ 3.9. 3.9.
1080		3-stavební postup realizace vjezdové spojky ze strany ČT	4.9. 18	29.10. 18																					3-stavební postup realizace vjezdové spojky ze strany ČT 4.9. 29.10.
1081		3-stavební postup realizace TBZ	15.10. 18	15.10. 18																					3-stavební postup realizace TBZ 15.10. 15.10.
1082		3-stavební postup realizace sudá skupina	7.9. 18	15.11. 18																					3-stavební postup realizace sudá skupina 7.9. 15.11.
1083		3-stavební postup realizace TBZ	15.11. 18	15.11. 18																					3-stavební postup realizace TBZ 15.11. 15.11.
1084		3-stavební postup realizace výhybka 23	16.11. 18	23.11. 18																					3-stavební postup realizace výhybka 16.11. 23.11.
1085		3-stavební postup realizace TBZ	23.11. 18	23.11. 18																					3-stavební postup realizace TBZ 23.11. 23.11.
1089	34-01-02	Žst. Karviná, ukolejnění	1.3. 18	25.10. 18																					1.3. 25.10.
1092		2-stavební postup realizace SK1,3	16.3. 18	20.6. 18																					2-stavební postup realizace SK1,3 16.3. 20.6.
1093		2-stavební postup realizace TBZ	4.7. 18	4.7. 18																					2-stavební postup realizace TBZ 4.7. 4.7.
1094		3-stavební postup realizace sudá skupina	4.7. 18	4.10. 18																					3-stavební postup realizace sudá skupina 4.7. 4.10.



Optimalizace trati Český Těšín - Dětmарovice
realizační HMG na rok 2018 - aktualizace k 20.5.2018

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018														
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden		
1095		3-stavební postup realizace TBZ	25.10. 18	25.10. 18													3-stavební postup realizace TBZ 25.10. ♦ 25.10.		
1096	35-01-02	Karviná - Dětmарovice, ukolejnění	16.3. 18	25.7. 19													Karviná - Dětmарovice, ukolejnění		
1097		1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK	16.3. 18	4.7. 18													1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK 16.3. ██████████ 4.7.		
1098		1-stavební postup TBZ	4.7. 18	4.7. 18													1-stavební postup TBZ 4.7. ♦ 4.7.		
1099		2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmарovice TK1	16.3. 18	20.8. 18													2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmарovice TK1 16.3. ██████████ 20.8.		
1100		2-stavební postup TBZ	30.8. 18	30.8. 18													2-stavební postup TBZ 30.8. ♦ 30.8.		
1101		3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2	4.7. 18	7.12. 18													3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2 4.7. ██████████ 7.12.		
1102		3-stavební postup TBZ	7.12. 18	7.12. 18													3-stavební postup TBZ 7.12. ♦ 7.12.		
1110		Vnější uzemnění .	1.11. 17	15.11. 18													Vnější uzemnění . ██████████ 15.11.		
1111	31-06-07	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	30.3. 18	15.10. 18													Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, uzemnění trafostanice 22/0,4kV 30.3. ██████████ 15.10.		
1112		realizace	30.3. 18	30.9. 18													realizace 30.3. ██████████ 30.9.		
1113		TBZ	15.10. 18	15.10. 18													TBZ 15.10. ♦ 15.10.		
1114	31-06-08	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, uzemnění SpS	30.3. 18	15.10. 18													Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, uzemnění SpS 30.3. ██████████ 15.10.		
1115		realizace	30.3. 18	30.9. 18													realizace 30.3. ██████████ 30.9.		
1116		TBZ	15.10. 18	15.10. 18													TBZ 15.10. ♦ 15.10.		

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018																		
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden					
1117	32-06-08	Žst. Louky nad Olší, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	30.3. 18	15.10. 18																			
1118		realizace	30.3. 18	30.9. 18																			
1119		TBZ	15.10. 18	15.10. 18																			
1120	33-06-03	Louky nad Olší - Karviná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	30.5. 18	15.11. 18																			
1121		realizace	30.5. 18	15.11. 18																			
1122		TBZ	15.11. 18	15.11. 18																			
1123	34-06-07	Žst. Karviná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	8.3. 18	4.7. 18																			
1124		realizace	8.3. 18	20.6. 18																			
1125		TBZ	4.7. 18	4.7. 18																			
1129		Přeložky silnoproudých zařízení	1.11. 17	25.7. 18																			
1132	31-06-42	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava veřejného osvětlení obce	1.3. 18	13.7. 18																			
1133		realizace	1.3. 18	13.7. 18																			
1138	31-06-45	Český Těšín - Louky nad Olší, Zast. Chotěbuz, přeložky silnoproudých rozvodů ČD	1.3. 18	25.7. 18																			
1139		realizace	1.3. 18	25.7. 18																			
1140	32-06-41	Žst. Louky nad Olší, přeložky silnoproudých rozvodů ČD	1.2. 18	25.5. 18																			

ID	č.objektu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018															
					prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden		
1141		realizace	1.2. 18	25.5. 18		1.2.	realizace					25.5.								
1144		Přeložky a ochrany sdělovacích vedení	13.9. 17	15.7. 18	ložky a ochrany sdělovacích vedení															
1145	31-10-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úpravy a přeložky DK SŽDC	1.2. 18	15.7. 18	Český Těšín - Louky nad Olší, úpravy a přeložky DK SŽDC															
1146		realizace	1.2. 18	15.7. 18		1.2.	realizace					15.7.								
1149	32-10-01	Žst. Louky nad Olší, úpravy a přeložky DK SŽDC	1.2. 18	25.5. 18	Žst. Louky nad Olší, úpravy a přeložky DK SŽDC															
1150		realizace	1.2. 18	25.5. 18		1.2.	realizace					25.5.								
1151	32-10-02	Žst. Louky nad Olší, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; - NENACENO VAT práce hrazeny	1.12. 17	15.5. 18	y sdělovacích kabelů nedrážních správců; - NENACENO VAT práce hrazeny															
1152		realizace	1.12. 17	15.5. 18			realizace					15.5.								
1155	35-10-01	Karviná - Dětmarovice, úpravy a přeložky DK a TK SŽDC	1.12. 17	20.6. 18	arviná - Dětmarovice, úpravy a přeložky DK a TK SŽDC															
1156		realizace	1.12. 17	20.6. 18			realizace					20.6.								
1163	50-10-01	Český Těšín - Dětmarovice, úsek Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu ČD-T	1.2. 18	25.5. 18	ětmarovice, úsek Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu ČD-T															
1164		realizace	1.2. 18	25.5. 18		1.2.	realizace					25.5.								

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **128983**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 2ff1ac23-76e2-47e6-aa65-299b25629cd0

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **25.10.2018 09:35:10**



a4855ffa-77fb-4d64-8b75-b987c5596bd7
