

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 2077/00066001/2018

Číslo smlouvy Zhotovitele: 84-18

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

IČ: 27900096

DIČ: CZ27900096

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 11881

Jednající: Ing. Jan Tříška, předseda představenstva

Bc. Simona Krpatová, člen představenstva

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Jan Tříška, předseda představenstva

Bc. Simona Krpatová, člen představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.08.2018 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/00516 a III/0059 Zbuzany - průtah**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 4 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli.
3. S ohledem na nutnost dodržet dodatečně vznesený požadavek silničního správního úřadu na zachování maximální možné dopravní obslužnosti území, bylo nezbytné plnění Díla rozdělit na 3 samostatné etapy, v důsledku čehož není možné provést Dílo ve stanoveném termínu. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na

sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže. Smluvní strany se proto dohodly uzavřít tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.1. a 4.2. bod e) Smlouvy dohodly na prodloužení termínu provádění Díla a jeho jednotlivých dílčích termínů.
2. Článek 4.1. Smlouvy věta první se proto mění následovně:
„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce nejpozději do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 7 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli.“
3. Dílo bude probíhat v souladu s harmonogramem stavebních prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje tak Přílohu č. 5 Smlouvy – Časový plán výstavby – časový harmonogram.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Seznam příloh:

1. časový plán výstavby – časový harmonogram


V Říčanech dne
Objednatel:

V Kladně dne
Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.
Ing. Jan Tříška, předseda představenstva

Bc. Simona Krpatová, člen představenstva

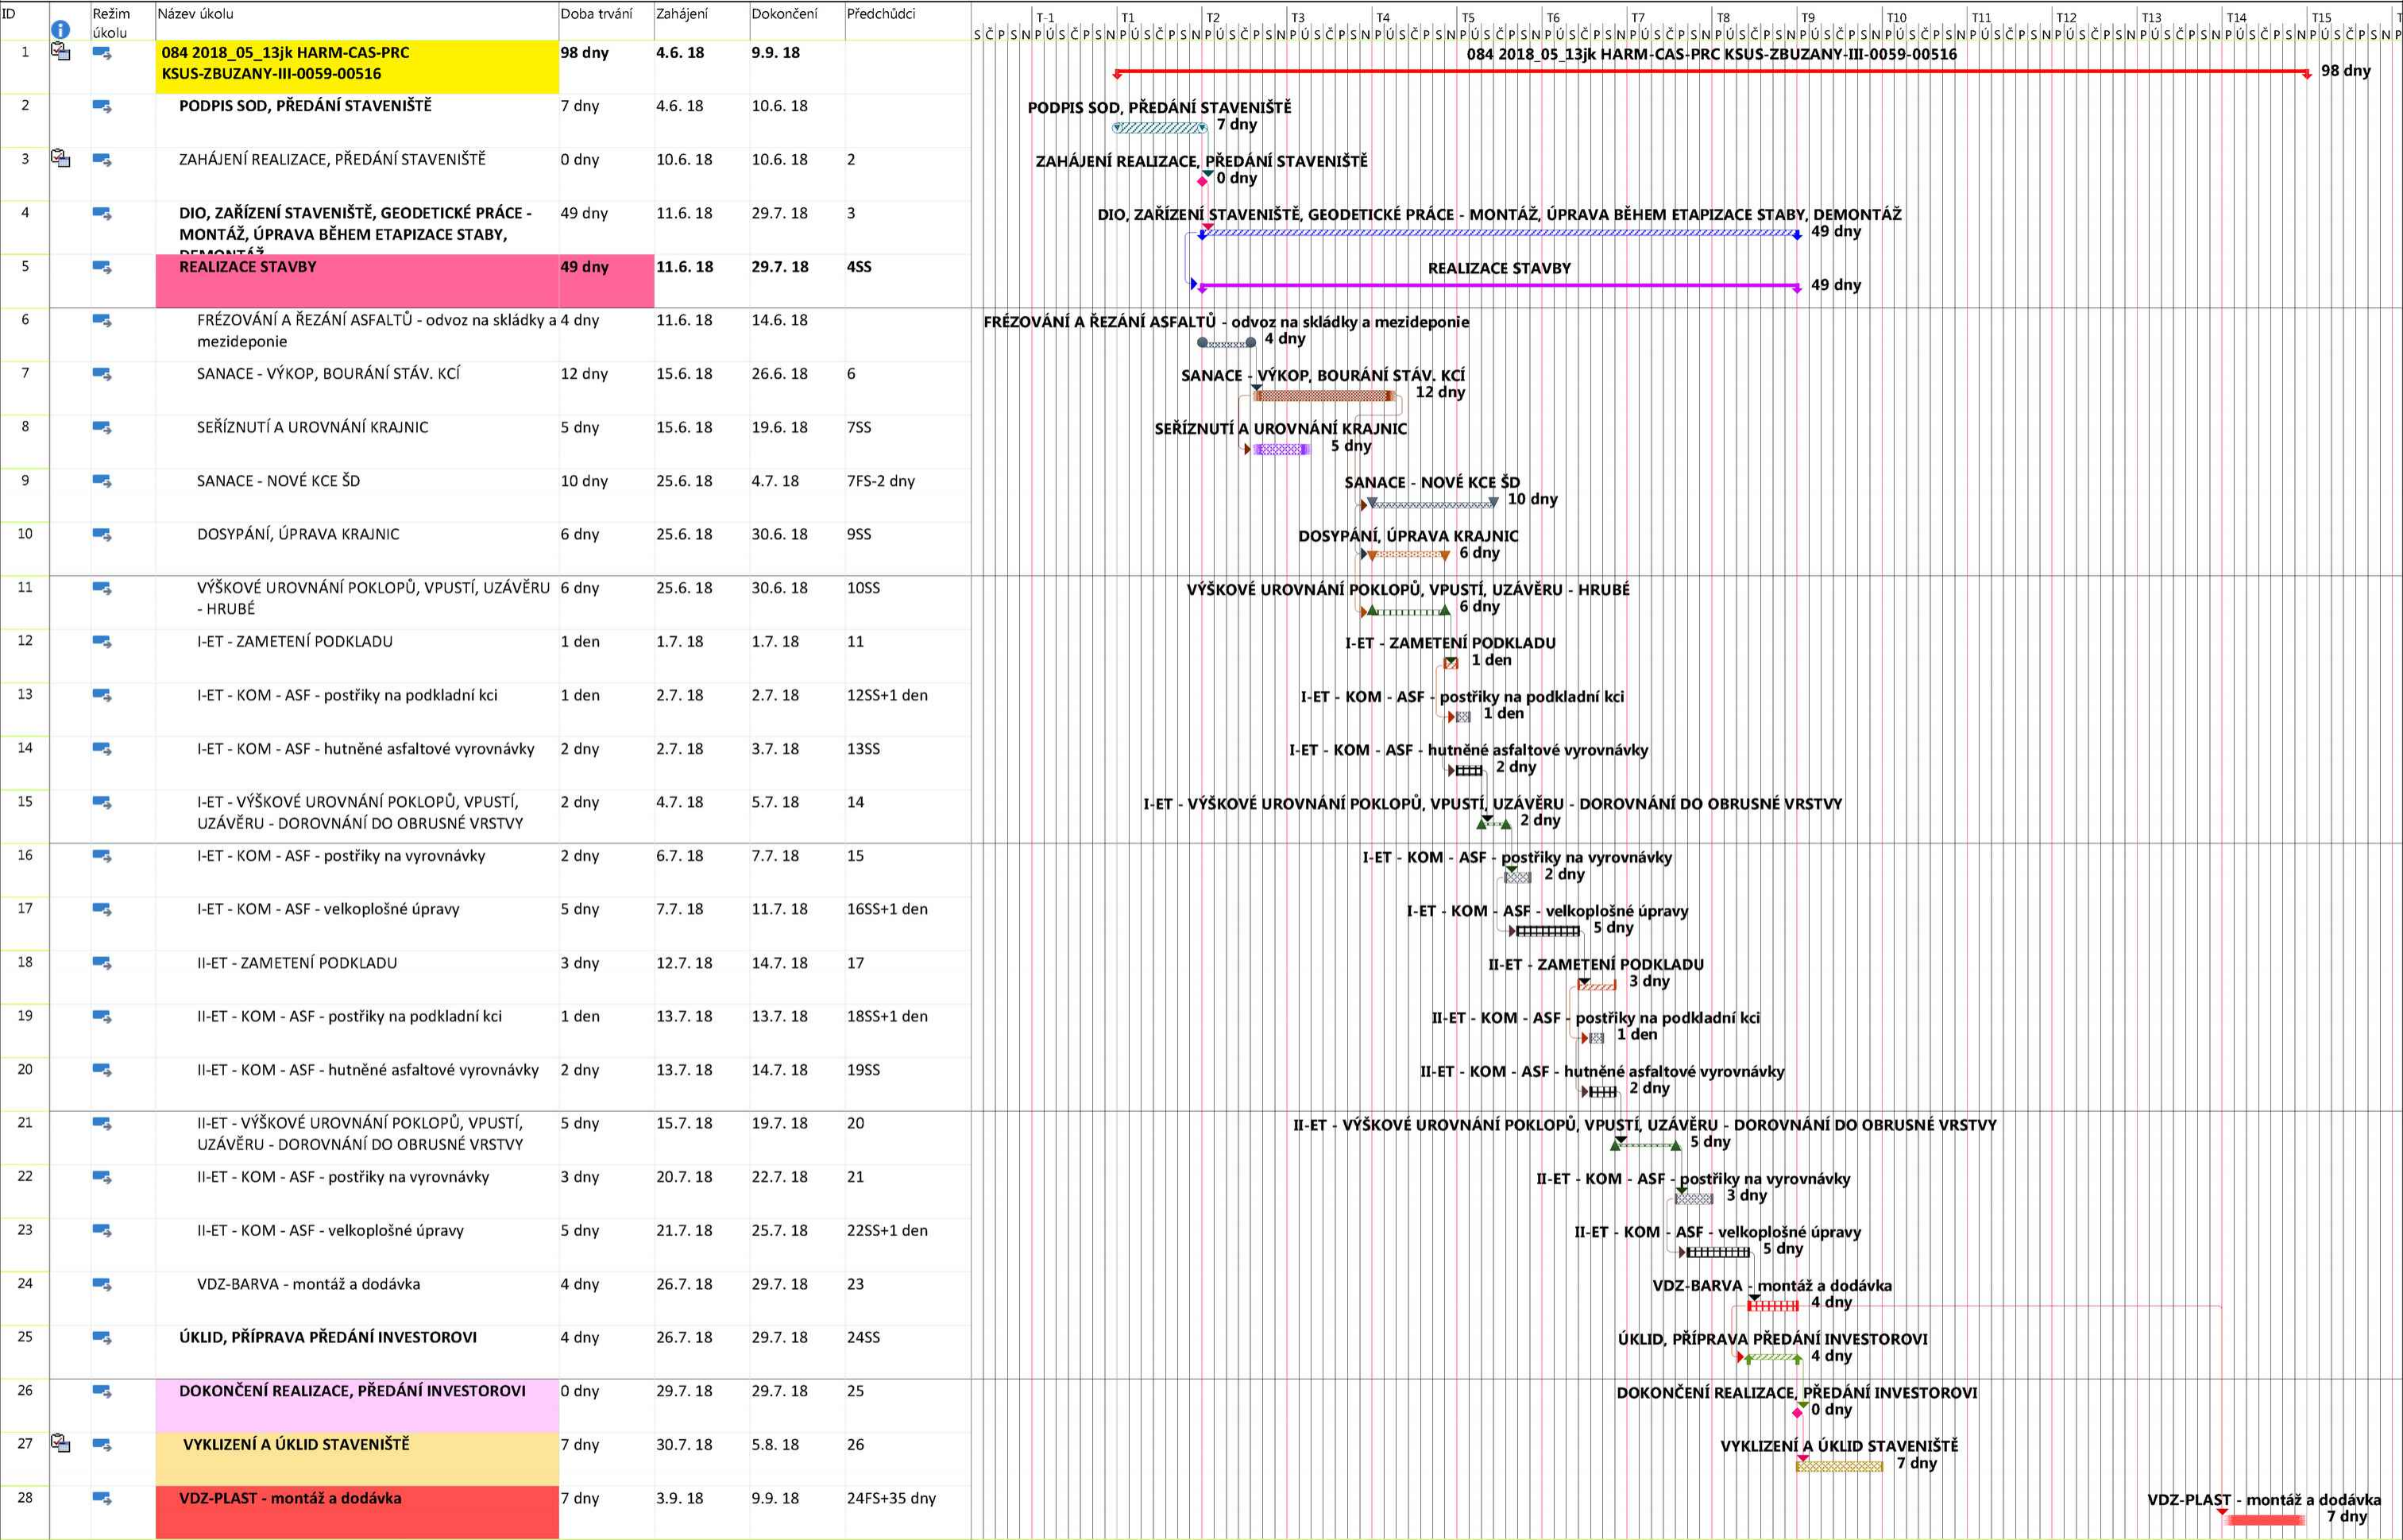

Projekt: 084 2018_05_13jk HARM-CAS-PRC KSUS-ZBUZA
Datum: 18.10. 18

Úkol
Rozdělení
Milník
Souhrnný

Souhm projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadáného úkolu

084 2018_05_13jk HARM-CAS-PRC KSUS-ZBUZANY-III-0059-00516.mpp

Stránkování harmonogramu 1 /1
