

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. ZHOTOVITELE: 509/05/2017 - I.

č. OBJEDNATELE: 50/2017


Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

Realitní a stavební společnost s r.o.

Sídlo: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno
IČ: 41432037
DIČ: CZ41432037
zastoupena: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90993
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce Dusíkova divadla“ ze dne 09.06.2017

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 2:

čl. I.

Předmět plnění

Účastníci prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 09.06.2017 Smlouvu o dílo. Dále dne 20.09.2017 mezi sebou uzavřeli Dodatek č. 1 k této smlouvě.

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. I. ve spojení s dodatkem č. 1, mění a rozšiřuje, resp. zužuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnových listech stavby č. 5 – 9, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2.

čl. II.

Doba plnění

Dále se účastníci dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že původní doba plnění díla uvedená v čl. II smlouvy o dílo ve spojení s dodatkem č. 1, se z důvodu dohodnutých změn mění:

Původní doba plnění:

I. etapa

Předání a převzetí staveniště zhotoviteli: do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele
Zahájení stavebních prací: 12.06.2017
Dokončení stavebních prací: max. do 30.04.2019

II. etapa

Předání a převzetí staveniště zhotoviteli: do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele
Zahájení stavebních prací: do 10 dnů od předání staveniště
Dokončení stavebních prací: max. do 31.10.2018

III. etapa

Předání a převzetí staveniště zhotoviteli: do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele
Zahájení stavebních prací: do 10 dnů od předání staveniště
Dokončení stavebních prací: max. do 30.04.2019

na

Nová doba plnění:

I. etapa

Předání a převzetí staveniště zhotoviteli: do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele
Zahájení stavebních prací: 12.06.2017
Dokončení stavebních prací: max. do 30.04.2019

II. etapa

Předání a převzetí staveniště zhotoviteli: do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele
Zahájení stavebních prací: do 10 dnů od předání staveniště
Dokončení stavebních prací: max. do 30.11.2018

III. etapa

Předání a převzetí staveniště zhotoviteli: do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele
Zahájení stavebních prací: do 10 dnů od předání staveniště
Dokončení stavebních prací: max. do 30.04.2019

čl. III.

Cena díla

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. IV smlouvy o dílo, se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:

Původní cena díla:

Cena dle SOD bez DPH	11.490.281,00	Kč
Cena po D1 bez DPH	11.693.403,04	Kč

DPH po D1 v sazbě 21 %	2.455.614,64	Kč
Cena po D1 včetně DPH	14.149.017,68	Kč
<i>(dále jen "Cena za provedení díla")</i>		

na

Nová cena díla:

Cena bez DPH	11.817.080,04	Kč
DPH 21 %	2.481.586,81	Kč
Cena celkem včetně DPH	14.298.666,85	Kč
<i>(dále jen "Cena za provedení díla")</i>		

**čl. IV.
Závěrečné ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění a zůstávají v platnosti. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy stavby č. 5 - 9

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 433/2018 ze dne 22.10.2018.

V Čáslavi dne 26.10.2018

V Čáslavi dne 26.10.2018

REALITNÍ a STAVEBNÍ
SPOLČNOST S R.O.

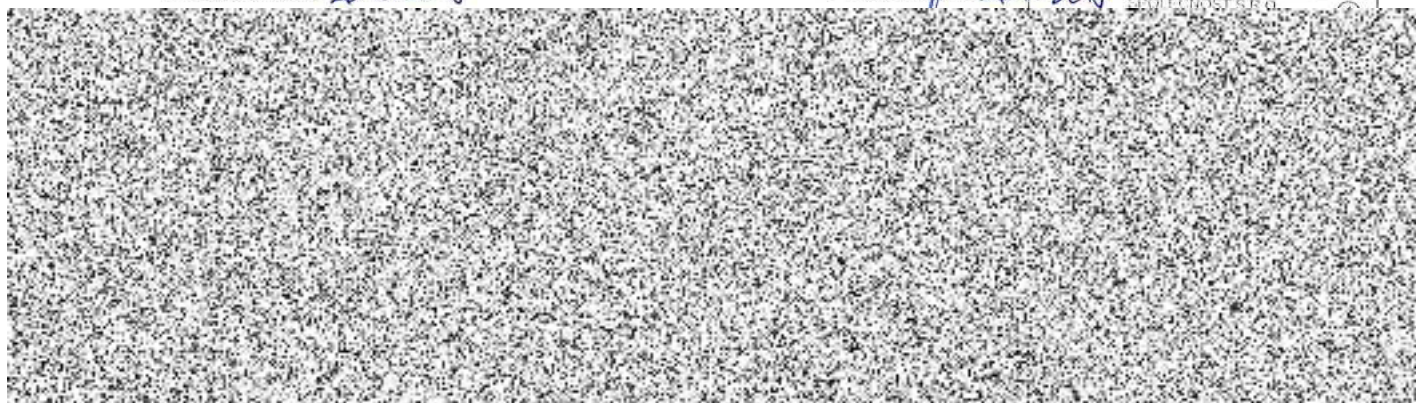

Rekonstrukce Dusíkova divadla
Rekapitulace

DOPADY ZMĚNY:

Do časového plánu stavby

Původní termín 2. etapy: **31.10.2018**

Nový termín 2. etapy: **30.11.2018**

Zhotovitel žádá o prodloužení termínu z důvodu klimatických podmínek (příliš horké počasí na provádění fasády a ostatních betonářských prací) a nárůstu mokrych procesů - kompletní štukování stěn ve foyer.

Do ceny stavby	bez DPH	vč. DPH
Vícepráce celkem:	832 924,56	1 007 838,72
Méněpráce celkem:	-709 247,56	-858 189,54
<i>Změnový list 5 - vícepráce</i>	<i>348 786,00</i>	
<i>Změnový list 5 - méněpráce</i>	<i>-195 650,00</i>	
<i>Změnový list 6 - vícepráce</i>	<i>219 399,30</i>	
<i>Změnový list 6 - méněpráce</i>	<i>-211 774,87</i>	
<i>Změnový list 7 - vícepráce</i>	<i>78 840,06</i>	
<i>Změnový list 7 - méněpráce</i>	<i>-182 913,06</i>	
<i>Změnový list 8 - vícepráce</i>	<i>185 899,20</i>	
<i>Změnový list 8 - méněpráce</i>	<i>0,00</i>	
<i>Změnový list 9 - vícepráce</i>	<i>0,00</i>	
<i>Změnový list 9 - méněpráce</i>	<i>-118 909,63</i>	
Σ	123 677,00 Kč	149 649,18 Kč
Cena dle D1	11 693 403,04 Kč	13 903 241,00 Kč
Nová cena díla	11 817 080,04 Kč	
DPH	2 481 586,81 Kč	
Cena vč. DPH	14 298 666,85 Kč	


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Rekonstrukce Dusíkova divadla

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

5

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Výplně otvorů - okna, dveře

Popis změny:

Výměna oken a dveří

Odůvodnění změny:

Okna: V PD byla uvažována repase 8 ks špaletových oken, při jejich demontáži bylo zjištěno, že jsou dožilá. Byl zadán posudek, na základě kterého bylo přistoupeno k výrobě oken nových.

Dveře: Po posouzení stavu stávajících dveří byla projednána změna projektu. Dveře budou zachovány a pouze upraveny dle požadavku projekce. Původně zamýšlená prosklená stěna nebude realizována.

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

Ing. arch. Aleš Burian

podpis / razítko:



POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do ceny stavby:	348 786,00	Kč	bez DPH
	-195 650,00	Kč	bez DPH

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost, s. r. o.

Stavbyvedoucí: Jaroslav Vaňátko

podpis:



VYJÁDRĚNÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

TDI investora: Ing. Daniel Chráska souhlasím

Objednatel: souhlasím

podpis:



Rekonstrukce Dusíkova divadla, změnový list 5

č.p.	název položky	výměra mj	cena/mj	celkem
Vícepráce				
1.	D+M nového špaletového okna 1460/1950	8,00 ks	41 142,00	329 136,00
2.	repase, přesklení, kování, (nátěr)	1,00 ks	19 650,00	19 650,00
Celkem				348 786,00
Méněpráce				
44.	OS2/II proskl.dřev.venkovní stěna 1450/2375	-1,00 kpl	35 650,00	-35 650,00
67.	O03/III repase špaletové okno 1460/1950	-8,00 ks	20 000,00	-160 000,00
Celkem				-195 650,00
Celkem bez DPH				153 136,00
DPH 21 %				32 158,56
Celkem cena vč. DPH				185 294,56


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Rekonstrukce Dusíkova divadla

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

6

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební
oddíl,
(provozní
celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Vnitřní povrchy

Popis změny:

Oprava vnitřních omítek po provedení rozvodů elektro a topení.

Odůvodnění změny:

Vnitřní omítky v rekonstruovaných prostorách byly již několikrát v minulosti opravovány (elektro rozvody, rozvody ÚT). Při současné rekonstrukci prostor by opravené omítky tvořily velkou část celých povrchů, proto bylo rozhodnuto o přeštukování celé plochy stěn. Tím bude docíleno lepší kvality povrchu a celého rekonstruovaného prostoru. Sanační omítky nebyly prováděny, protože provedenou hydroizolací v minulé etapě bylo zabráněno pronikání vlhkosti.

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

Ing. arch. Aleš Burian

podpis / razítko:



POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do ceny stavby:	219 399,30	Kč	bez DPH
	-211 774,87	Kč	bez DPH

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost, s. r. o.

Stavbyvedoucí: Jaroslav Vaňátko

podpis:



VYJÁDRĚNÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

TDI investora: Ing. Daniel Chráska

souhlasím

Objednatel:

souhlasím

podpis:



Soupis položek

Rekonstrukce Dusíkova divadla, změnový list 6

č.p.	název položky	výměra mj	cena/mj	celkem
Vícepráce				
3.	Oškrábání stávajících maleb omítek, úklid, odvoz suti , likvidace suti	939,00 m2	33,70	31 644,30
4.	Penetrační nátěr pod štuk	939,00 m2	45,00	42 255,00
5.	Omítka štuková	939,00 m2	140,00	131 460,00
6.	Zdivo z příček tl.100mm, přizdívka a zazdívka pro topení	18,00 m2	455,00	8 190,00
12.	Omítka vnitřních stěn dvouvrstvá vápenná	18,00 m2	325,00	5 850,00
Celkem				219 399,30
Méněpráce				
10.	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	-97,07 m2	95,00	-9 221,65
11.	Sanační omítkový systém vnitřní	-97,07 m2	658,00	-63 872,06
51.	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy	-306,63 m2	91,00	-27 903,33
52.	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy	-14,95 m2	295,00	-4 410,25
57.	Oprava vápen.omítek stěn do 10%	-524,50 m2	62,00	-32 519,00
58.	Oprava vápen.omítek stěn do 50%	-94,44 m2	251,00	-23 704,44
62.	Sádrový film v podlaží i ve schodišti tl.2mm	-99,67 m2	101,00	-10 066,67
64.	Příplatek za zabudované rohovníky	-190,66 m2	10,00	-1 906,60
66.	Montáž výztužné sítě do stěrky	-99,67 m2	185,00	-18 438,95
118.	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10%	-306,63 m2	7,00	-2 146,41
119.	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50%	-14,96 m2	40,19	-601,24
120.	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10%	-524,51 m2	7,10	-3 724,02
121.	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50%	-94,44 m2	30,70	-2 899,31
122.	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100%	-97,07 m2	59,20	-5 746,54
123.	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného	-93,22 m2	49,50	-4 614,39
Celkem				-211 774,87
Celkem bez DPH				7 624,43
DPH 21 %				1 601,13
Celkem cena vč. DPH				9 225,57


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Rekonstrukce Dusíkova divadla

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

7

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Klempířské prvky

Popis změny:

Klempířské prvky - stávající klempířské výrobky (zejména žlaby a svody) byly znovu posouzeny po postavení lešení. Vzhledem k výsledku posouzení byl upraven postupopravy a výměny klempířských prvků.

Odůvodnění změny:

Bylo provedeno posouzení klempířských prvků, bylo zjištěno, že žlaby jsou v dobrém technickém stavu. Proto je možné provést pouze opravu - nátěry, dotmelit spoje, srovnat žlaby, letovat spoje, opravit úžlabí a vyčistit žlaby od nečistot (původně měly být z 35 % vyměněny). Naopak svody vykazují nevyhovující stav, takže původně navržená 35% výměna byla přehodnocena, a svody musí být vyměněny ve 100 % rozsahu.

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

Ing. arch. Aleš Burian

podpis / razítko:



POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do ceny stavby:	78 840,06	Kč	bez DPH
	-182 913,06	Kč	bez DPH

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost, s. r. o.

Stavbyvedoucí: Jaroslav Vaňátko

podpis:



VYJÁDRĚNÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

TDI investora: Ing. Daniel Chráska

souhlasím

Objednatel:

souhlasím

podpis:



Rekonstrukce Dusíkova divadla, změnový list 7

č.p.	název položky	výměra mj	cena/mj	celkem
	Vícepráce			
14.	Odpadní trouby z Pz Plechu	84,35 m	265,00	22 352,75
15.	Demontáž odpadních trub kruhových	84,35 m	21,00	1 771,26
16.	Revize klempířských prvků, dotmelení spojů, rovnání žlabů, letování spojů, oprava úžlabí , čištění žlabů od nečistot	150,00 hod	275,00	41 250,00
17.	Montážní materiál pro klempířské práce , tmel , nýty, cín	1,00 kpl	2 500,00	2 500,00
18.	Oplechování říms z Pz plechu rš.250mm	16,13 m	330,00	5 321,25
19.	Oplechování říms z Pz plechu rš.330mm	16,80 m	336,00	5 644,80
	Celkem			78 840,06
	Méněpráce			
1.	Díl 764 klempířské KCE komplet celý soubor	-1,00 kpl	182 913,06	-182 913,06
	Celkem			-182 913,06
	Celkem bez DPH			-104 073,00
	DPH 21 %			-21 855,33
	Celkem cena vč. DPH			-125 928,34


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Rekonstrukce Dusíkova divadla

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

8

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Ostatní změny

Popis změny:

Dilatační lišty a rámeček do nově prováděného teracových podlah

Dilatační prvek potrubí

Sněhové zábrany na šikmé střechy

Plynový ohříváč vody

Dveře do skladu

Odůvodnění změny:

Dilatační lišty v teracu: Po konzultaci s odbornou prováděcí firmou bylo pro zamezení vytváření smršťovacích dilatačních trhlin nutné plochy rozčlenit. S ohledem na architektonickou kvalitu daného prostoru byly dilatační spáry navrženy s použitím lišt v barvě mosazi. Projekt s dilatacemi nepočítal. V PD byl uvažován hliníkový rámeček okolo čistící zóny, ten byl nahrazen nerezovým rámečkem z důvodu vzhledu.

Dilatační prvek potrubí: S ohledem na délku potrubních rozvodů ÚT ve stěnách v drážce bylo nutné použít dilatační prvek, který nebyl v PD obsažen.

Sněhové zábrany na šikmé střechy: S ohledem na opakující se padání sněhu na přilehlé chodníky bylo rozhodnuto namontovat na šikmé střechy sněhové zábrany.

Plynový ohříváč vody: V souvislosti s novými rozvody bylo zjištěno, že ohříváč je dožilý a je nutná jeho výměna za nový.

Dveře do skladu: S ohledem na logickou návaznost prací a uzavření požárního úseku bylo nutné zahrnout protipožární dveře historizujícího vzhledu do této etapy stavby (původně s nimi bylo počítáno až v další etapě stavby).

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

Ing. arch. Aleš Burian

podpis / razítko:



POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do ceny stavby:	185 899,20	Kč	bez DPH
	0,00	Kč	bez DPH

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost, s. r. o.

Stavbyvedoucí: Jaroslav Vaňátko

podpis:



VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

TDI investora: Ing. Daniel Chráska

souhlasím

Objednatel:

souhlasím

podpis:



Soupis položek

Rekonstrukce Dusíkova divadla, změnový list 8

č.p.	název položky	výměra mj	cena/mj	celkem
Vícepráce				
7.	Dilatační prvek pro topení	1,00 kpl	9 500,00	9 500,00
8.	Montáž a dodávka sněhových zábran	146,00 m	375,00	54 750,00
9.	Výměna stávajícího plynového ohřevu vody za bojler	1,00 kpl	20 000,00	20 000,00
10.	Montáž a dodávka dilatačních lišt mosazných	40,70 m	596,00	24 257,20
11.	rámeček nerez	10,40 m	230,00	2 392,00
13.	Dveře D22 do skladu	1,00 kpl	75 000,00	75 000,00
Celkem				185 899,20
Celkem bez DPH				185 899,20
DPH 21 %				39 038,83
Celkem cena vč. DPH				224 938,02


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Rekonstrukce Dusíkova divadla

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

9

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Méněpráce

Popis změny:

Schodiště - schodiště z přízemí do suterénu nebylo vybouráno.

Zdravotechnika - 1 ks zařizovacích předmětů byl odpočten (chyba zadávacího rozpočtu).

Elektro - přepojování EPS.

Odůvodnění změny:

Schodiště - po posouzení schodiště nebylo bouráno. Všechny práce spojené s vybouráním a novým vybudováním byly zařazeny do méněprací.

Zdravotechnika - ve fázi realizace byly montovány 2 ks zařizovacích předmětů (klozet, umyvadlo, příslušenství), 1 ks odpočten.

EPS - po konzultaci s HZS Kutná Hora bylo prověřeno, že není třeba připojovat ústředí EPS na centrálu v Kladně, a proto bylo zařízení pro zařízení dálkového připojení ZDP odpočítáno.

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

Ing. arch. Aleš Burian

podpis / razítko:



POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do ceny stavby:	0,00	Kč	bez DPH
	-118 909,63	Kč	bez DPH

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost, s. r. o.

Stavbyvedoucí: Jaroslav Vaňátko

podpis:



VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

TDI investora: Ing. Daniel Chráska souhlasím

Objednatel: souhlasím

podpis:



Rekonstrukce Dusíkova divadla, změnový list 9

č.p.	název položky	výměra mj	cena/mj	celkem
Měněpráce - foyer				
12.	Vrty injek.povrch.kladivy do 56 mm do 10m	-3,60 m	1 035,00	-3 726,00
41.	Schodišťové konstrukce železobeton	-0,46 m3	3 265,00	-1 501,90
42.	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli	-0,02 t	38 560,00	-867,60
43.	Výztuž schodišťových konstrukcí sítí KARI	-0,05 t	28 950,00	-1 302,75
44.	Bednění podest přímočarých -zřízení	-4,68 m2	1 465,00	-6 856,20
45.	Bednění podest přímočarých odstranění	-4,68 m2	92,00	-430,56
46.	Stupně dusané na terén n adesku	-12,11 m	265,00	-3 209,15
47.	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	-6,06 m2	996,00	-6 035,76
48.	Bednění stupňů přímočarých -odstranění	-6,06 m2	71,00	-430,26
95.	Bourání ŽB schodiště ramen monolit	-6,73 m2	945,00	-6 359,85
110.	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10/10	-7,30 m	86,50	-631,45
169.	Oprava otevírání poklopu	-1,00 ks	4 500,00	-4 500,00
170.	Žebřík 2700/400	-1,00 ks	6 500,00	-6 500,00
207.	OS14C/III betonový obklad schodu	-8,00 ks	2 500,00	-20 000,00
208.	OS14d/III PS4 betonový obklad schodu	-1,00 ks	2 500,00	-2 500,00
Ménepráce ZTI				
44.	Klozet závěsný	-1,00 ks	3 323,00	-3 323,00
45.	Tlačítko dvoumnožstevní	-1,00 ks	1 127,00	-1 127,00
47.	Montážní prvek pro závěsné WC	-1,00 ks	5 393,00	-5 393,00
48.	Montáž klozetu závěsného	-1,00 ks	264,50	-264,50
49.	Montáž závěsných prvků	-1,00 ks	483,00	-483,00
51.	Umývatko na šrouby 50*23	-1,00 ks	1 288,00	-1 288,00
52.	Montáž umyvadel na šrouby	-1,00 ks	477,25	-477,25
53.	Umyvadlový sifon	-1,00 ks	747,50	-747,50
54.	Rohový ventil	-2,00 ks	112,70	-225,40
55.	Baterie stojánková	-1,00 ks	1 633,00	-1 633,00
56.	Montáž baterie umyvadlové	-1,00 ks	218,50	-218,50
58.	Dřez nerez	-2,00 ks	2 357,50	-4 715,00
62.	El.ohřívač	-1,00 ks	4 163,00	-4 163,00

Soupis položek

Měněpráce EPS				
25.	Technologie ZDP	-1,00 kpl	15 000,00	-15 000,00
26.	Připojení ústředny EPS	-1,00 kpl	5 000,00	-5 000,00
27.	Dodatek k projektové dokumentaci	-1,00 kpl	10 000,00	-10 000,00
	Celkem			-118 909,63
	Celkem bez DPH			-118 909,63
	DPH 21 %			-24 971,02
	Celkem cena vč. DPH			-143 880,66
