

Krycí list ZBV KSUS

Název a evidenční číslo Stavby:

III/10126 a III/10125 Mezouň, optimalizace

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

silnice III/10126 a III/10125

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

... / 2

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001
 a
 Obec Mezouň
 Mezouň 72, 267 18 Karlštejn
 IČ: 00233587

Zhotovitel: Ekotech Hořovice s.r.o.
 Masarykova 161, 268 01 Hořovice
 IČ: 27630668

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-90 116,00	251 167,65	161 051,65

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-90 116,00	251 167,65	161 051,65

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/10126 a III/10125 Mezouň, optimalizace Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): silnice III/10126 a III/10125	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: ... / 2	Číslo ZBV: 2																																								
Strany smlouvy o dílo č. 3128/00066001/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.10.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Ekotech Hořovice s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"> <u>Přílohy Změnového listu:</u> </td> <td style="width: 15%; text-align: center; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="width: 15%; text-align: center; padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="width: 45%; padding: 5px;">počet listu</td> <td style="width: 15%; text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="width: 15%; text-align: center; padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2. Změnový list</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">počet listu</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">počet listu</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Stavební dozor</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">počet listu</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">---</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">počet listu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">počet listu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">7. Další doklady</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">13</td> <td style="padding: 5px;">počet listu</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			<u>Přílohy Změnového listu:</u>			Paré č.	Příjemce	1. Krycí list	1	počet listu	1	Objednatel	2. Změnový list	1	počet listu	2	Zhotovitel	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listu	3	Stavební dozor	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listu	4	---	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listu			6. Přehled dalších dokladů	1	počet listu			7. Další doklady	13	počet listu		
<u>Přílohy Změnového listu:</u>			Paré č.	Příjemce																																						
1. Krycí list	1	počet listu	1	Objednatel																																						
2. Změnový list	1	počet listu	2	Zhotovitel																																						
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listu	3	Stavební dozor																																						
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listu	4	---																																						
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listu																																								
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listu																																								
7. Další doklady	13	počet listu																																								
Iniciátor změny: Objednatel Popis a zdůvodnění Změny:																																										
a) VÚ šoupata Po frézování bylo nutné provedení většího množství (+16) výškových úprav šoupat. Některé z nich byly pod asfaltových povrchem a nebylo možné jejich existenci předpokládat. Celkový počet byl vzájemně odsouhlasen s KSUS (pol.16410) b) "Nerealizace" stří. a velkoplošných úprav asf. vrstev +- 1 cm s ohledem na skutečnost po odfrézování vozovky a skutečnému zaměření nutné příčné rektifikace vozovky nebylo možné z důvodu většího množství celkové vyrovnávky tuto položku použít a je nahrazena novou položkou "vyrovnávky ACO 11" c) nová položka "vyrovnávka z ACO 11" z důvodu nutné příčné rektifikace na zajištění "odvodu" vody a správné výšce nášlapu u obrub byla použita vyrovnávka z ACO 11. Tato skutečnost byla vzájemně odsouhlasena s investorem stavby a je doložena vážnými listky z 26.7. a 31.7.2018., kdy byly připravovány úpravy před položení asfaltového koberce. Změny byly zjištěny až při provádění prací, jejich množství bylo zjištěno měřením. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemějí celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.																																										
Údaje v Kč bez DPH:																																										
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																																							
-90 116,00	251 167,65	161 051,65	341 283,65																																							
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																																										
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Milan Vyštejn	datum	podpis																																						
Projektant (autorský dozor)	jméno	XXX	datum	podpis																																						
Stavební dozor	jméno	Karel Motal	datum	podpis																																						
Zástupce Objednatele:	jméno	Karel Motal	datum	podpis																																						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																																										
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) KSÚS SK	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	podpis																																						
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Obec Mezouň	jméno	Hana Braunová	datum	podpis																																						
Zhotovitel	jméno	Milan Vyštejn	datum	podpis																																						
				Číslo paré:																																						

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby:	
III/10126 a III/10125 Mezouň, optimalizace	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	... / 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	
silnice III/10126 a III/10125	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 891 176,60

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 891 176,60	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-90 116,00	251 167,65	251 167,65	8,69%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-90 116,00	3 052 228,25	161 051,65	5,57%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

		jméno	datum	podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Milan Vyštejn		
Projektant (autorský dozor):	souhlasím	xxx		
Stavební dozor:	souhlasím	Karel Motal		
Zástupce Objednatele:	souhlasím	Karel Motal		
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání změny:	souhlasím	Tomáš Račák		

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2													
Ev. č. a název stavby: III/10126 a III/10125 Mezouň, optimalizace								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: silnice III/10126 a III/10125								č. 2					
Číslo a název rozpočtu: silnice III/10126 a III/10125 - KSUS								Skupina změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	22699	DIO	kpt	1,00	1,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00
1.2.	22615	frézování ploch do hloubky 6 cm	m2	6 073,20	6 073,20	0,00	91,00	552 661,20	0,00	0,00	552 661,20	0,00	0,00
1.3.	16410	VÚ šachty, vpusti	ks	10,00	10,00	0,00	1 705,00	17 050,00	0,00	0,00	17 050,00	0,00	0,00
1.4.	16410	VÚ šoupata	ks	86,00	102,00	16,00	1 399,00	120 314,00	0,00	22 384,00	142 698,00	22 384,00	18,60
1.5.	20111	číš. - metení strojné samosběrem	m2	10 813,00	10 813,00	0,00	11,00	118 943,00	0,00	0,00	118 943,00	0,00	0,00
1.6.	21821	střed. A velkoplošné úpravy asf. vrstev +- 1 cm	m2	1 733,00	0,00	-1 733,00	52,00	90 116,00	-90 116,00	0,00	0,00	-90 116,00	-100,00
1.7.	21820	střed. A velkopl. Úpravy nad 10.000 m2, tl. 5 cm, vše. Spoj. Postřiků z asfal. Emulze do 0,8 kg/m2	m2	6 073,20	6 073,20	0,00	242,00	1 469 714,40	0,00	0,00	1 469 714,40	0,00	0,00
1.8.	22817	frézování spar	bm	30,00	30,00	0,00	34,50	1 035,00	0,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00
1.8.	22831	zalévání spar asfaltovou zálivkou	bm	30,00	30,00	0,00	41,50	1 245,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00
1.9.	37712	VDZ - vodící proužky 12,5+balotina vč. předznačení	bm	3 862,00	3 862,00	0,00	79,00	305 098,00	0,00	0,00	305 098,00	0,00	0,00
		Nové položky - JC je nižší než OTSKP SPK 2018											
101	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 vyrovnávka ACO11	m3	0,00	46,88	46,88	4 880,00	0,00	0,00	228 783,65	228 783,65	228 783,65	100,00
		<i>dle vážních listků 114,72 t / 2,447t = 46,88 m3</i>											
		celkem						2 891 176,60	-90 116,00	251 167,65	3 052 228,25	161 051,65	5,57

0

2,2

0

0

47,11 4855,13904 228725,6

47,12	4855	228767,6
-------	------	----------

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/10126 a III/10125 Mezouň, optimalizace

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	5 950 181,80
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	5 998 141,45
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	7 257 751,16
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,81%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	3,90%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	47 959,65
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,81%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 785 054,54

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	8,60%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	511 757,65
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 975 090,90

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -	
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost				Nezbytnost				Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/10126 a III/10125 Mezouň, optimalizace	- 231 899,00	279 858,65	47 959,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 231 899,00	279 858,65	47 959,65	511 757,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
101	1	Oprava silnice / odpočet drenáží	- 141 783,00	28 691,00	- 113 092,00							- 141 783,00	28 691,00	-113 092,00	170 474,00						
101	2	Oprava silnice / Sanace konstrukčních vrstev (vyrovnávka)	- 90 116,00	251 167,65	161 051,65							- 90 116,00	251 167,65	161 051,65	341 283,65						

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/10126 a III/10125 Mezouň, optimalizace
Název stavebního objektu provozního souboru (SO PS):	silnice III 10126 a III 10125
Číslo SO PS číslo změny SO PS:	... 2


Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Fotodokumentace	13	
stavební deník	6	
vážní listky	6	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
geodetické zaměření provedených prací		archiv objednatele, zhotovitele
Počet listů celkem	13	









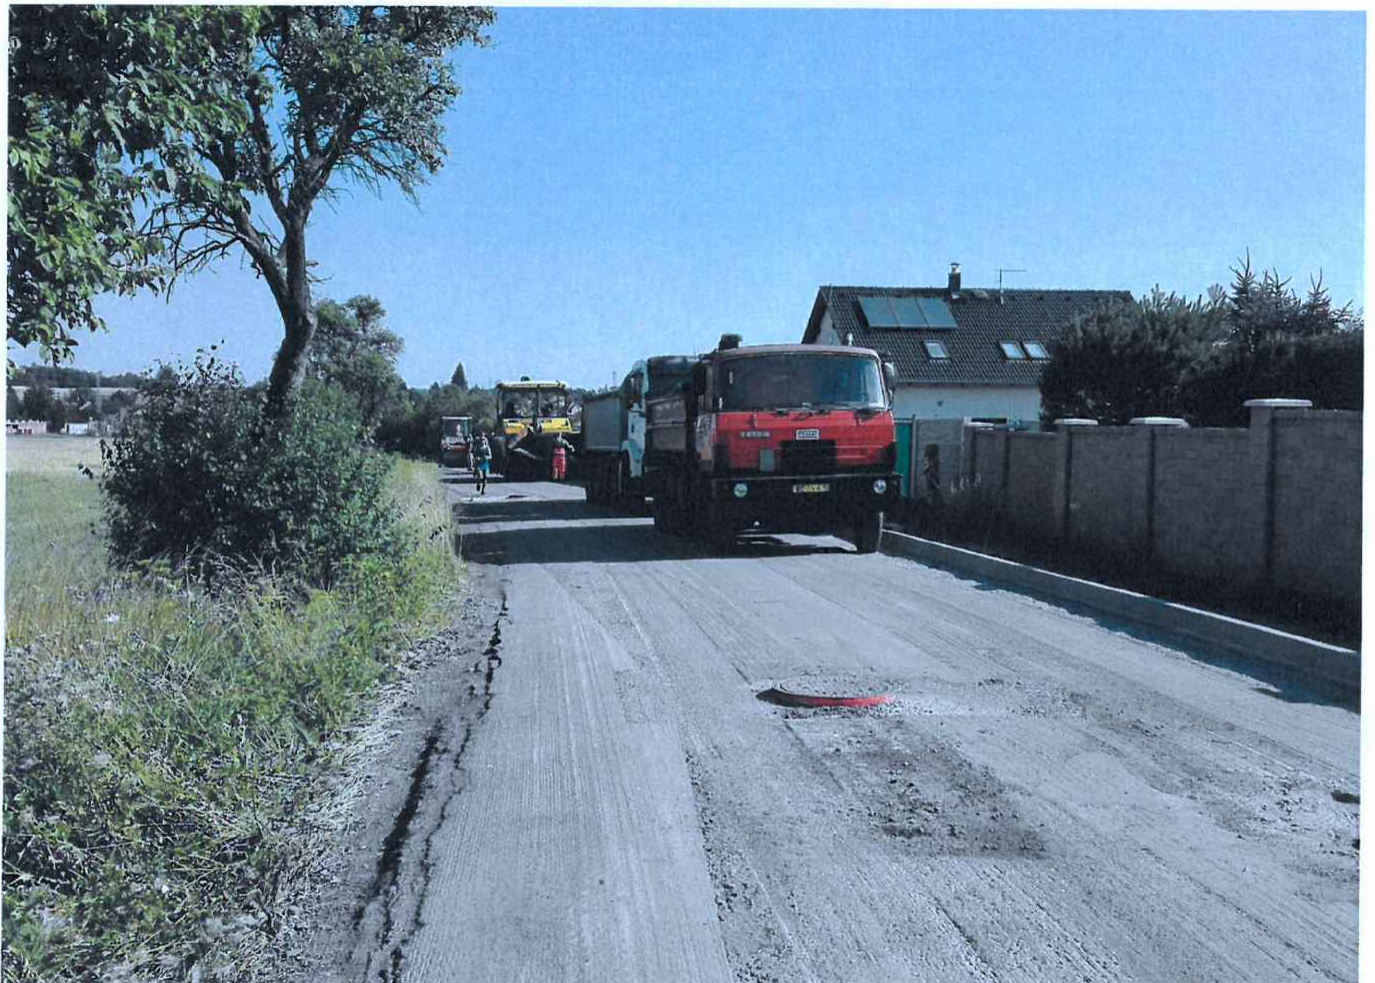

















Datum	Zúčastněné strany:
9.7.2018	Prac. doba: 6 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰
pondělí	Pčasí: počasí + 15°C + 26°C
	Pracovníci: 13x Strabag
	Mechanizace: Komatsu, JCB 3CX, 2x NA, 2x Bobcat
	Materiál: výkop
	Postup prací: - výk. práce pro dobvy cca
	220m směrem Nučice
	- odvoz na skládku
	- výstavba DIA
	- uklid staveniště
10.7.18	Prac. doba: 6 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰
úterý	Pčasí: oblačno + 15°C + 22°C
	Pracovníci: sub Strabag 13x
	Mechanizace: Komatsu, JCB, 2x Bobcat, 2x NA
	Materiál: C8/10, bet. dobvy, výkop
	Postup prací: - výk. práce pod dobvy
	- odvoz na skládku
	- pokládka sil. obrub do betonu
	- uklid a zajištění staveniště
11.7.18	Prac. doba: 6 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰
středa	Pčasí: oblačno + 16°C +
	Pracovníci: sub Strabag 13x
	Mechanizace: Komatsu, JCB 3CX, 2x NA, 2x Bobcat
	pila, pch
	Materiál: C8/10, sil. dobvy, výkop
	Postup prací: - výkop. práce pro dobvy
	kolem základky, výkop směrem Nučice
	- pokládka obrub do betonu
	- uklid a zajištění staveniště

Ekotech s.r.o.
Hořovice
Masarykova 161, 263 01 Hořovice
tel./fax: 311 514 550-1, IČ: 2763066

Ekotech s.r.o.
Hořovice
Masarykova 161, 263 01 Hořovice
tel./fax: 311 514 550-1, IČ: 2763066

Ekotech s.r.o.
Hořovice
Masarykova 161, 263 01 Hořovice
tel./fax: 311 514 550-1, IČ: 2763066

Datum	Zúčastněné strany:
11.7.	Zápis z jednání
	Dnes bylo dohodnuto s paní Starostkou Braunovou že nástup na silničních obrubách bude 15 cm a ve výjezdech 3 cm. V místech pro předjíždění zůstane 2 cm dle PD. S touto změnou i pan Kyselka (zástupce)
11.7.	Dnešního dne proběhl kontrolní den stavky.
12.7.2018	Prac. doba: 6⁰⁰ - 17⁰⁰ Pozadí: podjízna + 15°C + 27°C Pracovníci: sub. Strabag 13x Mechanizace: Komatsu, JCB, 2x Bobcat, 2x NA, Material: C8/10, dornby, výkopek Postup prací: - výkop práce pro dornby vč. odvozu na skládku - pokládka silničních dornbů do bet. lože - uklid staveniště

Ekotech
Hořovice s.r.o.
Masarykova 161, 263 01 Hořovice
tel./fax: 311 514 550-1, IČ: 27630638

Ekotech
Hořovice s.r.o.
Masarykova 161, 263 01 Hořovice
tel./fax: 311 514 550-1, IČ: 27630638

Ekotech
Hořovice s.r.o.
Masarykova 161, 263 01 Hořovice
tel./fax: 311 514 550-1, IČ: 27630638

Datum	Zúčastněné strany:
13.7.2018	Prac. doba: 6 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰
pátek	Počasí: polojasno +14°C +23°C
	Pracovníci: sub. Strabag 13x
	Mechanizace: Komatsu, JCB, 2x bobcat, 2x NA
	Material: C8/10, drcuby, vykopce
	Postup prací: - vykop. prací na vyhled pro drcuby
	- pokládka sil. drcub do betonu
	- uklid a zajištění kom. kábelů

Ekotech s.r.o.
 Hořovice
 Masarykova 161, 263 01 Hořovice
 tel./fax: 311 514 550-1, IČ: 27630668

Ekotech s.r.o.
 Hořovice
 Masarykova 161, 263 01 Hořovice
 tel./fax: 311 514 550-1, IČ: 27630668

[Handwritten signature]

Datum	Zúčastněné strany:
17.7.18	Prac. doba: 6 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰
Uterý	Pčasí: pojasno +15°C +29°C
	Pracovníci: sub. Strabag 13x
	Mechanizace: Komatsu, JCB, 2x Bobcat, 2x NA
	Material: C8/10, drcuby, UV 2x
	Postup prací: - pdládka silnicnicu drcub
	do bet. lože
	- úprava smčová a výšková 2 ks
	ulnicu vpustí
	- vytýčení vjezdí na pozemky
	2 ks křižovatky
	- úklid a zabezpečení komunikace
	Ekotech s.r.o. Hořovice Masarykova 181, 260 01 Hořovice tel./fax: 311 514 550-1, IČ: 27330668
18.7.18	Prac. doba: 6 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰
	Pčasí: pojasno +18°C +
	Pracovníci: sub. Strabag 13x
	Mechanizace: Komatsu, JCB, 2x NA, 2x Bobcat
	pěch
	Material: C8/10, drcuby, KG trubky, UV - sestava 2x
	Podklad
	Postup prací: - pdládka drcub do bet. lože
	- výk. práce na UV v zastávky
	- připojení, cestování 2 ks UV
	- úklid a zajištění stavby
	Ekotech s.r.o. Hořovice Masarykova 181, 260 01 Hořovice tel./fax: 311 514 550-1, IČ: 27330668

Datum	Zúčastněné strany:
19.7.18	Prac. doba: 6 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰
čtvrtek	Pozadí: polojasno + 19°C + 29°C
	Pracovníci: sub. Strabag 13x, sub. SAT 4x sub. Akrop 1x
	Mechanizace: Greas Wd100; 1x traktorbagr, 2x Bobcat, 5x NA, samosběv
	Materiál: Z-mat
	Postup prací: - Sřezování vozovky III/10/25 vč. přepracování profilu - dobovování kolemi dovnitř a zadní - čištění komunikace - odvoz na deponii - rektifikace zadní

Ekotech s.r.o.
Hořovice
Masarykova 161, 263 01 Hořovice
tel./fax: 311 514 550-1, IČ: 27630668

Zápis zhotovitele

Upozorňujeme dodavatele, že po vyřezování vozovky, přesypávání dle TD, bude nutno provést vstup z vyrovnávek, které nejsou součástí S+D. Pozadí a množství bude udáno v rámci listky dle skutečnosti.

Ekotech s.r.o.
Hořovice
Masarykova 161, 263 01 Hořovice
tel./fax: 311 514 550-1, IČ: 27630668

Datum	Zúčastněné strany:
20.7.18	Pčasí: jasno +17°C +29°C
pátek	Pra.doba: 6 ⁰⁰ -17 ⁰⁰
	Pracovníci: sub. Strabag Bx, sub. SAT Gx sub. Akrop
	Mechanizace: 2x štréza W2100i, samosběr, 2x Bdrat, 2x traktorbagr, GxNA
	Materiál: 2-mat, BN30
	Postup prací: - štrézání vozovky III/10126 vč. přespádávání dle PD
	- dobavání kolew sadet a obrub
	- zametání vozovky
	- rektifikace

Ekotech s.r.o.
 Hořovice
 Masarykova 181, 263 01 Hořovice
 tel./fax: 311 514 550-1, IČ: 27090668

Zápis zhotovitele

Po odštrézání III/10126 nastal úplně stejný případ
 s vyramatkami jako na III/10125.

Ekotech s.r.o.
 Hořovice
 Masarykova 181, 263 01 Hořovice
 tel./fax: 311 514 550-1, IČ: 27090668

(Handwritten signature)

Mezouň - vážní lístky



dod. List číslo	váha t
306005	28,68
311005	21,74
306020	27,44
311029	17,78
306004	19,08
	114,72

Milan Vyštejn, jednatel



STRABAG Asfalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478

CZ-39201 Soběslav II

OS: Stašov 835CKAM

Tel.: [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

IČ: 25186183

DIČ: CZ25186183

STRABAG

Zápis do OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, č. vl. 8452.

Odběratel:

8070002

STRABAG a.s. DIREKCE 60

LIDICKÁ 802

CZ-26601 BEROUN

IČO/DIČ: 60838744 / CZ60838744



1951

18

Číslo osvědčení o SRV: 1951-CPR-5100801

D O D A C Í L I S T číslo: 306005

datum: 26/07/2018

čas: 06:43

č.obj. :

typ DL: L

stavba: MEZOUN
nákl.stř.: 841DCJZ



Dopravce:

vozidlo : 6S98802

řidič : FIŠER TRANS

Ident. kód zboží: 07234

Zboží : ACO 11 50/70

AC 11 obrus 50/70

Čís. zkoušky typu: PR15-012-CK

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá ČSN EN 13 108-1

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č.:PR15-012-CK' podle
zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Zboží odebráno na OS:

Obalovna Stašov - P.O.Box 27, 267 51 Zdice

Brutto: 41,36 t G

Tara: 12,68 t G

Netto: 28,68 t E

AD-C

Přílohou je Popis a užití výrobku

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič je seznámen s 'Dopravním řádem provozovny' a
odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Vystavil:

Moutelíková Renata

Převzal:

.....
podpis

.....

STRABAG Asfalt s.r.o.
Na Švadlačkách 478
CZ-39201 Soběslav II
OS: Stašov 835CKAM
Tel.: XXXXXXXXXX
Fax : XXXXXXXXXX
IČ: 25186183 DIČ: CZ25186183



Zápis do OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, č. vl. 8452.

Odběratel:

8070002

STRABAG a.s. DIREKCE 60

LIDICKÁ 802

CZ-26601 BEROUN

IČO/DIČ: 60838744 / CZ60838744

D O D A C Í L I S T číslo: 311005

stavba: MEZOUN
nákl.stř.: 841DCJZ



Číslo osvědčení o SŘV: 1951-CPR-5100801

datum: 31/07/2018
čas: 07:08
č.obj. :
typ DL: L



Dopravce:

vozidlo : 1AT2948

řidič : STRABAG/PANGERLE

Ident. kód zboží: 07774

Zboží : ACP 16 + 50/70 B

AC 16 + podkl. 50/70 B

Čís. zkoušky typu: PR15-005-CK

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá ČSN EN 13 108-1

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č.:PR15-005-CK' podle
zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Zboží odebráno na OS:

Obalovna Stašov - P.O.Box 27, 267 51 Zdice

Brutto: 36,34 t G

Tara: 14,60 t G

Netto: 21,74 t E

Přílohou je Popis a užití výrobku

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič je seznámen s 'Dopravním řádem provozovny' a
odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Vystavil:
Moutelíková Renata

Převzal:

.....
podpis

.....

STRABAG Asfalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478

CZ-39201 Soběslav II

OS: Stašov 835CKAM

Tel.: 311/686913-4

Fax : 311/696931

IČ: 25186183

DIČ: CZ25186183

STRABAG

Zápis do OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, č. vl. 8452.

Odběratel:

8070002

STRABAG a.s. DIREKCE 60

LIDICKÁ 802

CZ-26601 BEROUN

IČO/DIČ: 60838744 / CZ60838744



1951

18

Číslo osvědčení o SŘV: 1951-CPR-5100801

D O D A C Í L I S T číslo: 306020

datum: 26/07/2018

čas: 08:16

č.obj. :

typ DL: L

stavba: MEZOUN

nákl.stř.: 841DCJZ



Dopravce:

vozidlo : 6S49614

řidič : FIŠER J.

Ident. kód zboží: 07234

Zboží : ACO 11 50/70

AC 11 obrus 50/70

Čís. zkoušky typu: PR15-012-CK

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá ČSN EN 13 108-1

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č.:PR15-012-CK' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Zboží odebráno na OS:

Obalovna Stašov - P.O.Box 27, 267 51 Zdice

Brutto: 42,92 t G

Tara: 15,48 t G

Netto: 27,44 t E

Přílohou je Popis a užití výrobku

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič je seznámen s 'Dopravním řádem provozovny' a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Vystavil:

Moutelíková Renata

Převzal:

.....
podpis

.....
.....

STRABAG Asfalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478

CZ-39201 Soběslav II

OS: Stašov 835CKAM

Tel.: 311/686913-4

Fax : 311/696931

IČ: 25186183 DIČ: CZ25186183

STRABAG

Zápis do OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, č. vl. 8452.

Odběratel:

8070002

STRABAG a.s. DIREKCE 60

LIDICKÁ 802

CZ-26601 BEROUN

IČO/DIČ: 60838744 / CZ60838744

D O D A C Í L I S T číslo: 311029

stavba: MEZOUN
nákl.stř.: 841DCJZ



1951

18

Číslo osvědčení o SŘV: 1951-CPR-5100801

datum: 31/07/2018

čas: 08:43

č.obj. :

typ DL: L

Dopravce:

vozidlo : BE7461

řidič : BOBEK

Ident. kód zboží: 07234



Zboží : ACO 11 50/70

AC 11 obrus 50/70

Čís. zkoušky typu: PR15-012-CK

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá ČSN EN 13 108-1

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č.:PR15-012-CK' podle
zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Zboží odebráno na OS:

Obalovna Stašov - P.O.Box 27, 267 51 Zdice

Brutto: 29,18 t G

Tara: 11,40 t G

Netto: 17,78 t E

Přílohou je Popis a užití výrobku

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič je seznámen s 'Dopravním řádem provozovny' a
odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Vystavil:

Moutelíková Renata

Převzal:

.....
podpis

.....

STRABAG Asfalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478

CZ-39201 Soběslav II

OS: Stašov 835CKAM

Tel.: 311/686913-4

Fax : 311/696931

IČ: 25186183

DIČ: CZ25186183

STRABAG

Zápis do OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, č. vl. 8452.

Odběratel:

8070002

STRABAG a.s. DIREKCE 60

LIDICKÁ 802

CZ-26601 BEROUN

IČO/DIČ: 60838744 / CZ60838744



1951

18

Číslo osvědčení o SŘV: 1951-CPR-5100801

D O D A C Í L I S T číslo: 306004

datum: 26/07/2018

čas: 06:35

č.obj. :

typ DL: L

stavba: ~~MEZOUN~~

nákl.stř.: 841DCJZ



Dopravce:

vozidlo : BE7461

řidič : BOBEK

Ident. kód zboží: 07234

Zboží : ACO 11 50/70

AC 11 obrus 50/70

Čís. zkoušky typu: PR15-012-CK

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá ČSN EN 13 108-1

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č.:PR15-012-CK' podle
zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Zboží odebráno na OS:

Obalovna Stašov - P.O.Box 27, 267 51 Zdice

Brutto: 30,48 t G

Tara: 11,40 t G

Netto: 19,08 t E

Přílohou je Popis a užití výrobku

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič je seznámen s 'Dopravním řádem provozovny' a
odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Vystavil:

Moutelíková Renata

Převzal:

.....
podpis

.....

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Ektotech Hořovice s.r.o.
Masarykova 161
268 01 Hořovice

Vyřizuje/telefon
Motal [REDACTED]

Praha
13.7.2018

Věc : Vyjádření ke změnám u akce „III/10126 a III/10125 Mezouň, optimalizace“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětných silnic III/10116 a III/10125 v obci Mezouň Vás tímto žádá o provedení následujících změn u stavby „III/10126 a III/10125 Mezouň, optimalizace“:

- Po frézování bude nutné provedení většího množství výškových úprav šoupat. Některé z nich jsou pod stávajícím asfaltovým krytem a nebylo možné jejich existenci předpokládat. Celkový počet bude vzájemně odsouhlasen s KSUS SK a obcí Mezouň.
- Po odfrézování vozovky a po skutečném zaměření nutné příčné rektifikace vozovky nebude možné z důvodu většího množství celkové vyrovnávky tuto položku použít a bude nahrazena novou položkou "vyrovnávky ACO 11", která bude použita z důvodu nutné příčné rektifikace na zajištění řádného odvedení dešťové vody a správné výšce nášlapů u obrub.

Jedná se o změny nepodstatné a nepředvídané a zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Na základě podkladů po provedení díla zhotovitel připraví návrh ZBV.

Přílohy : bez příloh

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (61)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Karel Motal
vedoucí TSÚ-oblast Kladno



Bank. spoj. [REDACTED]
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
