




Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 3

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Česká republika – Správa základních registrů

zastoupená: 

se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3

IČO: 72054506

(dále jen „*Objednatel*“)

a

2. Zhotovitel

První certifikační autorita, a.s.

zastoupená: 

se sídlem: Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00

IČO: 26439395

DIČ: CZ26439395

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7136

číslo účtu: 168457418/0300

(dále jen „*Zhotovitel*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 k Smlouvě o dílo ze dne 20. 11. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 3. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 30. 4. 2019 (dále jen „Smlouva“).

I.

Dne 20. 11. 2018 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vybudování Národní certifikační autority. Dne 31. 3. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Dodatek č. 1 Smlouvy, kterým došlo k posunu termínu splnění milníku č. 2 nejpozději do 31. 5. 2019. Dne 30. 4. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Dodatek č. 2 Smlouvy, kterým došlo k změně milníku č. 2, který byl nově označen jako milník č. 3 s termínem splnění 30. 6. 2019 a milníku č. 3, který byl nově označen jako milník č. 2 s termínem splnění 30. 4. 2019. Dále došlo ke změně výše platby milníku č. 2 a milníku č. 3.

II.

Smluvní strany se na základě článku VII. bodu 37 dohodly na změně termínu splnění a obsahu milníku č. 3 obsaženého v Příloze č. 5.

U Přílohy č. 5 dochází ke změně termínu splnění milníku č. 3 nejpozději do 30. 11. 2019 a ke změně obsahu milníku č. 3 na zapojení všech Organizací do provozu NCA na produkčním prostředí.

S ohledem na skutečnost, že některé Organizace nemají s Objednatelům uzavřeny příslušné smluvní dokumenty a nejsou připraveny k instalaci, se smluvní strany dohodly, že termín spuštění provozu NCA na produkčním prostředí pro všechny Organizace se mění z 30. 6. 2019 na 30. 11. 2019.

Smluvní strany konstatují, že posun termínu není z viny Zhotovitele, který splnil termín spuštění pilotního provozu NCA na produkčním prostředí dne 28. 6. 2019, nicméně nikoli pro všechny Organizace, a to z důvodu jejich nepřipravenosti. Ostrý provoz NCA byl zahájen dne 1. 7. 2019.

Dále smluvní strany konstatují, že pokud dojde ke splnění milníku č. 3 dříve než 30. 11. 2019, je Zhotovitel oprávněn k fakturaci zbývající části z celkové Ceny Díla.


Na základě výše uvedené skutečnosti dochází k úpravě Přílohy č. 5, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Praze dne 28. 6. 2019

V Praze dne 27. 6. 2019

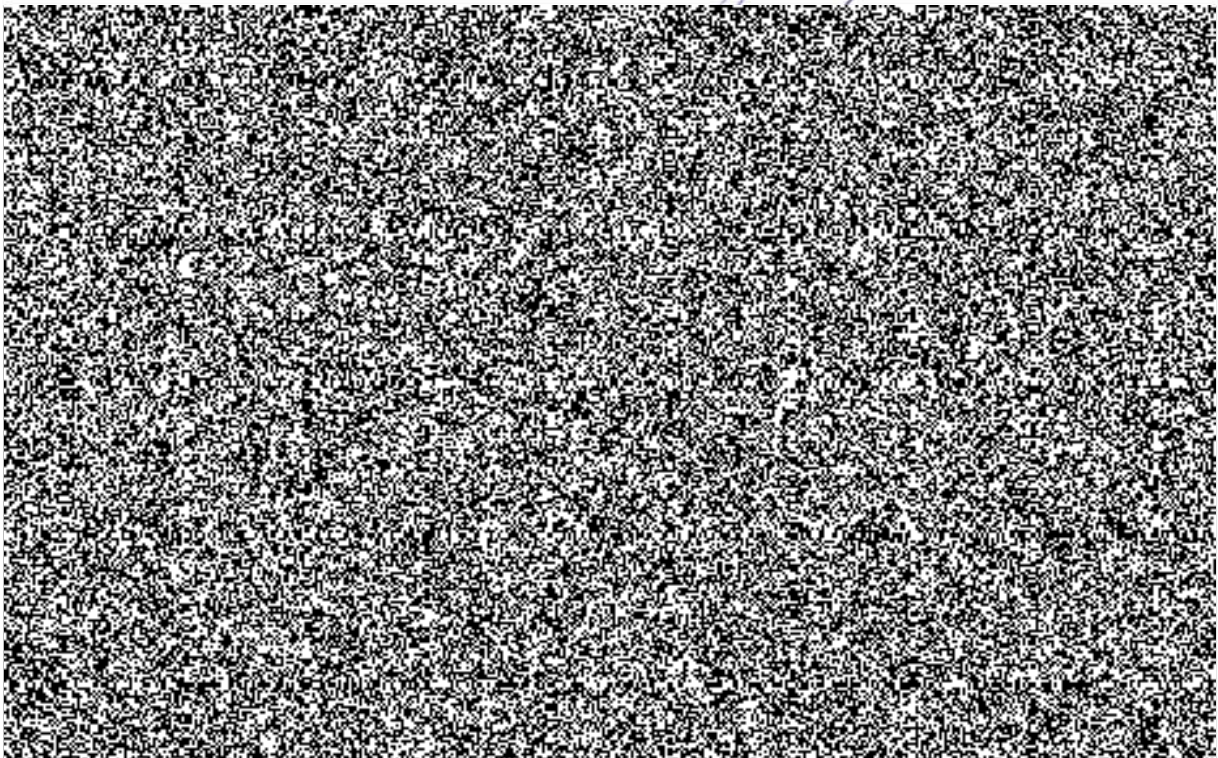

stava

Příloha č. 5 Smlouvy

Milníky, jejich akceptační kritéria a termíny pro splnění milníků

Číslo milníku	Nejzazší termín pro splnění milníku	Název milníku	Výše platby	Akceptační kritéria
1	10. 12. 2018	Předání funkcionality a veškeré dokumentace nezbytné k podání žádosti o získání Statusu	Tento milník zakládá právo Zhotovitele na fakturaci dle skutečně odvedené práce a logicky uzavřených celků Díla, max. však do výše 70% Ceny Díla. ! Pokud bude faktura doručena kdykoliv v období mezi 12. prosincem 2018 a 28. únorem 2019, musí splatnost faktury činit 60 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vydání ostrého kořenového certifikátu a ostrého mezilehlého certifikátu pro fyzickou a právnickou osobu. 2. Kompletně hotové testovací prostředí NCA. 3. Provedení úspěšných akceptačních testů na reálně dodanou funkcionality systému, včetně potvrzení ze strany min. jedné Bezpečnostní složky o fungování služeb NCA dle Návrhu implementace. 4. Předání dokumentace k podání žádosti o získání Statusu (včetně žádosti o provedení auditu).
2	30. 4. 2019	Získání Statusu	Tento milník zakládá právo Zhotovitele na fakturaci dle skutečně odvedené práce, max. však do výše 90% Ceny Díla.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obdržení Zprávy o posouzení shody ze strany akreditované společnosti (subjektu posuzování shody). 2. Udělení Statusu ze strany MVČR a provedení zápisu na důvěryhodný seznam.
3	30. 11. 2019	Zapojení všech Organizací do provozu NCA na produkčním prostředí.	Tento milník zakládá právo Zhotovitele na fakturaci zbývajících částí z celkové Ceny Díla.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Úspěšné provedení akceptačních testů bez jakýchkoliv nálezů. Systém musí potvrdit správné fungování na straně všech Organizací. 2. Úspěšné provedení bezpečnostních testů¹ aplikační i

¹ Jedná se o penetrační test a vulnerability test, zaměřený na aplikační část (včetně testů doporučených OWASP pro webové aplikace) a dále bezpečnostní testy infrastruktury a jejích prvků, zahrnující zejména: testy zranitelnosti jednotlivých prvků, testy konfigurací, testy možnosti zneužití z pohledu standardního uživatele apod., přičemž cílem těchto testů bude ověřit aktuálnost FW a OS vybavení síťových prvků, firewallů a serverů a konfigurací (povolené porty, doporučená nastavení apod.).

				<p>infrastrukturní části NCA bez jakýchkoliv nálezů.</p> <p>3. Předání veškeré zbývající dokumentace dle této Smlouvy včetně dokumentace k funkčnímu a bezpečnostnímu testování.</p> <p>4. Realizovaná školení a předání školících materiálů.</p> <p>5. Předání zdrojových kódů dle pravidel uvedených v Rámcové dohodě.</p>
--	--	--	--	--

Splněním milníku se rozumí podpis akceptačního protokolu pro příslušný milník s výrokem „splňuje“ oběma Smluvními stranami. K podpisu akceptačního protokolu pro příslušný milník nemůže dojít dříve, než Zhotovitel splní řádně bez jakýchkoliv vad akceptační kritéria sjednaná v této příloze Smlouvy pro příslušný milník.
