



Soupis objektů s DPH

Stavba: 2015/1_rev8 - PD Rekonstrukce CB vozovky D2 km 24,3-18,4 vlevo

Varianta: ZŘ -

OC [Kč]	90 548 681,19
OC + DPH [Kč]	109 563 904,24

Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
SO 101	Rekonstrukce komunikace	86 950 642,79	18 259 634,99	105 210 277,78
SO 181	Dopravně - inženýrská opatření během stavby	1 732 534,40	363 832,22	2 096 366,62
SO 190.1	Trvalé dopravní značení	1 865 504,00	391 755,84	2 257 259,84

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.2 ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Od: Skanska a.s., 26271303, Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „D2 Rekonstrukce CB vozovky D2 km 24,3 - 18,4 vlevo“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 513540 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky

nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Uherském Hradišti dne 23.9.2015

Skanska a.s.

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.5
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: **D2 Rekonstrukce CB vozovky D2 km 24,3 - 18,4 vlevo**

Společnost Skanska a.s.,
se sídlem: Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov,
IČ: 26271303,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **D2 Rekonstrukce CB vozovky D2 km 24,3 - 18,4 vlevo**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 513540 (dále jen „uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Přibližné množství	Jednotková cena
vybouraný CB kryt (beton)	49 270 t	60,- Kč/t
vybouraná obalovaná směs (asfalty)	450 t	90,- Kč/t
ocelové konstrukce (svodidla, apod.)	41 t	5 000,- Kč/t

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Uherském Hradišti dne 23.9.2015

Skanska a.s.

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.6
PROGRAM PRACÍ, ČASOVÝ PLÁN, SCHÉMA STAVENIŠTĚ
A ROZDĚLENÍ PRACÍ

Společnost Skanska a.s.,
se sídlem: Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov,
IČ: 26271303,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D2 Rekonstrukce CB vozovky D2 km 24,3 - 18,4 vlevo, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 513540 (dále jen „uchazeč“), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / živice), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto dokumentu,
2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích:
 - předání staveniště
 - přechodné dopravní opatření - zajištění provozu v režimu 2+1
 - budování ZS
 - demontáž svodidel
 - vybourání CB krytu
 - frézování a odbourání SC
 - odtěžení podkladu z ŠP
 - položení vrstvy SC
 - položení CB krytu
 - úpravy kolem hlásek SOS
 - zhotovení monolitických příkopů
 - provedení krajnic a sanace svahu
 - osazení svodidel
 - vodorovné dopravní značení
 - zprovoznění stavby
 - předání dokončeného díla
3. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Všeobecných obchodních podmínkách ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídka specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané subdodavateli	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)
Ochrana optické sítě Telefónica	Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) Olšanská 2681/6 130 00 Praha 3	0,05	Jmenovaný podzhotovitel
Zpracování RDS a DSPS	Dopravní stavby PROJEKCE s r.o Železniční 547/4A 772 00 Olomouc	0,4	Zpracování RDS a DSPS pro stavby: Lipník n. Bečvou – obchvat Mosty u Jablunkova - obchvat Český Těšín – Žukov D2 Rekonstrukce CB vozovky km 19,2 – 24,4 vpravo
Dopravně – inženýrské opatření a trvalé dopravní značení	ZNAKOM, s.r.o. Rybníček 332/12 602 00 Brno, Ponava	2,3	DIO na stavbách: Křížení D1, D2 rekonstrukce vlevo Rekonstrukce CB vozovky D1 km 220,2 – 225,2 vlevo D2 Rekonstrukce CB vozovky D2 km 19,2 – 24,4 vpravo
CELKEM %		2,75	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací.


Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takového změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Uherském Hradišti dne 23.9.2015

Skanska a.s.

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, betonáže, apod.), schéma staveniště a harmonogram předání RDS.

Grafické schema staveniště

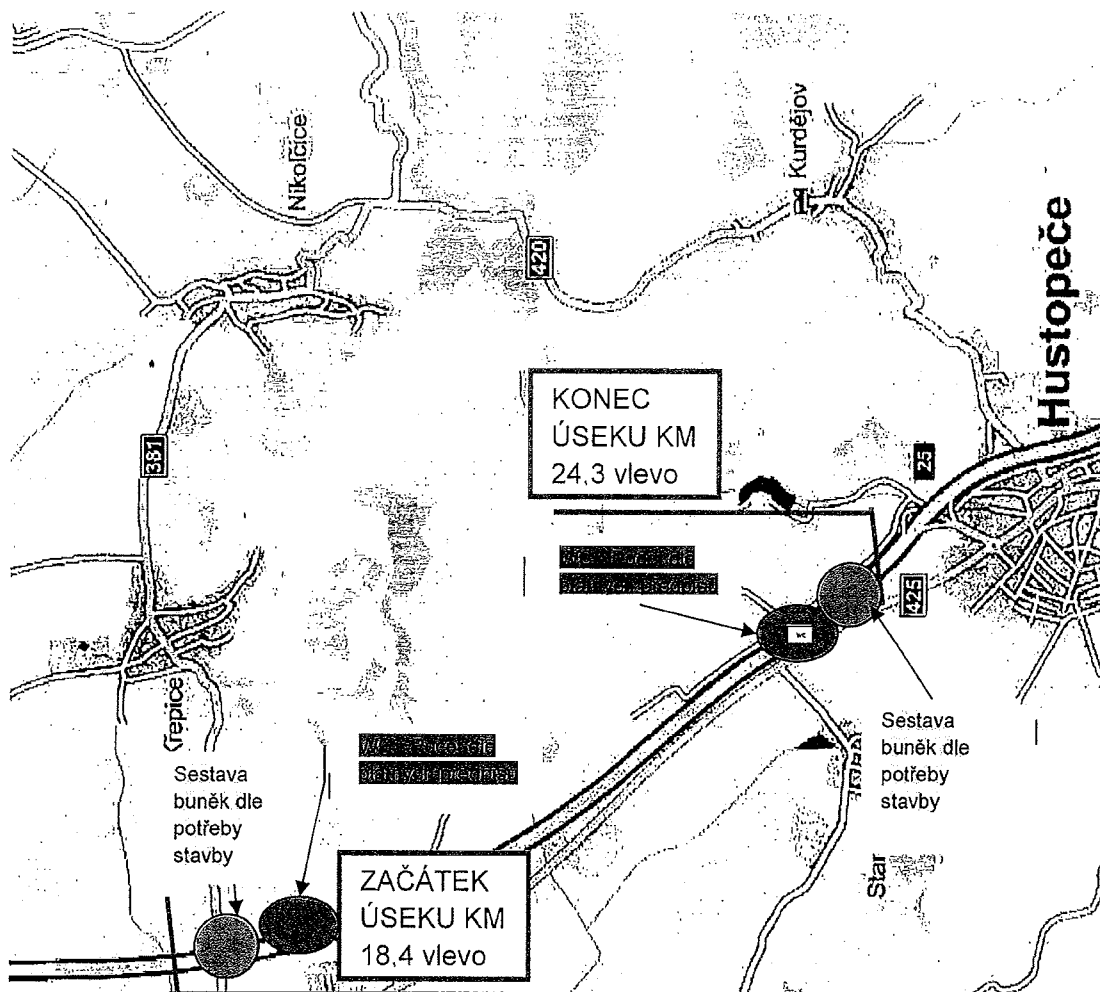

Plochy pro ZS budou situované na ploše dálnice v uzavřeném jízdním pásu. Při bourání počítáme s kontinuálním odvozem materiálu. Na ploše ZS budou umístěné chemické přenosné WC, srážkové vody budou odváděné v průběhu stavby do stávajícího odvodnění a následně do vodotečí. Pro potřeby provozně – sociálního zázemí uvažujeme s instalací provizorních mobilních buněk. Dodavatel Skanska uvažuje s použitím buněk pro kanceláře a provoz. Součástí buňkové sestavy může být buňka určená pro TDI.

Výroba asfaltových směsí se předpokládá v obalovně v Rajhradcích. Tamtéž jsou umístěny laboratoře živitných směsí.

Betonové směsi budou vyráběny v mobilních betonárnách umístěných v Pískovně v Žabčicích v dojezdové vzdálenosti do 20 km od místa stavby.

Ocelové konstrukce se budou vyrábět v našem zámečnickém provozu v Brně – Černovicích a na stavbu budou dováženy v dílech určených k zabudování.

Laboratorní zkoušky budou prováděny v akreditovaných laboratořích Skanska (Laboratoř C.B.K v Uherském Hradišti) a dále v laboratořích ŘSD a subdodavatele v Brně. Nerecyklovatelný odpad bude uložen na řízené skládce. Zavazujeme se v maximální míře dodržet kladené požadavky a kvalitativní podmínky, minimalizovat negativní ekologické a dopravní vlivy v důsledku výstavby ke spokojenosti všech dotčených subjektů.

Datum: 23.9.2015

Skanska a.s.

165

PROGRAM PRACÍ

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Doba trvání	6	III. 2016	IV. 2016	V. 2016	VI. 2016	VII. 2016	VIII. 2016	IX. 2016	X.
					5.22.29	7.14.21.28	4.11.18.25	2.9.16.23.30	6.13.20.27	4.11.18.25	1.8.15.22.29	5.12.19.26	3.
1	Rekonstrukce CB vozovky D2 km 24,3-18,4 vlevo	1.3. 16	26.9. 16	210 dny									
2	Zpracování RDS	1.3. 16	28.3. 16	28 dny									
3	Předání a schválení RDS	29.3. 16	3.4. 16	6 dny									
4	Předání staveniště	4.4. 16	4.4. 16	1 den									
5	Vybudování zařízení staveniště	5.4. 16	14.4. 16	10 dny									
6	S0 101 Rekonstrukce vozovky	7.4. 16	21.6. 16	76 dny									
7	Vytýčení inženýrských sítí	7.4. 16	8.4. 16	2 dny									
8	Demontáž svodidel	7.4. 16	12.4. 16	6 dny									
9	Případná stranová přeložka kabelových vedení	7.4. 16	11.4. 16	5 dny									
10	Vybourání CB krytu a rigolů	7.4. 16	16.4. 16	10 dny									
11	Diagnostika stavu stabilizace	17.4. 16	19.4. 16	3 dny									
12	Frézování SC	14.4. 16	23.4. 16	10 dny									
13	Odstranění ŠP, SC a podloží v případě lokálních sanací	20.4. 16	24.4. 16	5 dny									
14	Provedení lokálních sanací - cement + ŠD+SC	25.4. 16	1.5. 16	7 dny									
15	Položení vrstvy SC	25.4. 16	6.5. 16	12 dny									
16	Pokládka CB krytu	30.4. 16	17.5. 16	18 dny									
17	Zrání a ošetřování betonu	18.5. 16	14.6. 16	28 dny									
18	Prořezání a utěsnění spár	14.5. 16	2.6. 16	20 dny									

Projekt: Harmonogram prací Datum: 22.9. 15	Úkol		Souhrnný		Zahmutý průběh		Seskupit podle souhmu	
	Kritický úkol		Zahmutý úkol		Rozdělení		Konečný termín	
	Průběh		Zahmutý kritický úkol		Vnější úkoly			
	Milník		Zahmutý milník		Souhm projektu			

PROGRAM PRACÍ

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Doba trvání	6	III. 2016	IV. 2016	V. 2016	VI. 2016	VII. 2016	VIII. 2016	IX. 2016	X.
					5.22.29	7. 14.21.28	4. 11.18.25	2. 9. 16.23.30	6. 13.20.27	4. 11.18.25	1. 8. 15.22.29	15. 12.19.26	3.
19	Oprava drenáže v km 18,59 - 19,00	17.4. 16	26.4. 16	10 dny									
20	Zhotovení monolitického příkopového žlabu	10.6. 16	16.6. 16	7 dny									
21	Zpevnění a pročištění stávajících příkopů	10.6. 16	19.6. 16	10 dny									
22	Úpravy kolem hlásek SOS	10.6. 16	14.6. 16	5 dny									
23	Dosypání krajnic, ohumusování a osetí krajnic a SDP	10.6. 16	19.6. 16	10 dny									
24	Osazení nových svodidel	12.6. 16	21.6. 16	10 dny									
25	SO 181 Dopravně inženýrská opatření	5.4. 16	25.6. 16	82 dny									
26	Instalace přechodného dopravního značení	5.4. 16	6.4. 16	2 dny									
27	Odstranění přechodného dopravního značení	25.6. 16	25.6. 16	1 den									
28	SO 190.1 Trvalé dopravní značení značení	15.6. 16	24.6. 16	10 dny									
29	Výměna svislého DZ	15.6. 16	19.6. 16	5 dny									
30	Vododrovné DZ	22.6. 16	24.6. 16	3 dny									
31	Předání díla do provozu	25.6. 16	25.6. 16	1 den									
32	Dokončující práce, vyhotovení dokumentace pro předání díla	26.6. 16	25.9. 16	92 dny									
33	Předání dokončeného díla	26.9. 16	26.9. 16	1 den									


Projekt: Harmonogram praci
Datum: 22.9. 15

Úkol



Souhrnný

Kritický úkol



Zahnutý úkol

Průběh



Zahmutý kriticky

Milník



Zahmutý milník

Zahmutý průběh



Rozdělení



Vnější úkoly

Seskupit podle souhmu



4 4 0 1 1 0 1 1 0 0 0

Konečný termín



DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.7
SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS

Společnost Skanska a.s.,
se sídlem: Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov,
IČ: 26271303,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D2 Rekonstrukce CB vozovky D2 km 24,3 - 18,4 vlevo, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 513540 (dále jen „uchazeč“), tímto s ohledem na povinnost zhotovitele **zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem** v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 4.34 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek, **a to zejména z hlediska její věcné správnosti a souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a smlouvou o dílo (včetně zejména technických podmínek)**, uvádí, že na výstupní kontrole realizační dokumentace stavby (RDS) se bude podílet následující osoba:

Název / jméno	IČ / datum narození	Sídlo / bydliště
Ing. Pavel Dudík autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby	19.4.1955	Slovenská 2552/11 796 01 Prostějov
Ing. Zdeněk Šrámek autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce	14.05.1955	Holičská 31/9 772 00 Olomouc

Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby (RDS) uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna.

V Uherském Hradišti dne 23.9.2015

Skanska a.s.

PROJEKTANT
AUTORIZOVANÝ INŽENÝR
V OBOU
DOPRAVNÍ STAVBY
A
INŽENÝRSKÉ
KONSTRUKCE

SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

Realizační dokumentace bude vyhotovena subdodavatelem - projekční společností Dopravní stavby PROJEKCE s r.o.

Výstupní kontrola bude spočívat v níže uvedených činnostech prováděných autorizovanými osobami v oboru dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce uvedenými ve formuláři 4.4.7.

System činnosti výstupní kontroly RDS:

- přítomnost na vstupním jednání jednotlivých stavebních objektů
- převzetí pracovního paré ke kontrole a připomínkování (současné s předložením objednateli)
- zpracování připomínek a předání zhotoviteli RDS k zapracování (kopie pro objednatele)
- přítomnost na závěrečném projednání jednotlivých SO
- kontrola zapracování do čistopisu RDS
- potvrzení čistopisu RDS.

V Uherském Hradišti dne 23.9.2015

Skanska a.s.

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.11
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost Skanska a.s.,
se sídlem: Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 Chodov,
IČ: 26271303,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D2 Rekonstrukce CB vozovky D2 km 24,3 - 18,4 vlevo“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 513540 (dále jen „uchazeč“), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o dílo	Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky
1.	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se
2.	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o dílo	Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky
1.	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se
2.	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy o dílo poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v čl. 17.5 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Uherském Hradišti dne 23.9.2015

Skanska a.s.
