

PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM, TRAFOSTANICE - **zhotovitel**

Investiční akce s RN do 20 mil. Kč, ISPROFOND 500 554 0002

POLOŽKA: PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM

(ČÍSLO PROJEKTU 542 553 0006)

VÝTISK Č.

SMLOUVA O DÍLO

Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/90/R/SoD/2019

Evidenční číslo ZHOTOVITELE:

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána

mezi :

Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

se sídlem: nábrž. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO, DIČ: 67981801, CZ67981801

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupen: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [REDAKCE]

(dále jen "Objednatel") na jedné straně

a

název: Elektroprim Koutník, a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 5510

se sídlem: Baarova 3/58, 140 00, Praha 4 - Michle

IČO, DIČ: 25688812, CZ25688812

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupen: Pavel Koutník, předseda představenstva

(dále jen "dodavatelem/Zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si **Objednatel** přeje, aby **Dílo PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM, TRAFOSTANICE – zhotovitel**, financovaného z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury,

z položky : **Investiční akce s RN do 20. mil. Kč, ISPROFOND 500 554 0002,**

jmenovité akce : **PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM**, číslo projektu 542 553 0006.

Bylo provedeno **dodavatelem/Zhotovitelem** a přijal **dodavatelovu/Zhotovitelovu** nabídku na provedení a dokončení **Díla** a na odstranění všech vad na něm za **Přijatou smluvní částku** ve výši **841 787,- Kč bez DPH**, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena / Přijátá smluvní částka v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena / Přijátá smluvní částka v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM, TRAFOSTANICE - zhotovitel	841 787,-	176 775, 27	1 018 562, 27

kterážto Přijátá smluvní částka byla spočtena na základě závazných jednotkových cen podle oceněného soupisu prací (Výkazu výměr).

dohodli se Objednatel a dodavatel/Zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavebně montážní práce PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM, TRAFOSTANICE – **zhotovitel**, ev. č. S/RVC/90/R/SoD/2019 dle registru pod systémovým číslem N006/19/V00020144 na profilu zadavatele (NEN) se Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu

- Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu
- Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- Smlouva o dílo
- (a) Krycí list nabídky
- (b) Rozhodnutí o výběru dodavatele
- (c) Příloha - Výkaz výměr
- (d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky¹
- (e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky²
- (f) Technická specifikace³
- (g) Výkresy⁴
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, datový nosič
 - Kontrolní kniha stavby
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob
 - Stavební povolení č.j./ MURCE/7903/2018 ze dne 27.2.2018 s NPM 28.3.2018
 - část f) technické specifikace, část g) výkresy, část d) Smluvní podmínky obecné pro stavby malého rozsahu, e) smluvní podmínky zvláštní pro stavby malého rozsahu.

¹ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

² Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

³ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁴ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Základní datum je 8.7.2019.

Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit dodavateli/Zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo a odstraní na něm všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/Zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech] stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: _____

Datum: 5.8.2019

PODEPSÁN _____

PODEPSÁN

Jméno: Ing. Lubomír Fojtů
Funkce : ředitel

Jméno : Pavel Koutník
Funkce : předseda představenstva

za Objednatele
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

za dodavatele/Zhotovitele
Elektroprim Koutník, a.s.

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název díla: PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM, TRAFOSTANICE - **zhotovitel**

Následující tabulka odkazuje na **Smluvní podmínky**.

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Česká republika – Ředitelstvím vodních cest ČR nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Elektroprim Koutník, a.s. Baarova3/58,140 00, Praha 4 - Michle
Doba pro dokončení	1.1.9	13 týdnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	12 týdnů realizace a dodávka + 1 týden na odzkoušení a revize
Sekce	1.1.26	: není
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Sociální odpovědnost	1.7	ne
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		Staveniště bude poskytnuto za podmínek všech orgánů vypsanych ve vydaném platném SP Č.j.MURCE/7903/2018 ze dne 27. 2. 2018 s NPM
Pověřená osoba	3.1	Ing. Jaromír Mandřák
Zástupce objednatele	3.2	Správce stavby: Sdružení „Garnets-Beting“
Jmenování podzhotovitelé	4.3	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Záruka za odstranění vad	4.6.	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Projektová dokumentace Zhotovitel PD	5.1	PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM Dokumentace pro provádění stavby D.1.2.10 IO 10 Trafostanice AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Věcný milník: Nepoužije se Z důvodu krátké doby pro realizaci zakázky: 13 týdnů
Odstranění vad	9.1	60 měsíců pro všechny objekty nebo jejich ucelené části s výjimkou: technologického zařízení (elektrické přístroje) na 24 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Cenová soustava	10.2	OTSKP v aktuální cenové úrovni

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 30 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 30 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 30 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); [5 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 Kč] Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) [20 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); [2 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Bez milníku – krátká doba výstavby a koordinace

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); [10 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. [2 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 g)	Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram]. [4 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou událost ve výši 100 000 Kč, vyjma rizika povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší než 10% z Přijaté smluvní částky.
	14.2	Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele: - rozšířené pojištění škod během Záruční doby po dobu min. 24 měsíců - pojištění okolního majetku - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na Díle
	14.2	Pojištění odpovědnosti Minimální limit 10 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všechny pojistné události v úhrnu
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje

Datum 5.8.2019

Za Elektroprim Koutník, a.s.
Pavel Koutník, předseda představenstva

PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy k nabídce)														
Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Pořadové číslo ZBV:												
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):														
Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1														
Zhotovitel: [doplňte]														
<p><u>Přílohy Změnového listu:</u></p> <p>Rozpis ocenění změn položek</p>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Paré č.</td> <td style="width: 90%;">Příjemce Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)	1		2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplňte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)													
1														
2	Zhotovitel													
3	Projektant													
4	Supervize													
[doplňte dle potřeby]														
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]														
Popis Změny:														
Údaje v Kč bez DPH:														
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem												
0,00	0,00	0,00												
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu														
Charakter změny (nehodící škrtněte)	A	B	C	D	E									
Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:														
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>														


<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</p>			
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</p>			
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>			
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů			
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů			
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku			
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p>			
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat			
-			
b) nemění celkovou povahu zakázky			
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku			
<p>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</p>			
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám			
-			
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší			
-			
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší			
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality			
Podpis vyjadřuje souhlas se			
Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	Podpis
Vyjádření:			
Garant smlouvy objednatele	jméno	datum	Podpis
Supervize	jméno	datum	Podpis
Zástupce Objednatele (Správce stavby)	jméno	datum	Podpis
Vyjádření:			

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy : S/ŘVC/xxx/xxx/SoD/20xx	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady		
týká se bodu :	Kč vč. DPH			
Objednatel	jméno		datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno		datum	Podpis
příkazce operace:	jméno		datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno		datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	jméno		datum	Podpis
Zhotovitel	jméno		datum	Podpis
				Číslo paré:

a) Krycí list nabídky

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM, TRAFOSTANICE – zhotovitel“



ŘEDITELSTVÍ
VODNÍCH
CEST
ČR

Příloha č. 2:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Přístaviště Roudnice nad Labem, trafostanice

zhotovitel

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název uchazeče (obchodní firma nebo název)	Elektroprim Koutník, a.s.
Adresa uchazeče (celá adresa včetně PSČ)	Baarova 3/58, 140 00, Praha 4 - Michle
Právní forma	Akciová společnost
IČ	25688812
DIČ	CZ25688812
Osoba oprávněná jednat za uchazeče	██████████, ██████████
Kontaktní osoba uchazeče	██████████
Kontakt na kontaktní osobu uchazeče (tel., e-mail)	██████████, ██████████

Jednotné zpracování nabídkové ceny:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Celková nabídková cena	841.787,-	176.775,27	1.018.562,27

5.8.2019
Datum zpracování nabídky

Razítko a podpis

b) Rozhodnutí o výběru dodavatele

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM, TRAFOSTANICE – zhotovitel“



Ředitelství vodních cest ČR

Veřejná zakázka: „Přístaviště Roudnice nad Labem, trafostanice - zhotovitel“

Zadávací řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: do 700.000,00 Kč (bez DPH)

Zadavatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12 , 110 15 Praha 1

IČ: 67981801

DIČ: CZ67981801

Zastoupený: Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem

Rozhodnutí o výběru dodavatele

Na základě návrhu komise zadavatel rozhodl o výběru dodavatele č. 3:

Elektroprim - Koutník, a.s.
Baarova 3/58, 140 00 Praha 4 – Michle
IČ: 256 88 812

Odůvodnění:

1. Vybraný dodavatel předložil nabídku, která byla zadavatelem hodnocena v souhrnu hodnotícího kritéria nejlépe, což vyplývá ze zprávy o hodnocení nabídek.
2. Vybraný dodavatel prokázal způsobilost a kvalifikaci podle požadavků zadavatele následujícími dokumenty:

Požadavek	Ano/ Ne	Dokumenty či jiné relevantní údaje
Základní způsobilost		
§ 74 ZZVZ – prokázání předložením písemného čestného prohlášení	Ano	Čestné prohlášení dodavatele, Elektroprim - Koutník, a.s. , o splnění základní způsobilosti, dle § 74 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání VZ ve znění pozdějších předpisů, ze dne 5.8.2019



Ředitelství vodních cest ČR

Profesní způsobilost		
§ 77 odst. 1 ZZVZ – výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence	Ano	- Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Elektroprim - Koutník, a.s., vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze dne 30.7.2019
Ekonomická kvalifikace		
§ 78 odst. 1 ZZVZ – doklad o minimálním ročním obrátu dodavatele nebo obrátu dosaženého dodavatelem a to nejdéle za 3 bezprostředně předcházející účetní období; doložením ročního obrátu min. 5 mil. Kč za poslední 3 roky	Ano	- Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016, spol. Elektroprim - Koutník, a.s. (IČ: 25688812), ověřená kopie dokladu ze dne 18.5.2018 - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017, spol. Elektroprim - Koutník, a.s. (IČ: 25688812), ověřená kopie ze dne 18.5.2018 - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2018, spol. Elektroprim - Koutník, a.s. (IČ: 25688812)
Technická kvalifikace		
§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ – splňuje dodavatel, který předloží: • min. 2 zakázky, jejichž předmětem bylo provedení elektro-montážních prací venkovních rozvodů NN ve finančním objemu nad 2 mil. Kč bez DPH za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení <i>(Pozn.: Dodavatel předloží osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto stavebních prací. Pokud účastník prováděl stavební práce ve sdružení, bude započítána pouze část, za kterou byl účastník zodpovědný. Toto prokáže vlastním prohlášením ve spojení</i>		(1) Modernizace, rekonstrukce a oprava VKS a CEVEL na DNT <u>popis služby:</u> Kompletní modernizace el. zařízení a řídicího systému pasových dopravníků PD31, PD32 a PD33, včetně nových rozvodů, přívodu napájení, transformátorů, rozváděčů vysokého a nízkého napětí, rozváděčů ŘS, včetně nových FM, kamerového systému, požární signalizace a komunikace s centrálním velínem DNT <u>objednatel:</u> NOEN, a.s., Václavské náměstí 802/56, 110 01 Praha 1, [REDACTED] <u>období realizace:</u> 2016, 08/2015-12/2016



Ředitelství vodních cest ČR


<p>s popisem prováděných prací v rámci referenční zakázky)</p>		<p>- Osvědčení o referenční zakázce (č.j. 001310/2017/JHA) od objednatele NOEN, a.s., k zakázce „Modernizace, rekonstrukce a oprava VKS a CEVEL na DNT CQMS pro Severočeské doly, a.s. Doly Nástup Tušimice (DNT)“, objem zakázky: 143.300.000,00 Kč bez DPH, ze dne 20.12.2016</p> <p>(2) Obnova 2ks hal na PÚ OČV DB – realizace, IO203, SO102, SO103, SO104, SO105</p> <p><u>popis služby:</u> Kompletní dodávky a montáže trafostanice 6/0,4kV, 630kVA, rozváděčů R1-R4, venkovního odpínače 6kV, přívodního vedení NN, svodiče přepětí, kabelových koncovek 6kV, uzemňovacího vedení trafo kiosku, osvětlení včetně zásuvkových rozvodů, vnějšího uzemnění a hromosvodu vč. napájení garážových vrat a konvektorů</p> <p><u>objednatel:</u> Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křížíkova 2393, 415 01 Teplice, [redacted], tel.: [redacted] email: [redacted]</p> <p><u>období realizace:</u> 2018, 10/2018-02/2019</p> <p>- Osvědčení o referenční zakázce od objednatele Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., k zakázce „Obnova 2ks hal na PÚ OČV DB – realizace, IO203, SO102, SO103, SO104, SO105, objem zakázky: 3.033.610,00 Kč bez DPH, ze dne 30.7.2019</p>
Technická kvalifikace		
<p>§ 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ – splňuje dodavatel, který bude mít k dispozici realizační tým v minimálně tomto složení:</p> <p>1) Stavbyvedoucí</p>	<p>Ano</p>	<p>1) Stavbyvedoucí – [redacted]</p> <p><u>vzdělání:</u> Vysoká škola strojní a elektrotechnická Plzeň</p> <p><u>osvědčení:</u> č. 10244 (vedené pod č. [redacted]), autorizovaný inženýr</p>



Ředitelství vodních cest ČR

<p>- úplné středoškolské vzdělání s maturitou</p> <p>- osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „Technika prostředí staveb, specializace pro inženýra IE 02 nebo pro technika TE 03“</p> <p>- nejméně 5 let profesní praxe v oboru</p> <p>- min. 2 zakázky, jejímž předmětem bylo provedení elektromontážních prací venkovních rozvodů NN ve finančním objemu nad 2 mil. Kč bez DPH za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení</p>	<p>v oboru technologická zařízení staveb, vydané ČKAIT ke dni 21.3.1995</p> <p><u>profesní praxe:</u></p> <p>03/1993 – dosud: RELAN s.r.o., U Pivovaru 3, 415 01 Teplice, IČ: 46710779, popis činnosti: Řízení staveb od projektu po realizaci</p> <p><u>min. 2 zakázky:</u></p> <p>(1) Trafostanice PDSS Dubí (2018), popis služby: zajištění PD, vedení stavby, koordinace pro Elektroprim Koutník a.s., rozsah služby: 80 hodin</p> <p>(2) Trafostanice Polabské mlékárny Varnsdorf, popis služby: zajištění PD, vedení stavby, koordinace pro Techco Electric Teplice s.r.o., rozsah služby: 100 hodin</p> <p>- PROHLÁŠENÍ člena týmu –</p> <p>1) Stavbyvedoucího - ██████████ ██████████ že pokud bude firmě Elektroprim Koutník, a.s. udělena zakázka s názvem „Přístaviště Roudnice nad Labem, trafostanice“, bude se podílet na akci jako osoba odpovědná vedením díla, ze dne 5.8.2019</p>
---	---

V Praze, dne 6. 8. 2019






Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

c) Oceněný soupis prací

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM, TRAFOSTANICE – zhotovitel“

Přístaviště Roudnice nad Labem rozpočet - IO 10 Trafostanice

Hlava I	Projektové a průzkumné práce	x	
Hlava II	Provozní soubory	x	
Hlava III	Stavební objekty, inženýrské objekty IO 10 Trafostanice <u>Celkem hlava III:</u>		
Hlava IV	Stroje a zařízení	x	
Hlava V	Umělecká díla	x	
Hlava VI	Vedlejší rozpočtové náklady - geodetické vytýčení stavby - zaměření skutečného provedení - zařízení staveniště <u>Celkem hlava VI:</u>		
Hlava VII	Práce nestavebních oraganizací	x	
Hlava VIII	Nepředvídané náklady		
Hlava IX	Ostatní náklady Dokumentace skutečného provedení stavby Provozní řády a zaškolení obsluhy technologie VN a NN <u>Celkem hlava IX:</u>		
Hlava X	Příspěvky jiným organizacím	x	
Hlava XI	Provozní náklady	x	
Náklady celkem bez DPH:			841 787,00
Náklady celkem s DPH:			1 018 562,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přístaviště Roudnice nad Labem

Objekt: 10 - IO 10 Trafostanice

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.12.2018

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest

IČ: 7E+07

DIČ:

Zhotovitel: Elektroprim Koutník, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

841 787,00

DPH základní	21,00%	ze	841 787,00	176 775,27
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 018 562,27

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístaviště Roudnice nad Labem

Objekt: 10 - IO 10 Trafostanice

Místo:

Datum: 18.12.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

D1 -

2) Ostatní náklady a VRN

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

841 787,00

ROZPOČET

Stavba: Přístaviště Roudnice nad Labem

Objekt: 10 - IO 10 Trafostanice

Místo: Datum: 05.08.2019

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest Projektant:
 Zhotovitel: Elektroprim Koutník, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D1 -

1	K	Pol45 paušální položka	Klosková trafostanice s vnější obsluhou - Stavba - Doprava - kontrola stanoviště - autojeřáb - pokládka	kpl			
2	K	Pol46 měřená položka	Výkop jámy pro trafostanici strojně -výkop strojně -naložení -odvoz zeminy na skládku do 10 km viz. D.1.2.10.6 a D.1.2.10.7 (1*1+1,9*1)*3,6+1,3*1*4,6	m3			
3	K	Pol47 měřená položka	Štěrkové lože pod trafostanici včetně zhutnění, štěrkok drt' 0 - 63 mm viz D.1.2.10.6 a D.1.2.10.7 0,54*3,35	m3			
4	K	Pol48 paušální položka	Vnější uzemnění trafostanice, mřížová síť s tyčemi do výkopu	kpl			
5	K	Pol49 měřená položka	Systém ochrany před bleskem, mřížová soustava, dva svody	kpl			
6	K	Pol50 paušální položka	Nastavení ochran a uvedení zařízení do provozu	kpl			
7	K	Pol53 paušální položka	Výchozí revize elektroinstalace, včetně vypracování revizní zprávy	kpl			

d) Smluvní podmínky obecné pro stavby menšího rozsahu

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM, TRAFOSTANICE – zhotovitel“

- Celá část d) Smluvní podmínky obecné pro stavby menšího rozsahu jsou uloženy v části h) Formuláře a ostatní dokumenty na přiloženém datovém nosiči.

e) Smluvní podmínky zvláštní pro stavby menšího rozsahu

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM, TRAFOSTANICE – zhotovitel“

Celá část e) Smluvní podmínky zvláštní pro stavby menšího rozsahu je uložena na datovém nosiči, jenž je součástí části h) Formuláře a ostatní dokumenty.

f) Technické specifikace

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM, TRAFOSTANICE – zhotovitel“

- Technická zpráva
- Technické podmínky

Celá část f) Technické specifikace je uložena na datovém nosiči, jenž je součástí části h) formuláře a ostatní dokumenty.

g) Výkresy

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM, TRAFOSTANICE – zhotovitel“

- Průvodní zpráva
- Souhrnná tech. zpráva
- Výkresy

Celá část g) Výkresy je uložena na datovém nosiči, jenž je součástí části H) Formuláře a ostatní dokumenty


h) Formuláře a ostatní dokumenty, datový nosič

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM, TRAFOSTANICE – zhotovitel“

- Formulář seznam poddodavatelů a jiných osob
- Kontrolní kniha stavby
- Stavební povolení č.j. MURCE /7903/2018 z 27.2.2018 s NPM 28.3.2018

Obsah datového nosiče

- Celá část d) Smluvní podmínky obecné pro stavby menšího rozsahu jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči
- Celá část e) Smluvní podmínky zvláštní pro stavby menšího rozsahu jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči
- Celá část f) Technické specifikace jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči
- Celá část g) Výkresy jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči
- Celá část h) Formuláře a ostatní dokumenty jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči

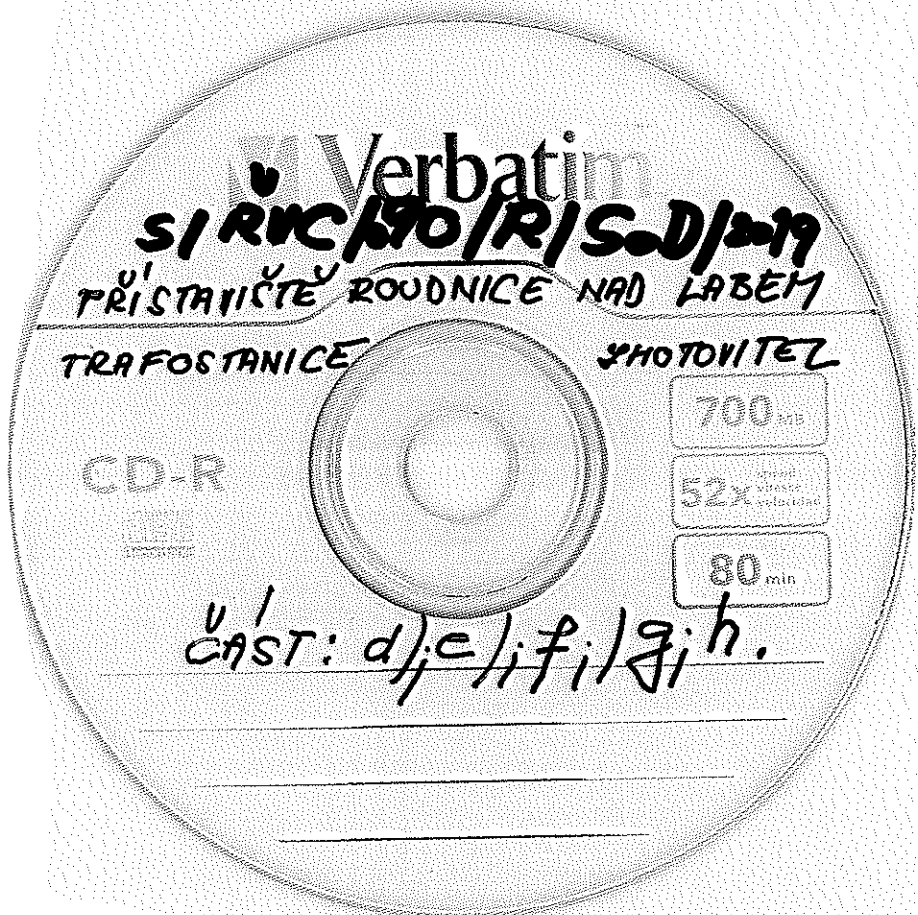

h) Formuláře a ostatní dokumenty, datový nosič PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM, TRAFOSTANICE – zhotovitel

**FORMULÁŘ
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB**

Společnost: Elektroprim Koutník, a.s.

se sídlem: Baarova 3/58, Praha 4, 140 00

IČO:25688812

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5510,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM, TRAFOSTANICE – zhotovitelů“

uveřejněno pod systémovým číslem N006/19/V00020144 na profilu zadavatele - NEN (dále jen „dodavatel“),

I)

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
Betonbau s.r.o.	49614819	dodávka trafostanice
TM – bau, s.r.o.Meziboří	03620336	výkopové a zemní práce
AQUATIS, a.s.	46347526	Dokumentace skutečného provedení stavby
bude doplněno	bude doplněno	bude doplněno
bude doplněno	bude doplněno	bude doplněno

II)

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce a případně naplňujícími kritéria hodnocení nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení jiné osoby	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo jiné osoby	Kvalifikace, která je jinou osobou prokazována
TM – bau, s.r.o.Meziboří	03620336	Osvědčení o autorizaci
[REDACTED]	46710779	Osvědčení o autorizaci
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

V Praze dne 5.8.2019

Elektroprim Koutník, a.s.,
Pavel Koutník
Předseda představenstva
