

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Odpovědnost	III 19		08.IV 19	
								Č	P	S	N
1											
2		RÚIAN 3.0	187 dny	01.01. 20	24.09. 20						
3		Nabytí účinnosti RD	0 dny	02.01. 20	02.01. 20						
4		Nabytí účinnosti DS1	0 dny	02.01. 20	02.01. 20						
5		Analýza RÚIAN 3.0	31 dny	02.01. 20	13.02. 20						
6		Zadání požadavků nad rámec DS1	2 dny	02.01. 20	03.01. 20	3	Objednatel				
7		Příprava koncepcí CR nad rámec DS1	5 dny	02.01. 20	08.01. 20	3	Objednatel, Zhotovite				
8		Schválení koncepce CR nad rámec DS1	1 den	09.01. 20	09.01. 20	7	Objednatel				
9		Nacnění analýz CR nad rámec DS1	2 dny	10.01. 20	13.01. 20	8	Zhotovitel				
10		Objednání analýz CR nad rámec DS1	3 dny	14.01. 20	16.01. 20	9	Objednatel				
11		Příprava analýz CR DS1	15 dny	02.01. 20	22.01. 20	4	Zhotovitel				
12		Příprava analýz CR nad rámec DS1	10 dny	17.01. 20	30.01. 20	10	Zhotovitel				
13		Připomínkování analýz CR	15 dny	09.01. 20	29.01. 20	11SS+5 dny	Objednatel, Zhotovite				
14		Schválení analýz CR z DS1 v KZ	2 dny	23.01. 20	24.01. 20	11	Objednatel				
15		Schválení analýz CR nad rámec DS1 v KZ	2 dny	30.01. 20	31.01. 20	13	Objednatel				
16		Nacnění pracností realizací CR nad rámec DS1	3 dny	03.02. 20	05.02. 20	15	Zhotovitel				
17		Schválení pracností realizací CR nad rámec DS1	2 dny	06.02. 20	07.02. 20	16	Objednatel				
18		Zařazení CR nad rámec DS1 do dodávky	1 den	10.02. 20	10.02. 20	17	Objednatel, Zhotovite				
19		Objednání realizace CR nad rámec DS1 do dodávky	3 dny	11.02. 20	13.02. 20	18	Objednatel				

Projekt: harmonogram_RÚIAN_20 Datum: 10.12. 19	Úkol		Ruční úkol	
	Rozdělení		Pouze s dobou trvání	
	Milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Souhrnný		Ruční souhrn	
	Souhrn projektu		Pouze zahájení	
	Vnější úkoly		Pouze s datem dokončení	
	Vnější milník		Konečný termín	
	Neaktivní úkol		Průběh	
	Neaktivní milník		Manual Progress	
	Neaktivní souhrn			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Odpovědnost	III 19		08.IV 19	
								Č	P	S	N
20											
21		Prototyp dodávky RÚIAN 3.0	66 dny	27.01. 20	29.04. 20						
22		Design dodávky	20 dny	27.01. 20	21.02. 20	14;19FF+5 dny	Zhotovitel				
23		Vývoj dodávky	25 dny	03.02. 20	06.03. 20	22SS+5 dny	Zhotovitel				
24		Interní testování Zhotovitelem	15 dny	17.02. 20	06.03. 20	23SS+10 dny	Zhotovitel				
25		Předání testovacích scénářů	1 den	09.03. 20	09.03. 20	24	Zhotovitel				
26		Předání 1. verze prototypu Objednateli	1 den	09.03. 20	09.03. 20	24	Zhotovitel				
27		Testování Objednatelem	20 dny	10.03. 20	06.04. 20	26	Objednatel				
28		Průběžné opravy dodávky	20 dny	10.03. 20	06.04. 20	26	Zhotovitel				
29		Projednáni a vyhodnoceni prototypu	1 den	07.04. 20	07.04. 20	27	Objednatel, Zhotovite				
30		Obnova referenčního prostředí	15 dny	07.04. 20	29.04. 20	27	Objednatel				
31											
32		Dodávka RÚIAN 3.0	39 dny	08.04. 20	05.06. 20						
33		Vývoj dodávky	20 dny	08.04. 20	11.05. 20	29	Zhotovitel				
34		Interní testování Zhotovitelem	10 dny	23.04. 20	07.05. 20	29SS+10 dny	Zhotovitel				
35		Předání dodávky Objednateli	1 den	11.05. 20	11.05. 20	34	Zhotovitel				
36		Předání finálních testovacích scénářů	0 dny	11.05. 20	11.05. 20	35	Zhotovitel				
37		Testování Objednatelem	15 dny	12.05. 20	01.06. 20	35	Objednatel				
38		Bezpečnostní testování	5 dny	19.05. 20	25.05. 20	35FS+5 dny	Zhotovitel				
39		Výkonnostní testování	5 dny	26.05. 20	01.06. 20	35FS+10 dny	Zhotovitel				


Projekt: harmonogram_RÚIAN_20
Datum: 10.12. 19

Úkol		Ruční úkol	
Rozdělení		Pouze s dobou trvání	
Milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Souhrnný		Ruční souhrn	
Souhrn projektu		Pouze zahájení	
Vnější úkoly		Pouze s datem dokončení	
Vnější milník		Konečný termín	
Neaktivní úkol		Průběh	
Neaktivní milník		Manual Progress	
Neaktivní souhrn			


ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Odpovědnost	III 19		08.IV 19	
								Č	P	S	N
40		Rezerva	3 dny	02.06. 20	04.06. 20	37	Objednatel				
41		Pokyn k sestavení finálního předání	1 den	05.06. 20	05.06. 20	40	Objednatel				
42											
43		Finalizace dodávky RÚIAN 3.0	15 dny	08.06. 20	28.06. 20						
44		Sestavení finálního předání	2 dny	08.06. 20	09.06. 20	41	Zhotovitel				
45		Předání finálního předání	1 den	10.06. 20	10.06. 20	44	Zhotovitel				
46		Předání uživatelské dokumentace	0 dny	10.06. 20	10.06. 20	45	Zhotovitel				
47		Ověření instalace na REF prostředí	2 dny	11.06. 20	12.06. 20	45	Objednatel				
48		Ověření dodávky na REF prostředí	5 dny	15.06. 20	19.06. 20	47	Objednatel				
49		Bezpečný týden	4 dny	22.06. 20	25.06. 20	48	Objednatel				
50		Instalace na produkční prostředí	2 dny	26.06. 20	28.06. 20	49	Objednatel				
51											
52		Akceptace dodávky RÚIAN 3.0	35 dny	29.06. 20	17.08. 20						
53		Ověření dodávky na produkčním prostředí	4 týdny	29.06. 20	27.07. 20	50	Objednatel				
54		Příprava podkladů pro akceptaci	4 týdny	29.06. 20	27.07. 20	50	Objednatel				
55		Akceptace dodávky RÚIAN 3.0	15 dny	28.07. 20	17.08. 20	53	Objednatel, Zhotovite				

Projekt: harmonogram_RÚIAN_20 Datum: 10.12. 19	Úkol		Ruční úkol	
	Rozdělení		Pouze s dobou trvání	
	Milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Souhrnný		Ruční souhrn	
	Souhrn projektu		Pouze zahájení	
	Vnější úkoly		Pouze s datem dokončení	
	Vnější milník		Konečný termín	
	Neaktivní úkol		Průběh	
	Neaktivní milník		Manual Progress	
	Neaktivní souhrn			


13.V 19	17.VI 19	22.VII 19	26.VIII 19	30.IX 19	04.XI 19	09.XII 19	13.I 20	17.II 20	23.III 20	27.IV 20	01.VI 20	06.VII 20	10.VIII 20	14.IX 20	18.X 20												
P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N

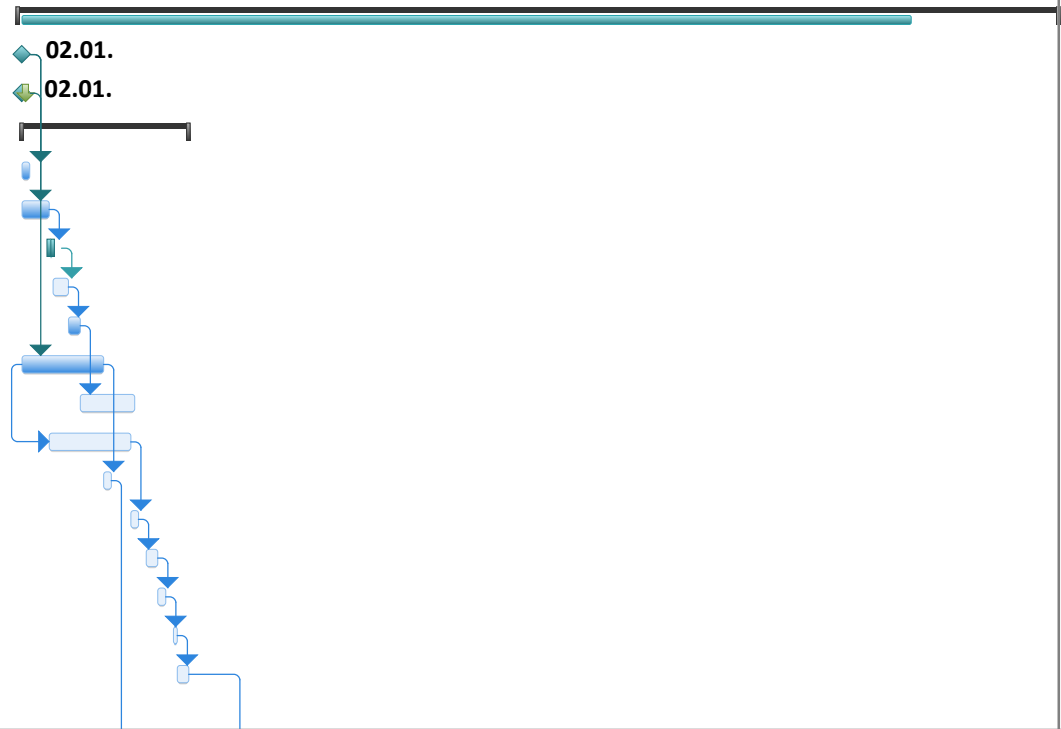

Projekt: harmonogram_RÚIAN_20 Datum: 10.12. 19	Úkol		Ruční úkol	
	Rozdělení		Pouze s dobou trvání	
	Milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Souhrnný		Ruční souhrn	
	Souhrn projektu		Pouze zahájení	
	Vnější úkoly		Pouze s datem dokončení	
	Vnější milník		Konečný termín	
	Neaktivní úkol		Průběh	
	Neaktivní milník		Manual Progress	
	Neaktivní souhrn			

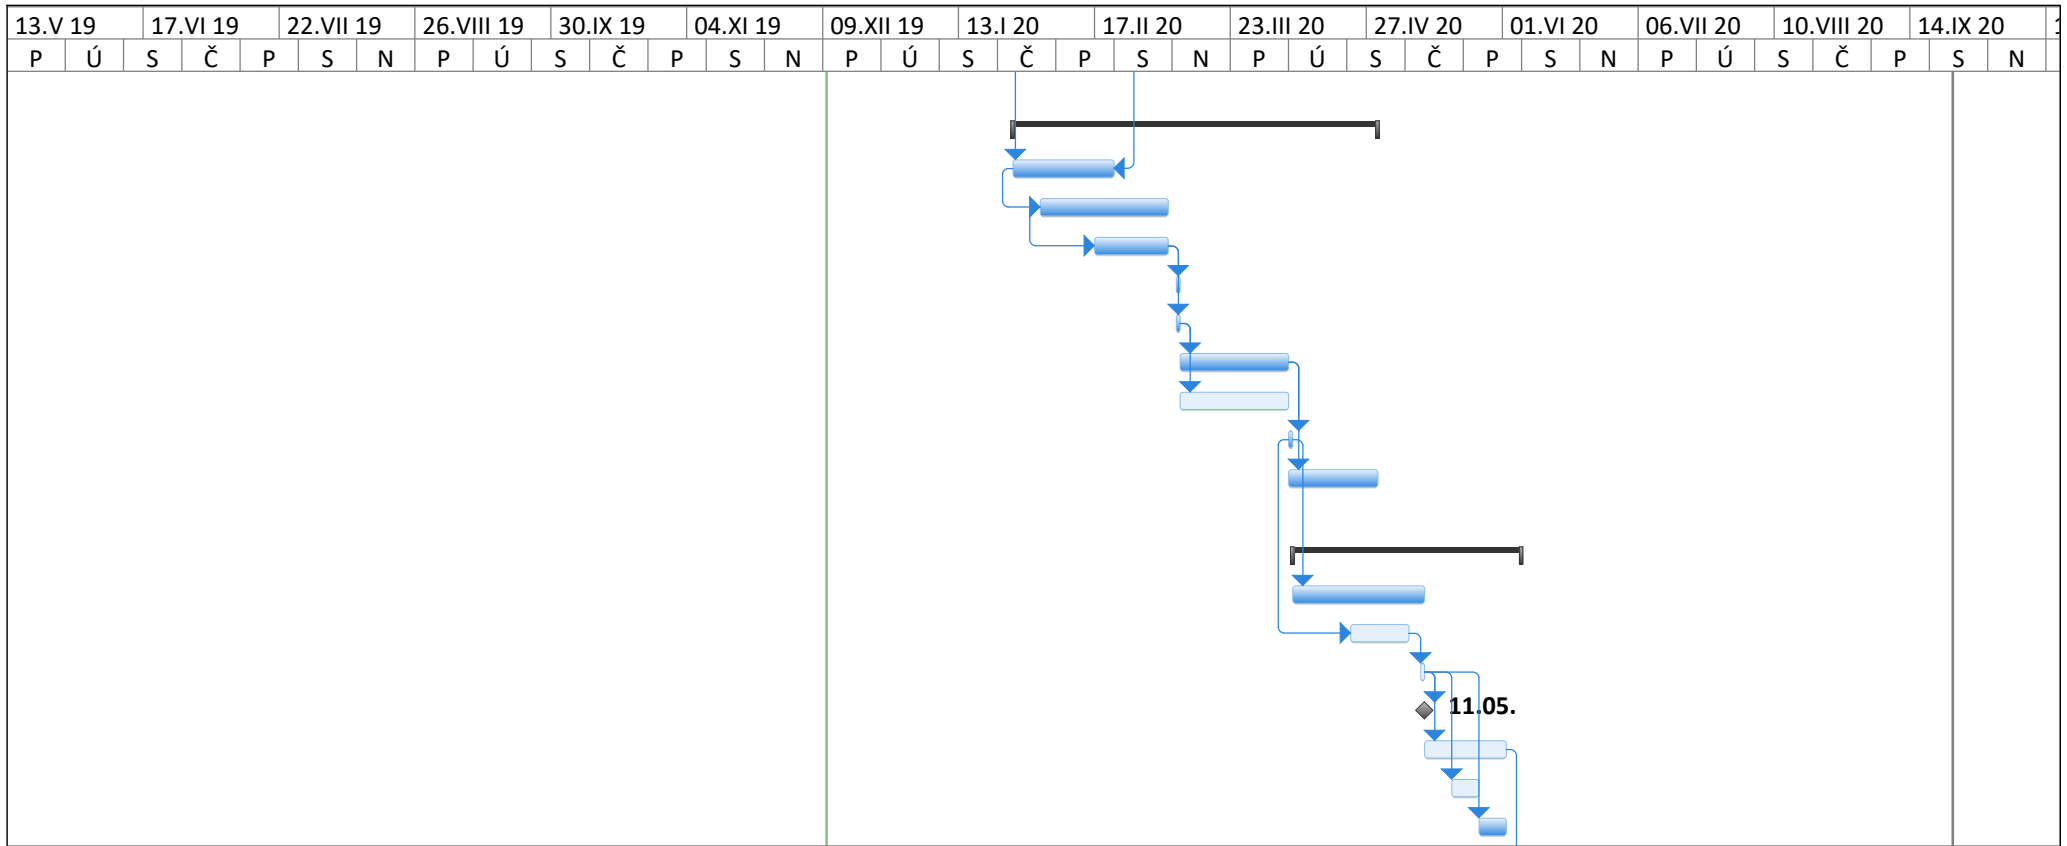

Projekt: harmonogram_RÚIAN_20 Datum: 10.12. 19	Úkol		Ruční úkol	
	Rozdělení		Pouze s dobou trvání	
	Milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Souhrnný		Ruční souhrn	
	Souhrn projektu		Pouze zahájení	
	Vnější úkoly		Pouze s datem dokončení	
	Vnější milník		Konečný termín	
	Neaktivní úkol		Průběh	
	Neaktivní milník		Manual Progress	
	Neaktivní souhrn			

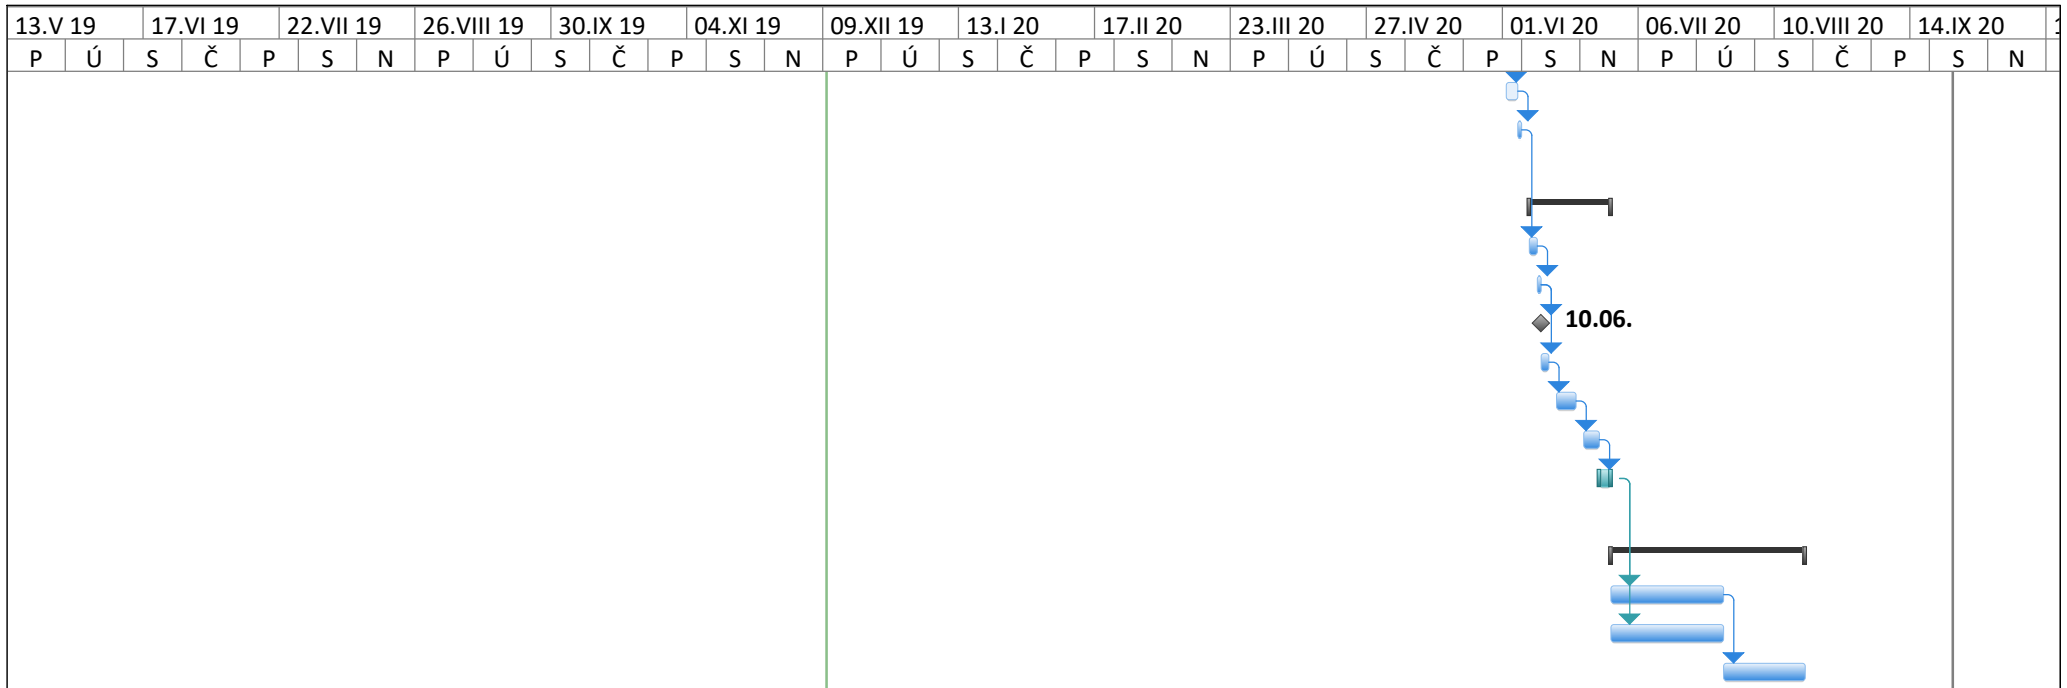

Projekt: harmonogram_RÚIAN_20 Datum: 10.12. 19	Úkol		Ruční úkol	
	Rozdělení		Pouze s dobou trvání	
	Milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Souhrnný		Ruční souhrn	
	Souhrn projektu		Pouze zahájení	
	Vnější úkoly		Pouze s datem dokončení	
	Vnější milník		Konečný termín	
	Neaktivní úkol		Průběh	
	Neaktivní milník		Manual Progress	
	Neaktivní souhrn			
