



TSKRP001ZM96

6300 ✓

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: 3/16/6300/140

číslo smlouvy zhotovitele: S/2016/18

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení:

č. ú.:

zastoupena: Ing. Jirím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Antonín Semecký, pověřený řízením úseku speciálních staveb
Josef Plecítý, TDI

2. Zhotovitel: Stavební firma HOBST a s

IČ: 48033251

DIČ: CZ 48033251

Bankovní spojení:

zastoupena: Ondřejem Cikhartem, členem představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ondřej Cikhart, člen představenstva
- ve věcech technických: Ing. Vladimír Hobst, předseda představenstva

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

II.**Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Hlavní – Spořilovská (X 570) – oprava říms a odvodnění, Praha 4“, dle dokumentace, kterou zpracovala firma Top Con servis s.r.o., Varšavská 30, 120 00 Praha 2, záložní adresa: Ke Stírce 56, Praha 8.

Dílo je vymezeno následovně:

Předmětem plnění veřejné zakázky je sanace říms, oprava odvodňovacího systému, výměna povrchové vrstvy pochozí plochy chodníků a další související práce dle soupisu prací.

Součástí plnění je:

- projednání vydání DIR a realizace DIO odbornou firmou,
- projednání a zajištění potřebného záboru pro zřízení staveniště včetně energetických zdrojů.

(dále jen „dílo“).

2. Místo realizace díla: Praha 4, ul. Hlavní, most přes ul. Spořilovskou
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
4. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením stavby a v souladu se stavebním zákonem č. [REDAKCE] Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.

III.

Doba plnění díla

Termín zahájení : [REDAKCE] - dnem předání staveniště

Po předání staveniště a dle vydaného DIR, který zajišťuje zhotovitel a po zajištění finančního krytí.

V případě nepřidělení finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo posunout termín zahájení až do doby přidělení finančních prostředků. Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí a souhlasí s ním.

Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech od předání staveniště činí: 85

Termín dokončení : do 85 kal. dnů od předání staveniště

Při pozdním zahájení díla z důvodu prodloužení objednatele s předáním místa realizace díla se termíny dokončení o toto prodloužení prodlouží.

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno dle vydaného stavebního povolení.

IV.

Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.
2. Celkem cena za dílo bez DPH : 4 633 165,46 Kč
DPH : 972 964,75 Kč
Cena celkem včetně DPH : 5 606 130,21 Kč

V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních, včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IPR Praha ve dvojím vyhotovení, projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realizaci, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot.

3. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli po provedení prací event. po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části za podmínek stanovených v tomto článku níže.
2. Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.

Veškeré daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

Vzhledem k tomu, že objednatel hospodaří s veřejnými prostředky hlavního města Prahy, bude na fakturách daňových dokladech zhotovitele zohledněna tato skutečnost v údajích „objednatel“ takto:

Hlavní město Praha
IČ: 00064581
Mariánské náměstí 2
110 00 Praha 1
zastoupené TSK hl.m.Prahy
Řásnovka 770/8
110 15 Praha 1

3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ a „Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.
4. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 21 dní po převzetí faktury objednatelům. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami a zhotovitelem potvrzeným „Referenčním listem“ (textová část + foto).
5. Zhotovitel předloží jako doklad pro fakturaci dodací listy nově dodaného a zabudovaného materiálu na stavbě.
6. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí faktury.

7. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výhradně pro veřejnoprávní činnost, tj. pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty (DPH) a příjemce k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k DPH.

VI.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení díla. Zápis o předání staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo bude nedílnou součástí SD jako jeho příloha.
2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:
 - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti objednatele a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě
 - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele, které brání řádnému provádění díla
 - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně zhotovitele)
 - d) prodlení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu smlouvy ukáže jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

VII.

Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.
 - Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.
 - Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.
 - Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
 - Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.

- Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.
3. Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.
 4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.
 5. Na stavbě bude objednatel zastupovat stavební dozor investora (TDI).

VIII. Převzetí díla

1. Po provedení díla, příp. jeho samostatné části vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.
2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezuji, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí díla odmítnout.
3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
Při přejímacím řízení pro odstraněné vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle čl. VIII. odst. 1 – 2 smlouvy.
4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDI) na základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou provedeny řádně a zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu objednatelem.
5. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.
6. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
7. Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přejímacímu řízení stavby tyto doklady:
 - originál SD,
 - výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v TP TSK,
 - atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě,
 - dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré,
 - vyúčtování likvidace vybouraného materiálu,
 - hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů,
 - vyjádření správců inž. sítí.

Zhotovitel je povinen dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení.

IX. Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta na 60 měsíců.
Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla.
2. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené doby životnosti. Zhotovitel upozorní objednatele na výrobky s kratší záruční lhůtou.
3. Objednatel uplatní právo ze záruky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní případ s objednatelem v rámci reklamačního řízení.

X. Smluvní pokuty

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den prodlení,
2. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den, a to až do doby uvedení díla do řádného stavu,
3. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přejímacím řízení ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení,
4. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení,
5. smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení,
6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení povinnosti,
7. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat při změně subdodavatele způsobem stanoveným v čl. XI. odst. č. 9 této smlouvy ve výši 10 % ze sjednané celkové ceny díla za každý jednotlivý případ,

8. smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě zhotovitelem na žádost Objednatele, a to ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezabavuje objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

XI.

Ostatní ujednání

1. Na základě usnesení č. 2026 Rady hl.m. Prahy ze dne 11.12.2007 je zhotovitel povinen umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy, který zhotovitel obdržel jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky. Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí a zavazuje se ji splnit.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
 - a) porušení obecně závazných předpisů,
 - b) porušení smluvních podmínek,
 - c) porušení příkazů daných objednatelem,
 - d) zničení, ztráty, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
 - e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele, nese tento zhotovitel plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nepochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

3. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení zhotoviteli a zhotovitel má nárok na zaplacení ceny části díla, která byla provedena do okamžiku, kdy obdržel odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
4. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky budou vyžadovat (požadavek OD MHMP, PČR atd.). Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujistňuje objednatele, že dílo lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.
6. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných vůči objednateli investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku víceprací (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V případě neodsouhlasení těchto prací v SD nebudou tyto práce objednatelem zaplacený.

Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (VV) a z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje) budou předloženy bez podrobného vyčíslení TDI, který nechá okamžitě tyto vícepráce schválit náměstkovi pro speciální stavby objednatele. Vícepráce mohou být zahájeny až po souhlasu příslušného náměstka, v naléhavých případech, kdy vícepráce přímo ovlivňují splnění termínu vydaného DIR nebo brání dalším navazujícím pracím, může být dán souhlas telefonicky.
7. Při přerušení nebo zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám.
9. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadání prací subdodavateli neuvedenému v příloze vyžádat si předem souhlas objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení stavby a veškerých dalších vyjádření orgánů státní správy.
11. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí orgánů státní správy.
12. Zhotovitel zajistí DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí), dodrží jeho podmínky a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce za jeho porušení.
13. Zhotovitel projedná min. 14 dnů před zahájením stavby DIR se všemi dotčenými organizacemi a správci.
14. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení.
15. Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané laboratoří objednatele.
16. Osazení dopravního značení bude provedeno odbornou firmou.
17. Zhotovitel zajistí zábor veřejného prostranství.
18. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.
19. Zhotovitel se zavazuje, že se bude v průběhu provádění díla řídit technickými normami a předpisy, které předložil k odsouhlasení objednateli před podpisem smlouvy.

XII. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně **1 000 000,- Kč**. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.


XIII. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
2. Smluvní strany berou na vědomí a uzavírají tuto smlouvu s přihlédnutím k usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 40/19 ze dne 19.6.2014, jímž bylo zřizovatelem Objednatele rozhodnuto o převodu veškerých činností příspěvkové organizace na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., jež je obchodní korporací ve výlučném vlastnictví hlavního města Prahy, přičemž součástí převodu těchto činností je i převod (postoupení) všech smluvních vztahů příspěvkové organizace na akciovou společnost. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí s tím, aby práva a povinnosti Objednatele z této smlouvy byly k rozhodnému datu převodu činností postoupeny na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., která nastoupí do právního postavení Objednatele.
3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran
4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.

8. Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se této smlouvy a prováděného díla dalším osobám, s výjimkou ředitele TSK, náměstka pro speciální stavby a stavebního dozoru objednatele.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- Podrobný harmonogram prací
 - Položkový rozpočet
 - Seznam subdodavatelů

V Praze dne 11. 08. 2016


objednatel

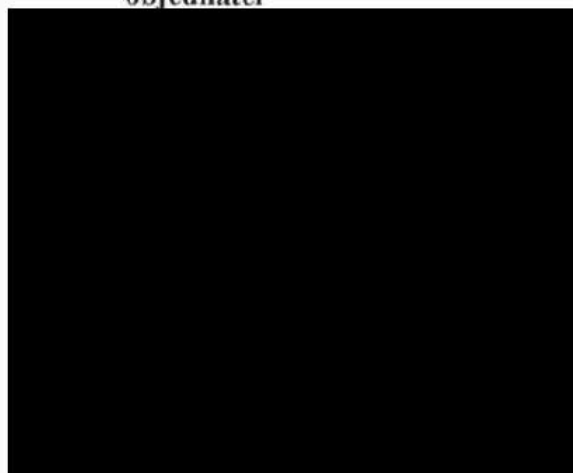

číslo 770/3, 110 15 PRAHA
17

V Praze dne 11. 08. 2016

zhotovitel

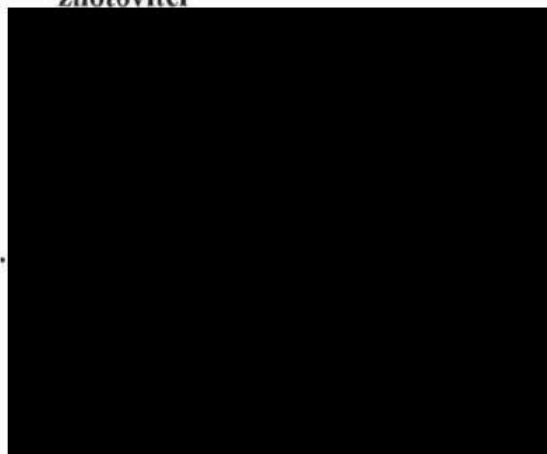

....

Akce: „Hlavní – Spořilovská (X 570) – oprava říms a odvodnění, Praha 4“

HARMONOGRAM PRACÍ

Rok	Den	2016
Přípravné práce	1	
Bourací práce	2	
Očištění betonových povrchů	3	
Reprofilace	4	
Vyrovnávací stěrka	5	
Náter betonových konstrukcí	6	
Chodníky	7	
Litý asfalt	8	
Oprava zábradlí	9	
Odláždění svahů	10	
Dokončovací práce	11	
DIO	12	
Počet kal. dnů	13	

Zahájení prací: 08 / 2016 dnem předání staveniště
Dokončení prací: 85 kal. dní od předání staveniště

Počet kal. dnů celkem: 85

NÁZEV A Č. STAVBY : Oprava objektu						
X 570 - Hlavní - Spořilovská						
Č.	POL.	NÁZEV POLOŽKY	m.j.	MNOŽSTVÍ	CENA ZA	CENA CELK.
				PSP	JEDN. Kč	Kč
1		Vyřezání dřevin podél říms, vč. odvozu, 4*2*10	m2	80,00	165,00	13 200,00
2		Zemní práce pro odláždění svahů u křidel	soub.	1,00	32 000,00	32 000,00
3		Odbourání pochozí vrstvy LA tl. 30 mm na chodnicích a předmostích (do vzdál. 2,5 m od MZ), vč. odvozu a skládkovného, 2*2,6*69,0	m2	358,80	630,00	226 044,00
4		Odstranění podkladní betonové vrstvy pod LA na tl. 40 mm, vč. odvozu a skládkovného, 2*2,6*69,0*0,05	m3	14,35	6 720,00	96 445,44
5		Odstranění porušené betonové pochozí vrstvy obslužných chodníků na tl. 70 mm, vč. odvozu a skládkovného, 2*0,7*69,0*0,07	m3	6,76	6 720,00	45 440,64
6		Výměna krycích plechů MZ v chodnicích, vč. přikotvení a PKO, (4*0,2*3,2+4*0,2*1,0)*48,0	kg	161,28	156,00	25 159,68
7		Vybourání chodníkových vrstev pro nové odvodnění a kolem šachet, vč. odvozu a skládkovného, (4*5,5*1,0+4*2,5)*0,25	m3	8,00	6 720,00	53 760,00
8		Vybourání (odřiznutí) obrubníkových plechů, 4*5,5	m	22,00	1 190,00	26 180,00
9		Očištění betonových povrchů vodním paprskem 1200 bar - svislý líc říms, 4*(0,65+0,1)*64,0	m2	192,00	280,00	53 760,00
10		Očištění betonových povrchů vodním paprskem 1200 bar - horní povrch říms, 2*0,45*64,0	m2	57,60	280,00	16 128,00
11		Očištění betonových povrchů vodním paprskem 1200 bar - obslužné chodníky (až na konec křidel), 2*0,7*(64,0+2*4,0)	m2	100,80	280,00	28 224,00
12		Očištění betonových povrchů vodním paprskem 1200 bar - chodníky, 2*2,7*69,0	m2	358,80	280,00	100 464,00
13		Ruční dočištění ploch říms, 30% plochy	m2	74,88	648,00	48 522,24
14		Ochrana obnažené výztuže, antikor a adheziv nátěr - římsy	m2	74,88	690,00	51 667,20
15		Reprofilace výztuže - dodávka a montáž	kg	250,00	59,00	14 750,00
16		Odstranění (vybourání) ohrubné vrstvy LA tl. 40 mm, na š. 0,50 m podél obrubníků, vč. odvozu a skládkovného	m2	138,00	630,00	86 940,00
17		Obnova PKO obrubníkových plechů (očištění, otryskání, třívrstvý NS), 4*0,15*64,0	m2	38,40	920,00	35 328,00
18		Vyspravení povrchu sanačním materiálem do hl. 50 mm 15% plochy říms	m2	37,44	5 620,00	210 412,80
19		Vyspravení povrchu sanačním materiálem do hl. 30 mm ... 20% plochy říms	m2	49,92	3 910,00	195 187,20
20		Vyspravení povrchu sanač. maltou do hl. 15 mm ... 50% plochy říms	m2	124,80	2 630,00	328 224,00
21		Vyrovnávací stěrka povrchu říms, 100% plochy	m2	249,60	620,00	154 752,00
22		Omytí povrchu betonů vodou 150 bar před nátěrem	m2	249,60	190,00	47 424,00
23		Dvojnásobný ochranný nátěr betonů s účinky proti CHRL a UV (římsy a obslužné chodníky)	m2	350,40	645,00	226 008,00
24		Podkladní a vyrovnávací vrstva pod odvodňovací obrubníky, 4*5,5*1,0*0,05	m3	1,10	13 600,00	14 960,00

Č. POL.	NÁZEV POLOŽKY	m.j.	MNOŽSTVÍ		CENA ZA		CENA CELK.	
			PSP	JEDN. KČ	JEDN. KČ	KČ		
25	Chodníkové odvodňovací obrubníky s příčnými nátoky, včetně výtokových dílců, čistících kusů, dodávka a montáž, 4*5	m	20,00	5 630,00		112 600,00		
26	Doplňení chodníkových vrstev jemnozrnným betonem, 4*5,5*0,2	m3	4,40	13 600,00		59 840,00		
27	Betonová vyrovnávací spádová deska obslužných chodníků ve sklonu 2%, tl. min. 60 mm, se svařovanou sítí	m3	6,55	15 490,00		101 490,48		
28	Betonová vyrovnávací spádová deska chodníků ve sklonu 2%, tl. min. 60 mm, se svařovanou sítí	m3	23,32	15 490,00		361 257,78		
29	Přímopochozí stěrková izolace s křemičitým posypem na chodnících, včetně úpravy spár na koncích NK	m2	358,80	1 670,00		599 196,00		
30	LA tl. 40 mm na š. 0,5 m podél obrubníků	m2	138,00	590,00		81 420,00		
31	Oprava lokálního poškození zábradlí	soub.	1,00	26 300,00		26 300,00		
32	Obnova lokálního porušení PKO zábradlí (očistění, třířstvý NS)	m2	50,00	750,00		37 500,00		
33	Svislé svody DN 200, dodávka, montáž včetně všech detailů a napojení (přikotvení), 4*8,0	m	32,00	4 290,00		137 280,00		
34	Mobilní zavěšené pracovní lešení, 10*1=10 m2, výšky 2 m - mont., demont., nájem	soub.	4,00	74 500,00		298 000,00		
35	Odláždění svahů podél křídla na š. 1,0 m, z kamene tl. 200 mm do betonového lože tl. 150 mm, 2*4*5,0	m2	40,00	2 650,00		106 000,00		
36	Zařízení staveniště, cca 2 % z IN	soub.	1,00	123 000,00		123 000,00		
37	DIO, omezení provozu na převáděné komunikaci, vč. projektové dokumentace a projednání	soub.	1,00	295 000,00		295 000,00		
38	RDS, pásmo IV max.	soub.	1,00	142 300,00		142 300,00		
39	PD - skutečné provedení stavby	soub.	1,00	21 000,00		21 000,00		
	Cena celkem bez DPH					4 633 165,46		
	DPH 21 %					972 964,75		
	Cena celkem s DPH					5 606 130,21		

Akce:

„Hlavní – Spořilovská (X 570) – oprava říms a odvodnění, Praha 4“

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Práce uvažované zadat subdodavateli	Jméno a sídlo subdodavatele	% podílu prací	IČO:
DIO	Proznak Praha, s.r.o.	6,3 %	271 66 392

Uchazeč Stavební firma HOBST, a.s. prohlašuje, že:

Všechny práce provedeme vlastními kapacitami a náš podíl prací na této zakázce činí 93,7 %.

