

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl. n.“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-1115/2020

ISPROFOND: 511 372 0011

a

Společnost „MTS + HT CZ – Podchody hl.n.“

vedoucí společník

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B758,

bank. spojení: [redacted] č. účtu: [redacted]

zastoupena: Ing. František Kočí, předseda představenstva a Ján Dudáš, člen představenstva

a

druhý společník

HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00,

IČO: 466 78 468, DIČ: CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B6229

zastoupena: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva a Jörg Mathew, člen představenstva

e. smlouva: JSAD35/INV/2020/3

Korespondenční adresa:

Metrostav a.s., divize5, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 20050050

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Objednatel si přeje, aby Dílo „**Prodloužení podchodů v žst. Praha hl. n.**“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány:
 - 1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný 11.3. 2020
 - 1.2 Dopis nabídky datovaný 24.1.2020
 - 1.3 Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace druhé vydání 04/2019
 - 1.4 Technická specifikace
 - 1.5 Výkresy a
 - 1.6 Formuláře:
 - 1.6.1 Soupis prací,
2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve Zvláštních technických podmínkách.
3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb.
 - 5.1 Objednatel zašle Zhotoviteli do 7 dní ode dne účinnosti Smlouvy o dílo aktualizovaný Soupis prací v otevřeném datovém formátu XML, který bude mít strukturu dat dle datového předpisu (viz www.xdc.szdc.cz). Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů od obdržení tohoto soupisu prací oceněný soupis prací dle své Nabídky Zhotovitele (v listinné formě) v otevřeném datovém formátu XML. Soupis prací v otevřeném formátu XML může Zhotovitel také vyplnit v modulu pro ocenění nabídkové ceny na zabezpečeném serveru <https://www.xdc.szdc.cz>. Zhotovitel odpovídá za shodu obsahu listinné a elektronické podoby oceněného Soupisu prací.
 - 5.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XDC, www.xdc.szdc.cz):
 - 5.2.1 Faktura,
 - 5.2.2 souhrn fakturace,
 - 5.2.3 soupis zjišťovacích protokolů,
 - 5.2.4 zjišťovací protokoly.
6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
7. NEOBSAZENO
8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetím Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatelem ve smyslu Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] a Pod-článku 10.2 [Převzetí části díla] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatelem.
9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona

č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.

10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
12. Neobsazeno.
13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 21 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatností ani nevymahatelností ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.
15. Objednatel si vyhrazuje:
 - 15.1 neobsazeno
 - 15.2 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:
 - SO 140 Prodloužení severního podchodu
 - 15.3 požadavek, že významné činnosti při plnění veřejné zakázky dle předchozího bodu 15.2 musí být plněny takovým subjektem na straně Zhotovitele, který před uzavřením Smlouvy prokázal odpovídající požadavky na technickou kvalifikaci, konkrétně poskytnutí a dokončení odpovídajících nejvýznamnějších stavebních prací, a to jeho vlastními prostředky; pokud by plnění měl poskytovat jiný subjekt na straně Zhotovitele, pak pouze pokud prokáže, že rovněž splňuje předmětnou kvalifikaci v potřebném rozsahu a Objednatel tuto skutečnost potvrdí písemným souhlasem; Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise Nabídky za každý případ porušení vyhrazeného požadavku.
 - 15.4 změnu zhotovitele v souladu s § 100, odst.2 ZZVZ v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl.14 Pokynů pro dodavatele. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.
 - 15.5 právo valorizovat částky způsobilé k platbě Zhotoviteli, a to v souladu s Podčlánkem 13.8 Smluvních podmínek. Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že valorizace může nabývat hodnot kladných i záporných.

16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou v listinné podobě Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
17. NEOBSAZENO.
18. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy o dílo Objednateli závazný příslib banky, kterým prokázal, že mu při splnění podmínek dojednaných s bankou budou poskytnuty finanční zdroje minimálně ve výši 13 milionů Kč. Príslib banky musí být platný po celou dobu realizace stavebních prací až do vydání posledního Potvrzení o převzetí části Díla. V případě, že Zhotovitel neudrží v platnosti bankovní příslib v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o dílo, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.
19. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatелеm jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo.
20. Smlouva o dílo se vyhotovuje v sedmi (7) vyhotoveních, z nich tři (3) vyhotovení obdrží Objednatel a 4 vyhotovení Zhotovitel.
21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 7	Žádost o poskytnutí zálohové platby

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

09-04-2020

V Praze dne

V Praze dne 6.4.2020

Objednatel

**Správa železnic,
státní organizace**

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ
pro modernizaci dráhy

Zhotovitel

**Společnost „MTS + HT CZ – Podchody hl.n.“
Vedoucí společník
Druhý společník
Metrostav a.s.,
HOCHTIEF CZ a.s.**

Ing. František Kočí
předseda představenstva

Ján Dudáš
člen představenstva

Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva

Jörg Mathew
člen představenstva

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Do přílohy smlouvy bude vložena tabulka Rekapitulace ceny dle PS a SO předložená v nabídce uchazeče podle odst.12.3 Pokynů pro dodavatele.

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení			
PS 110	Zabezpečovací zařízení			
D.2	Železniční sdělovací zařízení			
PS 210.1A	Místní kabelizace			
PS 220	KABELOVÝ KOLEKTOR - PŘELOŽKY SDĚL. KABELŮ			
PS 221	ÚPRAVY EPS V KOLEKTORU			
PS 222.1A	Úprava sdělovacího zařízení			
PS 230.1A	Informační systém			
PS 231.1A	Rozhlasový systém			
PS 232.1A	Kamerový systém			
D.3	Silnoproudá technologie včetně DŘT			
PS 350.1A	Rozvodny 0,4kV R51,R61,R71 - technologie			
D.4	Ostatní technologická zařízení			
PS 415	Eskalátory na výstupu ze severního prodlouženého podchodu			
PS 416	Výtah na výstupu ze severního prodlouženého podchodu			
E.1.1.1	Železniční svršek			
SO 110.1A	Úpravy žel. svršku a spodku			
E.1.4	Mosty, propustky, zdi			
SO 140.1A	Prodloužení severního podchodu			
SO 207	Zárubní zeď severozápad			
E.1.6	Potrubní vedení			
SO 160	Odvodnění výstupů z podchodů			
SO 161	Přeložka vodovodu v místě křížení prodlouženého severního podchodu			
E.1.8	Pozemní komunikace			
SO 180	Chodník směr Seifertova			
E.1.9	Kabelovody, kolektory			
SO 190.1	Přeložka stávajícího kolektoru			
SO 190.2	Provizorní hala po dobu výstavby přeložky kolektoru			
E.2	Pozemní stavební objekty			
SO 211	Oplocení směr Seifertova			
SO 216.1A	Mobilniář na 5.-7.nástupišti			
SO 217.1A	Povrchové úpravy výstupů z podchodů			
SO 221	Zastřešení výstupu ze severního podchodu			
SO 223.1A	Rekonstrukce stávajících podhledů v podchodech včetně prodlouženého severního podchodu			
SO 240.1A	Orientační systém pro cestující (včetně chodníku Legerova)			
E.3.1	Trakční vedení			
SO 310.1A	Úpravy trakčního vedení			
F.3.4	Ohřev výměn (elektrický - EOv, plynový - POv)			
SO 340	Úprava EOv			
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů			
SO 360.1A	Úprava rozvodu nn, vn a osvětlení			
SO 361	Kabelový kolektor - přeložky rozvodů nn a vn			
SO 367.1A	Severní podchod - úprava rozvodu nn a osvětlení			
SO 369	Přístupové komunikace k severnímu podchodu - osvětlení			
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí			
SO 375.1A	Ukolejnění konstrukcí			
SO 98-98	Všeobecný objekt			
SO 98-98	Všeobecný objekt			

PŘÍLOHA Č. 2

Oprávněné osoby

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Ředitel stavby dle směrnice SM SŽDC 105 Změny během výstavby

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce)

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████████████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení	██ ██████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████████████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████████████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení	██████████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	██████████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

PŘÍLOHA Č. 3

Seznam poddodavatelů


Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
AŽD Praha s.r.o. Žirovnická 3146/2 Záběhlice 106 00 Praha 10 IČO: 480 29 483	Stavební a montážní práce na stavebních dílech: PS 110 Zabezpečovací zařízení PS 210.1A Místní kabelizace PS 220 KABELOVÝ KOLEKTOR - PŘELOŽKY SDĚL. KABELŮ PS 221 ÚPRAVY EPS V KOLEKTORU PS 222.1A Úprava sdělovacího zařízení PS 230.1A Informační systém PS 231.1A Rozhlasový systém PS 232.1A Kamerový systém PS 350.1A Rozvodny 0,4kV R51,R61,R71 – technologie PS 415 Eskalátory na výstupu ze severního prodlouženého podchodu PS 416 Výtah na výstupu ze severního prodlouženého podchodu	██████████

PŘÍLOHA Č. 4


Harmonogram postupu prací

Grafické znázornění postupu prací (Harmonogram postupu prací) předložené v nabídce uchazeče podle odst. 9.1 Pokynů pro dodavatele.

ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Půlrok 1, 2020		Půlrok 2, 2020		Půlrok 1, 2021		Půlrok 2, 2021
							B	K	Č	Z	L	L	B
1		Prodloužení podchodu v žst, Praha Hlavní n. - Etapa 1A											
2		Zahájení stavby											
3		Stavební postup 0											
4		Příprava staveniště, oplocení staveniště.											
5	SO 110 1A	Provizorní přeložka koleje 40b,											
6	SO 110 1A	Snesení koleje v místě přeložky vodovodu											
7	SO 161	Přeložka vodovodu, včetně snesení opuštěné části vodovodu											
8	SO 160	Výstavba kanalizace v místě snesené koleje po napojovací šachtu											
9	SO 310.1A	Základy a provizorní stožáry mezi koleje 32 a 34 (P66, P76)											
10	SO 310.1A	Úprava TV nad kolejí 32b, 36b a částí 34 pro vložení MP - krátkodobá výluka těchto kolejí											
11	PS 350 1A	Úprava rozvodny R61											
12		SP 01 Prodloužení severního podchodu včetně chodníku											
13	SO 140	Vložení MP do koleje 32 b											
14	SO 110 1A	Snesení částí koleje 34 (v rozsahu haly)											
15	SO 310 1A, SO 375 1A	Provizorní zakotvení trakčního vedení na provizorní stožáry mezi kolejemi 32 a 34											
16	SO 140	Kotvené záporové pažení pro 1. část podchodu v rozsahu haly											
17	SO 140	Výkop prodlužovaného podchodu v rozsahu obnažení kolektoru											
18	SO 190.2	Ochranná hala											
19	SO 190.1	Odstranění stropu kolektoru.											
20	SO 361	Zrušení kabelového kanálu mezi kolektorem a podchodem včetně kabelů											
21	SO 190.2	Zřízení ocelové konstrukce pro vyvěšení kabelů,											
22	PS 110, PS 220, SO 361	Přeložení kabelů, jejich provizorní zavěšení na samostatnou konstrukci											
23	SO 140	Výkop prodlužovaného podchodu v rozsahu 1.části podchodu a zrušení kolektoru v překládané části, včetně odstranění původních pilotů											
24	SO 140	Betonáž - Betonová konstrukce 1. částí podchodu,											
25	PS 110, PS 220, SO 361	Definitivní přeložka kabelů nad strop konstrukce											
26		Technologická přestávka											
27	SO 190.2	Odstranění provizorní haly											
28	SO 140	Hydroizolace podchodu a následný zásyp											
29	SO 140	Kotvené záporové pažení po 1. části podchodu (pro přeložku koleje)											
30	SO 110 1A	Přeložka koleje 40 b pro autocouchet do původní polohy.											
31	SO 190.1	Obnovení komunikace po kolektoru (bude dočasně sloužit jako cesta pro složky IZS). Pojezd po kabelových kanálech											
32	SO 140	Kotvené záporové pažení a výkop 2.části prodlužovaného podchodu.											
33	SO 140	Betonová konstrukce 2. částí prodlužovaného podchodu,											
34	SO 160	Napojení na kanalizaci											
35	SO 140	Hydroizolace, zásyp											
36	SO 140	Definitivní povrchy a obklady											
37	PS 416	Výtahy											
38	PS 415	Eskalátory											
39	SO 221	Zastřešení výstupu z podchodu, korordinace PS 416, PS 415											
40	SO 180	Chodník směr Seifertova											
41	SO 369	Osvětlení k prodlouženému severnímu podchodu											
42	PS 230 1A	Orientační a informační systém											
43		SO 207 Zárubní zeď severozápad - Etapa 3											
44		Železobetonová konstrukce											
45		Izolace											

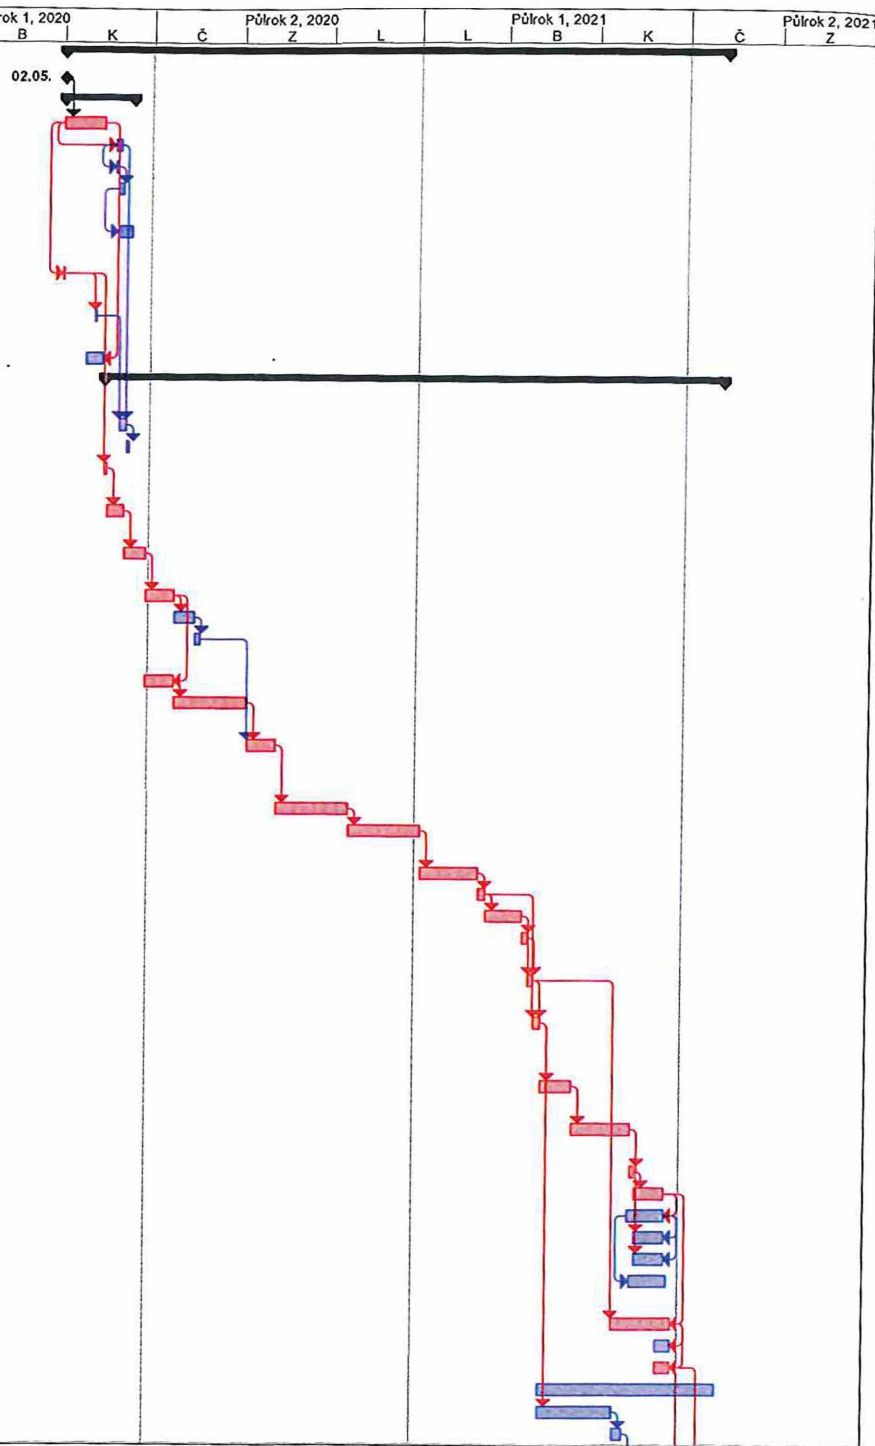

ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Půlrok 1, 2020			Půlrok 2, 2020			Půlrok 1, 2021			Půlrok 2, 2021	
							B	K	Č	Z	L	L	B	K	Č	Z	
46		Zásypy hutnění	████	████	████████												
47		Komunikace	████	████	██████████												
48		Odvodnění	████	████	██████████												
49		Osvětlení	████	████	██████████												
50		Mobiliář	████	████	██████████												
51		Zeleň	████	████	██████████												
52		Dokončovací práce - Etapa 1A a 3	████	████	██████████												
53		Ukončení stavby	████	████	██████████												



PŘÍLOHA Č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

2. Rozsah zpracovávaných údajů

- 2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v čl.4 Všeobecných technických podmínek na zhotovení stavby.
- 2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.
- 3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.
- 3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
- 3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
- 3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.
- 3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.
- 3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.
- 3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.

- 3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchování je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta

- 4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatel, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatel vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.
- 4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatel na základě tohoto ustanovení.
- 4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatel požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.

PŘÍLOHA Č. 6

Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo

a

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

PŘÍLOHA Č. 7

Žádost o poskytnutí zálohové platby

V souladu s ustanovením pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“ žádáme o poskytnutí zálohové platby na finanční plnění výši: [REDAKCE] Kč.

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v souladu s výše uvedenou Smlouvou o dílo v období: [REDAKCE] včetně.

Součástí této žádosti je:

- aktuální Správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu Pod-článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, zajišťující vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, které musí korespondovat s věcným plněním Díla.
- zálohová faktura č. [REDAKCE]

V dne

.....

Zhotovitel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 707756

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a182a16c-50b7-4416-8cfc-0be2427bc89a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.04.2020 08:42:04



45238faf-a417-413f-a2e7-fead35526aea
