



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Agendové číslo: 28/06/2020/Bro
Evidenční číslo: d202000323
výtisk č.

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

TELMO a.s.

sídlo: Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10
adresa pro doručování: Pražská 96, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 47307781
DIČ: CZ47307781
zastupuje: [REDACTED] předseda představenstva
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 20073
(společník č. 1)

a

KZ systém s.r.o.

sídlo: Ke Koupališti 1257/4, 434 01 Most
IČ: 25047752
DIČ: CZ25047752
zastupuje: [REDACTED] jednatel společnosti
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14871
(společník č. 2)

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky vedené pod názvem:
„Protipovodňový varovný a informační systém statutárního města Chomutova“.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Agendové číslo: 28/06/2020/Bro
Evidenční číslo: d202000323
výtisk č.

Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s podanou žádostí o finanční příspěvek na projekt pod názvem „Protipovodňový varovný a informační systém statutárního města Chomutov“, který byl předložen na základě Výzvy k předkládání žádostí MŽP_145. výzva, PO 1, SC 1.4, Aktivita 1.4.3 – Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

Projekt má být realizován s finanční podporou v rámci výzvy MŽP_145. výzva, PO 1, SC 1.4, Aktivita 1.4.3 – Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

Dosud nebylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory ze strany OŽP. **V případě rozhodnutí poskytovatele finanční podpory o neschválení finanční podpory nebo v případě, že objednatel neobdrží Rozhodnutí o poskytnutí podpory nejpozději do 30. 9. 2020, si objednatel vyhrazuje právo upustit v souladu s čl. X. odst. 5 této smlouvy od realizace 2. etapy díla.**

Projekt je vázán dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce a další platnou legislativou.

Pravidla mohou být v průběhu realizace projektu aktualizována. Informace o aktualizaci Pravidel jsou uveřejněny na internetových stránkách na <https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674>, <https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=677>.

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku zhotovitele, která splnila požadavky objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. Dílo

1. Dílem se v této smlouvě rozumí vybudování varovného a informačního systému statutárního města Chomutova zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti města a integrovaných monitorů hladin pro včasné varování obyvatel. Záměrem objednatele je vybudovat varovný a informační systém tak, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí ze zvýšení vodní hladiny na lokálním toku a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, a tak snížit materiální škody a chránit zdraví a životy obyvatel. Systém bude ozvučovat celé předmětné území pomocí akustických bezdrátových jednotek, které slouží pro přenos varovných informací pro obyvatele v případě ohrožení povodněmi. Všechny použité komponenty varovného systému v obou etapách budou obousměrné, které zajistí on-line zpětnou informaci o stavu a funkci zařízení, budou vysílat na individuálních kmitočtech s plně digitální modulací. Součástí díla budou všechny výrobky, materiály a softwarové licence, potřebné k zajištění funkčnosti díla.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Agendové číslo: 28/06/2020/Bro
Evidenční číslo: d202000323
výtisk č.

2. Dílo se skládá z následujících částí:

a) **1. etapa**, jejímž předmětem je zejména:

- vybudování centrálního řídicího systému na Magistrátu města Chomutova (1ks řídicí systém VIS) s možností ovládání varovného informačního systému
- vybudování lokálního řídicího systému v Zooparku Chomutov (1ks vzdálený klient VIS) s napojením na centrální řídicí systém
- vybudování dalších částí varovného a informačního systému:
 - 12 ks venkovních digitálních obousměrných hlásičů
 - 32 ks reproduktorů
- zajištění přenosu dat mezi jednotlivými částmi systému a zálohování dat

b) **2. etapa**, jejímž předmětem je zejména:

- vybudování lokálního řídicího systému na Městské policii Chomutov a v Městském informačním centru s napojením na centrální řídicí systém (2ks vzdálený klient VIS)
- vybudování dalších částí varovného a informačního systému:
 - 118 ks venkovních digitálních obousměrných hlásičů
 - 368 ks reproduktorů
 - 1ks webová aplikace s provázáním na digitální povodňový plán

Pro účely této smlouvy se každá etapa považuje za samostatné dílo a bude předávána a placena samostatně.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky jeho provádění blíže specifikováno:

- a) Technická dokumentace, 2/2020, název: „Protipovodňový varovný a informační systém Statutárního města Chomutov“, zpracovatel: Projekční kancelář – Varovné systémy, Ing. Vladimír Pavlík, Najdrova 2183, 252 63 Rostoky.
- b) Stanovisko k technickému záměru vydané Hasičským záchranným sborem pod č. j. HSUL – 1306-3/PRE -2020, ze dne 1. 4. 2020.
- c) Zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr dodavatele díla
- d) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla (dále jen „položkový rozpočet“), který je součástí nabídky zhotovitele ze dne 22. 04. 2020.
- e) Náležitosti dokumentace skutečného provedení díla, které jsou přílohou č. 2 této smlouvy.

4. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace uvedené v odst. 3 písm. a).

5. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými v odst. 3, a že je mají k dispozici. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že si uvedené dokumenty po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky.

6. Součástí díla jsou zejména též následující **povinné** související práce a projektové a inženýrské činnosti:

- a) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich nepoškození během provádění díla a v případě potřeby zpětné protokolární předání jejich správcům;
- b) při realizaci stavby zabezpečení koordinace s vlastníky a správci inženýrských sítí;
- c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Agendové číslo: 28/06/2020/Bro
Evidenční číslo: d202000323
výtisk č.

- provedení díla;
- d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, řádné označení všech výkopů a jiných nebezpečných míst;
 - e) ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
 - g) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - h) uvedení všech povrchů poškozených stavbou do řádného stavu (ploty, zdi, domy, komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
 - i) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí a dalším dotčeným osobám, orgánům nebo organizacím, zabezpečení splnění jimi stanovených podmínek apod.;
 - j) zajištění úklidu stavbou znečištěných pozemních komunikací;
 - k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z rozhodnutí nebo jiných dokladů;
 - l) zajištění úklidu předávaného díla;
 - m) zajištění opatření proti prašnosti;
 - n) zpracování kontrolního a zkušebního plánu v souladu se zadávací dokumentací zakázky a platnými předpisy a jejich předložení objednateli ke schválení před zahájením fyzické realizace díla.
 - o) zajištění související projektové a inženýrské činnosti, tj. zajištění projektové dílenské dokumentace pro realizaci stavby a zajištění související inženýrské činnosti ve smyslu podkladů a průzkumů nutných případně pro výše uvedenou projekční činnost a jiné se stavbou související činnosti (zajištění souhlasu dotčených orgánů státní správy a samosprávy, např. dopravně inženýrská opatření, ohlášení dočasných staveb zařízení staveniště, apod.). Radiový projekt pro účely vydání povolení k individuálnímu oprávnění k provozování varovného vyrozumívacího systému od Českého telekomunikačního úřadu zajistí objednatel, který též zajistí podání žádosti a vydání tohoto povolení.
 - p) dopracování zadávacího projektu pro provádění stavby:
 - projektová dílenská dokumentace pro realizaci stavby apod.
 - zhotovení Dokumentace skutečného provedení díla
 - q) zhotovení nezbytné další dokumentace jako např. pro zajištění a kontrolu jakosti, pro zpracování SW, pro obsluhu a údržbu apod.
 - r) uvedení díla do provozu, zkoušky, akceptační testy, garanční testy, zaškolení obsluhy a údržby, aj.
 - s) Zajištění časově neomezených licencí k software potřebnému k řádnému fungování díla, a to bez nutnosti jakýchkoliv dodatečných plateb ze strany objednatele

III. Cena a změny díla

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková smluvní cena za provedení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy činí:

Celková cena díla

cena bez DPH:	4 880 027,- Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	1 024 806,- Kč
cena s DPH:	5 904 833,- Kč



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Agendové číslo: 28/06/2020/Bro
Evidenční číslo: d202000323
výtisk č.

z toho:

etapa 1.

cena bez DPH: 750 057,- Kč
sazba DPH 21 %
DPH: 157 512,- Kč
cena s DPH: 907 569,- Kč

etapa 2.

cena bez DPH: 4 129 970,- Kč
sazba DPH 21 %
DPH: 867 294,- Kč
cena s DPH: 4 997 264,- Kč

2. Podkladem pro stanovení výše ujednané ceny díla je položkový rozpočet. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla, obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek této smlouvy. Položkový rozpočet dále slouží jako podklad pro zpracování faktur a v případě nutnosti také pro sestavení Změnového položkového rozpočtu dle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení čl. III odst. 1 této Smlouvy.
3. Změny předmětu díla a s tím související změny ceny díla, jejichž potřeba vznikne v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, budou řešeny v písemném dodatku ke smlouvě, který smluvní strany uzavřou za účelem provedení prací a dodávek nad rámec předmětu díla (dále jen „vícepráce“) či naopak neprovedení některých prací a dodávek, které byly součástí předmětu díla (dále jen „méněpráce“) či obojího současně (společně též „dodatečné stavební práce“), pokud je jejich provedení nezbytné. To samé platí také v případě, kdy v průběhu realizace díla dojde k zjištění skutečností odlišných od dokumentace předané objednatelem, a tyto mají vliv na cenu díla.
4. Nutnost provedení dodatečných prací musí být zhotovitelem vždy předem písemně oznámeno objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zjištění této skutečnosti a to formou „Změnového listu“, který je přílohou č. 1 této Smlouvy. Jeho přílohou bude „Změnový položkový rozpočet“ sestavený dle pravidel uvedených v odst. 6 tohoto článku smlouvy.
5. Dodatek ke smlouvě může být uzavřen pouze na základě odsouhlaseného změnového listu objednatelem, konkrétně osobou oprávněnou jednat ve věcech technických dle čl. XIII. odst. 3 písm. a).
6. Při sestavování Změnového položkového rozpočtu na dodatečné práce budou jednotlivé položky oceňovány následujícím způsobem, přičemž k cenám dodatečných prací již nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové náklady. :
 - 6.1 Dodatečné práce, jejichž položky jsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny podle jednotkové ceny těchto položek.
 - 6.2 Dodatečné práce, které nejsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Agendové číslo: 28/06/2020/Bro
Evidenční číslo: d202000323
výtisk č.

- dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha, a.s.“ (dále jen „Směrné ceny“), platných v době provádění dodatečných prací, snížených paušálně o 10 %.
 - dle předložené nabídky na provedení těchto prací formou individuální kalkulace, jde-li o položky, u nichž nelze určit Směrné ceny. Takto kalkulovaná cena musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým.
7. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Cena může být změněna v souvislosti se změnou sazeb DPH dle platných a účinných právních předpisů České republiky.

IV. Platební podmínky

1. Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení této smlouvy.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu díla takto:
 - a) Etapa 1.
 - 100 % z ceny etapy po řádném ukončení a předání etapy včetně odstranění veškerých vad a nedodělků, a to do 5 pracovních dnů.
 - b) Etapa 2.
 - do výše 90 % ceny etapy průběžně, a to měsíčně vždy do 10 pracovních dnů po potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu příslušné etapy objednatelem dle odst. 3 tohoto článku.
 - 10 % z ceny etapy po řádném ukončení a předání etapy včetně odstranění veškerých vad a nedodělků, a to do 5 pracovních dnů.
3. Zhotovitel je povinen v rámci 2. etapy díla měsíčně, vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny práce, které mají být fakturovány, předkládat objednateli zjišťovací protokoly se soupisem provedených prací a dodávek a odstraněných vad a nedodělků, jejichž součástí bude vždy též výkaz výměr (dále jen „zjišťovací protokol“), a dále bude postupováno takto:
 - a) Objednatel ve lhůtě do 10 dnů zkontroluje věcnou a početní správnost zjišťovacího protokolu a soulad se skutečně provedenými pracemi.
 - b) Objednatel dále v této lhůtě zhotoviteli písemně potvrdí správnost zjišťovacího protokolu nebo mu sdělí důvody nepotvrzení.
 - c) Nepotvrdí-li objednatel správnost zjišťovacího protokolu, nemá zhotovitel právo vystavit fakturu a požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do správného stavu, a dokud objednatel takto opravený zjišťovací protokol neschválí.
 - d) Nepotvrzení správnosti protokolu objednatelem není důvodem pro přerušení či ukončení provádění díla ze strany zhotovitele.
4. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
5. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů a pravidel pro žadatele a příjemce OŽP a musí k nim být přiložen zjišťovací protokol potvrzený objednatelem. Lhůta splatnosti nezačne běžet, dokud faktura nebude splňovat všechny výše uvedené podmínky, a to zejména:



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Agendové číslo: 28/06/2020/Bro
Evidenční číslo: d202000323
výtisk č.

- a. označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČ, DIČ,
 - b. číslo dokladu,
 - c. datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - d. název a číslo projektu (objednatel sdělí zhotoviteli číslo projektu, jakmile se jej od OPŽ dozví)
 - e. číslo smlouvy o dílo, na základě které dochází k fakturaci,
 - f. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má plnit,
 - g. konstantní a variabilní symbol,
 - h. důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
 - i. označení etapy díla, za kterou je fakturováno
 - j. razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
 - k. seznam příloh,
6. Nebude-li faktura obsahovat některou z náležitostí uvedenou v čl. IV. odst. 5. této smlouvy či náležitost dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti v ní určené vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod a datum vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli k opravě, neběží původní lhůta splatnosti dle vadné faktury, ale tato začne běžet až po opětovném doručení nově vyhotovené opravené faktury.
7. Oznamí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem objednatel přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
8. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny požadovat po objednateli úroky z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení; celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.
9. Objednatel neposkytuje zálohy.

V. Místo a termíny provádění díla

1. Místem provádění díla je:

Okres	<u>Chomutov</u>
Obec	Statutární město <u>Chomutov</u>
Kraj	<u>Ústecký</u>

Bližší specifikace místa realizace v rámci města je přílohou č. 2 této smlouvy.

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro jednotlivé etapy díla tak, jak je uvedeno níže, a zhotovitel je povinen je v této lhůtě převzít. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol:



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Agendové číslo: 28/06/2020/Bro
Evidenční číslo: d202000323
výtisk č.

- a) 1. etapa: do 5 kalendářních dnů od uzavření smlouvy
b) 2. etapa: nejpozději **do 5 kalendářních dnů** ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště na adresu zhotovitele: e-mail info@telmo.cz. Výzvu k převzetí staveniště je objednatel povinen zaslat zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co obdrží rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory uvedené v preambuli této smlouvy, obdrží-li toto rozhodnutí nejpozději do 30. 9. 2020. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, výzvu zhotoviteli zaslat i v případě, že rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory neobdrží nebo je obdrží po 30. 9. 2020.
3. Zhotovitel je povinen zahájit provádění příslušné etapy díla nejpozději do **5 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.
4. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s harmonogramem, který je přílohou č. 4 této smlouvy a který může být měněn jen po vzájemné dohodě smluvních stran, a řádně dílo dokončit a předat objednateli takto:
1. etapa – do 2 kalendářních měsíců ode dne předání příslušného staveniště.
 2. etapa - do 6 kalendářních měsíců ode dne předání příslušného staveniště.
5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla, jestliže prokáže, že je provádění díla nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem (nevhodné klimatické podmínky a vyšší moc) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených důvodů, je povinen zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne.
6. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději **do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí příslušné etapy díla**. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a jeho zařízení, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
2. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu provádění díla ze strany objednatele, poskytovatele příspěvku OŽP ČR a umožnit nerušený výkon technického dozoru investora (TDI), autorského dozoru projektanta (AD), popřípadě dalších osob pověřených objednatelem; a poskytnout jim potřebnou součinnost a podmínky pro výkon jejich funkce v rámci zařízení staveniště.
4. Objednatel bude organizovat minimálně 1x týdně kontrolní dny (dále jen „KD“), kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit. Objednatel bude pořizovat z KD záznam, který předá zhotoviteli v 1 vyhotovení. Za zhotovitele je povinna účastnit se kontrolních dnů oprávněná osoba uvedená v čl. XIII. odst. 3 písm. b) a stavbyvedoucí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Agendové číslo: 28/06/2020/Bro
Evidenční číslo: d202000323
výtisk č.

5. Dle zvláštních předpisů je objednatel dále povinen jmenovat koordinátora BOZP.
6. Zhotovitel je také povinen vyzvat písemně: emailem a současně zápisem do stavebního deníku objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, bez nároku na finanční náhrady, musí zhotovitel odkrýt a zase zakrýt.
7. Zhotovitel je povinen plně respektovat stávající zeleň, do níž se dle projektové dokumentace nebude při provádění díla zasahovat, a chránit ji před poškozením.
8. Formát soupisu provedených prací, změnových výkazů výměr, úprav dílčích harmonogramů:
Zpracování celkové grafické, obrazové, textové, tabulkové a jiné dokumentace v tištěné, také i v elektronické verzi, která bude zadavateli odevzdána na CD nosiči v jednom vyhotovení ve formátech *xls, *pdf. Výkazy výměr, oceněné rozpočty a harmonogram realizace budou zpracovány a odevzdány v elektronické podobě v souboru *xls a v tištěné formě v tabulce *xls.

VII. Předání a převzetí díla

1. Po dokončení etapy díla je zhotovitel povinen ji fyzicky předat objednateli v místě plnění a objednatel je povinen ji převzít, nebude-li vykazovat vady. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejméně **2 pracovní dny předem**, a to zápisem ve stavebním deníku a současně zasláním e-mailu na adresy osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických. Objednatel je povinen se k předání díla dostavit.
2. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo/etapu převzít s vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkčnímu bezpečnému užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
3. O předání a převzetí díla/etapy bude objednatelem sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělkami nebránícími užívání, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 5 dnů ode dne předání díla. V předávacím protokolu, event. jeho přílohách, musí být zejména uvedeno:
 - a. označení díla a příslušné etapy,
 - b. označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
 - d. evidenční údaje díla,
 - e. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle a příslušné etapě,
 - f. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv, a v případě nepřevzetí jeho důvody,
 - g. datum a místo sepsání zápisu,
 - h. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - i. seznam převzaté a odsouhlasené kompletní dokumentace (viz odst. 5, tohoto článku),
 - j. soupis vad a nedodělků nebránících užívání, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění,



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Agendové číslo: 28/06/2020/Bro

Evidenční číslo: d202000323

výtisk č.

- k. termín vyklizení staveniště,
- l. datum ukončení záruky na příslušnou etapu díla,
- m. celková cena díla a příslušné etapy díla dle této Smlouvy.

4. Dílo/etapa se považuje za předané okamžikem, kdy je jeho předání a převzetí potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu. Za objednatele kontaktní osoba ve věcech technických, za zhotovitele zástupce společnosti - kontaktní osoba ve věcech technických.
5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání a převzetí etapy díla níže uvedené doklady nezbytné pro následný provoz a údržbu příslušné etapy díla, a to ve 3 vyhotoveních:
- protokol zhotovitele o ukončení montáže
 - soupis všech změn a odchylek oproti technické dokumentaci
 - technické listy
 - projektová dokumentace skutečného provedení díla v tištěném provedení - 3x, v elektronické formě na CD - 1x .pdf, nedojde-li k odchylkám oproti dokumentaci provedení stavby, která byla součástí zadávacího řízení, může zhotovitel doložit původní dokumentaci s vyznačením nepodstatných odchylek ověřenou zhotovitelem díla (osobou zmocněnou jednat ve věcech technických nebo stavbyvedoucím, statutárním zástupcem zhotovitele a razítkem zhotovitele),
 - stavební deník, který bude zároveň doložen v elektronické formě na CD - 1x .pdf,
 - atesty použitých materiálů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění o technických požadavcích na výrobky), certifikáty,
 - revize, protokoly o kontrolách
 - protokoly o zkouškách provedených akreditovanou laboratoří, které vyžaduje provádění díla dle ČSN, TKP, PK, ČSN EN
 - revize elektroinstalace a další dokumenty související s realizací veřejného osvětlení
 - průběžná fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací, fotodokumentace bude předána v digitální podobě na CD objednateli společně s dílem,
 - dokumentace pro provoz,
 - dokumentace pro údržbu,
 - a případně další potřebné doklady, které budou během realizace dohodnuty mezi objednatelem a další dodatečné doklady musí být objednatelem vyžadovány opodstatněně, tak aby bylo zajištěno bezpečné užívání díla a následný provoz.

Náklady na pořízení všech těchto dokladů jsou zahrnuty v ceně díla.

VIII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet předáním příslušné části díla objednateli.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Agendové číslo: 28/06/2020/Bro
Evidenční číslo: d202000323
výtisk č.

2. Zhotovitel po dobu záruky odpovídá za to, že jakost díla bude odpovídat této smlouvě a zejména všem dokumentům uvedeným v čl. II. této smlouvy a příslušným normám, právním předpisům a směrnícím platným v době provádění díla.
3. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona.
4. V případě zjištění vady díla v záruční době je objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně vyzvat zhotovitele k odstranění vady.
5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamovaných vad díla do 5 dnů a tyto odstranit do 10 dnů ode dne doručení výzvy objednatele.
6. Smluvní strany se mohou v odůvodněných případech dohodnout na prodloužení výše uvedených lhůt.
7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedených lhůtách ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, má objednatel právo zadat odstranění vady jinému subjektu za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli takto vzniklé náklady nahradit.
8. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
9. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

IX. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením etapy díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné etapy díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s nastoupením k odstranění vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušné etapy díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Agendové číslo: 28/06/2020/Bro
Evidenční číslo: d202000323
výtisk č.

5. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelům dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.
6. V případě prodlení s umístěním informační tabule na odsouhlasené místo podle čl. XII odst. 16 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení.
7. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši. Povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, zaplacením smluvní pokuty nezaniká.
8. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10 % z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla/etapy díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50 % z celkové ceny díla vč. DPH.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti, které dává druhé smluvní straně právo odstoupit od smlouvy, považují zejména:
 - prodlení zhotovitele s provedením díla/etapy díla či takové prodlení zhotovitele s prováděním díla, které prokazatelně ohrožuje konečný termín předání díla/etapy díla - stejné účinky má i prohlášení zhotovitele o tom, že termín nedodrží,
 - provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či bránění nebo znemožnění kontrol díla, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele,
 - postoupení smlouvy třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany,
 - zahájení insolvenčního řízení nebo likvidace zhotovitele,
3. Odstoupení je účinné písemným oznámením a jeho doručením druhé straně.
4. V případě rozhodnutí poskytovatele finanční podpory uvedené v preambuli této smlouvy o neschválení finanční podpory nebo v případě, že objednatel neobdrží rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory nejpozději do 30. 9. 2020, si objednatel vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v části týkající se 2. etapy díla. Toto právo lze využít kdykoliv až do doby doručení výzvy k převzetí staveniště zhotoviteli.
5. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v části týkající se 2. etapy díla v případě, že objednatel nedoručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště k této etapě nejpozději do 10. 10. 2020, přičemž toto právo lze využít kdykoliv až do doby doručení výzvy k převzetí staveniště zhotoviteli.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Agendové číslo: 28/06/2020/Bro
Evidenční číslo: d202000323
výtisk č.

6. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Bylo-li zčásti plněno, může být od smlouvy odstoupeno jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro smluvní stranu význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
7. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen zastavit provádění díla, kromě činností, které jsou nezbytné pro předcházení vzniku škod, a předat dílo včetně veškeré dokumentace objednateli. V případě odstoupení od smlouvy ohledně části plnění bude při fakturaci a placení již provedených částí díla postupováno přiměřeně dle ustanovení čl. IV. této smlouvy.
8. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení povinnosti zhotovitelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů spojených s dokončením díla, a to ve výši, v jaké celkové náklady na provedení díla (tj. cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, plus cena za dokončení díla) přesáhnou cenu za provedení díla sjednanou v této smlouvě. Náhrada nákladů je splatná do 30 dnů ode dne, kdy bude zhotovitel k jejich zaplacení objednatelem vyzván.

XI. Další práva a povinnosti

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, jestliže ji uvedl v nabídce, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. V případě, že zhotovitel prokazoval prostřednictvím poddodavatele splnění části kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, musí příslušnou část díla realizovat prostřednictvím tohoto poddodavatele. Takového poddodavatele je zhotovitel oprávněn změnit jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení (tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli prokázat příslušnými dokumenty či splněním všech požadavků dle zadávací dokumentace veřejné zakázky společně se žádostí o souhlas se změnou). Změnu jiného poddodavatele je zhotovitel povinen pouze předem písemně oznámit objednateli.
2. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu poskytl plnění určené k plnění předmětu smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.
3. Zhotovitel je povinen o průběhu prací vést řádně stavební deník. Stavební deník bude trvale během pracovní doby přístupný na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště a končí dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodětku, jež byl zapsán v protokole o předání díla.
4. Zhotovitel, objednatel, AU a TDI objednatelů a koordinátor BOZP provádí zápisy do stavebního deníku. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen se do 5 pracovních dnů od provedení zápisu vyjádřit. Zhotovitel je povinen předat osobně objednateli



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Agendové číslo: 28/06/2020/Bro
Evidenční číslo: d202000323
výtisk č.

průpisy stavebního deníku, je-li vyžadováno jeho vyjádření k určitému zápisu, a to v den provedení zápisu. Dohody zapsané či potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy.

5. Nebezpečí škody na etapě díla nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí příslušné etapy objednatelem.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla třetím osobám a je povinen ji v plném rozsahu nahradit.
7. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo bude financováno z Operačního programu životní prostředí a rozpočtu statutárního města Chomutova, a že porušení podmínek této smlouvy může mít za následek neposkytnutí či krácení této dotace. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli takto vznikne, a to až do výše celkové ceny díla. V této souvislosti prohlašuje, že se seznámil s podmínkami dotace, na které odkazuje preambule této smlouvy.
8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, přičemž limit pojistného plnění není nižší než celková cena za dílo včetně DPH sjednaná v čl. III, odst. 1. této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod hranici uvedenou v předchozí větě. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Kopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy a v případě jejích změn nebo uzavření nové pojistné smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od takové změny.
9. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.
10. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění díla kvalifikovaným způsobem a s odbornou péčí a k tomu účelu rovněž osoby provádějící činnosti dle této smlouvy průběžně školit a kontrolovat.
11. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů a umožnit k nim přístup minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFDI ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále je „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Agendové číslo: 28/06/2020/Bro
Evidenční číslo: d202000323
výtisk č.

13. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným výkonu kontroly projektu, z něhož je veřejná zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
14. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy, platnými ČSN a případně jinými normami vztahujícími se k dílu. S odpady bude nakládáno dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
15. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu ovlivnění okolí (hluk, prach, znečištění, ovlivnění dopravní situace apod.).
16. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost plnit jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Takovým oznámením není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje převzít nejpozději do 5 dnů od uzavření této smlouvy od objednatele informační tabuli a umístit ji, nejpozději den následující po dni převzetí staveniště, na místo odsouhlasené zástupcem objednatele v blízkosti prováděného díla (pro obě části díla bude jedna tabule, kterou zhotovitel po dohodě s objednatelem umístí nejdříve na první a následně na druhé staveniště). Zhotovitel je povinen udržovat informační tabuli v bezvadném stavu na smlouveném místě po celou dobu provádění příslušné části díla. Za stav informační tabule odpovídá zhotovitel po celou dobu provádění díla. Po předání a převzetí díla bude informační tabule vrácena objednateli ve stavu, v jakém jí od objednatele převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. V případě vrácení poškozené informační tabule je zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu ve výši skutečných nákladů na její opravu, kterou zajistí objednatel. V případě ztráty informační tabule se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli škodu ve výši pořizovací ceny informační tabule.

XIII. Doručování a osoby oprávněné jednat

1. Strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemností týkajících se jejich smluvního vztahu se řídí následujícími pravidly:
 - a. Písemnosti se zasílají prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě nebo na adresu, kterou druhá smluvní strana odesílateli naposledy písemně oznámila jako svou adresu pro doručování, případně osobně. Odmítne-li adresát takto zaslanou písemnost převzít, platí, že je tímto okamžikem doručena. Vrátili-li se písemnost odesílateli zpět z jiného důvodu, platí, že je doručena dnem, kdy ji pošta přesměřovala zpět k odesílateli.
 - b. Písemnosti lze zasílat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Agendové číslo: 28/06/2020/Bro
Evidenční číslo: d202000323
výtisk č.

Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozí věty ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Doručení dokumentu datovou schránkou má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou.

2. Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je adresou pro doručování adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této smlouvy.
3. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat ve věcech technických, avšak bez oprávnění měnit smlouvu:

a) za objednatele: [REDACTED]
osoby jednající ve věcech technických

b) za zhotovitele: [REDACTED]
Odborný pracovník - dohled nad stavbou, osoba zmocněna jednat ve věcech technických

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
4. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 413/20 ze dne 25. 05. 2020, a to v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek č. 030/05-16 schválenou usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 197/16 ze dne 9. 5. 2016.
5. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Agendové číslo: 28/06/2020/Bro
Evidenční číslo: d202000323
výtisk č.

Přílohy:

- 1) Změnový list
- 2) Náležitosti dokumentace skutečného provedení díla
- 3) Specifikace místa plnění
- 4) Časový harmonogram provádění prací

V Chomutově

JUDr. Marek Hrabáč



Digitální podpis: 24.06.2020 10:06


Důvod podpisu:

Potvrzuji správnost
a úplnost tohoto dokumentu.


STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

JUDr. Marek Hrabáč, primátor

V Jablonci nad Nisou



TELMO a.s. (společník č. 1)



KZ systém s.r.o. (společník č. 2)





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Agendové číslo: 28/06/2020/Bro
Evidenční číslo: d202000323
výtisk č.

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Změnový list č. ze dne

Název stavby:	
Číslo smluvního vztahu:	
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu doplnit odkazy smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Agendové číslo: 28/06/2020/Bro
Evidenční číslo: d202000323
výtisk č.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Agendové číslo: 28/06/2020/Bro
Evidenční číslo: d202000323
výtisk č.

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Náležitosti dokumentace skutečného provedení díla

- Dokumentace skutečného provedení díla musí být zpracována v souladu s obecně závaznými právními a jinými předpisy vč. nejnovějších technických norem. Dokumentace skutečného provedení díla musí být zpracována tak, aby byla logická, přehledná, věcná, srozumitelná, čitelná (velikost písma min. 10, formáty písma Calibri, Ariel, Times New Roman), komplexní a jazykově správná. Dokumentace skutečného provedení díla musí být zpracována v českém jazyce a pro jednotlivé objekty, dále musí za **titulní stranou obsahovat podrobný obsah, který bude očíslovaný vč. dokladové části dokumentů.**

- Titulní strana

Titulní strana dokumentace skutečného provedení DÍLA nebo čelní strana hlavních desek bude obsahovat následující údaje:

- *Celý název investiční akce;*
- *Název dokumentace;*
- *Stupeň dokumentace;*
- ZADAVATEL: *Název*
- OBJEDNATEL: *Název + logo;*
- ZHOTOVITEL: *Název společnosti [+ logo];*
- Vypracoval: *Jména projektantů, u širšího týmu pouze zodpovědný projektant;*
- Datum: *Měsíc, rok.*

Titulní strany dílčích částí dokumentace skutečného provedení díla budou obsahovat kromě výše uvedených údajů také název příslušné části dokumentace („textová část“, „výkresová část“ apod.).

Desky a přílohy dokumentace skutečného provedení díla budou označeny číslem paré.

- Textová část

Jednotlivé kapitoly textové části dokumentace skutečného provedení díla musí být označeny a číslovány v souladu s doporučenou osnovou, stránky musí být číslovány, v záhlaví stránky musí být vždy uveden *název investiční akce včetně názvu dokumentace*, v zápatí text: *Název objednatele, název zhotovitele a číslo stránky.*

V dokumentaci skutečného provedení díla musí být řádně uvedeny všechny podklady pro vypracování dokumentace skutečného provedení díla. Seznam všech použitých podkladů pro vypracování dokumentace skutečného provedení díla musí být uveden v samostatné kapitole, tyto podklady musí být v textu vhodně zmíněny, např. formou poznámky pod čarou. Jako podklad lze kromě projektových dokumentací a studií uvádět i literaturu, technické normy apod. U každého nepůvodního textu, tabulky, grafu, schématu nebo podobného objektu, který pracuje s převzatými údaji, musí být vždy uveden zdroj.

- Výkresy

Druh použitých mapových nebo situačních podkladů, jejich zpracovatel a rok zaměření musí být vždy uveden přímo na příslušném výkrese a/nebo v textové části dokumentace skutečného provedení díla.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí




Agendové číslo: 28/06/2020/Bro
Evidenční číslo: d202000323
výtisk č.

Tyto údaje musí být uvedeny na každém výkrese u rozpisky. Každý situační výkres musí obsahovat severku. Ostatní požadavky na výkresy, mapy a situace vyplývají z obecně závazných právních předpisů a technických norem.

- Digitální forma dokumentace skutečného provedení díla

Digitální forma odevzdávané dokumentace skutečného provedení díla musí zcela odpovídat její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh a výkresů.

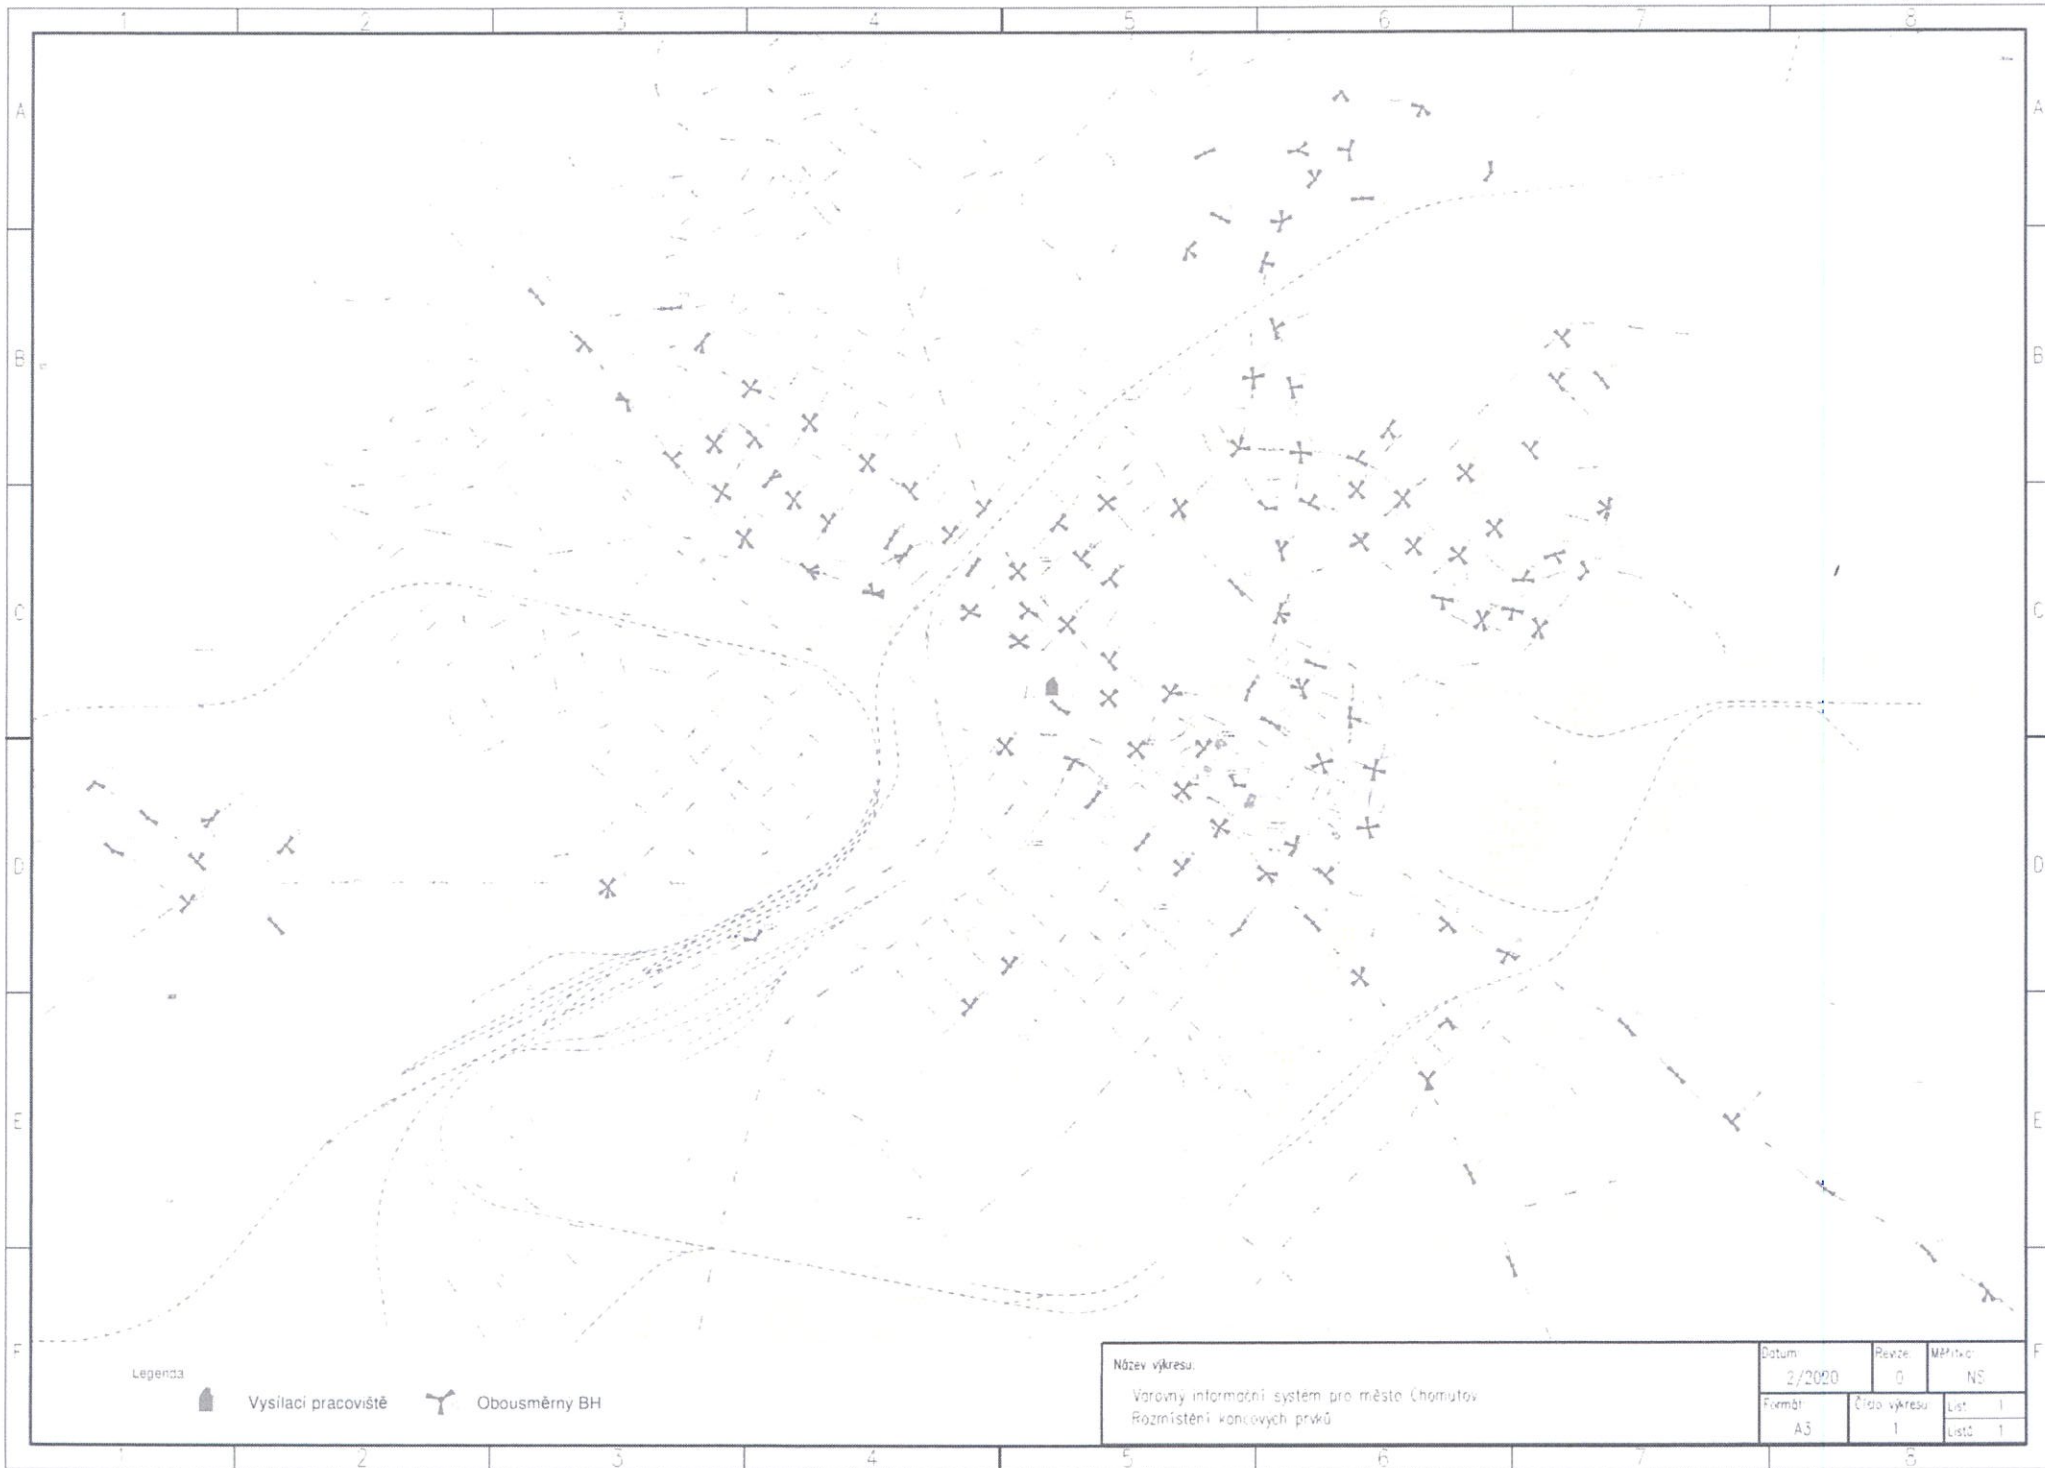

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 23.03.2020 11:15:03

Vyhotoveno dálkovým přístupem do katastru nemovitostí pro účel ověření výstupu z informačního systému veřejné správy
ve smyslu § 9 zák. č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Okres: CZ0422 Chomutov

Obec: 562971 Chomutov

Kat.území: 652458 Chomutov I

list vlastnictví: 1

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

A Vlastník, jiný oprávněný

Identifikátor

Podíl

Vlastnické právo

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001
Chomutov

00261891

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

B Nemovitosti

Pozemky

Parcela

Výměra[m2]

Druh pozemku

Způsob využití

Způsob ochrany

240/20

1885 zastavěná plocha a
nádvoří

Součástí je stavba: Chomutov, č.p. 4602, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: 240/20

B1 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B - Bez zápisu

C Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

Typ vztahu

o Věcné břemeno (podle listiny)

trpět stavbu "LMG stanice" a umožnit vstup a vjezd za účelem provozování, údržby a
oprav, dle ZPMZ 2920

Oprávnění pro

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003
Chomutov, RČ/IČO: 70889988

Povinnost k

Parcela: 240/20

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 08.09.2003 a 11.09.2003.
Právní účinky vkladu práva ke dni 16.09.2003.

V-3780/2003-503

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno (podle listiny)

strpět na nemovitosti trvalé umístění zařízení výměňkové stanice v rozsahu dle
projektové dokumentace; strpět vstup za účelem provozování zařízení výměňkové stanice,
jeho kontroly, měření, oprav a údržby

Oprávnění pro

T e p l o Chomutov s.r.o., Jakoubka ze Stříbra 112/3,
43001 Chomutov, RČ/IČO: 61538647

Povinnost k

Parcela: 240/20

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 02.06.2006. Právní účinky
vkladu práva ke dni 21.06.2006.

V-3228/2006-503

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

D Poznámky a další obdobné údaje - Bez zápisu

Plomby a upozornění - Bez zápisu

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 23.03.2020 11:15:03

Okres: CZ0422 Chomutov

Obec: 562971 Chomutov

Kat.území: 652458 Chomutov I

List vlastnictví: 1

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

E Nabyvací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

o Vznik práva ze zákona zákon č. 172/1991 Žádost MěÚ Chomutov o zápis do KN dle § 1 ze dne 10.3.1992.

POLVZ:468/1992

Z-100468/1992-503

Pro: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov

RČ/IČO: 00261891

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, kód: 503.

Vyhotovil:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Vyhotoveno: 23.03.2020 11:29:27

Katastr nemovitostí - částečný výpis

Ověřuji pod pořadovým číslem **MMCH/56682/2020/ÚKT**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba:



V Chomutově dne 23.03. 2020

Podpis



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí



Čestné prohlášení žadatele

Žadatel město Chomutov, se sídlem Zborovská 4602, Chomutov 430 28, IČ: 00261891 prohlašuje, že **je vlastníkem sloupů veřejného osvětlení, na kterém budou umístěny veškeré bezdrátové rozhlasové v rámci projektu „Statutární město Chomutov - protipovodňový varovný a informační systém“.**

V Chomutově, dne

JUDr. Marek Hrabáč



Digitální podpis:
01.04.2020 14:03
Důvod podpisu:
Schvaluji
tento dokument.....

JUDr. Marek Hrabáč, primátor města

Harmonogram realizace
„Protipovodňový varovný a informační systém statutárního města Chomutov“

I. ETAPA	7.20	8.20
Zahájení realizace do 5 kalendářních dní ode dne uzavření SoD		
Přípravná fáze projektu, obhlídka místa plnění do 5 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště		
Instalace vysílacího pracoviště		
Instalace bezdrátových hlásičů		
Konfigurace a oživení systému		
Předání díla a zahájení zkušebního provozu		do 2 kalendářních měsíců ode dne předání a převzetí staveniště

II. ETAPA	10.20	11.20	12.21	1.21	2.21	3.21
Zahájení realizace do 5 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k 30. 9. 2020						
Přípravná fáze projektu, obhlídka místa plnění do 5 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště						
Instalace bezdrátových hlásičů						
Konfigurace a oživení systému						
Předání díla a zahájení zkušebního provozu						do 6 kalendářních měsíců ode dne předání a převzetí staveniště
