

Položkový rozpočet

Zakázka: MBÚ AV Třeboň - Dokončení

Objednatel: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4

IČ: 61388971
DIČ: CZ61388971

Zhotovitel: Petr Görner
Rechle 380
389 01 Vodňany

IČ: 69545278
DIČ: CZ601215342

Vypracoval: Petr Görner

Rozpis ceny

Celkem

HSV			691 241,03
PSV			1 515 848,60
MON			340 755,00
Vedlejší náklady			311 250,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 859 094,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 859 094,63 CZK
Základní DPH	21 %	600 410,00 CZK
Zaokrouhlení		0,37 CZK

Cena celkem s DPH


3 459 505,00 CZK

v Vodňanech

dne

18.7.2016


 Za zhotovitele


 Za objednatele

STAVITELSTVÍ GÖRNER .CZ

Petr Görner
 Rechle 380/II, 389 01 Vodňany
 Mob.: +420 723 789 342
 IČ: 695 45 278, DIČ: CZ6012150342

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
 Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Krč
 Technický úsek

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			43 725,31
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			49 131,72
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			244 120,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			131 058,65
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			53 433,60
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			50 566,99
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 000,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			48 609,96
99	Staveništní přesun hmot	HSV			60 594,80
711	Izolace proti vodě	PSV			16 165,00
713	Izolace tepelné	PSV			103 249,03
720	Zdravotechnická instalace	PSV			304 337,50
730	Ústřední vytápění	PSV			217 174,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			488 188,20
764	Konstrukce klempířské	PSV			24 291,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			104 600,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 450,00
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			200 556,00
776	Podlahy povlakové	PSV			16 775,00
783	Nátěry	PSV			5 300,00
784	Malby	PSV			28 762,87
M21	Elektromontáže	MON			298 607,00
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			42 148,00
VN	Vedlejší náklady	VN			311 250,00
Cena celkem					2 859 094,63

Položkový rozpočet

S:	MÚ AV Třeboň - Dokončení
----	--------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				43 725,31
1	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	100,00000	99,30	9 930,00
2	181301106R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 30-40 cm, do 500m2	m2	100,00000	118,00	11 800,00
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ, přípojka teplovodu	m3	30,03000	438,30	13 162,15
4	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,31000	652,63	1 507,58
5	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	7,39200	669,42	4 948,35
6	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	55,00000	10,80	594,00
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	19,40400	91,90	1 783,23
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				49 131,72
8	289970111R00	Vrstva geotextilie Síhga JustiFix JV	m2	171,00000	136,12	23 276,52
9	631571003R00	Násyp ze štěrkopisku 0 - 32, zpevňující	m3	25,65000	1 008,00	25 855,20
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				244 120,00
10	347013215R00	Dokončení opláštění SDK stěn, 1x RigiStabil 15 mm	m2	423,00000	305,00	129 015,00
11	342091044R00	Povrchová úprava stěn SDK - Q2	m2	584,00000	120,00	70 080,00
12	342091044R00	Úprava vnitřních a vnějších rohů SDK - No Coat	m	535,00000	60,00	32 100,00
13	342091044R00	Úprava vnějších rohů SDK - L Trim, okolo obložkových zárubní	m	60,00000	60,00	3 600,00
14	342091044R00	Úprava SDK - vyřezání RigiStabilu u kot. patek, rošt z KVH na stropě - zkrácení	soub.	1,00000	7 000,00	7 000,00
15	342091044R00	Doplnění tepelné izolace do přiček	soub.	1,00000	2 325,00	2 325,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				131 058,65
16	416026126R00	Podhled SDK, ocel. dvouúrov. kříž. rošt, 1x RF 15 mm	m2	171,50000	565,00	96 897,50
17	416026124R00	Podhled SDK, ocel. dvouúrov. kříž. rošt, 1x RFI 12,5mm	m2	44,70000	591,00	26 417,70
18	347021212R00	Předstěna tl.125mm, ocel. kce CW, 2x Fermacel	m2	9,75000	794,20	7 743,45
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				53 433,60
19	28312001R	D+M obklad Vinyl, koupelny	m2	58,08000	920,00	53 433,60
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				50 566,99
20	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	10,81000	3 234,00	34 959,54
21	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,29000	28 020,00	8 125,80
22	632411115R00	Potěr vyrovnávací, ruční zpracování, tl. 12 mm	m2	30,50000	245,30	7 481,65
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				10 000,00
23	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š.do 1 m, H 10 m, demontáž a pronájem	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				48 609,96
24	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	247,10000	73,29	18 109,96
25	952901111R00	Přípomoc profesím	soub.	1,00000	30 500,00	30 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				60 594,80
26	99-01	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	226,10000	268,00	60 594,80
Díl: 711		Izolace proti vodě				16 165,00
27	711212012RT3	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou, MapeIastic (fa Mapei), pružná hydroizolace	m2	30,50000	530,00	16 165,00
Díl: 713		Izolace tepelné				103 249,03
28	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	216,20000	14,80	3 199,76
29	28375998R	Deska izolační EPS Perimetr 1250x600x120 mm	m2	216,20000	373,50	80 750,70
30	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	216,20000	31,00	6 702,20
31	713134211RO6	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů, parotěsná fólie DEKFOL N AL 170 speciál	m2	110,14000	90,50	9 967,67
32	713111211RO6	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů, DEKFOL N AL 170 speciál	m2	27,10000	97,00	2 628,70
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				304 337,50

33	720-01	ZTI podrobněji - viz. samostatný rozpočet	soub.	1,00000	304 337,50	304 337,50
Díl:	730	Ústřední vytápění				217 174,00
34	730-01	ÚT podrobněji - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	217 174,00	217 174,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				488 188,20
35	61198105-01	D+M terasa modřín sibiř. 15x150 mm, lepené k podkl, pigmentovaná tlaková impregnace, skladba P3	m2	30,40000	1 810,00	55 024,00
36	61198105-02	D+M terasa modřín sibiř. 24x150 mm, nerez vruty, pig. tlaková impregnace, podklad rošt, skladba P4	m2	30,90000	1 410,00	43 569,00
37	61198105-03	D+M terasa modřín sibiř. 24x150 mm, nerez vruty, pig. tlak. impr., podkl. rošt+podložky, sklad. P5	m2	111,00000	1 410,00	156 510,00
38	61198105-04	Mon. obklad stěn vodorovný modřín sibiř. 15x125 mm, pig. tlak. impr., podkl. rošt	m2	172,38000	540,00	93 085,20
39	61198105-05	Dem + Mot - podkladní rošt fasády	soub.	1,00000	100 000,00	100 000,00
40	61198105-06	Dodávka spojovacího materiálu	soub.	1,00000	33 000,00	33 000,00
41	61198105-07	Zvedací mechanismy	soub.	1,00000	7 000,00	7 000,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				24 291,00
42	K1	D+M oplechování parapetu, komplet viz. výpis PD	m	57,00000	155,00	8 835,00
43	K4	D+ M mřížka větrané mezery, komplet viz. výpis PD	m	84,00000	184,00	15 456,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				104 600,00
44	D2	D+M vnitřní dveře otočné 60x197cm, vč. zárubně, kování, komplet viz. výpis PD	m2	6,00000	4 500,00	27 000,00
45	D3	D+M vnitřní dveře posuvné do pouzdra 80x197cm, včetně pouzdra, komplet viz. výpis PD	m2	6,00000	11 300,00	67 800,00
46	D4	D+M vnitřní dveře otočné 80x197cm, včetně, zárubně, kování, mřížky, komplet viz. výpis PD	m2	2,00000	4 900,00	9 800,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				6 450,00
47	Z1	D+M rohož vstupu, komplet viz. výpis PD	ks	3,00000	2 150,00	6 450,00
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				200 556,00
48	775540010RAA	Podlahy lamelové, třívrstvá parketa	m2	185,70000	1 080,00	200 556,00
Díl:	776	Podlahy poviakové				16 775,00
49	776520010RAB	Podlaha poviaková z PVC pásů, soklík, podlahovina Novoflor extra tloušťky 2,0 mm	m2	30,50000	550,00	16 775,00
Díl:	783	Nátěry				5 300,00
50	783112110R00	Nátěry	soub.	1,00000	5 300,00	5 300,00
Díl:	784	Malby				28 762,87
51	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	509,98000	13,30	6 782,73
52	784195412R00	Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x	m2	509,98000	43,10	21 980,14
Díl:	M21	Elektromontáže				298 607,00
53	M21-01	Elektroinstalace podrobněji viz. samostatný rozpočet	kus	1,00000	298 607,00	298 607,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				42 148,00
54	M24-01	VZT podrobněji viz samostatný rozpočet	soub.	1,00000	42 148,00	42 148,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				311 250,00
55	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	27 950,00	27 950,00
56	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
57	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
58	005241020R	Kolaudace	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
59	005122020R	Rozpočet terasy - doplnění	Soubor	1,00000	110 600,00	110 600,00
60	005122020R	Demontáž + montáž podkladního roštu - fasáda	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00
61	005122020R	Oprava stavebních otvorů 6ks	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
62	005122020R	Šrouby na fasádu 9000ks x 3,30 = 29700,-	Soubor	1,00000	29 700,00	29 700,00

Harmonogram stavby: MÚ AV Třeboň - Dokončení

Zhotovitel : Petr Görner
Rechle 380
695452 Vodňany


Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Nh	Počet prac. dní	Prům. počet prac.	1
	MU AV Třeboň - Dokončení	1.8.2016	30.11.2016	2 859 095	2 277	121	5	
1	Zemní práce							
162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	7.11.2016	11.11.2016	9 930	1	5	3	
181 30-1106.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 30-40 cm, do 500m2	7.11.2016	15.11.2016	11 800	51	7	3	
132 20-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ, přípojka teplovodu	5.9.2016	9.9.2016	13 162	11	5	3	
451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	5.9.2016	9.9.2016	1 508	4	5	3	
175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	5.9.2016	9.9.2016	4 948	12	5	3	
899 72-1112.R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	5.9.2016	9.9.2016	594	1	5	3	
174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	5.9.2016	9.9.2016	1 783	4	5	3	
2	Základy,zvláštní zakládání							
289 97-0111.R00	Vrstva geotextilie Sínga JustiFix JV	8.8.2016	9.8.2016	23 277	16	2	1	
631 57-1003.R00	Náryp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující	8.8.2016	15.8.2016	25 855	47	6	1	
3	Svislé a kompletní konstrukce							
347 01-3215.R00	Dokončení opláštění SDK stěn, 1x RigiStabil 15 mm	29.8.2016	15.9.2016	129 015	422	14	5	
342 09-1044.R00	Povrchová úprava stěn SDK - Q2	12.9.2016	7.10.2016	70 080	292	20	3	
342 09-1044.R00	Úprava vnitřních a vnějších rohů SDK - No Coat	5.9.2016	23.9.2016	32 100	268	15	3	
342 09-1044.R00	Úprava vnějších rohů SDK - L Trim, okolo obložkových zárubní	29.8.2016	16.9.2016	3 600	30	15	1	
342 09-1044.R00	Úprava SDK - vyřezání RigiStabilu u kot. patek, rošt z KVH na stropě - zkrácení	29.8.2016	16.9.2016	7 000	1	15	1	
342 09-1044.R00	Doplnění tepelné izolace do příček	29.8.2016	2.9.2016	2 325	1	5	1	
4	Vodorovné konstrukce							
416 02-6126.R00	Podhled SDK ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RF 15 mm	24.10.2016	4.11.2016	96 898	172	10	3	
416 02-6124.R00	Podhled SDK ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RFI 12,5mm	24.10.2016	4.11.2016	26 418	42	10	3	
347 02-1212.R00	Předstěna tl.125mm,ocel.kce CW, 2x Fermacel	24.10.2016	28.10.2016	7 743	11	5	3	
61	Úpravy povrchů vnitřní							
283-12001R	D+M obklad Vinyl, koupelny	7.11.2016	18.11.2016	53 434	0	10	3	
63	Podlahy a podlahové konstrukce							
631 31-2511.R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	26.9.2016	30.9.2016	34 960	35	5	3	
631 36-1921.RT3	Výtuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	26.9.2016	30.9.2016	8 126	4	5	3	
632 41-1115.R00	Potěr vyrovnávací, ruční zpracování, tl. 12 mm	3.10.2016	7.10.2016	7 482	9	5	3	
94	Lešení a stavební výtahy							
941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, demontáž a pronájem	26.9.2016	14.10.2016	10 000	0	15	3	
95	Dokončovací kce na pozem.stav.							
952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	21.11.2016	30.11.2016	18 110	76	8	3	
952 90-1111.R00	Přípomoc profesím	1.8.2016	25.11.2016	30 500	0	85	3	
99	Stavěništní přesun hmot							
99-01	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	1.8.2016	25.11.2016	60 595	193	85	3	
711	Izolace proti vodě							
711 21-2012.RT3	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou, Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace	31.10.2016	4.11.2016	16 165	15	5	3	
713	Izolace tepelné							
713 12-1111.RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	19.9.2016	23.9.2016	3 200	17	5	3	
283-75998R	Deska izolační EPS Perimetr 1250x600x120 mm	19.9.2016	23.9.2016	80 751	0	5	3	
713 19-1100.RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	19.9.2016	23.9.2016	6 702	15	5	3	
713 13-4211.RO6	Montáž parozábrany na stěny s přeplepením spojů, parotěsná fólie DEKFOL N AL 170 speciál	31.10.2016	4.11.2016	9 968	15	5	3	
713 11-1211.RO6	Montáž parozábrany krovů spodem s přeplepením spojů, DEKFOL N AL 170 speciál	31.10.2016	4.11.2016	2 629	5	5	3	
720	Zdravotnická instalace							
720-01	ZTI podrobněji - viz. samostatný rozpočet	1.8.2016	26.8.2016	304 338	0	20	3	
730	Ústřední vytápění							
730-01	ÚT podrobněji - viz. samostatný rozpočet	1.8.2016	26.8.2016	217 174	6	20	3	
762	Konstrukce tesařské							
611-98105-01	D+M terasa modřín sibiř. 15x150 mm, lepené k podkl, pigmentovaná tlaková impregnace, skladba P4	17.10.2016	4.11.2016	55 024	0	15	3	
611-98105-02	D+M terasa modřín sibiř. 24x150 mm, nerez vruty, pig. tlaková impregnace, podklad rošt, skladba P4	17.10.2016	4.11.2016	43 569	0	15	3	
611-98105-03	D+M terasa modřín sibiř. 24x150 mm, nerez vruty, pig. tlak. impr., podkl. rošt+podložky, sklad. P5	17.10.2016	4.11.2016	156 510	0	15	3	
611-98105-04	Mon. obklad stěn vodorovný modřín sibiř. 15x125 mm, pig. tlak. impr., podkl. rošt	26.9.2016	14.10.2016	93 085	0	15	3	
611-98105-05	Dem + Mot - podkladní rošt fasády	5.9.2016	23.9.2016	100 000	0	15	3	
611-98105-06	Dodávka spojovacího materiálu	5.9.2016	9.9.2016	33 000	0	5	3	
611-98105-07	Zvedací mechanismy	26.9.2016	14.10.2016	7 000	0	15	3	
764	Konstrukce klempířské							
K1	D+M oplechování parapetu, komplet viz. výpis PD	10.10.2016	14.10.2016	8 835	89	5	3	
K4	D+ M mřížka větrané mezery, komplet viz. výpis PD	10.10.2016	14.10.2016	15 456	131	5	4	
766	Konstrukce truhlářské							
D2	D+M vnitřní dveře otočné 60x197cm, vč. zárubně, kování, komplet viz. výpis PD	14.11.2016	18.11.2016	27 000	4	5	3	
D3	D+M vnitřní dveře posuvné do pouzdra 80x197cm, včetně pouzdra, komplet viz. výpis PD	14.11.2016	18.11.2016	67 800	4	5	3	
D4	D+M vnitřní dveře otočné 80x197cm, včetně, zárubně, kování, mřížky, komplet viz. výpis PD	14.11.2016	18.11.2016	9 800	1	5	3	
767	Konstrukce zámečnické							
Z1	D+M rohož vstupu, komplet viz. výpis PD	21.11.2016	25.11.2016	6 450	3	5	3	
775	Podlahy vlysové a parketové							
775 54-0010.RAA	Podlahy lamelové, třívrstvá parketa	7.11.2016	18.11.2016	200 556	184	10	3	
776	Podlahy povlakové							
776 52-0010.RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, podlahovina Novoflor extra tloušťky 2,0 mm	7.11.2016	18.11.2016	16 775	16	10	3	
783	Nátěry							
783 11-2110.R00	Nátěry	31.10.2016	4.11.2016	5 300	0	5	3	
784	Malby							
784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	31.10.2016	2.11.2016	6 783	17	3	3	
784 19-5412.R00	Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x	31.10.2016	8.11.2016	21 980	52	7	3	
M21	Elektromontáže							
M21-01	Elektroinstalace podrobněji viz. samostatný rozpoč	1.8.2016	26.8.2016	298 607	0	20	3	
M24	Montáže vzduchotechnických zař							
M24-01	VZT podrobněji viz samostatný rozpočet	12.9.2016	16.9.2016	42 148	0	5	3	
VN	Vedlejší náklady							
005 12-1020.R	Provoz zařízení staveniště	1.8.2016	5.8.2016	27 950	0	5	3	
005 24-1010.R	Dokumentace skutečného provedení	21.11.2016	25.11.2016	10 000	0	5	3	
005 24-1020.R	Geodetické zaměření skutečného provedení	21.11.2016	25.11.2016	15 000	0	5	3	
005 24-1020.R	Kolaudace	28.11.2016	30.11.2016	15 000	0	3	3	
005 12-2020.R	Rozpočet terasy - doplnění	10.10.2016	28.10.2016	110 600	0	15	3	
005 12-2020.R	Demontáž + montáž podkladního roštu - fasáda	5.9.2016	23.9.2016	100 000	0	15	3	
005 12-2020.R	Oprava stavebních otvorů 6ks	29.8.2016	2.9.2016	3 000	0	5	3	
005 12-2020.R	Šrouby na fasádu 9000ks x 3.30 = 29700,-	12.9.2016	16.9.2016	29 700	0	5	3	

Harmonogram stavby: MÚ AV Třeboň - Dokončení


Zhotovitel : Petr Görner
Rechle 380
695452 Vodňany

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Nh
	MÚ AV Třeboň - Dokončení	1.8.2016	30.11.2016	2 859 095	2 277
1	Zemní práce	5.9.2016	15.11.2016	43 725	84
162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	7.11.2016	11.11.2016	9 930	1
181 30-1106.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 30-40 cm,do 500m2	7.11.2016	15.11.2016	11 800	51
132 20-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ, přípojka teplovodu	5.9.2016	9.9.2016	13 162	11
451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	5.9.2016	9.9.2016	1 508	4
175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	5.9.2016	9.9.2016	4 948	12
899 72-1112.R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	5.9.2016	9.9.2016	594	1
174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	5.9.2016	9.9.2016	1 783	4
2	Základy,zvláštní zakládání	8.8.2016	15.8.2016	49 132	63
289 97-0111.R00	Vrstva geotextilie Síhga JustiFix JV	8.8.2016	9.8.2016	23 277	16
631 57-1003.R00	Náryp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující	8.8.2016	15.8.2016	25 855	47
3	Svislé a kompletní konstrukce	29.8.2016	7.10.2016	244 120	1 013
347 01-3215.R00	Dokončení opláštění SDK stěn, 1x Rigistabil 15 mm	29.8.2016	15.9.2016	129 015	422
342 09-1044.R00	Povrchová úprava stěn SDK - Q2	12.9.2016	7.10.2016	70 080	292
342 09-1044.R00	Úprava vnitřních a vnějších rohů SDK - No Coat	5.9.2016	23.9.2016	32 100	268
342 09-1044.R00	Úprava vnějších rohů SDK - L Trim, okolo obložkových zárubní	29.8.2016	16.9.2016	3 600	30
342 09-1044.R00	Úprava SDK - vyřezání Rigistabilu u kot. patek, rošt z KVH na stropě - zkrácení	29.8.2016	16.9.2016	7 000	1
342 09-1044.R00	Doplnění tepelné izolace do příček	29.8.2016	2.9.2016	2 325	1
4	Vodorovné konstrukce	24.10.2016	4.11.2016	131 059	224
416 02-6126.R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RF 15 mm	24.10.2016	4.11.2016	96 898	172
416 02-6124.R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RFI 12,5mm	24.10.2016	4.11.2016	26 418	42
347 02-1212.R00	Předstěna tl.125mm,ocel.kce CW, 2x Fermacel	24.10.2016	28.10.2016	7 743	11
61	Úpravy povrchů vnitřní	7.11.2016	18.11.2016	53 434	0
283-12001R	D+M obklad Vinyl, koupelny	7.11.2016	18.11.2016	53 434	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	26.9.2016	7.10.2016	50 567	48
631 31-2511.R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	26.9.2016	30.9.2016	34 960	35
631 36-1921.RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	26.9.2016	30.9.2016	8 126	4
632 41-1115.R00	Potěr vyrovnávací, ruční zpracování, tl. 12 mm	3.10.2016	7.10.2016	7 482	9
94	Lešení a stavební výtahy	26.9.2016	14.10.2016	10 000	0
941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, demontáž a pronájem	26.9.2016	14.10.2016	10 000	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	1.8.2016	30.11.2016	48 610	76
952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	21.11.2016	30.11.2016	18 110	76
952 90-1111.R00	Přípomoc profesím	1.8.2016	25.11.2016	30 500	0
99	Staveništní přesun hmot	1.8.2016	25.11.2016	60 595	193
99-01	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	1.8.2016	25.11.2016	60 595	193
711	Izolace proti vodě	31.10.2016	4.11.2016	16 165	15
711 21-2012.RT3	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou, Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace	31.10.2016	4.11.2016	16 165	15
713	Izolace tepelné	19.9.2016	4.11.2016	103 249	53
713 12-1111.RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	19.9.2016	23.9.2016	3 200	17
283-75998R	Deska izolační EPS Perimetr 1250x600x120 mm	19.9.2016	23.9.2016	80 751	0
713 19-1100.RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	19.9.2016	23.9.2016	6 702	15
713 13-4211.R06	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů, parotěsná fólie DEKFOL N AL 170 speciál	31.10.2016	4.11.2016	9 968	15
713 11-1211.R06	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů, DEKFOL N AL 170 speciál	31.10.2016	4.11.2016	2 629	5
720	Zdravotnická instalace	1.8.2016	26.8.2016	304 338	0
720-01	ZTI podrobněji - viz. samostatný rozpočet	1.8.2016	26.8.2016	304 338	0
730	Ústřední vytápění	1.8.2016	26.8.2016	217 174	6
730-01	ÚT podrobněji - viz. samostatný rozpočet	1.8.2016	26.8.2016	217 174	6
762	Konstrukce tesařské	5.9.2016	4.11.2016	488 188	0
611-98105-01	D+M terasa modřín sibiř. 15x150 mm, lepené k podkl, pigmentovaná tlaková impregnace, skladba P3	17.10.2016	4.11.2016	55 024	0
611-98105-02	D+M terasa modřín sibiř. 24x150 mm, nerez vruty, pig. tlaková impregnace, podklad rošt, skladba P4	17.10.2016	4.11.2016	43 569	0
611-98105-03	D+M terasa modřín sibiř. 24x150 mm, nerez vruty, pig. tlak. impr., podkl. rošt+podložky , sklad. P5	17.10.2016	4.11.2016	156 510	0
611-98105-04	Mon. obklad stěn vodorovný modřín sibiř. 15x125 mm, pig. tlak. impr., podkl. rošt	26.9.2016	14.10.2016	93 085	0
611-98105-05	Dem + Mot - podkladní rošt fasády	5.9.2016	23.9.2016	100 000	0
611-98105-06	Dodávka spojovacího materiálu	5.9.2016	9.9.2016	33 000	0
611-98105-07	Zvedací mechanismy	26.9.2016	14.10.2016	7 000	0
764	Konstrukce klempířské	10.10.2016	14.10.2016	24 291	219
K1	D+M oplechování parapetu, komplet viz. výpis PD	10.10.2016	14.10.2016	8 835	89
K4	D+ M mřížka větrané mezery, komplet viz. výpis PD	10.10.2016	14.10.2016	15 456	131
766	Konstrukce truhlářské	14.11.2016	18.11.2016	104 600	8
D2	D+M vnitřní dveře otočné 60x197cm, vč. zárubně, kování, komplet viz. výpis PD	14.11.2016	18.11.2016	27 000	4
D3	D+M vnitřní dveře posuvné do pouzdra 80x197cm, včetně pouzdra, komplet viz. výpis PD	14.11.2016	18.11.2016	67 800	4
D4	D+M vnitřní dveře otočné 80x197cm, včetně, zárubně, kování, mřížky, komplet viz. výpis PD	14.11.2016	18.11.2016	9 800	1
767	Konstrukce zámečnické	21.11.2016	25.11.2016	6 450	3
Z1	D+M rohož vstupu, komplet viz. výpis PD	21.11.2016	25.11.2016	6 450	3
775	Podlahy vlysové a parketové	7.11.2016	18.11.2016	200 556	184
775 54-0010.RAA	Podlahy lamelové, třívrstvá parketa	7.11.2016	18.11.2016	200 556	184
776	Podlahy povlakové	7.11.2016	18.11.2016	16 775	16
776 52-0010.RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, podlahovina Novoflor extra tloušťky 2,0 mm	7.11.2016	18.11.2016	16 775	16
783	Nátěry	31.10.2016	4.11.2016	5 300	0
783 11-2110.R00	Nátěry	31.10.2016	4.11.2016	5 300	0
784	Malby	31.10.2016	8.11.2016	28 763	69
784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	31.10.2016	2.11.2016	6 783	17
784 19-5412.R00	Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x	31.10.2016	8.11.2016	21 980	52
M21	Elektromontáže	1.8.2016	26.8.2016	298 607	0
M21-01	Elektroinstalace podrobněji viz. samostatný rozpoč	1.8.2016	26.8.2016	298 607	0
M24	Montáže vzduchotechnických zař	12.9.2016	16.9.2016	42 148	0
M24-01	VZT podrobněji viz samostatný rozpočet	12.9.2016	16.9.2016	42 148	0
VN	Vedlejší náklady	1.8.2016	30.11.2016	311 250	0
005 12-1020.R	Provoz zařízení staveniště	1.8.2016	5.8.2016	27 950	0
005 24-1010.R	Dokumentace skutečného provedení	21.11.2016	25.11.2016	10 000	0
005 24-1020.R	Geodetické zaměření skutečného provedení	21.11.2016	25.11.2016	15 000	0
005 24-1020.R	Kolaudace	28.11.2016	30.11.2016	15 000	0
005 12-2020.R	Rozpočet terasy - doplnění	10.10.2016	28.10.2016	110 600	0
005 12-2020.R	Demontáž + montáž podkladního roštu - fasáda	5.9.2016	23.9.2016	100 000	0
005 12-2020.R	Oprava stavebních otvorů 6ks	29.8.2016	2.9.2016	3 000	0
005 12-2020.R	Šrouby na fasádu 9000ks x 3,30 = 29700,-	12.9.2016	16.9.2016	29 700	0
	Cena za měsíc				
	Cena za rok				

Finanční harmonogram

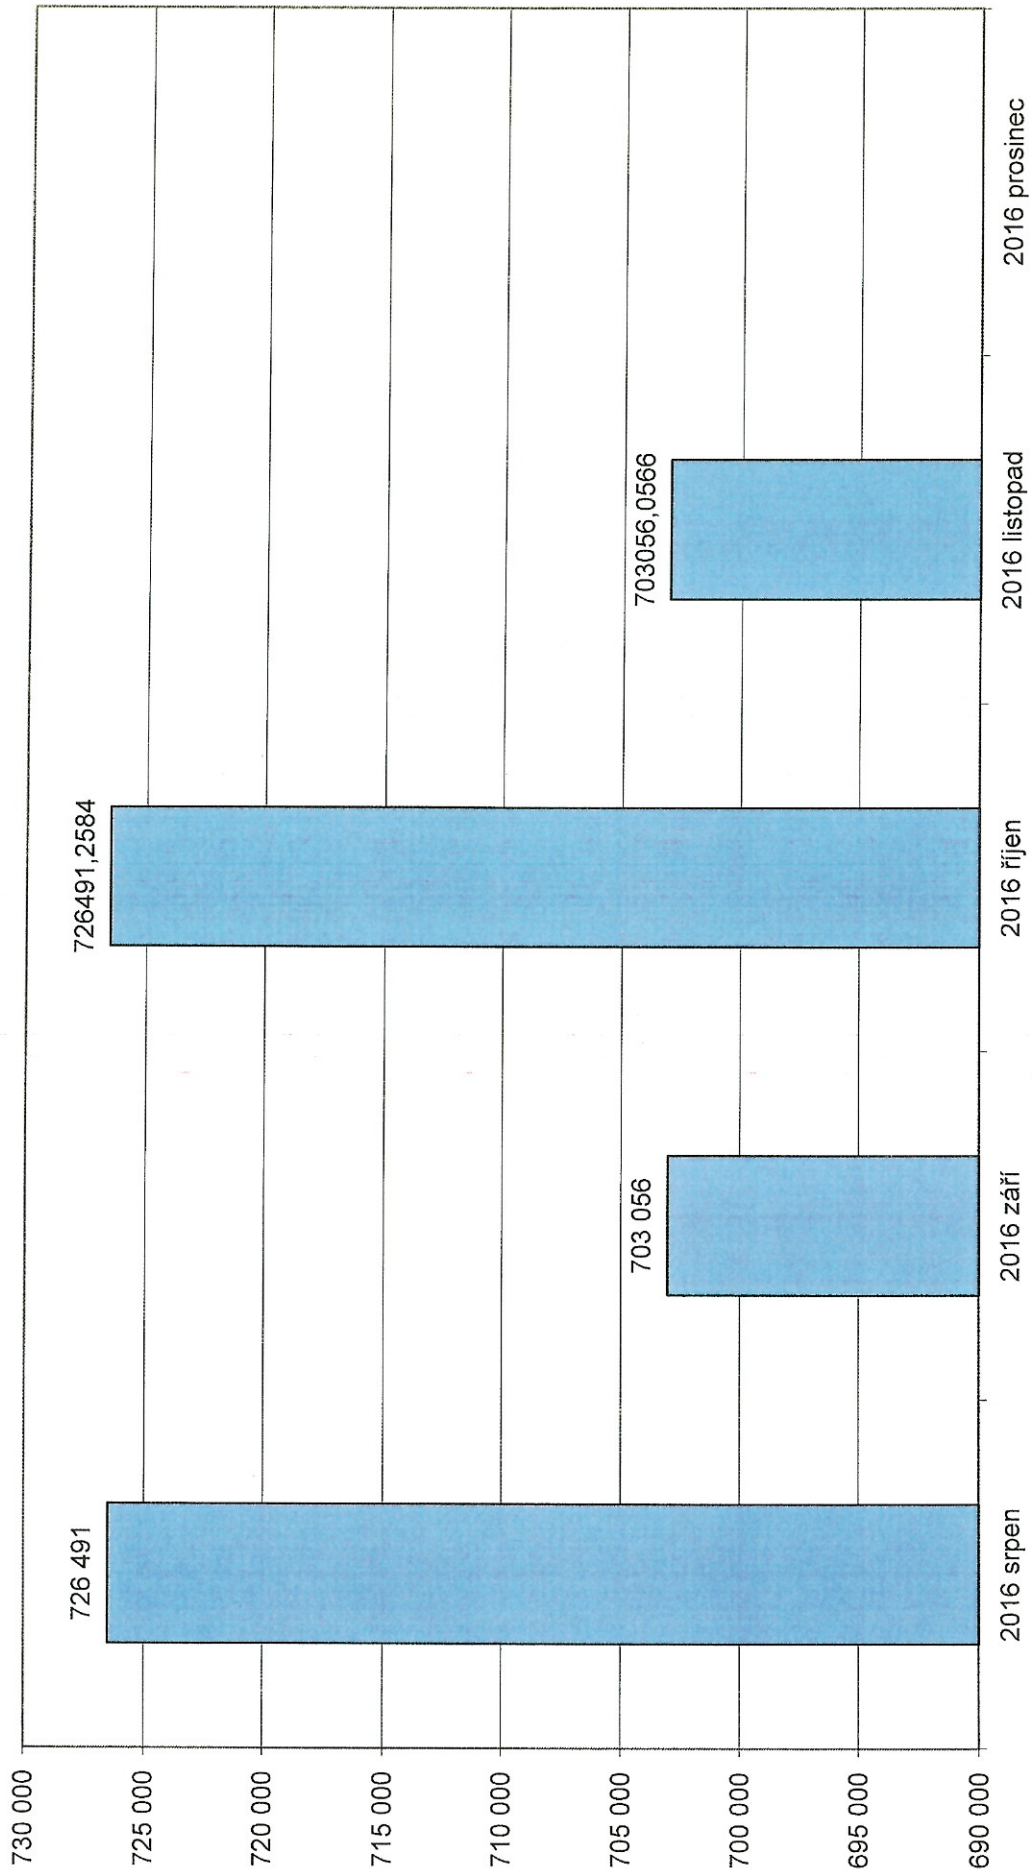

Součtový finanční harmonogram

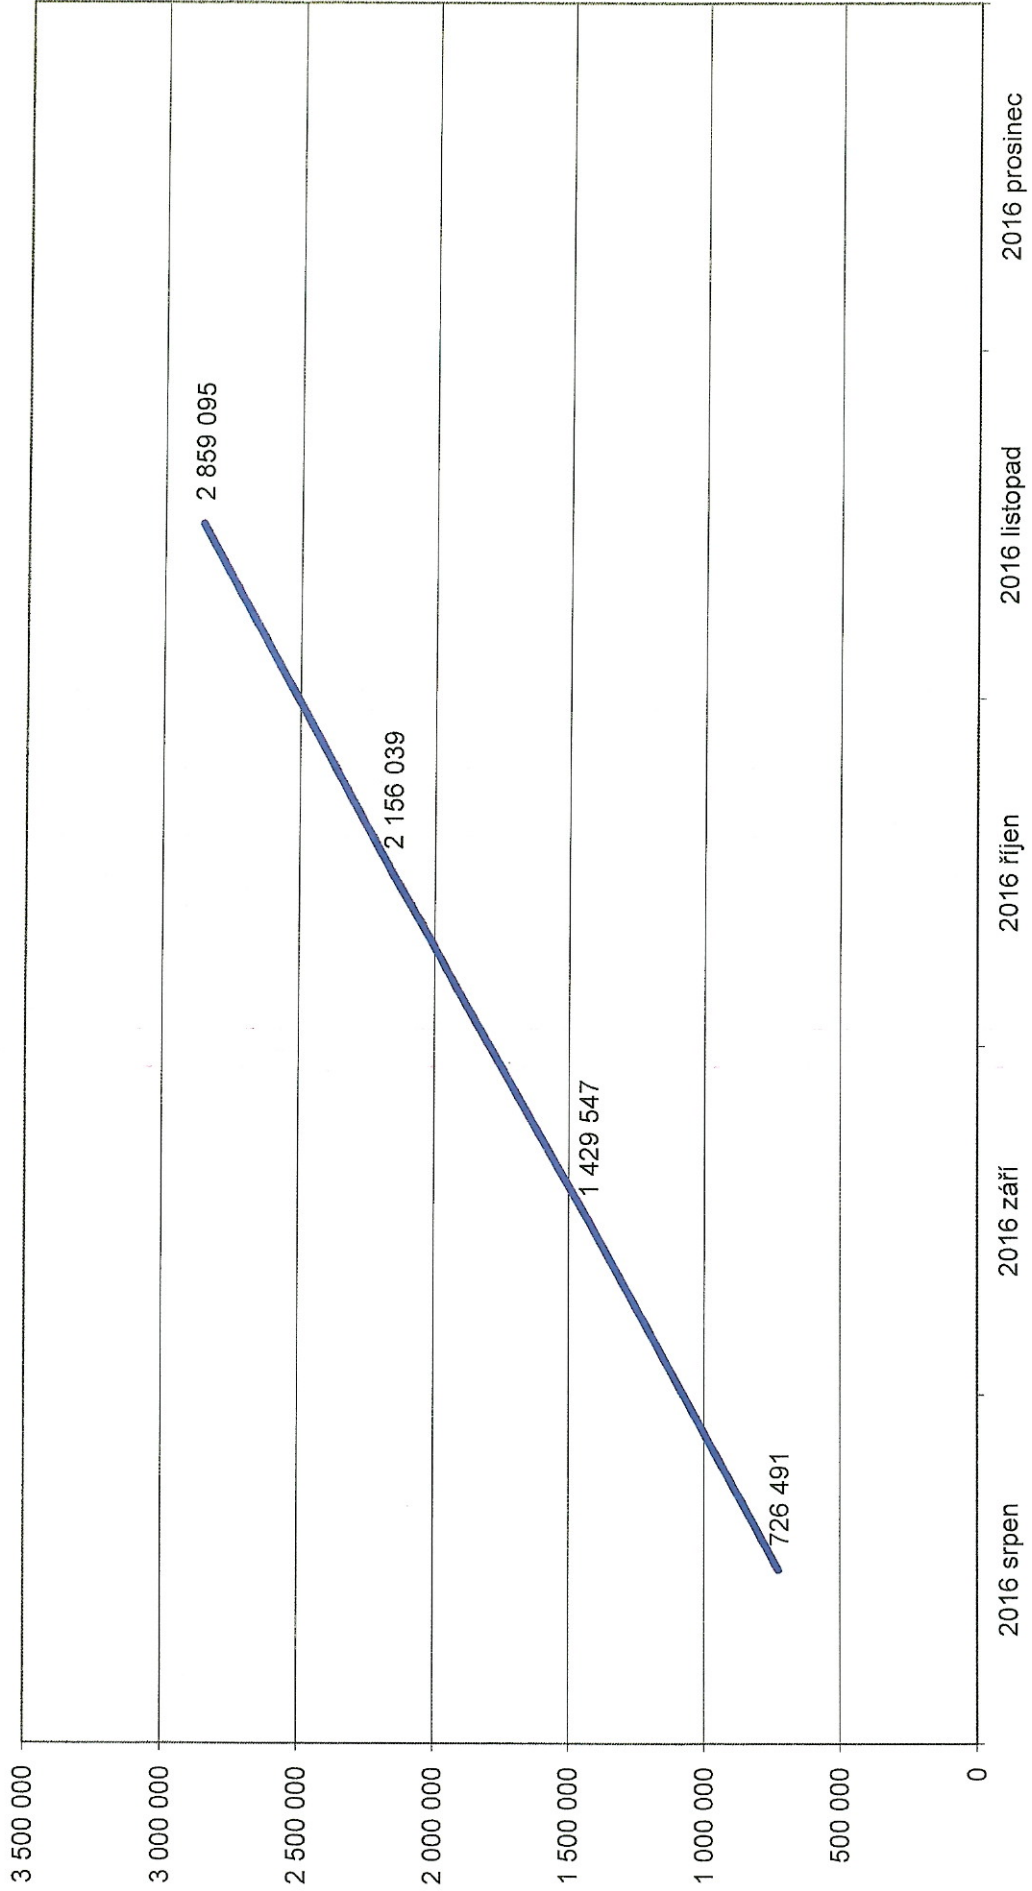



Veřejná zakázka
Zadávací řízení
Limit veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky
Zadavatel
Adresa
IČ
Zastoupený

Rekonstrukce ubytovny
Otevřená výzva
Malého rozsahu
3 500 000,- Kč vč. DPH
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
61388971
RNDr. Martin Bilej, DrSc.

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

		Popis části zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli a % předpokládaná výše podílu
1.	Obchodní firma/jméno	František Ernest
	Sídlo	Nová 63, České Budějovice
	IČO	70673233
	Telefon	+420773075611
	Fax	Reg8@seznam.cz
	Zastoupená	Františkem Ernestem
		Zdravotechnická instalace – ZTI 10 %
2.	Obchodní firma/jméno	Jiří Pechek
	Sídlo	Lidická 199, Č. Budějovice
	IČO	70673250
	Telefon	+420607664265
	Fax	jiripechek@seznam.cz
	Zastoupená	Jiřím Pechkem
		Ústřední vytápění – ÚT 8 %
3.	Obchodní firma/jméno	DEFITA s.r.o.
	Sídlo	Kojatice 19, Třebelovice
	IČO	25530810
	Telefon	+420602553916
	Fax	defita@defita.cz
	Zastoupená	Alešem Šotkovským
		Tesařské konstrukce - fasáda - terasy 25 %
4.	Obchodní firma/jméno	Podlahy Hajný
	Sídlo	V Oblouku 548, Č. Budějovice
	IČO	63248077
	Telefon	+420602468783
	Fax	info@podlahyhajny.cz
	Zastoupená	Lubošem Hajným
		Podlahové krytiny 6 %



		Popis části zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli a % předpokládaná výše podílu	
1.	Obchodní firma/jméno	Calta elektro s.r.o.	Elektroinstalace 10 %
	Sídlo	Masarykova 258, Milevsko	
	IČO	10301682	
	Telefon		
	Fax	caltaelektro@caltaelektro.cz	
	Zastoupená	Karlem Caltou	
2.	Obchodní firma/jméno		
	Sídlo		
	IČO		
	Telefon		
	Fax		
	Zastoupená		
3.	Obchodní firma/jméno		
	Sídlo		
	IČO		
	Telefon		
	Fax		
	Zastoupená		
4.	Obchodní firma/jméno		
	Sídlo		
	IČO		
	Telefon		
	Fax		
	Zastoupená		
