

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

č. 02PT-001997

č. D4/13/2015

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

„Společnost MTS + SWIETELSKY+HOCHTIEF, D1 úsek 03, Hvězdovice - Ostředek“

Doručovací adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Účastníci Společnosti:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8,

IČ 00014915

DIČ CZ00014915

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 –
správce

zastoupena

a

SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3

SWIETELSKY stavební s.r.o, odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143,

393 01 Pelhřimov

IČ 480 35 599

DIČ CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032 - společník

zastoupena

a

HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ 46678468

DIČ CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6229 -
společník
zastoupena

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice - EXIT 34 Ostředek, **ISPROFIN 521 155 0018** byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 549 424 016,30 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice - EXIT 34 Ostředek	549 424 016,30	115 379 043,42	664 803 059,72

	Rezerva 10 % (d)	DPH (e)	Rezerva včetně DPH (f)
D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice - EXIT 34 Ostředek	54 942 401,63	11 537 904,34	66 480 305,97

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice - EXIT 34 Ostředek, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 377347.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č.: 3; 4; 14; 15; 22; 23; 24; 25; 26; 44; 48; 50; 53; 65b; 65c; 70; 71; 95; 108; 115; 117; 118; 119; 120; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 154.
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 5.11.2014.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven v 8 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 6 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 28-04-2015

Datum: 28.4.2015

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za dodavatele/zhotovitele

Metrostav a.s.

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za dodavatele/zhotovitele

Metrostav a.s.

Datum: 28.4.2015

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za dodavatele/zhotovitele

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 28.4.2015

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za dodavatele/zhotovitele

HOCHTIEF CZ a.s.


PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za dodavatele/zhotovitele

HOCHTIEF CZ a.s.



V Praze dne: 11-02-2015

Číslo zakázky: 02PT-001997

Vyřizuje:

Č.j. 535/21/15-21000 - Štunc

Společnost MTS + SWIETELSKY + HOCHTIEF

Vedoucí: METROSTAV a.s., DIVIZE 4
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice - EXIT 34 Ostředek“

zadávací řízení zahájeno dne 30. 7. 2014, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 377347/ ISPROFIN: 521 155 0018 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 5 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 1,

která v hodnocení dosáhla celkového počtu 92 bodů
podaná sdružením uchazečů

Společnost MTS + SWIETELSKY + HOCHTIEF

Vedoucí: METROSTAV a.s., DIVIZE 4

IČ: 00014915

Se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Člen: SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599

se sídlem K silu 1143, 393 01 Pelhřimov

Člen: HOCHTIEF CZ a.s.



IČ: 46678468

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Celková nabídková cena uchazeče: 549.424.016,30,- Kč (bez DPH)

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2, podaná uchazečem

COLAS CZ a.s.

IČ: 26177005

Se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Celková nabídková cena uchazeče: 556.800.307,49,- Kč (bez DPH)

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4, podaná uchazečem

EUROVIA CS a.s.

IČ: 45274924

Se sídlem Nedokončená 1332, 198 00 Praha 9

Celková nabídková cena uchazeče: 564.910.352,62,- Kč (bez DPH)

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 7, podaná sdružením uchazečů

SMP + M-SILNICE + Berger Bohemia + VHS, D1 Hvězdovice - Ostředek

Vedoucí: SMP CZ, a.s.

IČ: 27195147

Se sídlem Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Člen: M-SILNICE a.s.

IČ: 42196868

Se sídlem Husova 1697, Pardubice

Člen: Berger Bohemia a.s.

IČ: 45357269

Se sídlem Klatovská 410, Plzeň

Člen: VHS společnost s ručením omezeným

IČ: 40233308

Se sídlem Křížíkova 2393, Teplice

Celková nabídková cena uchazeče: 569.997.490,00,- Kč (bez DPH)

6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, podaná sdružením uchazečů



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Sdružení IMOS + TRACE

Vedoucí: TRACE Group Hold PLC

IČ: 123682269

se sídlem SOFIA 1408, Obvod Triamica, Ul.Nikola, Obrazopisov 12

Člen: IMOS Group s.r.o.

IČ: 27756971

Se sídlem Tečovice 353, 763 02 Zlín

Celková nabídková cena uchazeče: 763.862.003,00, Kč (bez DPH)

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem 1 jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

Poučení:

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

V Praze dne 11.07.2013

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice - EXIT 34 Ostředek

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice - EXIT 34 Ostředek“, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací dokumentace č.: 3; 4; 14; 15; 22; 23; 24; 25; 26; 44; 48; 50; 53; 65b; 65c; 70; 71; 95; 108; 115; 117; 118; 119; 120; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 154.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název stavby	<u>Nabídková cena stavby v Kč bez DPH</u>	DPH	<u>Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH</u>
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice - EXIT 34 Ostředek	549 424 016,30	115 379 043,42	664 803 059,72

Rezerva 10 % (d)	DPH (e)	Rezerva včetně DPH (f)
54 942 401,63	11 537 904,34	66 480 305,97

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Uznáváme, že rezerva je samostatnou položkou nabídkové ceny a že na její čerpání v jakémkoliv rozsahu nemáme žádný nárok a její využití závisí výlučně na rozhodnutí zadavatele.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou a zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

<u>Dílčí hodnotící kritérium</u>	<u>Váha kritéria v celkovém hodnocení</u>	<u>Hodnota</u>
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	90 %	549 424 016,30 Kč bez DPH
Délka záruční doby	10 %	72 měsíců

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „**zákon**“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č.: 3; 4; 14; 15; 22; 23; 24; 25; 26; 44; 48; 50; 53; 65b; 65c; 70; 71; 95; 108; 115; 117; 118; 119; 120; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 154.
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací - výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně

uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Uchazeč důkladně prozkoumal veškerou předloženou dokumentaci, veškeré nejasnosti či nepřesnosti si vyjasnil před odevzdáním nabídky a podrobně se seznámil i s místem realizace podmínkami stavbou dotčených míst s tím, že prohlašuje, že za nabízenou cenu je takto stanovený rozsah předmětu plnění je za uvedených podmínek schopen zrealizovat.

Podpis

Metrostav a.s.

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení Metrostav a.s., za Společnost na základě plné moci

Adresa Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum 14.04.2015

PŘÍLOHA K NABÍDCE

„Společnost MTS + SWIETELSKY + HOCHTIEF, D1 úsek 03, Hvězdovice - Ostředek“

Název stavby: **D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice - EXIT 34 Ostředek**

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa dodavatele	1.1.2.3, 1.3	Metrostav a.s. Koželušská 2450/4 180 00 Praha 8
Název a adresa správce stavby	1.1.2.4, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.6.11	11 měsíců bez zimní technologické přestávky
Doba pro dokončení stavby	1.1.3.3	13 měsíců bez zimní technologické přestávky
Záruční doba	1.1.3.7	(a) 72 měsíců. pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) následujících objektů cizích správců v rozsahu dle PDPS, u nichž je délka záruční doby zadavatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců, (ii) těch materiálů / zařízení / technických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technických podmínkách uvedena záruční doba přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy k nabídce níže [viz řádek (b) této Přílohy k nabídce níže], a (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí záruční doba

		dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ
		(b) Záruční doba materiálů / zařízení / technických zařízení / prací, pro něž je v Technických podmínkách uvedena záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce záruční doby uvedené v Technických podmínkách u příslušného materiálu / zařízení / technického zařízení / práce
		(c) 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce
Výše rezervy	1.1.4.11	10% Přijaté ceny stavby
Části stavby	1.1.5.6	jednotlivé stavební objekty
Stavba	1.1.6.19	D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice - EXIT 34 Ostředek
Elektronické přenosové systémy	1.3	fax e-mail
Použité právo	1.4	právo České republiky
Rozhodující jazyk	1.4	čeština
Komunikační jazyk	1.4	čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	ode dne zahájení prací oznámeného dle čl. 8.1 obchodních podmínek
Výše bankovní záruky za provedení díla	4.2	30 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti	4.2	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti

bankovní záruky za provedení díla		bankovní záruky za provedení díla splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele zajistit, že žádný z jeho podzhotovitelů ani dodavatelů na nižších úrovních subdodavatelského řetězce v minulosti ani v budoucnosti nebude vykonávat stanovené činnosti	4.4	250.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
Výše bankovní záruky za odstranění vad	4.25	3 % Přijaté ceny stavby
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za odstranění vad	4.25	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za odstranění vad splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuty za porušení dalších povinností zhotovitele	4.29 a)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení
	4.29 b)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení zhotovitele s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistných smluv dle kapitoly 18. Smlouvy o dílo
	4.29 c)	5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.29 d)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.29 e)	50.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s odstraněním každého jednotlivého případu znečištění pozemní komunikace
	4.29 f)	250.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním postupného závazného milníku
	4.29 g)	50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.29 h)	25.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení;
Maximální celková výše smluvních pokut	4.29	30 % z přijaté ceny stavby
Smluvní pokuta za porušení	4.30	Smluvní pokuta činí (i) 25.000,- Kč

povinnosti zhotovitele postupovat tak, aby nedošlo k porušení právních povinností objednatele		za každý jednotlivý případ porušení čl. 4.30 a současně (ii) 5.000,- Kč za každý započatý den a osobu, do jejíhož práva je zasahováno.
Postupný závazný milník	4.35	a) dokončení prací v rozsahu odpovídajícím etapách 0, 1, 2A, 2B dle zásad organizace výstavby do 5 měsíců od data zahájení prací, do této doby se nepočítá zimní technologická přestávka dle definice v ZTKP b) dokončení prací v rozsahu odpovídajícím etapě 3 dle zásad organizace výstavby a uvedení levého jízdního pásu do provozu do 8 měsíců od data zahájení prací, do této doby se nepočítá zimní technologická přestávka dle definice v ZTKP
Jmenování podzhotovitelé	5.1	Jmenovaným podzhotovitelem SO 03-451 a SO 03-452 je objednatelem určena spol. O2 Czech republic a.s.
Smluvní pokuta	8.7	nedodržení doby pro dokončení: 125.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla v době pro dokončení nedodržení doby pro uvedení stavby do provozu: 250.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části prací v rozsahu nezbytném pro uvedení stavby do provozu
Procentní odpočty, jejichž prostřednictvím bude splacena záloha	14.2	15%
Měna platby	14.15	koruna česká, podle Dopisu nabídky
Výše částky, s jejímž zaplacením musí být objednatel v prodlení, aby zhotovitel mohl za současného splnění příslušných podmínek odstoupit od Smlouvy o dílo	16.2 c)	nejméně 75.000 000,- Kč bez DPH
Výše pojistného plnění	18.1	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy o dílo dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací

		bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1% z Přijaté ceny stavby bez DPH

Jestliže tímž skutkovým jednáním zhotovitele dojde k současnému nebo postupnému porušení více povinností zhotovitele, jejichž splnění je zajištěno různými smluvními pokutami, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení všech těchto smluvních pokut, a to v jejich plné výši.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení o průběžných a konečných platbách budou zasílány objednateli na jím předepsaných formulářích.

Datum: 20.04.2015

Metrostav a.s.
(na základě plné moci za Společnost)

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

„Společnost MTS + SWIETELSKY + HOCHTIEF, D1 úsek 03, Hvězdovice - Ostředek“

Název stavby: **D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice - EXIT 34 Ostředek**

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice - EXIT 34 Ostředek“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.4.6 dílu 1 části 4 zadávací dokumentace), již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem za podmínek uvedených v Technických podmínkách není tímto odstavcem dotčeno.
- 2) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.
- 3) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.
- 4) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.
- 5) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto naším závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva

na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce 5 Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.

- 6) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo a v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje 1 rok, vždy též do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 5 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.
- 7) Bereme na vědomí, že některá další práva a povinnosti smluvních stran související se subdodavatelskými smlouvami, s požadavky na jejich obsah a s procesem jejich schvalování jsou stanoveny v čl. 4.4 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

Datum: V Praze dne 20.04.2015

Metrostav a.s.
(na základě plné moci za Společnost)

Čestné prohlášení

„Společnost MTS + SWIETELSKY, D1 úsek 03, Hvězdovice - Ostředek“

Účastník společnosti: Metrostav a.s.

IČ: 00014915

Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

O zakázku: „D1 modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice – EXIT 34 Ostředek“

čestně prohlašuje, že

obdržel dodatečné informace k zadávacím podmínkám číslo:

3; 4; 14; 15; 22; 23; 24; 25; 26; 44; 48; 50; 53; 65b; 65c; 70; 71; 95; 108; 115; 117; 118; 119;
120; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 154.

V Praze dne 14.04.2015

Metrostav a.s.
(na základě plné moci za Společnost)

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 2, ČÁST 2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Název zakázky: **D1 MODERNIZACE - ÚSEK 03, EXIT 29 HVĚZDONICE - EXIT
34 OSTŘEDEK**

Číslo: 02PT-001997

11/2014

4.23	Činnost zhotovitele na staveništi	
4.24	Vykopávky	
5	JMENOVANÍ PODZHOTOVITELÉ	23
5.1	Definice „jmenovaného podzhotovitele“	
5.2	Překážky jmenování	
5.3	Platby jmenovaným podzhotovitelům	
5.4	Prokázání plateb	
6	TECHNICKÝ PERSONÁL A PRACOVNÍ SÍLY	24
6.1	Najímání technického personálu a pracovních sil	
6.2	Mzdové tarify a pracovní podmínky	
6.3	Osoby v pracovním poměru u objednatele	
6.4	Pracovní právo	
6.5	Pracovní doba	
6.6	Zařízení pro technický personál a pracovní síly	
6.7	Ochrana zdraví a bezpečnost	
6.8	Dozor zhotovitele	
6.9	Personál zhotovitele	
6.10	Záznamy o personálu zhotovitele a vybavení zhotovitele	
6.11	Neukázněné chování	
7	TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ, MATERIÁLY A PRACOVNÍ POSTUPY	25
7.1	Způsob realizace	
7.2	Vzorky	
7.3	Kontrola	
7.4	Zkoušení	
7.5	Odmítnutí	
7.6	Opravné práce	
7.7	Vlastnictví technologického zařízení a materiálů	
7.8	Poplatky	
8	ZAHÁJENÍ PRACÍ, ZPOŽDĚNÍ A PŘERUŠENÍ PRACÍ	27
8.1	Zahájení prací	
8.2	Lhůta pro dokončení	
8.3	Program prací	
8.4	Prodloužení lhůty pro dokončení	
8.5	Zpoždění způsobená úřady	
8.6	Rychlost postupu	
8.7	Smluvní pokuta	
8.8	Přerušení práce	
8.9	Následky přerušení	
8.10	Platba za technologické zařízení a materiály v případě přerušení práce	
8.11	Prodloužení přerušení	
8.12	Pokračování v práci	
9	PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY	30
9.1	Povinnosti zhotovitele	
9.2	Odklad zkoušek	
9.3	Opakování zkoušek	
9.4	Neúspěšné přejímací zkoušky	
10	PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM	31
10.1	Převzetí stavby a částí stavby	
10.2	Převzetí částí prací	
10.3	Překážky provedení přejímacích zkoušek	
10.4	Plochy vyžadující uvedení do původního stavu	
11	ODPOVĚDNOST ZA VADY	32
11.1	Dokončení nedokončených prací a odstranění vad	
11.2	Náklady na odstranění vad	

shora, a jestliže zhotoviteli proto vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku opoždění v provedení přejímacích zkoušek, oznámí to správci stavby a vznikne mu nárok podle čl. 20.1 (*Nároky zhotovitele*) na:

- a) prodloužení doby pro dokončení za podmínek stanovených v článku 8.4 (*Prodloužení doby pro dokončení*), a
- b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů, včetně odpovídající režie v odůvodněné výši.

Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil, nebo o nich rozhodl.

V případě některých druhů přejímacích zkoušek může být v Technických podmínkách stanovena odlišná doba než doba uvedená v první větě tohoto odstavce.

Za 10.4 se vkládá nový článek 10.5 následujícího znění:

10.5 Předčasné užívání stavby

„Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby stavba nebo její část mohla být uvedena do provozu na základě povolení o předčasném užívání stavby vydaného příslušným stavebním úřadem podle § 123 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Za tímto účelem je zhotovitel zejména povinen:

- a) uzavřít s objednatelem dohodu podle § 123 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, která bude obsahovat zejména (i) souhlas zhotovitele s předčasným užíváním stavby a (ii) popřípadě podmínky předčasného užívání stavby, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby pro uvedení stavby do provozu;
- b) poskytnout objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určující polohu definičního bodu stavby nebo její části a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o předčasné užívání stavby nebo její části), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k předčasnému užívání stavby nebo její části před jejím úplným dokončením;
- c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k předčasnému užívání stavby nebo její části před jejím úplným dokončením v souladu se zavedenou odbornou praxí tak, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o předčasné užívání stavby nebo její části ze strany objednatele.“

11 ODPOVĚDNOST ZA VADY

V 11.1 v prvním odstavci se tečka za odstavcem b) nahrazuje čárkou a doplňuje se nový odstavec c):

„c) předá veškeré výše uvedené práce protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci).“

Na konec 11.1 se vkládá odstavec následujícího znění:

„Zhotovitel je povinen objednateli do 10 dnů po oznámení vady oznámit, jakým způsobem

zamýšlí vadu díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí objednatel.“

V 11.2 písmeno b) zní:

b) technologickému zařízení, materiálům nebo pracím, které nejsou z důvodu na straně zhotovitele v souladu se Smlouvou o dílo, nebo

V 11.2 poslední odstavec zní:

„Jestliže a do té míry, v níž lze vadu přičíst jiné příčině, než důvodům na straně zhotovitele, bude to zhotoviteli neprodleně oznámeno objednatelem (nebo v jeho zastoupení) a bude platit článek 13.3 (*Postup při změnách*).“

V 11.3 první věta zní:

„Objednatel bude mít podle článku 2.5 (*Nároky objednatele*) nárok na prodloužení záruční doby na stavbu nebo část stavby, jestliže a do té míry, v níž stavba, část stavby nebo některá hlavní součást technologického zařízení (podle okolností a po převzetí) nemohou být užívány k účelům, pro něž byly zamýšleny, kvůli vadě nebo poškození z důvodů na straně zhotovitele.“

V 11.4 odst. druhém písm. b) se text „, nebo“ ruší a nahrazuje tečkou.

V 11.4 odst. druhý se ruší písm. c), a to bez náhrady.

V 11.4 se za odst. druhý doplňuje následující třetí odstavec:

„Jestliže zhotovitel do data oznámeného dle odstavce prvního tohoto článku vadu nebo poškození neodstraní, vznikne objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 % nákladů, které byly vynaloženy, nebo by je bylo třeba vynaložit k odstranění vady.“

11.8 se jako celek ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Jestliže je o to zhotovitel požádán správcem stavby, bude pod vedením správce stavby pátrat po příčině vady. Pokud nemá být vada odstraněna na náklady zhotovitele podle článku 11.2 (*Náklady na odstranění vad*), správce stavby odsouhlasí nebo stanoví v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*) náklady na toto pátrání, na jejichž úhradu bude mít zhotovitel právo.“

V 11.9 se doplňuje nový odstavec následujícího znění:

„Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli vystavení osvědčení o řádném plnění díla (nebo jeho části) ve smyslu § 56 odst. 3 písm. a) Zákona o veřejných zakázkách v rozsahu, v němž zhotovitel dílo (nebo jeho část) s výjimkou případných ojedinělých drobných vad či nedodělků nebránících užívání díla, neprovedl řádně a včas.“

12 MĚŘENÍ A OCEŇOVÁNÍ

Ve 12.3 se druhý a třetí odstavec ruší, a nahrazuje tímto textem:

„Příslušná sazba nebo cena za každou položku práce bude sazba nebo cena uvedená ve Smlouvě o dílo, nebo (není-li tam tato položka uvedena) bude použita sazba nebo cena nová, která bude odvozena od některé odpovídající sazby nebo ceny ve Smlouvě o dílo, s odůvodněnými úpravami. Jestliže pro odvození nové sazby nebo ceny není odpovídající žádná sazba ani cena, bude cena odvozena z odpovídajících nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem, přičemž se vezmou v úvahu další odpovídající záležitosti.“

Jako podklad pro odvození vhodných sazeb a cen mohou být použity kalkulace jednotkových cen, doložené pro tento účel zhotovitelem podle článku 13.3 (*Postup při změnách*).

Postup pro stanovení nové sazby nebo ceny podle předchozího odstavce stanoví objednatel.“

12.4 se ruší, a to bez náhrady.

13 ZMĚNY A ÚPRAVY

13.1 nově zní takto:

Změny může iniciovat správce stavby kdykoli před vydáním Protokolu o převzetí prací, buď prostřednictvím pokynu, nebo žádosti zhotoviteli, aby předložil návrh změn díla dle článku 13.2 (*Zhodnocení*). Při vydávání pokynu ke změně nebo při jejím schvalování musí být respektována příslušná ustanovení Zákona o veřejných zakázkách. Zhotovitel neprovede žádnou změnu stavby, pokud a dokud správce stavby nevydá pokyn ke změně nebo neschválí změnu navrženou zhotovitelem dle článku 13.2 (*Zhodnocení*).

Zhotovitel je povinen provést každou změnu, ledaže objednateli prostřednictvím správce stavby oznámí, že navrhovaná změna sníží bezpečnost nebo vhodnost stavby k zamýšlenému účelu popřípadě, že nemůže v požadovaném čase získat vybavení potřebné k provedení této změny, a tyto skutečnosti řádně odůvodní v podrobnostech umožňujících objednateli posoudit správnost a odůvodněnost oznámení zhotovitele. Po obdržení tohoto oznámení zhotovitele je správce stavby oprávněn předchozí pokyn zrušit, potvrdit nebo změnit. Zhotovitel je povinen takové rozhodnutí správce stavby akceptovat a řádně splnit.

Objednatel je oprávněn prostřednictvím správce stavby nařídít zhotoviteli provedení změn, které jsou Vícepracemi, pouze za podmínek stanovených v Zákoně o veřejných zakázkách a ve Směrnici ZBV. Objednatel není oprávněn požadovat provedení víceprací zhotovitelem po podpisu Protokolu o převzetí prací.

V případě, že objednatel prostřednictvím správce stavby rozhodne o nutnosti provedení Víceprací a o jejich zadání v rámci jednacím řízení bez uveřejnění ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách, zavazuje se zhotovitel předložit na výzvu objednatele nabídku na provedení víceprací za podmínek, které budou v maximálním možném rozsahu odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění díla dle Smlouvy o dílo a požadavkům objednatele v tomto jednacím řízení bez uveřejnění. Zhotovitelem navržená cena za provedení Víceprací (resp. kterékoliv jejich části) stanovena postupem podle čl. 12.3 (*Oceňování*). Celková výše dodatečného plnění za poskytnutí Víceprací zadáných v jednacím řízení bez uveřejnění nesmí překročit částku stanovenou Zákonem o veřejných zakázkách. Dohoda o provedení Víceprací bude uzavřena v souladu s dohodou stran nebo Směrnicí ZBV.

Objednatel si v rámci svého rozpočtu vyhradil částku Rezervy ve výši stanovené v Příloze k nabídce, kterou je objednatel oprávněn dle svého uvážení využít za účelem úhrady případných nároků zhotovitele podle Smlouvy o dílo jdoucích nad rámec přijaté ceny stavby (např. dodatečných nákladů, ceny Víceprací, apod.). Zhotovitel nemá na čerpání finančních prostředků ve výši Rezervy v jakémkoliv rozsahu žádný nárok a její využití závisí výlučně na rozhodnutí objednatele.

Pokud zhotovitel provede Vícepráce, v rozporu s pokyny správce stavby nemá nárok na zaplacení takových prací.“

13.2 nově zní takto:

„Zhotovitel je oprávněn kdykoliv předložit správci stavby písemný návrh změn stavby, který podle názoru zhotovitele (i) urychlí dokončení, (ii) sníží náklady objednatele na realizaci, údržbu nebo provoz stavby, (iii) zlepší efektivitu nebo hodnotu dokončené stavby pro objednatele, nebo (iv) bude jinak ku prospěchu objednatele.

Návrh bude obsahovat náležitosti uvedené v článku 13.3 (*Postup při změnách*).

Jestliže návrh, který byl schválen správcem stavby, zahrnuje změnu v dokumentaci části zhotovovaných prací, a jestliže se strany nedohodnou jinak, potom platí, že:

- a. tyto změny bude projektovat zhotovitel,
- b. zhotovitel zajistí veškerá povolení nebo změnu vydaných rozhodnutí, jež jsou potřebná pro realizaci této změny,
- c. budou platit odstavce (a) až (d) článku 4.1 (*Všeobecné povinnosti zhotovitele*), a
- d. jestliže tato změna povede ke snížení ceny díla za tuto část, potom bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*), aby odsouhlasil nebo stanovil
 - i. částku, která bude zahrnuta do ceny díla,
 - ii. způsob měření, ocenění a plateb za tuto část díla.

Správce stavby není povinen návrh zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dílo. Zhotovitel nesmí před rozhodnutím správce stavby o změnách díla odkládat provádění díla. Pokud uskutečnění takového návrhu vyžaduje provedení víceprací, postupuje se v souladu s článkem 13.1 (*Právo na změnu*), v případě méněprací se postupuje dle článku 13.4.2."

13.3 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

"Správce stavby je oprávněn před nařízením provedení změny podle čl. 13.1 (*Právo na změnu*) požádat zhotovitele o předložení a zhotovitel je povinen s maximálním urychlením s ohledem na povahu změny a při zachování zavedené odborné praxe objednateli prostřednictvím správce předložit:

- a) popis navrhovaných prací, které bude nově třeba provést a programu jejich uskutečnění;
- b) návrh Zhotovitele na veškeré nutné úpravy Programu prací podle článku 8.3 (*Program prací*) a závazný odhad doby, o kterou dojde k posunutí (prodloužení) doby pro dokončení;
- c) návrh cenové kalkulace požadovaných víceprací dle článku 13.1 (*Právo na změnu*), kterou v případě následného konání jednacího řízení bez uveřejnění za účelem zadání takových víceprací není oprávněn bez souhlasu objednatele zvýšit.

Po obdržení tohoto návrhu je objednatel oprávněn postupovat (i) podle článku 13.1 (*Právo na změnu*) a (ii) v souladu s článkem 8.4 (*Prodloužení doby pro dokončení*) těchto Podmínek při

posouzení, zda a v jakém rozsahu je zhotovitel v souvislosti s návrhem oprávněn požadovat prodloužení doby pro dokončení díla. Během čekání na odpověď bude zhotovitel řádně pokračovat v provádění částí díla, které není dotčeno projednávanou změnou, jako kdyby objednatel nerozhodoval dle věty první tohoto odstavce, ledaže mu objednatel sám nebo prostřednictvím správce stavby dá opačný pokyn.

Čl. 13.4 Platba v použitelných měnách se jako celek ruší a nahrazuje novým článkem tohoto znění:

13.4 Omezení rozsahu prací a méněpráce

13.4.1 Omezení rozsahu prací

Objednatel je oprávněn kdykoliv před dokončením (tj. i před zahájením realizace) určitého stavebního objektu uvedeného v Soupisu prací oznámit zhotoviteli, že na dokončení (realizaci) takového stavebního objektu nemá zájem. Po obdržení oznámení objednatele dle předcházející věty zhotovitel:

- a) přestane provádět veškeré práce na příslušném stavebním objektu (pokud již nějaké provádí) kromě těch, k nimž dal správce stavby pokyn pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost na stavbě,
- b) předá správci stavby dokumentaci zhotovitele za podmínek a v rozsahu, v jakém byl povinen ji do data oznámení objednatele dle první věty tohoto článku vypracovat s ohledem na postup prací, a veškeré další práce a materiály týkající se příslušného stavebního objektu, a
- c) odstraní ze staveniště vybavení a materiály určené k realizaci příslušného stavebního objektu (pokud se na staveništi nacházejí), kromě toho, co je nutné k zajištění bezpečnosti nebo co využije k realizaci jiných stavebních objektů.

Hodnotu práce případně vykonané zhotovitelem ve vztahu k příslušnému stavebnímu objektu stanoví správce stavby a za tímto účelem vydá potvrzení o platbě, které bude obsahovat:

- a) cenu veškerých prací řádně uskutečněných za účelem realizace příslušného stavebního objektu ve výši stanovené v Soupisu prací,
- b) veškeré další účelně, efektivně a hospodárně vynaložené náklady, které zhotoviteli skutečně vznikly ve snaze realizovat příslušný stavební objekt, a
- c) účelně, efektivně a hospodárně vynaložené náklady na odstranění pomocných prací a vybavení zhotovitele určených k realizaci příslušného stavebního objektu ze staveniště a navrácení těchto věcí do provozovny zhotovitele v jeho zemi (nebo na jiné místo za náklady, které nejsou vyšší).

Omezení předmětu plnění dle tohoto článku 13.4.1 si smluvní strany potvrdí písemným zápisem, který bude obsahovat odpovídající snížení ceny díla v rozsahu odpovídajícím neprovedeným pracím na příslušných stavebních objektech, na jejichž realizaci objednatel nemá zájem, a dále podmínky případného finančního vyrovnání smluvních stran ohledně nákladů případně vynaložených zhotovitelem za účelem realizace těchto stavebních objektů a stanovených správcem stavby postupem uvedeným výše. O veškerých omezeních rozsahu dodávek, k nimž dle tohoto článku 13.4.1 případně dojde, bude rovněž proveden zápis do stavebního deníku.

Objednatel není oprávněn využít svého oprávnění dle tohoto článku 13.4.1, jestliže by nedokončení (nerealizace) příslušného stavebního objektu prokazatelně znemožňovalo dokončení (realizaci) jiného stavebního objektu, na jehož dokončení (realizaci) má objednatel nadále zájem."

13.4.2 Méněpráce

Jestliže se budou zhotovitel nebo správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo není nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to objednateli, který rozhodne o jejich případném neprovedení. O neprovedení určitých prací je objednatel oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu.

Pokud objednatel rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do stavebního deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které zhotovitel není oprávněn provést, a tomu odpovídající snížení ceny díla."

Ve 13.5 bodu (ii) se ruší slova „jako procento“.

Ve 13.6 se ve třetím odstavci ruší slova:

„Kromě všech položek, pro něž seznam prací za denní sazbu uvádí, že platba není splatná,“

Ve 13.7 odst. b) se ruší slova: „které budou zahrnuty do ceny díla“.

13.8 se jako celek ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

"Jakákoliv změna přijaté ceny stavby nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek uvedených v Soupisu prací) z důvodu případné změny nákladů zhotovitele v čase (např. případného růstu cen pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, a to jak ve vztahu k pracím podle Smlouvy o dílo, tak ve vztahu k případným Vícepracím, s výjimkou úpravy ceny podle čl. 2.7 (*Následky prodlení Objednatele na cenu díla*). Možnost provedení úpravy ceny díla v důsledku změny práva podle článku 13.7 (*Úpravy v důsledku změn práva*) tím není dotčena."

Za 13.8 se vkládá nový článek 13.9 následujícího znění:

„13.9 Upřesňování Dokumentace stavby

Vícepracemi podle článku 1.1.6.15 se rozumí i takové změny v množství jednotlivých položek, které vznikají v důsledku pouhého upřesňování Dokumentace stavby (např. v důsledku toho, že realizační dokumentace stavby (RDS) představuje konkretizaci Dokumentace stavby (PDPS)) nebo odrážejí zjištěný skutečný stav na staveništi rozdílný oproti stavu předpokládanému v Dokumentaci stavby za předpokladu, že takové změny v množství jednotlivých položek neznamenaají změnu použitého technického řešení díla ani provedení nové položky oproti položkám uvedeným v Soupisu prací.

Správce stavby je oprávněn písemným pokynem nařídit zhotoviteli provedení změny ve smyslu tohoto čl. 13.9 (*Upřesňování Dokumentace stavby*). Zhotovitel je povinen provést každou takto správcem stavby nařízenou změnu, ledaže objednateli prostřednictvím správce stavby oznámí, že navrhovaná změna sniží bezpečnost nebo vhodnost díla k zamýšlenému účelu a tyto skutečnosti řádně odůvodní v podrobnostech umožňujících správci stavby posoudit správnost a odůvodněnost oznámení zhotovitele. Po obdržení tohoto oznámení zhotovitele je správce stavby oprávněn předchozí pokyn zrušit, potvrdit nebo změnit. Zhotovitel je povinen takové rozhodnutí správce stavby akceptovat a řádně splnit. Zhotovitel však neodpovídá za případné vady díla vzniklé v důsledku splnění pokynů správce stavby dle předchozí věty, na jejichž nevhodnost či nesprávnost zhotovitel správce stavby prokazatelně upozornil, avšak správce stavby na jejich provedení přesto trval. Veškerá dokumentace a komunikace dle tohoto odstavce, včetně zejména písemného souhlasu správce stavby s provedením změny, musí být založena ve stavebním deníku, popřípadě na ní musí být ve stavebním deníku poukázáno a musí k němu být přiložena jako nedílná součást.

V případě, že objednatel prostřednictvím správce stavby rozhodne o nutnosti provedení víceprací ve smyslu tohoto čl. 13.9 (*Upřesňování Dokumentace stavby*) a o jejich zadání v rámci jednacím řízení bez uveřejnění ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách, zavazuje se zhotovitel předložit na výzvu objednatele nabídku na provedení víceprací za podmínek, které budou v maximálním možném rozsahu odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění díla dle Smlouvy o dílo a požadavkům objednatele v tomto jednacím řízení bez uveřejnění. V případě víceprací vzniklých v průběhu realizace stavby podle realizační dokumentace stavby (RDS) odsouhlasené podle článku 4.34 (*Kontrola a odsouhlasování realizační dokumentace stavby (RDS)*), resp. Dokumentace stavby (PDPS) v případě, že se realizační dokumentace stavby (RDS) nezpracovává, se práce provádí na základě souhlasu správce stavby před jejich zadáním v jednacím řízení bez uveřejnění tak, aby nebyla narušena plynulost výstavby nebo nevznikly škody z jejího přerušení.

Cena prací provedených na základě změny ve smyslu tohoto čl. 13.9 (*Upřesňování Dokumentace stavby*) se určí na základě skutečného množství provedených prací a jednotkových cen takových prací uvedených v Soupisu prací. Pokud však zhotovitel provede změnu ve smyslu tohoto čl. 13.9 (*Upřesňování Dokumentace stavby*) bez písemného pokynu správce stavby, nemá zhotovitel nárok na zaplacení takových prací a má se za to, že tyto práce byly oceněny v Soupisu prací s jednotkovou cenou 0,- Kč."

14 CENA DÍLA A PLATBY

Ve 14.1 se písmena c) a d) ruší a nahrazují se tímto novým zněním:

c) veškerá množství, která jsou dána v Soupisu prací nebo jiném souvisejícím dokumentu, jsou množství odhadovaná a nemají být pokládána za skutečná a správná množství prací, které má zhotovitel realizovat, jakož ani pro účely kapitoly 12 (*Měření a oceňování*); větší množství je však možné realizovat výlučně za podmínek stanovených v čl. 13.1 (*Právo na změnu*),

d) Není-li v Technických podmínkách nebo Souvisejících dokumentech stanoveno jinak, platí, že zhotovitel ocenil všechny položky soupisu prací tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační dokumentace stavby (RDS) a dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) a zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením těchto dokumentací nad rámec ceny položek oceněných v soupisu prací žádný nárok.

Článek 14.2 zní:

„14.2 Záloha

Objednatel poskytne zhotoviteli na jeho žádost zálohu ve výši maximálně 10% ročního objemu prostředků schválených SFDI pro příslušnou akci, ne však více než 10% objemu prací předpokládaného zhotovitelem na daný kalendářní rok v programu prací předloženého podle článku 8.3 (*Program prací*). Záloha bude poskytnuta na každý kalendářní rok až do uplynutí doby pro dokončení stavby podle článku 8.2 (*Doba pro dokončení*) s výjimkou těch kalendářních roků, v nichž celková doba realizace díla v souladu se Smlouvou o dílo nepřesáhne 6 měsíců.

Výše splátek a použitá měna budou takové, jak je uvedeno v Příloze k nabídce.

Správce stavby vydá Potvrzení dílčí platby na první splátku poté, co objednatel obdrží záruku za provedení díla podle článku 4.2 (*Záruka za provedení díla*).

Záloha bude splacena prostřednictvím procentních odpočtů v Potvrzení platby uvedených v Příloze k nabídce:

- a) odpočty začnou v Potvrzení platby následujícím po poskytnutí zálohy Objednatelem,
- b) celková výše zálohy bude splacena do konce kalendářního roku, ve kterém byla poskytnuta; poslední odpočet bude proveden nejpozději v Potvrzení platby vydaném po ukončení desátého kalendářního měsíce; v případě posledního odpočtu zálohy bude výše amortizační sazby Objednatelem upravena dle potřeby,
- c) po splacení zálohy poskytnuté Objednatelem v daném kalendářním roce bude v kalendářním roce následujícím na základě požadavku zhotovitele poskytnuta nová záloha.

Po splacení zálohy poskytnuté Objednatelem v daném kalendářním roce bude v kalendářním roce následujícím na základě požadavku zhotovitele poskytnuta nová záloha ve výši a za podmínek uvedených v Příloze k nabídce.

Poskytování a splacení zálohy zohlední zhotovitel v harmonogramu plateb zpracovaném v souladu s článkem 14.4. (*Harmonogram plateb*).

Jestliže záloha nebyla splacena před vydáním Protokolu o převzetí prací nebo před odstoupením podle kapitoly 15 (Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele), kapitoly 16 (Odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele) nebo kapitoly 19 (*Vyšší moc*) (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným zhotovitelem objednateli.“

Ve 14.3 se v prvním odstavci vypouští slova ", které budou zahrnovat zprávu o postupu prací v tomto měsíci v souladu s článkem 4.21 (*Zprávy o postupu prací*)".

Ve 14.3 se na konec prvního odstavce doplňuje:

"Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení průběžných a konečných platbách bude zhotovitelem předávána na formulářích předepsaných objednatelem. Zhotovitel je povinen správci stavby předat Prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml na kompaktním disku CD-R."

Ve 14.3 se v prvním odstavci ruší písm. b) a nahrazuje se tímto zněním:

„b) veškeré částky, které mají být přičteny a odečteny za změny v legislativě v souladu s článkem 13.7 (*Úpravy v důsledku změn práva*),“

Na konec 14.3 se dále vkládá tento nový text:

"Jestliže jsou jednotlivé "Všeobecné položky Soupisu prací, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 – Všeobecné konstrukce a práce“ oceněny v Soupisu prací pevnou cenou za celou položku a jestliže není v Soupisu prací výslovně stanoveno jinak (v kterémžto případě je daná Všeobecná položka splatná v okamžiku uvedeném v Soupisu prací), je zhotovitel povinen tyto položky zahrnout pouze a výhradně do Prohlášení vyhotovovaných bezprostředně po ukončení každého kalendářního čtvrtletí (tedy do Prohlášení vyhotovovaných bezprostředně po uplynutí měsíců března, června, září a prosince), které skončilo před uplynutím doby pro dokončení díla stanovené ve Smlouvě o dílo ke dni jejího uzavření. Tyto položky zhotovitel v příslušném Prohlášení ocení částkou vypočítanou jako podíl (i) celkové pevné ceny příslušné

položky uvedené v Soupisu prací a (ii) celkového počtu kalendářních čtvrtletí v období od zahájení prací do uplynutí doby pro dokončení díla stanovené ve Smlouvě o dílo ke dni jejího uzavření.

Pokud dojde z důvodu na straně objednatele k prodloužení doby pro dokončení díla, může zhotovitel zahrnout položky uvedené v první větě tohoto odstavce v prokázané výši odsouhlasené objednatelem do Prohlášení vyhotovovaného i po ukončení kalendářního čtvrtletí (nebo kalendářního měsíce), které skončilo po uplynutí doby pro dokončení Díla stanovené dle původní Smlouvy o dílo ke dni jejího uzavření.

V souladu s článkem 4.11 (*Dostatečnost přijaté ceny díla*) zhotovitel v žádném případě není oprávněn do Prohlášení (resp. faktury, která je jeho součástí) nad rámec položek výslovně uvedených v Soupisu prací zahrnovat jako samostatné položky žádné další práce, které nebyly do Soupisu prací doplněny předepsaným způsobem dle čl. 13.1 (*Změny a úpravy*). "

14.4 zní:

"Zhotovitel předloží Správci stavby do 42 dnů po zahájení prací nezávazné odhady plateb, o nichž očekává, že budou splatné v každém čtvrtletí. Revidované odhady budou předkládány ve čtvrtletních intervalech, dokud nebude vydán Protokol o převzetí prací na celou stavbu."

14.5 se ruší, a to bez náhrady.

14.6 zní:

„Žádná částka nebude potvrzena ani vyplacena, dokud objednatel neobdrží a neschválí záruku za provedení díla. Potom správce stavby do 28 dnů po obdržení Prohlášení a podpůrných dokumentů dle čl. 14.3 (*Žádost o potvrzení dílčí platby*) sdělí objednateli své připomínky k prohlášení a částku, o níž má správce stavby za to, že na její úhradu má zhotovitel nárok.

Jestliže některé údaje uvedené v Prohlášení nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být objednatelem nebo správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, oznámí objednatel nebo správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody zhotoviteli do 28 dní od obdržení Prohlášení. V takovém případě se (i) k Prohlášení nepřihlíží, tj. okamžik doručení takto vadného Prohlášení nemůže být okamžikem, od něhož plyne doba splatnosti příslušné částky dle čl. 14.7 písm. b) (*Platba*), a (ii) zhotovitel je povinen předložit objednateli prostřednictvím správce stavby bez zbytečného odkladu nové Prohlášení spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou o dílo. Doba splatnosti peněžitého plnění uvedeného v Prohlášení běží až od okamžiku, kdy je správci stavby předáno Prohlášení, které je v souladu s touto Smlouvou o dílo. Správce stavby následně vydá objednateli Potvrzení dílčí platby, v němž je stanovena výše dílčí platby, kterou objednatel na základě Prohlášení uhradí zhotoviteli.

Z žádného jiného důvodu nebude odmítnuta úhrada kterékoliv částky uvedené v Prohlášení kromě toho, kdy:

- a) se ukáže, že některá dodaná věc nebo provedená práce není zcela v souladu se Smlouvou o dílo, cena této úpravy nebo výměny může být odečtena od částky jinak splatné, dokud úprava nebo výměna není dokončena a/nebo
- b) zhotovitel neprovedl nebo neprovádí některou práci nebo povinnost v souladu se Smlouvou o dílo a takto mu to bylo oznámeno správcem stavby nebo objednatelem, může správce stavby nebo objednatel stanovit hodnotu této práce nebo povinnosti a odečíst ji od částky jinak splatné, dokud práce nebo povinnost není provedena.

Objednatel může kdykoliv zohlednit skutečnost, která měla být správně zohledněna

v některém předchozím Prohlášení. Nebude se mít za to, že úhrada jakýchkoliv částek uvedených v Prohlášení znamená přijetí, schválení, souhlas nebo spokojenost objednatele.“

Ve 14.7 a) se slova: "do 42 dnů po vydání Dopisu o přijetí nabídky nebo" nahrazují slovy "do 60 dnů od vyžádání zálohy zhotovitelem nebo".

Ve 14.7 se písmeno b) jako celek ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

"b) částku uvedenou v Prohlášení do 60 dnů poté, co správce stavby obdrží příslušné Prohlášení a podpůrné dokumenty v souladu s touto Smlouvou o dílo a"

Ve 14.7 se písmeno c) jako celek ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

"c) částku uvedenou v Závěrečném prohlášení do 60 dnů poté, co objednatel obdrží toto Závěrečné prohlášení v souladu s touto Smlouvou o dílo."

Ve 14.7 poslední odstavec zní:

„Platba částky bude provedena na bankovní účet určený zhotovitelem.“

Ve 14.7 se za poslední odstavec vkládá nový odstavec:

„Zhotovitel bere na vědomí a uznává, že doba splatnosti v délce 60 dnů dle této kapitoly 14 (*Cena díla a platby*), dle čl. 4.36 (*Poskytnutí součinnosti jinému zhotoviteli*) a čl. 8.9 (*Následky přerušení*) je odůvodněna povahou závazku, když (i) předmětem Smlouvy o dílo je provedení komplexní a rozsáhlé stavby, (ii) platby za provedené práce jsou čerpány z veřejných prostředků, u nichž existuje zvýšená míra požadavku na prověření správnosti a oprávněnosti jejich vynaložení, s čímž je spojen delší a složitější administrativní proces jejich schvalování, (iii) před úhradou je nutné ověřit, že všechny fakturované práce byly provedeny řádně a kvalitně a v rozsahu odpovídajícím Smlouvě o dílo (včetně projektové dokumentace) a příslušné faktury, a (iv) součástí faktury (resp. prohlášení) je obvykle velké množství položek.“

14.8 se ruší jako celek a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Jestliže se objednatel dostane do prodlení se zaplacením jakékoliv částky dle Smlouvy o dílo, bude mít zhotovitel nárok na úhradu úroku z prodlení ve výši 6 % z dlužné částky ročně. Na tuto platbu má zhotovitel nárok bez formálního oznámení nebo potvrzení a aniž by to bylo na překážku jinému právu nebo nápravnému prostředku.“

14.9 se ruší.

14.10 se ruší.

14.11 se jako celek ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

"Do 56 dnů po obdržení Protokolu o převzetí prací na celou stavbu zhotovitel předá objednateli prostřednictvím správce stavby šest kopií Závěrečného prohlášení s podpůrnými dokumenty, které bude detailně vyjadřovat, ve formě schválené objednatelem:

a) cenu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou o dílo a

b) veškeré další částky, které zhotovitel považuje za splatné podle Smlouvy o dílo nebo jinak.

Zhotovitel je povinen objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml na kompaktním disku CD-R. Podpůrné dokumenty předložené spolu se Závěrečným prohlášením musí objednateli objektivně umožňovat jednoznačné ověření správnosti všech údajů uvedených v Závěrečném prohlášení.

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném prohlášení nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být objednatelem nebo správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, oznámí objednatel nebo správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného prohlášení. V takovém případě se (i) k Závěrečnému prohlášení nepřihlíží, tj. okamžik doručení takto vadného Závěrečného prohlášení nemůže být okamžikem, od něhož plyne doba splatnosti příslušné částky dle čl. 14.7 písm. c) (*Platba*), a (ii) zhotovitel je povinen předložit objednateli prostřednictvím správce stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné prohlášení spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou o dílo. Doba splatnosti peněžitého plnění uvedeného v Závěrečném prohlášení běží až od okamžiku, kdy je správcí stavby předáno Závěrečné prohlášení, které je v souladu s touto Smlouvou o dílo. Článek 14.13 (*Vydání potvrzení konečné platby*) není tímto ustanovením dotčen.

14.13 se jako celek ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Jestliže zhotovitel **nepředal** objednateli prostřednictvím správce stavby šest kopií Závěrečného prohlášení s podpůrnými dokumenty v souladu s článkem 14.11 (*Žádost o potvrzení konečné platby*) a článkem 14.12 (*Vyúčtování*), vyzve správce stavby zhotovitele, aby tak učinil. Jestliže zhotovitel nepodá do 28 dnů Závěrečné prohlášení splňující podmínky dle této Smlouvy o dílo, správce stavby vydá Závěrečné prohlášení na takovou částku, kterou spravedlivě stanoví jako splatnou.

14.14 se jako celek ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

"Objednatel nebude zavázán (mimo případy, kdy není dle českého práva možné tento závazek smluvně omezit) zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc vzniklou ze Smlouvy o dílo nebo realizace stavby (nebo v souvislosti s nimi), pokud na ně zhotovitel neuplatní nárok v Závěrečném prohlášení.

Tento článek však neomezuje odpovědnost objednatele v případě podvodu nebo úmyslného protiprávního jednání objednatele."

14.15 se ruší a nově zní:

„Cena díla bude zaplacená v měně jmenované v Příloze k nabídce.“

Za 14.15 se vkládá nový článek:

14.16 Úhrada nákladů

Kdykoliv bude zhotovitel požadovat po objednateli úhradu jakýchkoliv nákladů vedle sjednané ceny díla, je zhotovitel povinen prokázat, že příslušné náklady splňují veškeré podmínky stanovené článkem čl. 1.1.4.3, zejména že byly vynaloženy účelně, hospodárně a efektivně při plnění Smlouvy o dílo, a dále že jsou v souladu se Smlouvou o dílo.

Nestanoví-li Smlouva o dílo jinak, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady do 60 dnů poté, co obdrží řádně vyhotovenou fakturu (daňový doklad) zhotovitele spolu se všemi dokumenty jednoznačně prokazujícími, že má na úhradu takových nákladů v souladu se Smlouvou o dílo nárok.

15 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY OBJEDNATELE

V 15.2 se v prvním odstavci v bodě a) za slova "článku 4.2 (*Záruka za provedení díla*)" vkládají slova "a/nebo článku 4.25 (*Záruka za odstranění vad*)" nebo nesplní výzvu podle článku 15.1 (Výzva k nápravě),

V 15.2 se v bodě e) nahrazuje slovo „bankrot“ slovem „úpadek“ a znění „konkurzního nebo správního řízení“ zněním „kourkurzního řízení a jiného řízení s obdobnými důsledky“.

V 15.2 se v prvním odstavci na konci bodu f) nahrazuje tečka čárkou a za bod f) se vkládají nové body g) až o) následujícího znění:

- g) nesplní řádně a včas pokyn správce stavby nebo objednatele nebo jakoukoliv svou povinnost vůči správci stavby nebo objednateli podle Smlouvy o dílo, a nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené době poskytnuté mu za tím účelem správcem stavby nebo objednatelem ve výzvě k nápravě,
- h) zhotovitel nebo osoba jednající ve shodě se zhotovitelem nebo kterýkoliv člen jejich orgánů bude pravomocným rozsudkem příslušného soudu odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s uzavřením nebo plněním Smlouvy o dílo, zejména pak pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání zhotovitele podle zvláštních právních předpisů,
- i) neuzavřel nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu stanoveném v kapitole 18 (*Pojištění*) a takové porušení Smlouvy o dílo nenapravit ani v dodatečně nápravné době nikoliv kratší než 14 dnů od okamžiku doručení výzvy zhotoviteli,
- j) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na realizaci díla ani po uplynutí dodatečně přiměřené doby, která mu byla stanovena objednatelem ke splnění příslušných podmínek,
- k) v zadávacím řízení na zadání zakázky spočívající v realizaci díla uvedl ve své nabídce informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,
- l) bez výslovného písemného souhlasu objednatele dle čl. 4.4 (Podzhotovitelé) změnil kteréhokoliv subdodavatele uvedeného v nabídce na plnění veřejné zakázky nebo jejich podíl na pracích vykonávaných při realizaci díla, a nebo
- m) za podmínek stanovených v § 1977 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- n) pokud někdo z personálu, zmocněnců nebo podzhotovitelů zhotovitele poskytne nebo nařídí poskytnout (přímo nebo nepřímo) někomu úplatek nebo odměnu popsanou v tomto odstavci (f). Pouze legální platby a odměny personálu zhotovitele neopravňují k odstoupení od Smlouvy o dílo.

V 15.2 se ve třetím odstavci slova "(e) nebo (f)" nahrazují slovy "(e) až (h) a (l) (jedná-li se o postup dle v § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)" a doplňuje se věta: „Ustanovení § 2004 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije“.

V 15.2 se pátý odstavec ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

"Zhotovitel poté opustí staveniště a předá správci stavby veškeré požadované vybavení, dokumenty zhotovitele a jinou projektovou dokumentaci zhotovenou jím nebo pro něj a dokumentaci zhotovitele, technologická zařízení, materiály a práce, za něž obdržel platbu. Zhotovitel dále využije svého nejlepšího úsilí k tomu, aby okamžitě splnil jakýkoliv odůvodněný pokyn obsažený v odstoupení (i) pro postoupení některé poddodávky a (ii) pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost na stavbě."

15.4 se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

"Poté, co odstoupení od Smlouvy objednatelem podle článku 15.2 (*Odstoupení ze strany objednatele*) vstoupilo v platnost, může objednatel:

- a) postupovat v souladu s článkem 2.5 (*Nároky objednatele*),
- b) odmítnout další platby zhotoviteli, dokud (i) nejsou stanoveny ceny provedených prací, jejich dokončení a odstranění všech vad, škody způsobené zpožděním při dokončení (jsou-li) a všechny další náklady způsobené objednatelem, a/nebo (ii) neobdrží od zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které utrpěl objednatel, a veškeré mimořádné náklady na dokončení stavby po započtení všech částek splatných zhotoviteli podle článku 15.3 (*Ocenění k datu odstoupení*). Po obdržení náhrady za všechny tyto ztráty, škody a mimořádné výdaje vyplátí objednatel zůstatek zhotoviteli. "

Za první odstavce 15.5 se dále vkládá tento nový odstavec:

„Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo v celém rozsahu předmětu plnění nebo jeho části v případě, že se v průběhu této Smlouvy o dílo ukáže, že není možno dosáhnout účelu předvídaného touto Smlouvou o dílo bez provedení víceprací dle Zákona o veřejných zakázkách, a předpokládaný rozsah víceprací potřebných k dosažení účelu předvídaného touto Smlouvou o dílo přesahuje maximální rozsah víceprací, které je objednatel oprávněn zadat zhotoviteli v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) Zákona o veřejných zakázkách. V takovém případě může objednatel po odstoupení od této Smlouvy o dílo nebo její části zadat práce potřebné k dosažení účelu předvídaného touto Smlouvou o dílo (včetně prací, které byly předmětem této Smlouvy o dílo včetně jejích dodatků, ale nebyly dokončeny) novému zhotoviteli v rámci nové veřejné zakázky.“

Na konec 15.5 se dále vkládá tento nový text:

„V případě, že objednatel, aniž by dosud sdělil zhotoviteli datum zahájení prací podle článku 8.1 (Zahájení prací), zhotoviteli oznámí, že odstupuje od smlouvy z důvodu, že

- a) nebylo schváleno financování realizace díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno v zadávací dokumentaci nebo oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci díla; nebo
- b) financování realizace díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno v zadávací dokumentaci nebo oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci díla, je podmíněno splněním podmínek, které by znamenaly podstatnou změnu projektu realizace díla;

nenáleží zhotoviteli kompenzace nákladů ani náhrada škody vč. ušlého zisku, ani jiné nároky peněžitého či jiného charakteru.“

16 PŘERUŠENÍ PRACÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE

V 16.1 čtvrtém odstavci se v písmenu b) vypouštějí slova "plus přiměřeného zisku, které

budou zahrnuty do ceny díla", a nahrazují se slovy: „plus odpovídající režie zhotovitele v odůvodněné výši“.

V 16.2 se ruší písmeno b) a nahrazuje se tímto novým zněním:

"b) správce stavby v rozporu se svými povinnostmi dle Smlouvy o dílo nevydá příslušné potvrzení platby do 56 dnů poté, co obdržel prohlášení a podpůrné dokumenty,"

V 16.2 se ruší písmeno c) a nahrazuje se tímto novým zněním:

"c) se objednatel dostane do prodlení s uhrazením částky ve výši uvedené v Příloze k nabídce po dobu přesahující šest kalendářních měsíců, a uvedené porušení neodstraní ani v dodatečné nápravné době nikoliv kratší než 28 dnů od doručení výzvy objednateli obsahující upozornění na možnost odstoupení od Smlouvy o dílo zhotovitelem,"

V 16.2 se ruší písmeno d) a nahrazuje se tímto novým zněním:

"d) objednatel zásadním způsobem neplní své povinnosti podle Smlouvy o dílo, a to ani ve době 63 dnů po té, co byl zhotovitelem písemně vyzván k nápravě; pro vyloučení pochybností se stanoví, že podle tohoto písmene je zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo pouze v takových případech zásadního neplnění povinností objednatele, které představují kvalitativně jiná porušení Smlouvy o dílo, než jaká jsou výslovně uvedena v jiných písmenech tohoto článku,"

V 16.2 se ruší písmeno e) a nahrazuje se tímto novým zněním:

"e) datum zahájení prací ve smyslu článku 8.1 (*Zahájení prací*) nenastane do 12 kalendářních měsíců od uzavření Smlouvy o dílo,"

V 16.2 se ruší písmeno f) a nahrazuje se tímto novým zněním:

"f) budou splněny podmínky stanovené v článku 8.11 (*Prodloužení přerušení*), a to v rozsahu stanoveném v článku 8.11 (*Prodloužení přerušení*), nebo".

V 16.2 se v bodě g) nahrazuje slovo „bankrot“ slovem „úpadek“.

V 16.2 poslední věta druhého odstavce se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

"Kromě toho v případě uvedeném v odstavci g) může zhotovitel odstoupit od Smlouvy o dílo okamžitě."

V 16.3 se jako celek ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

"Poté, co odstoupení od Smlouvy o dílo podle článku 15.2 (*Odstoupení ze strany objednatele*), článku 16.2 (*Odstoupení ze strany zhotovitele*) nebo článku 19.6 (*Dobrovolné odstoupení, platba a zánik závazku*) vstoupilo v platnost, zhotovitel neprodleně:

- přestane provádět veškeré práce **na díle** kromě těch, k nimž dal správce stavby pokyn pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost na stavbě,
- předá správci stavby dokumentaci zhotovitele a veškeré další práce **týkající se díla**, včetně případně technologických zařízení a materiálů, a
- odstraní ze staveniště vybavení a materiály určené k realizaci díla (pokud se na staveništi nacházejí), kromě toho, co je nutné k zajištění bezpečnosti."

V 16.4 se v bodě a) za slova: "záruku za provedení díla" vkládají slova "a/nebo záruku za odstranění vad".

V 17.1 se v posledním odstavci ruší slova „v článku (d) (i), (ii) a (iii) článku 18.3“ a nahrazují se slovy „v článku 18.2“.

V 17.2 se ruší slova "(nebo se má za to, že je vydán)" a "(nebo je za vydaný považován)", a to bez náhrady.

V 17.2 posledním odstavci se ruší slova „po vydání Protokolu o převzetí prací a které vznikly v důsledku předchozích činností, za něž byl zhotovitel odpovědný“ a nahrazují se slovy „a zhotovitel je za ně odpovědný“.

V 17.3 písmeno g) se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

"g) chyby v projektové dokumentaci vypracované personálem objednatele nebo jinými osobami, za něž odpovídá objednatel."

V 17.4 druhý odstavec písm. b) se na konci ruší slova „bude rovněž zahrnut přiměřený zisk“ a nahrazují se slovy: „bude rovněž zahrnuta odpovídající režie v odůvodněné výši“.

17.5 se ruší jako celek a nahrazuje se následujícím zněním:

„17.5 Duševní a průmyslová vlastnická práva

17.5.1 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jakákoli práva z duševního vlastnictví vytvořená na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní budou prostá právních vad a budou v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a že tato práva neporuší, ani nebudou mít za následek porušení jakéhokoliv práva duševního vlastnictví zhotovitele či třetích osob. Zhotovitel se zavazuje zajistit získání prohlášení dle předcházející věty také od všech poddodavatelů zhotovitele či se zhotovitelem spolupracujících osob.

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, že práva dle tohoto čl. 17.5 zůstanou objednateli v plném rozsahu zachována i v případě změny vykonavatele majetkových práv autora k autorskému dílu, popřípadě změny majitele patentu, užitého vzoru nebo vlastníka průmyslového vzoru nebo jiného práva z duševního vlastnictví.

Zhotovitel se také zavazuje zajistit zachování plného rozsahu práv dle tohoto čl. 17.5 v případě, že dojde ke změně vlastníka díla zhotoveného na základě této Smlouvy o dílo. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv dle předchozí věty, zavazuje se zhotovitel kdykoliv na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví dle tohoto čl. 17.5, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem díla) licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami licence udělené objednateli (avšak bez nároku na jakoukoliv dodatečnou úplatu).

17.5.2 Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a časově neomezené právo ke všem známým způsobům užití (licenci) k autorským dílům dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vzniklých na základě této Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, zejména k dokumentaci vypracované zhotovitelem či k softwaru vytvořenému na objednávku objednatele,

včetně práva měnit příslušné autorské dílo nebo jej použít k realizaci podobného díla. Objednatel je oprávněn poskytnout práva k užití autorského díla ve smyslu věty první tohoto odstavce zcela nebo zčásti třetí osobě (podlicence). Objednatel je oprávněn licenci postoupit na třetí osobu, k čemuž tímto zhotovitel poskytuje svůj výslovný souhlas. Autorská odměna zhotovitele za poskytnutí či postoupení shora uvedené licence (jakož i případné podlicence) je zahrnuta v uhrazené ceně díla; za uhrazenou se cena díla v tomto smyslu považuje poskytnutím první zálohy dle čl. 14.2 nebo první dílčí platby dle čl. 14.3, podle toho, která z uvedených plateb bude realizována dříve. Pokud je autorem nebo spoluautorem autorského díla třetí osoba, prohlašuje zhotovitel a zaručuje se, že byl oprávněn takovou osobou k tomu, aby poskytl objednateli oprávnění k užití autorského díla ve shora uvedeném rozsahu.

- 17.5.3 Zhotovitel poskytuje objednateli časově neomezené a nevýhradní právo užívat (licenci) software, pro něž je originálním nositelem autorských práv třetí osoba (tj. software, který nebyl vytvořen na objednávku objednatele), a který je dle Smlouvy o dílo součástí díla, a to pro účely provozu, podpory, údržby, úprav a oprav díla a navazujících technologických systémů objednatele, včetně jejich užití k realizaci podobného díla. Objednatel je oprávněn poskytnout práva k užití autorského díla ve smyslu věty první tohoto odstavce zcela nebo zčásti třetí osobě (podlicence). Objednatel je oprávněn licenci postoupit na třetí osobu, k čemuž tímto zhotovitel poskytuje svůj výslovný souhlas. Autorská odměna zhotovitele za poskytnutí shora uvedené licence je zahrnuta v uhrazené ceně díla; za uhrazenou se cena díla v tomto smyslu považuje poskytnutím první zálohy dle čl. 14.2 nebo první dílčí platby dle čl. 14.3, podle toho, která z uvedených plateb bude realizována dříve.
- 17.5.4 Ve vztahu k softwaru uvedenému v čl. 17.5.3 je zhotovitel povinen předat objednateli všechny verze zdrojového kódu softwaru, který je dle Smlouvy o dílo součástí díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel bude oprávněn předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění zhotovení, provozu, údržby anebo oprav díla a dalších technologických systémů objednatele, které na dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které objednatel nabyt k tomuto softwaru dle Smlouvy o dílo, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek: (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) zhotovitel se ocitne v úpadku a/nebo u něj nastane kterákoliv ze skutečností předvídaných v čl. 15.2 písm. e) výše; (iii) ve stanovené době, jinak ve době přiměřené neodstraní řádně jakoukoliv vadu počítačového programu či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy o dílo povinen; nebo (iv) objednatel začne v souladu se Smlouvou o dílo užívat dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze určenými zástupci obou smluvních stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojového kódu objednatelům zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího uzavření.
- 17.5.5 Zhotovitel tímto poskytuje objednateli nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání a provozu díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve formuláři „Přehled patentů, užitečných vzorů a průmyslových vzorů“, jenž je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které

jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany dle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy díla a všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) zhotovitel se ocitne v úpadku a/nebo u něj nastane kterákoliv ze skutečností předvídaných v čl. 15.2 písm. e) výše; (iii) ve stanovené době, jinak ve době přiměřené neodstraní řádně jakoukoliv vadu díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy o dílo povinen nebo (iv) objednatel začne v souladu se Smlouvou o dílo užívat dílo. V případě uvedeném v bezprostředně předcházející větě je objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke zhotovení nebo opravám díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám díla a týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně vypovědět. Ustanovení § 2370 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se však nepoužije. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky. Úplata za poskytnutí licence k využití patentovaného vynálezu je zahrnuta v uhrazené ceně díla a za uhrazenou se cena díla v tomto smyslu považuje poskytnutím první zálohy dle čl. 14.2 nebo první dílčí platby dle čl. 14.3, podle toho, která z uvedených plateb bude realizována dříve.

- 17.5.6 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo podat řádnou žádost o zápis příslušné licence do patentového rejstříku a činit veškeré kroky vhodné či nezbytné k tomu, aby taková licence byla do patentového rejstříku bezodkladně zapsána.
- 17.5.7 Zhotovitel poskytuje objednateli veškerá práva (licence) v rozsahu a za podmínek dle čl. 17.5.5 a 17.5.6 také ve vztahu ke všem technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, jenž je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění, nebo průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany dle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany.
- 17.5.8 Zhotovitel prohlašuje, že ve formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které jsou předmětem právní ochrany v rozsahu uvedeném v bodech 17.5.5 – 17.5.8 shora a jejichž získání je nezbytné pro užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou součástí zhotovitelem použitého technického a technologického řešení díla a které (ani funkční

ekvivalenty těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na zhotoviteli.

17.5.9 V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek vyplývající z prohlášení a záruk uvedených v tomto článku 17.5, bude zhotovitel odpovědný za veškeré důsledky z toho plynoucí, zejména bude povinen neprodleně zajistit objednateli (nebo jím určené osobě) úplné právo nerušeně užívat dílo v souladu se Smlouvou o dílo a právními předpisy tak, že tímto užíváním nebudou porušována práva duševního vlastnictví třetích osob. Zhotovitel bude dále povinen nahradit objednateli veškerou škodu způsobenou v důsledku porušení svých závazků dle tohoto článku 17.5 a uspokojit veškeré související nároky třetích osob. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva, v případě jakéhokoli jiného porušení závazků vyplývajících ze záruk a prohlášení se výše škody bude rovnat výši majetkové újmy způsobené objednateli. K výši škody dle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečně a účelně vynaložené náklady, včetně nákladů na právní zastoupení.

17.5.10 V případě, že by se v tomto článku 17.5 shora uvedená ujednání ukázala jako nedostatečná pro zajištění sjednaného rozsahu práv objednatele nakládat s jakýmkoliv právem duševního vlastnictví, zavazuje se zhotovitel zajistit, aby bylo příslušné právo duševního vlastnictví bez zbytečného odkladu po jeho vzniku v plném rozsahu převedeno na objednatele a zavazuje se ve vztahu k jakémukoliv jednotlivému právu duševnímu vlastnictví uzavřít s objednatelem smlouvu o poskytnutí licence k takovému právu z duševního vlastnictví, případně, nebude-li jeho převod dle kogentních ustanovení platných právních předpisů, resp. dle Smlouvy o dílo možný, jinou smlouvu (dle volby objednatele), která zajistí, aby takové právo duševního vlastnictví objednatel získal ve sjednaném rozsahu v souladu s kogentními ustanoveními platných právních předpisů, resp. se Smlouvou o dílo (zejména postoupením práv včetně práva výkonu majetkových práv k zaměstnaneckému či kolektivnímu dílu, poskytnutím licence či sublicence, registrací takové licence či sublicence v příslušném registru či rejstříku apod.).“

17.6 se ruší jako celek, a to bez náhrady.

18 POJIŠTĚNÍ

Kapitola 18 se jako celek ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

18.1 Pojištění díla

Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) díla, součástí díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním díla, a to na tzv. novou cenu díla ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce. Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a

úplného převzetí díla objednatelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen objednatel. Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy o dílo zhotovitelem.

Kdykoliv to objednatel bude požadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

18.2 Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku

Zhotovitel je povinen před zahájením díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou zhotovitelem objednateli a třetím osobám. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy o dílo. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění bude dosahovat alespoň výše stanovené v Příloze k nabídce. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy o dílo. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému objednatelem.

19. VYŠŠÍ MOC

V 19.6 druhý odstavec se ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

"Při takovém odstoupení správce stavby stanoví hodnotu vykonané práce a vydá potvrzení o platbě, které bude obsahovat:

- a) cenu veškerých prací řádně uskutečněných za účelem **realizace díla** ve výši stanovené v Soupisu prací,
- b) veškeré další účelně, efektivně a hospodárně vynaložené náklady, které zhotoviteli skutečně vznikly ve snaze realizovat dílo, a

- c) účelně, efektivně a hospodárně vynaložené náklady na odstranění pomocných prací a vybavení zhotovitele určených k realizaci díla ze staveniště a navrácení těchto věcí do provozovny zhotovitele v jeho zemi (nebo na jiné místo za náklady, které nejsou vyšší).

20 NÁROKY, SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

Ve 20.1 druhý odstavec zní:

„Jestliže zhotovitel nepředloží oznámení nároku během 28 dnů, bude odpovídat objednateli za škodu, vzniklou v důsledku pozdního uplatnění nároku.“

20.2 se ruší.

20.3 se ruší.

20.4 se ruší.

20.5 se ruší včetně názvu a nahrazuje se následujícím novým zněním:

20.5 Řešení sporů

„Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání smluvních stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem ve sporech je pro řízení vedené v prvním stupni před okresními soudy jako soudy věcně příslušnými Obvodní soud pro Prahu 1 a pro řízení vedená v prvním stupni před krajskými soudy jako soudy věcně příslušnými Městský soud v Praze, ledaže je k projednání a rozhodnutí sporu dle platných právních předpisů dána výlučná příslušnost jiného soudu České republiky.“

20.6 se ruší.

20.7 se ruší.

20.8 se ruší.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 3 – TECHNICKÉ PODMÍNKY

DÍL 3, ČÁST 1 TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Název zakázky: D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice - EXIT 34 Ostředek

Číslo: 02PT-001997

6/2014

Nedílnou součástí tohoto Dílu 3, části 1 zadávací dokumentace jsou následující Technické kvalitativní podmínky („TKP“):

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1

ze dne 6.8.2007 s účinností od 1. září 2007,

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998

a její přílohy č. 9 schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120

ze dne 21.2.2000.

Praha květen 2007

Kapitola 2 TKP Příprava staveniště

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1

ze dne 20.4.2007, s účinností od 1. května 2007

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120

ze dne 30.6.1998

Praha 2006

Kapitola 3 TKP Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1

ze dne 23.3.2009 s účinností od 1.4.2009

se současným zrušením znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1

ze dne 15.12.2003.

Praha, prosinec 2008

Kapitola 4 TKP Zemní práce

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1

ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RS/1
Praha, prosinec 2009

Kapitola 5 TKP

Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1
ze dne 12.3.2008 s účinností od 1.4.2008
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120
ze dne 19.3.2000
Praha, březen 2008

Kapitola 6 TKP

Cementobetonový kryt

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/1
ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 19581/01-123
ze dne 14.3.2001
Praha, srpen 2006

Kapitola 7 TKP

Hutněné asfaltové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8.4.2008 s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120
ze dne 19.3.1999
Praha, duben 2008

Kapitola 8 TKP

Litý asfalt

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1

ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MD-OPK, č.j. 619/03-120-RS/1
ze dne 15.12.2003
Praha, duben 2008

Kapitola 9 TKP

Kryty z dlažeb

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1
Ze dne 13.8.2010, s účinností od 1.9.2010
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, srpen 2010

Kapitola 10 TKP

Obrubníky, chodníky a dopravní plochy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1
ze dne 13.8.2010 s účinností od 1.9.2010
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, srpen 2010

Kapitola 11

Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1
ze dne 8.3.2010 s účinností od 1.4.2010
se současným zrušením pátého znění této kapitoly
TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/1
ze dne 29.8.2005
Praha, leden 2010

Kapitola 12 TKP

Trvalé oplocení

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1
ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2.2000
Praha, březen 2008

Kapitola 13 TKP

Vegetační úpravy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/1
ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120
ze dne 27.10.1997
Praha, srpen 2006

Kapitola 14 TKP

Dopravní značky a dopravní zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1
ze dne 25.3.2009, s účinností od 1.4.2009
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, březen 2009

Kapitola 15 TKP

Osvětlení pozemních komunikací

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1
ze dne 20.4.2007, s účinností od 1. května 2007.
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120
ze dne 30.6.1998
Praha, prosinec 2006

Kapitola 16 TKP

Piloty a podzemní stěny

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1
ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, prosinec 2010

Kapitola 17 TKP

Zrušeno

Kapitola 18 TKP

Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č. j. 474/05-120-RS/1
ze dne 29.8.2005 s účinností od 1.10.2005, revize 1.10.2010
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č. j. 24894/96-120 ze dne 27.12.1996
Praha, srpen 2005

Kapitola 19 TKP

ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce

ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1
ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
a TP 84 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí
schválených MD-OPK, č.j.635/03-120-RS/1 ze dne 18. 12. 2003
Praha, březen 2008
ČÁST B-dodatek č.1 - Schváleno: MD-OPKÚP č. j. 586/2011-910-IPK/1
ze dne 29. 8. 2011 s účinností od 1. září 2011.
Praha, 2011

Kapitola 20 TKP

Pylony a mostní závěsy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2.2000
Praha, duben 2008

Kapitola 21 TKP

Izolace proti vodě

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1
ze dne 8.3.2010, s účinností od 1.4.2010
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD OPK č.j. 619/03-120-RS/1
ze dne 15.12.2003
Praha, leden 2010

Kapitola 22 TKP

Mostní ložiska

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD - OI, č.j. 653/07-910-IPK/1
ze dne 6. 8. 2007 s účinností od 1. září 2007
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21. 2. 2000.
Praha, duben 2007

Kapitola 23 TKP

Mostní závěry

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 653/ 07/910-IPK/1
ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007.
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21. 2. 2000
Praha, květen 2007

Kapitola 24 TKP

Tunely

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1
ze dne 20. 4.2007 s účinností od 1. května 2007.

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleno MD-OPK, č.j. 19811/99-120
ze dne 19.3.1999
Praha, prosinec 2006

Kapitola 25 TKP **Protihlukové clony**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1
ze dne 23.3.2009, s účinností od 1.4.2009
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, únor 2009

Kapitola 26 TKP **Postřiky a nátěry vozovek**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1
ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120
ze dne 19.3.1999
Praha, březen 2008

Kapitola 27 TKP **Emulzní kalové vrstvy**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1
ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120
ze dne 19.3.1999
Praha, březen 2008

Kapitola 28 TKP **Mikrokoberce prováděné za studena**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1

ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120
ze dne 19.3.1999
Praha, březen 2008

Kapitola 29 TKP **Zvláštní zakládání**

MINISTERSTVO DOPRAV
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1
ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1
ze dne 15.12.2003
Praha, prosinec 2010

Kapitola 30 TKP **Speciální zemní konstrukce**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1
ze dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 24610/97-120
Praha, prosinec 2009

Kapitola 31 TKP **Opravy betonových konstrukcí**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP
Schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120
Ze dne 19.3.1999
Praha, květen 2009

Distribuci TKP zajišťuje:
Pragoprojekt a.s.
K Ryšánce 16
147 54 Praha 4

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 4 – SOUPIS PRACÍ

DÍL 4, ČÁST 1 SOUPIS PRACÍ V TIŠTĚNÉ FORMĚ

Název zakázky: D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice - EXIT 34 Ostředek

Číslo: 02PT-001997

6/2014

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 4, ČÁST 2 SOUPIS PRACÍ V ELEKTRONICKÉ FORMĚ (FORMÁT *.xc4)

Název zakázky: D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice - EXIT 34 Ostředek

Číslo: 02PT-001997

6/2014

SEZNAM HODINOVÝCH SAZEB PROFESÍ

profese	přímé náklady dělníka v Kč/hod	% sazba režie a zisku	hodinová sazba v Kč
Asfaltér silniční			
Betonář stavebních konstrukcí			
Dlaždič			
Kameník			
Kladeč potrubí			
Klempíř			
Lešenář			
Montér ocelových konstrukcí			
Obkladač			
Pomocný dělník			
Stavební dělník			
Střelmistr			
Svářeč			
Tesař			
Truhlář stavební			
Zámečnick stavební			
Zedník			
Železář			

Místo a datum: _____

Podpis: _____

Poznámka: Uchazeč doplní další profese podle svých podmínek

SEZNAM HODINOVÝCH SAZEB STROJŮ

Název stroje (zařízení)	provoz staveb. strojů v Kč	% sazba režie a zisku	hodinová sazba v Kč
Rypadlo na sucho			
Dozer s rozrývačem			
Silniční fréza			
Recyklační fréza, záběr š 2m, h 25cm			
Skrejpr motorový			
Grejdr motorový			
Dokončovací stroj "GRADALL"			
Vibrační deska			
Vibrátory ponorné a přiložené			
Válec kombin.-hladký a ježkový			
Válec motorový hladký			
Vrtná souprava na pás.podvozku			
Beraniadlo vibrační			
Mobil.čerpadla na beton.směs			
Nákladní automobil 12t			
Nákladní automobil, nosnost korby min. 25t			
Vlek za nákladní automobil, nosnost korby min. 12t			
Tahač návěsů (nosnost korby návěsu nad 20t)			
Dampř, nosnost korby min. 40t			
Betonárka stabilní			
Automíchač			
Cisterna			
Nakladač na kol.podvozku			
Transportér			
Jeřáb mobilní			
Jeřáb stavební			
Finišer na asfaltové směsi š lišty min. 12,5m			
Finišer na asfaltové směsi š lišty do 10m			
Finišer na CB směsi š lišty min. 12,5m			
Značkovací stroj			
Čerpadlo			
Stroj na úpravu beton.konstr.			
Kompresor mobilní			
Ohýbačka výztuže			
Svářecí zařízení			
Drtička mobilní			
Řezačka vozovky a betonových konstrukcí			
Sbíjecí kladivo pneumatické			
Bourací kladivo			

Místo a datum: _____

SEZNAM CEN MATERIÁLŮ

Materiál (díllec)	m.j.	Pořizovací cena franco staveniště	% sazba režie a zisku	cena v Kč
Kamenivo těžené	m ³			
Kamenivo drcené	m ³			
Krajníky silniční	m			
Obrubníky chod.100/15/25	m			
Obrubníky chod.100/20/25	m			
Obrubníky záhonové	m			
Obrubníky kamenné	m			
Příkopové tvárnice š.60 cm	m			
Příkopové tvárnice š.102 cm	m			
Štěrbínové trouby I.G	m			
Štěrbínové trouby I.A 12	m			
Vpust pro štěrbin.žlab	kus			
Čistící kus štěrbin.žlabu	kus			
Cement balený	t			
Čerstvý beton C 12,5	m ³			
C 12/15-XO	m ³			
C 20/25-XF2	m ³			
C 20/25-XF4	m ³			
C 25/30-XF2	m ³			
C 25/30-XF4	m ³			
C 30/37-XF2	m ³			
C 30/37-XF4	m ³			
Mech. zp. kamenivo MZK	m ³			
Kamenivo zp.cement.KSC I	m ³			
Cementová stabilizace SC I	m ³			
Cementová stabilizace SC II	m ³			
Silniční beton	m ³			
Asfaltová modifik.zálivka	t			
Asfaltové směsi AKT (BBTM)	t			
AB ložní modif.(ACL 16)	t			
AB ložní (ACL 16)	t			
AB obrus.modif.(ACO 16)	t			
AB obrus.(ACO 16)	t			
ABVH modif.(ACL 22)	t			
ABVH (ACL 22)	t			
ABS I (ACO 11)	t			
ABS II (ACO 11)	t			
ABS I modif.(ACO 11)	t			
AKMS I modif.(SMA 11)	t			
OK I (VMT 22)	t			
Litý asfalt MA 11 (LAS)	t			
Litý asfalt MA 11 modif. (LAS)	t			
Postřik infiltr. emulzní do 1,0 kg/m ²	m ²			
Postřik spoj.emulzní do 0,5 kg/m ²	m ²			

Ocel betonářská 10425	t
Ocel betonářská 10505	t
Předpínací výztuž	t
Trouby kanal.PVC DN 150	m
Trouby kanal.PVC DN 200	m
Trouby kanal.PVC DN 300	m
Trouby kanal.PVC DN 400	m
Trouby kanal.PVC DN 500	m
Trouby kanal.PVC DN 600	m
Trouby kanal.PVC DN 800	m
Trouby betonové DN 300	m
Trouby betonové DN 400	m
Trouby betonové DN 600	m
Trouby betonové DN 800	m
Trouby betonové DN 1000	m
Trouby betonové DN 1200	m
Trouby ocelové DN 100	m
Trouby ocelové DN 150	m
Trouby ocelové DN 300	m
Nátěr.hmoty na beton.k-ce	kg
Řezivo z jehličnatých dřevin	m ³
Kovové konstrukce nosné	t
Zábradlí ocelové silniční	kg
Zábradlí ocelové mostní	kg
Svodidla jednostranné ocelové H1	m
Svodidla jednostranné ocelové H2	m
Svodidla jednostranné ocelové N2	m
Svodidla oboustranné ocelové H3	m
Lanové svodidlo	m
Zábradelní svodidlo	m
Svodidla betonové 100 cm	m
Svodidla betonové 120 cm	m
Geotextilie netkaná 400 gr	m ²
Geotextilie netkaná 600 gr	m ²
Geotextilie výztužná	m ²
Izolační souvrství mostovky	m ²
Mostní závěry elastické	m ³
Mostní závěry podpovrchové	m
Most.závěry povrch.100 mm	m
Most.závěry povrch.160 mm	m
Most.závěry povrch.240 mm	m
Most.závěry povrch.720 mm	m
Dílce a části kovové lehké	t

Místo a datum: 26.9.2022

Poznámka: Uchazeč doplní další materiály podle svých podmínek

EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL

Stavba: D1-U03-konsolid - D1 MODERNIZACE, ÚSEK 03, EXIT 29 HVĚZDONICE – EXIT

Varianta: var. 1 -

Typ	Výsledek	Soubor	Věta	Položka	Chybná h.	Správná h.
1. Kontrola struktury XC4	splněno					
2. Právě jedna stavba v importu	splněno					
3. Kontrola duplicit	splněno					
4. Kontrola objektové skladby	splněno					
5. Kontrola duplicit položek krycího listu	splněno					
6. Kontrola položek krycího listu	splněno					
7. Spárování měrných jednotek	splněno					
Data jsou platná! EXPORT POVOLEN						
Celková cena varianty:		549 424 016,30 Kč				

Vypracoval: ..

Podpis: ..

Místo:
2014Datum:
2014

EXPORT NABÍDKY

Stavba: D1-U03-konsolid - D1 MODERNIZACE, ÚSEK 03, EXIT 29 H

Varianta: var. 1 -

Datum exportování nabídky: 1.12.2014

Investor:

Cena stavebních prací:	549 424 016,30 Kč
------------------------	-------------------

DPH:	115 379 043,42 Kč
------	-------------------

Cena stavebních prací včetně DPH:	664 803 059,72 Kč
-----------------------------------	-------------------

Cena celkem:	549 424 016,30 Kč
--------------	-------------------

DPH:	115 379 043,42 Kč
------	-------------------

Cena celkem včetně DPH:	664 803 059,72 Kč
-------------------------	-------------------

Soupis objektů

Stavba: D1-U03-konsolid - D1 MODERNIZACE, ÚSEK 03, EXIT 29 HVĚZDONICE – EXIT

Varianta: var. 1 -

Nabídková cena [Kč] 549 424 016,30
Odbytová cena [Kč] 549 424 016,30

Objekt	Popis	Nabídková cena	OC
SO 03-000	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		
SO 03-101	DÁLNICE D1 KM 29,500 – 34,100		
SO 03-130	SILNICE II/110 V KM 33,849		
SO 03-131	SILNICE III/1107 V KM 32,466		
SO 03-172	DIO		
SO 03-173	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		
S 201	PŘESYPANÝ MOST EV. Č. D1-036		
SO 03-202	MOST EV. Č. D1-037		
SO 03-221	NADJEZD EV. Č. D1-038		
SO 03-250	ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 32,780 VPRAVO		
SO 03-260	PHS U OBCE BĚLČICE		
SO 03-301	KANALIZACE D1 V KM 29,555 - 34,100		
SO 03-421	Přeložka napájecího kabelu NN v km 33,701		
SO 03-422	Ochrana kabelů NN v km 30,600 a km 32,400		
SO 03-451	Ochrana kabelu Telefonica O2 v SDP dálnice D1		
SO 03-452	Přeložky kabelů Telefonica O2 v km 32,460		
S -491	Dálniční systém SOS - kabelové vedení		
SO 03-492	Dálniční systém SOS - hlásky		
SO 03-493	Dálniční systém SOS - šachty a prostupy		
SO 03-494	Dálniční systém SOS - trubky pro optické kabely		
SO 03-495	Dálniční systém SOS - meteostanice		
SO 03-496	Dálniční systém SOS - automatický sčítač dopravy		
SO 03-497	Dálniční systém SOS - kamerový dohled		
SO 03-498	Dálniční systém SOS - optický kabel DIS		
SO 03-801	VEGETAČNÍ ÚPRAVY		

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.2 ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), zejména že jsme neuzavřeli a neuzavíráme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice - EXIT 34 Ostředek“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 377347 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoli zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na

jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoli získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatel o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Praze dne 14.04.2015

Metrostav a.s.

Metrostav a.s.

DÍL 1, ČÁST 4

FORMULÁŘ 4.4.2

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: SWIETELSKY stavební s.r.o., ,

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby
VÝCHOD

se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

IČ: 480 35 599

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice - EXIT 34 Ostředek“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 377347 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Pelhřimově dne 20.4.2015

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.2 ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: Společnost HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem: Plzeňská 6/3217, Praha 5, PSČ 150 00

IČ: 46678468, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice - EXIT 34 Ostředek“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 377347 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Praze dne 16.4.2015

HOCHTIEF CZ a. s.

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.5
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

„Společnost MTS + SWIETELSKY+HOCHTIEF, D1 úsek 03, Hvězdovice - Ostředek
Název veřejné zakázky: „D1 MODERNIZACE - ÚSEK 03, EXIT 29 HVĚZDOVICE - EXIT 34
OSTŘEDEK“

Společnost Metrostav a.s.,
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8,
IČ: 00014915,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758,

jakožto účastník Společnosti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D1
MODERNIZACE - ÚSEK 03, EXIT 29 HVĚZDOVICE - EXIT 34 OSTŘEDEK“, ev. č. dle
Věstníku veřejných zakázek 377347 (dále jen „uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy
materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Balené směsi asfaltové		
Suť z vybourané betonové vozovky		
Kamenné obruby		
Zámková dlažba		
Lomený kámen		
Ocelová svodidla		
Ostatní ocel		
Svodidlo New Jersey		

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený
materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém
množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého
množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceny uvedené v tabulce shora.
Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého
materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na
přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč
tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat
odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit
a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Praze dne 14.04.2015

Metrostav a.s.
(na základě plné moci za Společnost)

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.6
PROGRAM PRACÍ, ČASOVÝ PLÁN, SCHÉMA STAVENIŠTĚ
A ROZDĚLENÍ PRACÍ

„Společnost MTS + SWIETELSKY + HOCHTIEF, D1 úsek 03, Hvězdovice - Ostředek“

Společnost Metrostav a.s.,
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8,
IČ: 00014915,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758,

jakožto účastník Společnosti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D1 MODERNIZACE - ÚSEK 03, EXIT 29 HVĚZDOVICE - EXIT 34 OSTŘEDEK“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 377347 (dále jen „uchazeč“), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / živice), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto dokumentu,
2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích: viz. příloha,
3. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Všeobecných obchodních podmínkách ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané subdodavateli	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)
Překládka sítě elektronických komunikací	O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4	0,01%	Viz. příloha
Zhotovení živičných vrstev	BES s.r.o. Sukova 625, 256 01 Benešov	4,19% (vlastní kapacity)	Viz. příloha
CELKEM %		4,20%	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Praze dne 14.04.2015

Metrostav a.s.
(na základě plné moci za Společnost)

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS.

POSTUP PRACÍ

Zhotovitel předpokládá, že realizaci výše uvedeného úseku bude provádět v intencích zadávací dokumentace a dodatků k této dokumentaci, které byly obdrženy v zadávací lhůtě. Hrubý nástin postupu prací je uveden v ZOV a SO 03 172.1 – DIO. Zhotovitel předpokládá, že tento postup a základní principy vedení dopravy – tzn. 2+2 budou dodrženy.

Obecně je možné výstavbu rozdělit do základních 6 etap (resp. u některých etap dojde k rozdělení na podetapy). Časový průběh jednotlivých fází je zřejmý z Harmonogramu prací, který je přílohou Nabídky.

Stručný popis jednotlivých etap:

0. etapa

Prodloužení stávajícího přejezdu SDP v km 32,600 – 32,668 na 80 m (tj. do km 32,680). Doprava bude vedena v obou směrech 2 jízdními pruhy s využitím zpevněné krajnice. Rychlé pruhy budou uzavřeny. Dále proběhnou opravy vozovky před stavbou (SO 101.3). Tyto práce budou probíhat za operativních dopravních opatření. Zároveň se provizorně rozšíří LJP na šířku 11,5 m v místě před úsekem 03 k nejbližšímu přejezdu SDP (29,236 – 29,368).

1.A etapa

Celkově bude během 1. etapy snesen nadjezd D1-038 v MÚK Ostředek. Jednotlivé podetapy jsou krátkodobého charakteru, avšak s výrazným dopadem na dopravu a dopravní omezení. V této etapě budou probíhat přípravné práce na mostním objektu, provoz na mostě (sil. II/110) bude uzavřen, současně bude připravena v PJP ochranná vrstva pro snesení nadjezdu. Doprava bude vedena v levém jízdním pásu v režimu 2 + 1 jízdní pruh. Pro převedení dopravy do protisměru budou využity přejezdy v km 32,600 – 32,680 a 34,220 – 34,317. V kombinaci s etapou 2.A bude ponechán 1 jízdní pruh ve směru na Brno.

1.B etapa

Během této etapy dojde ke snesení nadjezdu D1-038 a následné odklizení jeho zbývajících částí z LJP. Dálnice budu po celou dobu této etapy v tomto úseku uzavřena.

1.C etapa = 1. A etapa

V této etapě budou probíhat dokončovací práce na odklizení zbylých částí nadjezdu z PJP. Doprava bude vedena v levém jízdním pásu v režimu 2 + 1 jízdní pruh. Pro převedení dopravy do protisměru budou využity přejezdy v km 32,600 – 32,680 a 34,220 – 34,317. V kombinaci s etapou 2.A bude ponechán 1 jízdní pruh ve směru na Brno.

2.A etapa

Během této etapy dojde k provizornímu rozšíření PJP o 0,75 m na potřebnou šířku zpevnění 11,50 m. Provoz bude veden v každém směru dvěma zúženými jízdními pruhy na minimální šířky 2,5 a 3,25 m(+2 x 0,50 m bezp. odstup)

2.B etapa

V této etapě se provedou práce v SDP a to provizorní přeložka kabelu TO2, modernizace kanalizace, betonáž pilíře v SDP, pravé opěry nadjezdu. Po modernizaci kanalizace se

provede definitivní uložení kabelů v SDP dle zásad uvedených v PD. Provoz bude veden v každém směru dvěma pomocnými jízdními pruhy při vnějším okraji zpevnění.

3. etapa

V této etapě bude probíhat kompletní modernizace poloviny dálnice vlevo ve směru staničení (tj. směr na Prahu). Současně s modernizací LJP bude modernizován i levý dálniční most (D1-037). Provoz bude převeden na levý jízdní pás dálnice. Celý úsek pracovního místa bude od provozu oddělen stabilním nebo přenosným záchytným bezpečnostním zařízením (svodidlem) betonovým nebo ocelovým se stupněm zadržení min. H1.

4. etapa


V této etapě bude probíhat kompletní modernizace poloviny dálnice vpravo ve směru staničení (tj. směr na Brno), modernizace levého dálničního mostu (D1-037) a dokončí se modernizace nadjezdu (D1-038) a zprovozní se nadjezd v MÚK Ostředek. Provoz bude převeden na zmodernizovaný levý jízdní pás dálnice. Celý úsek pracovního místa bude od provozu oddělen stabilním nebo přenosným záchytným bezpečnostním zařízením (svodidlem) betonovým nebo ocelovým se stupněm zadržení min. H1.

5. etapa


V této etapě budou probíhat dokončovací práce v SDP.

MODERNIZACE - ÚSEK 03, EXIT 29 HVĚZDOMICE - EXIT 34 OSTŘEDEK

ÚLAGE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

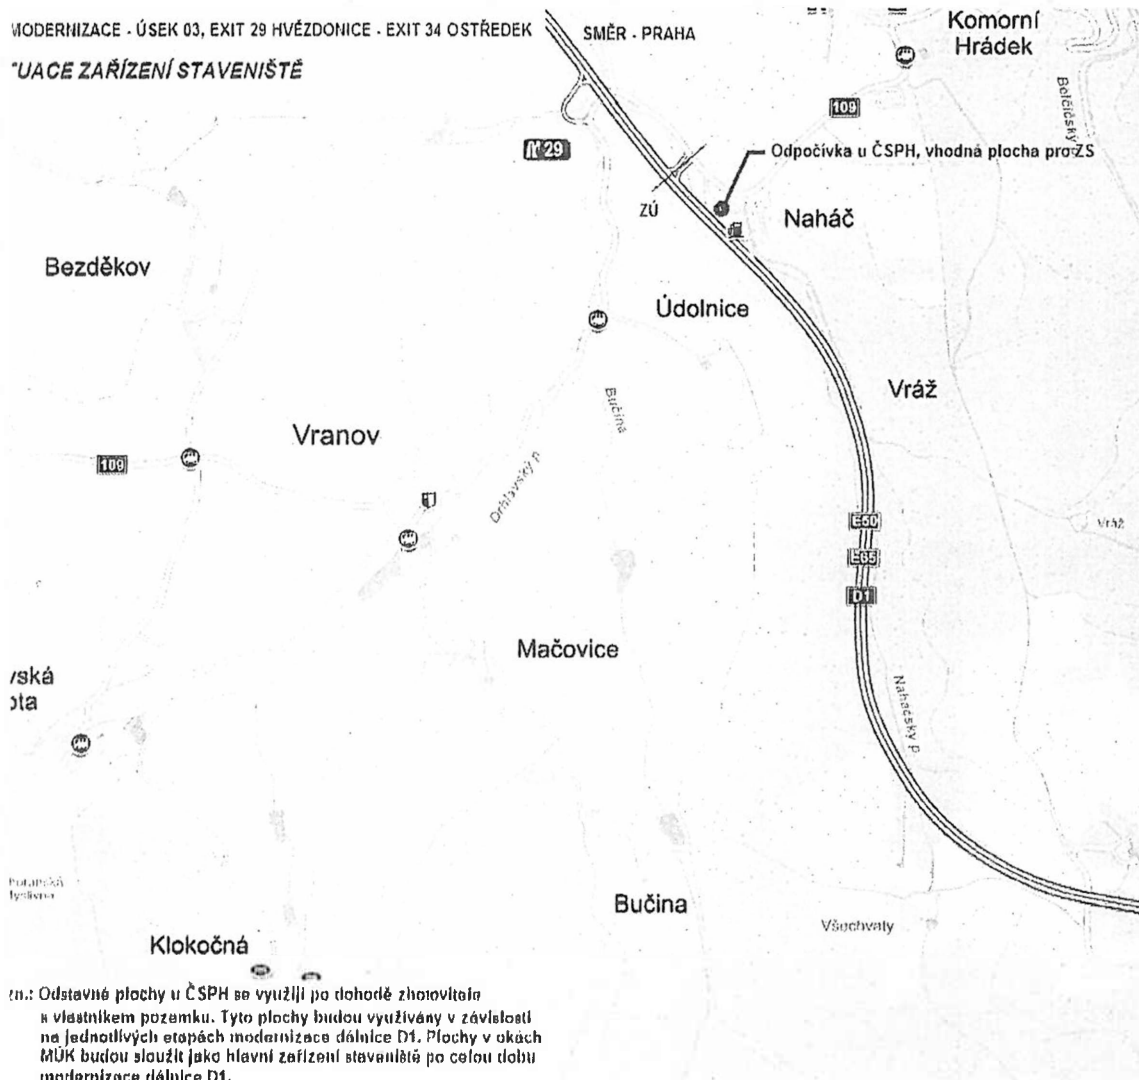

zn.: Odstavné plochy u ČSPH se využijí po dohodě zhotovitele a vlastníkem pozemku. Tyto plochy budou využívány v závislosti na jednotlivých etapách modernizace dálnice D1. Plochy v okáčích MUK budou sloužit jako hlavní zařízení staveniště po celou dobu modernizace dálnice D1.

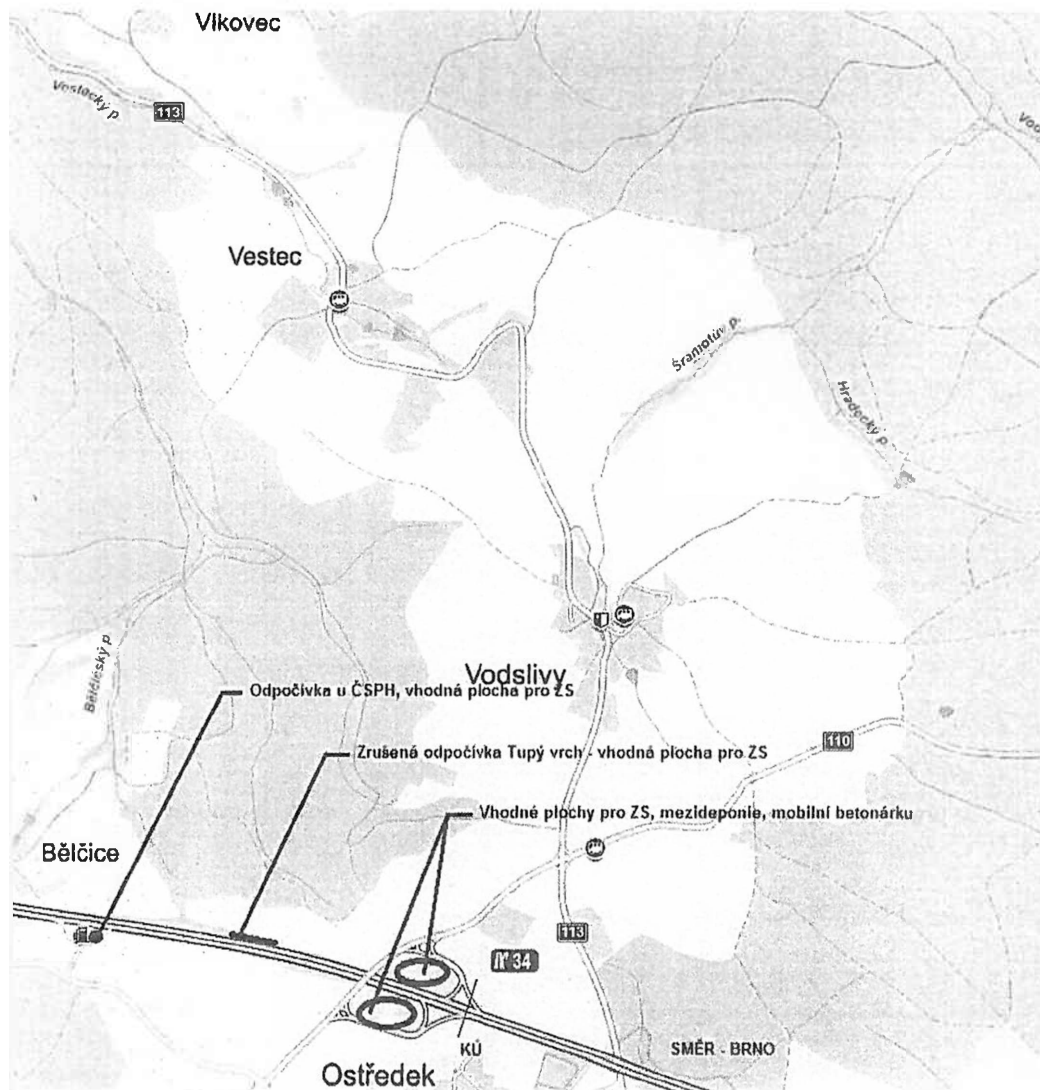

Finanční harmonogram stavby D1 MODERNIZACE - ÚSEK 03, EXIT 29 HVĚZDONICE - EXIT 34 OSTŘEDEK

Finanční harmonogram dle objektů	Rok Kvartál	2015				2016		
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.
Objekt								
Objekty řady 000								
Objekty řady 100								
Objekty řady 200								
Objekty řady 300								
Objekty řady 400								
Objekty řady 800								
SUMA		549 424 016,30						

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.7
SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS

„Společnost MTS + SWIETELSKY+HOCHTIEF, D1 úsek 03, Hvězdovice - Ostředek“

Společnost Metrostav a.s.,
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8,
IČ: 00014915,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

jakožto účastník Společnosti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D1 MODERNIZACE - ÚSEK 03, EXIT 29 HVĚZDONICE - EXIT 34 OSTŘEDEK“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 377347 (dále jen „uchazeč“), tímto s ohledem na povinnost zhotovitele zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 4.34 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek, a to zejména z hlediska její věcné správnosti a souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a smlouvou o dílo (včetně zejména technických podmínek), uvádí, že na výstupní kontrole realizační dokumentace stavby (RDS) se bude podílet následující osoba:

Název / jméno	IČ / datum narození	Sídlo / bydliště
Metrostav a.s.	00014915	Koželužská 2450/4, 180 0 Praha 8

Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby (RDS) uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna.

V Praze dne 14.04.2015

Metrostav a.s.
(na základě plné moci za Společnost)

Systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby

Realizační dokumentace stavby (RDS) je z pozice zhotovitele kontrolována ještě před odevzdáním konceptu RDS. Projektant realizační dokumentace stavby předá pro tyto účely zhotoviteli paré dokumentace, do které jsou případné nedostatky vyznačeny, případně popsány. Paré dokumentace pro kontrolu zhotovitelem, předá projektant RDS odpovědné osobě zhotovitele (která má příslušnou odbornou způsobilost ke kontrole RDS) pět pracovních dní před termínem vydání čístopisu, z toho tři dny je na provedení kontroly zhotovitelem a dva dny na zapracování připomínek projektantem RDS. Dokumentace je následně předána zpět projektantovi s průvodním dopisem. Projektant následně nedostatky upraví a vydá koncept RDS, který je již připomínkován pouze objednatelem Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Zhotovitel kontroluje zda-li je dokumentace v souladu se smluvními podmínkami (ČSN, TKP, ZTKP, a další smluvní dokumenty), zda-li je technické řešení technologicky proveditelné a jestli obsahuje veškeré formální náležitosti dle souhrnu smluvních dohod.

Kontrolu RDS provádí technické oddělení zhotovitele osobami s požadovanými autorizacemi. Nezávislou kontrolu RDS budou provádět tyto osoby v zaměstnaneckém poměru zhotovitele:

- autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby
- autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce
- autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb

V Praze dne 14.04.2015

Metrostav a.s.
(na základě plné moci za Společnost)

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.8
ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ

Obchodní firma vedoucího účastníka: Metrostav a.s.

Sídlo vedoucího účastníka: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 00014915, DIČ CZ00014915

Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

Telefon / Fax

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky):
netýká se

Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: [bude doplněno]

Telefon / Fax [bude doplněno] / [bude doplněno]

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku

Metrostav a.s. – správce

ii) SWIETELSKY stavební s.r.o. – společník iii) HOCHTIEF, a.s. - společník

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku:

„Společnost MTS + SWIETELSKY+HOCHTIEF, D1 úsek 03, Hvězdonic - Ostředek“
Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně, a dále, že vedoucí účastník sdružení bude oprávněn jednat za všechny ostatní účastníky sdružení a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních účastníků, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi účastníky sdružení bude odpovědností vedoucího účastníka sdružení („Smlouva“)

i) Datum uzavření: 02.12.2014

ii) Místo: Praha, Pelhřimov

iii) Příloha – Smlouva, plná moc

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci zakázky (v %) s uvedením druhu prací, které budou provedeny každým z nich

Metrostav a.s. – 55% - CB kryt, mosty

SWIETELSKY stavební s.r.o. – 30% - konstrukční vrstvy vozovek,

HOCHTIEF – 15% - zemní práce

V Praze dne 14.04.2015

Metrostav a.s.

(na základě plné moci za Společnost)

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.11
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

„Společnost MTS + SWIETELSKY+HOCHTIEF, D1 úsek 03, Hvězdovice - Ostředek“

Společnost Metrostav a.s.,
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8,
IČ: 00014915,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D1 MODERNIZACE - ÚSEK 03, EXIT 29 HVĚZDONICE - EXIT 34 OSTŘEDEK“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 377347 (dále jen „uchazeč“), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o dílo	Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky
1.	Netýká se	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
2.	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či

obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o dílo	Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky
1.	Netýká se	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
2.	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy o dílo poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v čl. 17.5 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Praze dne 14.04.2015

Metrostav a.s.
(na základě plné moci za Společnost)

PLNÁ MOC

HOCHTIEF CZ a. s.

IČ: 46678468, DIČ: CZ46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229.
zastoupena

jakožto zmocnitel

zmocňuje tímto:

obchodní společnost **Metrostav a.s.**, Praha 8, Koželužská 2450/4, 180 00, IČ 00014915, DIČ CZ00014915
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupena

jakožto zmocněnce

a správce společnosti s názvem „Společnost MTS + SWIETELSKY+ HOCHTIEF, D1 úsek 03, Hvězdovice - Ostředek“ vzniklé na základě společenské smlouvy uzavřené mezi zmocněncem, zmocnitelem a obchodní společností SWIETELSKY stavební s.r.o., dne 07. 11. 2014 (dále též jen „Společnost“) ke všem jednáním a úkonům, kterými bude zavazovat společníky Společnosti a tedy i zmocnitele v souvislosti:

1. s účastí Společnosti jakožto uchazeče v otevřeném zadávacím řízení na zhotovení stavby „**D1 modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice – EXIT 34 Ostředek**“, včetně podpisu a předložení nabídky, podávání námitek proti úkonům zadavatele, návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele a dalších opravných prostředků. Smlouvu o dílo do realizace podepíší všichni společníci.
2. ke všem jednáním, kterými bude zavazovat zmocnitele jakožto společníka Společnosti v souvislosti s realizací stavby „**D1 modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice – EXIT 34 Ostředek**“
3. k veškerým jednáním, provádění úkonů a jejich podpisu, které jsou potřebné k naplnění účelu vzniku Společnosti, k účasti Společnosti v předmětném shora uvedeném zadávacím řízení, jakož i ke zhotovení stavby „**D1 modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice – EXIT 34 Ostředek**“ a dále k přijímání pokynů a plnění od zadavatele pro zmocnitele.

Za zmocnitele v Praze dne: 02. 12. 2014

HOCHTIEF CZ a. s.

Zmocnění v celém rozsahu za Metrostav a.s. přijímám:

V Praze dne: 02. 12. 2014

Metrostav a.s.

PLNÁ MOC

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599, se sídlem K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 8032, zastoupena:

jakožto zmocnitel

zmocňuje tímto:

obchodní společnost **Metrostav a.s.**, Praha 8, Koželužská 2450/4, 180 00, IČ 00014915, DIČ CZ00014915 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupenou,

jakožto zmocněnce

a správce společnosti s názvem „Společnost MTS + SWIETELSKY+ HOCHTIEF, D1 úsek 03, Hvězdovice - Ostředek“ vzniklé na základě společenské smlouvy uzavřené mezi zmocněncem, zmocnitelem a obchodní společností HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ 46678468, dne 07. 11. 2014 (dále též jen „Společnost“) ke všem jednáním a úkonům, kterými bude zavazovat společníky Společnosti a tedy i zmocnitele v souvislosti:

1. s účastí Společnosti jakožto uchazeče v otevřeném zadávacím řízení na zhotovení stavby „**D1 modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice – EXIT 34 Ostředek**“, včetně podpisu a předložení nabídky, podávání námitek proti úkonům zadavatele, návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele a dalších opravných prostředků. Smlouvu do realizace podepíší všichni společníci.
2. ke všem jednáním, kterými bude zavazovat zmocnitele jakožto společníka Společnosti v souvislosti s realizací stavby „**D1 modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice – EXIT 34 Ostředek**“
3. k veškerým jednáním, provádění úkonů a jejich podpisu, které jsou potřebné k naplnění účelu vzniku Společnosti, k účasti Společnosti v předmětném shora uvedeném zadávacím řízení, jakož i ke zhotovení stavby „**D1 modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice – EXIT 34 Ostředek**“ a dále k přijímání pokynů a plnění od zadavatele pro zmocnitele.

Za zmocnitele v Pelhřimově dne: 02.12.2014

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnění v celém rozsahu za Metrostav a.s. přijímám:

V Praze dne: 02.12.2014

Metrostav a.s.



Metrostav a.s., divize 4

PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, identifikační číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, jejímž jménem jedná představenstvo společnosti jednající

jen "zmocnitel"), tímto zplnomocňuje:

(dále jen „zmocněnec“)

ke všem úkonům a jednáním, kterými bude zavazovat zmocnitele a dále v rozsahu oprávnění zmocnitele zavazovat též ostatní společníky sdružené ve společnosti vystupující pod názvem „Společnost MTS + SWIETELSKY + HOCHTIEF, D1 úsek 03, Hvězdnice - Ostředek“, v souvislosti s účastí v otevřeném řízení na zhotovení stavby „**D1 modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice – EXIT 34 Ostředek**“ a to zejména k podpisu smlouvy o dílo, která je součástí nabídky, k podpisu, předložení nabídky a dalších souvisejících dokumentů, k podpisu smluv o budoucí spolupráci, k podání námitek proti úkonům zadavatele, k podání návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele a dalších opravných prostředků jako i dalším úkonům ve věci veřejné zakázky „**D1 modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice - EXIT 34 Ostředek**“.

V Praze dne 30.10.2014

Metrostav a.s.

Metrostav a.s.

V Praze dne 30.10.2014

zmocnění přijímám:



Metrostav a.s., divize 4

PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, identifikační číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, jejímž jménem jedná představenstvo společnosti jednající

jen "zmocnitel"), tímto zmocňuje:

(dále jen „zmocněnec“)

ke všem úkonům a jednáním, kterými bude zavazovat zmocnitele a dále v rozsahu oprávnění zmocnitele zavazovat též ostatní společníky sdružené ve společnosti vystupující pod názvem „Společnost MTS + SWIETELSKY + HOCHTIEF, D1 úsek 03, Hvězdnice - Ostředek“, v souvislosti s účasti v otevřeném řízení na zhotovení stavby „**D1 modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice – EXIT 34 Ostředek**“ a to zejména k podpisu smlouvy o dílo, která je součástí nabídky, k podpisu, předložení nabídky a dalších souvisejících dokumentů, k podpisu smluv o budoucí spolupráci, k podání námitek proti úkonům zadavatele, k podání návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele a dalších opravných prostředků jako i dalším úkonům ve věci veřejné zakázky „**D1 modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice - EXIT 34 Ostředek**“.

V Praze dne 30.10.2014

Metrostav a.s.

Metrostav a.s.

V Praze dne 30.10.2014 zmocnění přijímám:

D O D A T E K č. 1

28. OPRAVIL :

Souhrnu smluvních dohod (Smlouvy o dílo) ze dne 30.4.2015 na zhotovení díla, tj. stavby D1
MODERNIZACE - ÚSEK 03 EXIT 29 HVĚZDONICE - EXIT 34 OSTŘEDEK
č. stavby v ISPROFIN: 5211550018,
č. sml. objednatele 02PT-001997, zhotovitele D4/13/2015

Smluvní strany:

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR – státní příspěvková organizace

se sídlem: Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4

za niž jedná:

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen **Objednatel**) na straně jedné

a

Zhotovitel:

"Společnost MTS + SWIETELSKY + HOCHTIEF, D1 úsek 03, Hvězdonic - Ostředek"

Doručovací adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Účastníci společnosti:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 758
kterou zastupuje:

a

SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Východ, K Silu 1143, 393 01
Pelhřimov

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032
kterou zastupuje:

a

HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229
kterou zastupuje:

(dále jen **Zhotovitel**) na straně druhé,

se v souvislosti s realizací stavby „**D1 MODERNIZACE - ÚSEK 03 EXIT 29 HVĚZDONICE - EXIT 34 OSTŘEDEK**“ dohodly na níže uvedených změnách uzavřené Smlouvy o dílo

takto:

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- A. V důsledku prodloužení výběrového řízení na zhotovitele stavby z důvodu uplatňování marných opravných prostředků ze strany neúspěšných uchazečů nemohla být realizace díla zahájena podle původních předpokladů ze zadávací dokumentace a nabídky, tzn. k 03/2015;
- B. Zahájení prací podle předpokladů zadávací dokumentace a nabídky po předání staveniště brání provádění prací na opravách havarijních stavů mostů evidenční číslo D1-035.1 a D1-035.2, jenž jsou v těsné blízkosti stavby a limitují postup a průběh některých prací na stavbě. Dopravní opatření na dálnici D1 přijaté v souvislosti prováděním prací na opravě havarijního stavu mostu evidenční číslo D1-035.1 limitující práce na stavbě bude ukončeno nejpozději do 12.5.2015. Dopravní opatření na dálnici D1 přijaté v souvislosti prováděním prací na opravě havarijního stavu mostu evidenční číslo D1-035.2 limitující práce na stavbě bude ukončeno nejpozději do 8.6.2015;
- C. Smluvní strany mají zájem z důvodu právní jistoty reflektovat dopady shora popsanych skutečností na termíny realizace díla a zároveň tím i následně přispět ke zmírnění negativních dopadů realizace stavby na obyvatele výstavbou dotčených obcí;

uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“).

I.

- 1. Při zohlednění skutečností uvedených v Preambuli se smluvní strany domluvily na změně lhůt realizace stavby následovně:
 - i) **Doba pro uvedení stavby do provozu** ve smyslu čl. 1.1.3.10 Obchodních podmínek stanovená v Příloze v nabídce se mění na 12 měsíců (do těchto 12ti měsíců se nezapočítává období zimní technologické přestávky od 1.11. do 31.3. a období vynuceného omezení prací od 1.10.2015 do 31.10.2015 dle přílohy č.1) a stanovuje se na nejpozději:

do 31.10.2016

- ii) **Doba pro dokončení stavby** ve smyslu čl. 1.1.3.3 Obchodních podmínek stanovená v Příloze v nabídce se mění na 14 měsíců (do těchto 14ti měsíců se nezapočítává období zimní technologické přestávky od 1.11. do 31.3. a období vynuceného omezení prací od 1.10.2015 do 31.10.2015 dle přílohy č.1) a stanovuje se na nejpozději:

do 31.5.2017

- iii) **Postupné závazné milníky** ve smyslu čl. 4.35 Obchodních podmínek stanovené v Příloze v nabídce se mění a stanovují se na:

- a) dokončení prací v rozsahu odpovídajícím etapám 0,1,2,2A,2B dle zásad organizace výstavby PDPS do 31.10.2015
 - b) dokončení prací v rozsahu odpovídajícím etapě 3 dle zásad organizace výstavby PDPS a uvedení levého jízdního pásu do provozu se mění na 9 měsíců (do těchto 9ti měsíců se nezapočítává období zimní technologické přestávky od 1.11. do 31.3. a období vynuceného omezení prací od 1.10.2015 do 31.10.2015 dle přílohy č.1) a stanovuje se na nejpozději do 31.7.2016.
2. Předpokládaný časový průběh a předpoklady postupu prací podle jednotlivých etap jsou podrobněji graficky zobrazeny v Harmonogramu, jenž tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
 3. Při dohodě na úpravách lhůt realizace uvedených v čl. I odst. 1 a 2 tohoto dodatku byly smluvními stranami zohledněny zimní technologická přestávka a vynucené omezení prací na stavbě bezprostředně předcházející zimní technologické přestávce.
 4. Ve snaze zmírnit dopady výstavby na obyvatele obcí dotčených výstavbou umožní objednatel krátkodobé uzavírky (zejména 2 uzavírky pro montáž nosníků nosné konstrukce mostu v nočních hodinách, operativní částečné jednodenní uzavírky přes den (předpokládaný počet 4) omezující provoz jednoho jízdního pruhu pro demontáž bednění říms nosné konstrukce mostu) v zimním období na dálnici D1 za účelem realizace prací na nadjezdu v MÚK Ostředek a souvisejících objektů (SO 03-221.2 a 03-130), aniž by tyto práce byly započítány do dob stanovených v čl. I bodě 1. Tímto opatřením bude umožněno vedení dopravy po zrealizovaném nadjezdu v MÚK Ostředek dříve než podle původních předpokladů, **tzn. ještě před dokončením etapy 3 stavby** a umožní se tak zkrácení zatěžování obce Ostředek, přes kterou musí být v průběhu stavby vedeny objízdné trasy.
 5. Smluvní strany se dále domluvily, že zhotovitel nebude uplatňovat po objednateli finanční nároky, jenž mu vznikly nebo mohly vzniknout v důsledku skutečnosti uvedených v bodech A) a B) Preambule Dodatku vyplývající z prodloužení dob realizace stavby uvedených v čl. I tohoto Dodatku. Smluvní strany se dále dohodly, že v důsledku skutečnosti uvedených v bodech A) a B) Preambule Dodatku vyplývající z prodloužení dob realizace stavby uvedených v čl. I tohoto Dodatku se nepoužije čl. 2.7 Obchodních podmínek.

II.

1. Veškeré ostatní podmínky stanovené ve Smlouvě o dílo nezměněné tímto Dodatkem včetně jeho příloh nejsou tímto Dodatkem dotčeny a zůstávají beze změn.

2. Tento Dodatek je vyhotoven v 8 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 výtisky obdrží Objednatel a 6 Zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

Přílohy:

1. Harmonogram postupu prací podle jednotlivých etap

Za Objednatele: 20 -05- 2015

Datum:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za Zhotovitele : 15 -05- 2015

Datum:

Metrostav, a.s.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

HOCHTIEF CZ a. s.

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předschůdky	Poznámky
1	D1-03 Hvězdonic - Ostředek	763 dny	30.4.15	31.5.17		
2	Přodání staveníště	0 dny	30.4.15	30.4.15		
3	Odstranění DIO D1-035.1 PJP (ŘSD)	0 dny	12.5.15	12.5.15		
4	Povolení MD-ČR realizovat DIO E0.1	0 dny	20.5.15	20.5.15		
5	Etapa 0.1	20 dny	20.5.15	8.6.15	4	Provizorní úpravy a opravy, provizorní rozšíření - 1 část
6	Odstranění DIO D1-035.2 LJP (ŘSD)	0 dny	8.6.15	8.6.15		
7	Etapa 2.1	28 dny	9.6.15	3.7.15	6FS+1 den	1. část SDP ZÚ - SO 202, provizorní rozšíření - 2 část
8	Etapa 1	7 dny	30.6.15	6.7.15	7SS+21 dny	SO 221.1 (demonice nadjezdu MÚK Ostředek)
9	Etapa 2.2	69 dny	7.7.15	13.9.15	8,7	SDP ZÚ-KÚ
10	Etapa 0.2	17 dny	14.9.15	30.9.15	9	Provizorní úpravy a opravy, provizorní rozšíření - 3. část
11	Vynucení omezení prací	31 dny	1.10.15	31.10.15	10	Nemožnost zahájení Etapy 3
12	Zmíně technologická přestávka	152 dny	1.11.15	31.3.16		
13	SO 221.2	323 dny	14.7.15	31.5.16	BSS+7 dny	Nadjezd MÚK Ostředek (montáž nosníků v E2.2[9], realizace v průběhu VOP[11]+ZTP[12])
14	SO 130	75 dny	18.3.16	31.5.16	13FF	Přeložka silnice II/110 (realizace v průběhu ZTP[12])
15	Etapa 3	105 dny	1.4.16	14.7.16	12	Modernizace LJP (směr Praha)
16	Etapa 4	95 dny	15.7.16	17.10.16	15	Modernizace PJP (směr Brno)
17	Etapa 5	14 dny	18.10.16	31.10.16	16	Dokončovací práce SDP (po zprovoznění D1)
18	Zmíně technologická přestávka	151 dny	1.11.16	31.3.17		
19	Dokončovací práce	61 dny	1.4.17	31.5.17	18	Dokončovací práce (po zprovoznění D1)

Projekt: D1-03 Hvězdonic - Ostředek

Úkol: Rozšíření Průběh Mílník Souhrnný Souhrnný projekt Vnější úkoly Vnější mílník Úkol

strana 1 (celkem 1)

D O D A T E K č. 2

Souhrnu smluvních dohod (Smlouvy o dílo) ze dne 28.4.2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.05.2015, na zhotovení díla, tj. **stavby D1 MODERNIZACE - ÚSEK 03, EXIT 29 HVĚZDONICE - EXIT 34 OSTŘEDEK**
č. stavby v ISPROFIN: 5211550018,
č. sml. objednatele 02PT-001997, zhotovitele D4/13/2015

Smluvní strany:

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR – státní příspěvková organizace

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

za niž jedná:

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen **Objednatel**) na straně jedné

a

Zhotovitel:

"Společnost MTS + SWIETELSKY + HOCHTIEF, D1 úsek 03, Hvězdonic - Ostředeck"

Doručovací adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Účastníci společnosti:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 758

kterou zastupuje:

a

SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Východ, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

kterou zastupuje:

a

HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229
kterou zastupuje:

(dále jen **Zhotovitel**) na straně druhé,

se v souvislosti s realizací stavby „**D1 MODERNIZACE - ÚSEK 03, EXIT 29 HVĚZDOVICE - EXIT 34 OSTŘEDEK**“ (dále též jen „Stavba“) dohodly na níže uvedených změnách uzavřené Smlouvy o dílo

takto:

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- A. Na základě závěru uzavírkové komise konané dne 3.2.2016 vyplynul požadavek na **zahájení stavební sezony 2016** za předpokladu efektivní **koordinace Stavby s realizací prací na souběžně** se Stavbou (což nebylo předpokládáno v zadávací dokumentaci Stavby) **probíhající opravě havarijního stavu mostu ev.č. D1-035**, jenž je v těsné blízkosti Stavby a mohl by limitovat postup a průběh prací na Stavbě. Zhotovitel Stavby je připraven vyjít vstříc správci stavby/objednateli ohledně jejich požadavku na zahájení prací ve stavební sezoně 2016 dne 5.3.2016, při splnění dále ujednaných předpokladů a podmínek.
- B. Smluvní strany mají zájem z důvodu právní jistoty reflektovat dopady shora popsané skutečnosti na termíny realizace díla a zároveň tím i přispět ke zmírnění negativních dopadů realizace stavby na uživatele dálnice D1;

uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“).

I.

- 1. Při zohlednění skutečnosti uvedené v Preambuli a v návaznosti na odsouhlasené změny (ZBV) č. 8 a 9 se smluvní strany domluví na změně lhůt realizace stavby následovně:
 - i) **Doba pro uvedení stavby do provozu** ve smyslu čl. 1.1.3.10 Obchodních podmínek stanovená v Příloze v nabídce se mění na 12 měsíců a 27 dní (do těchto 12ti měsíců a 27ti dní se nezapočítává období zimní technologické přestávky od 1.11.2015 do 4.3.2016, období vynuceného omezení prací od 1.10.2015 do 31.10.2015 a období od 16.11.2015 do 6.12.2015, ve kterém byly provedeny dílčí dodatečné práce na záporovém pažení SO 03-202.2, dle přílohy č.1) a stanovuje se na nejpozději:

do 31.10.2016

- ii) **Doba pro dokončení stavby** ve smyslu čl. 1.1.3.3 Obchodních podmínek stanovená v Příloze v nabídce se mění na 14 měsíců a 27 dní (do těchto 14ti měsíců a 27ti dní se nezapočítává období zimní technologické přestávky od 1.11.2015 do 4.3.2016, období zimní technologické přestávky od 1.11.2016 do 31.3.2017, období vynuceného omezení prací od 1.10.2015 do 31.10.2015 a období od 16.11.2015 do 6.12.2015, ve kterém byly provedeny dílčí dodatečné práce na záporovém pažení SO 03-202.2, dle přílohy č.1) a stanovuje se na nejpozději:

do 31.5.2017

- iii) **Postupné závazné milníky** ve smyslu čl. 4.35 Obchodních podmínek stanovené v Příloze v nabídce se mění a stanovují se na:

- a) dokončení prací v rozsahu odpovídajícím etapám 0,1,2,2A,2B dle zásad organizace výstavby PDPS do 31.10.2015
 - b) dokončení prací v rozsahu odpovídajícím etapě 3 dle zásad organizace výstavby PDPS a uvedení levého jízdního pásu do provozu se mění na 9 měsíců a 27 dní (do těchto 9ti měsíců a 27 dní se nezapočítává období zimní technologické přestávky od 1.11.2015 do 4.3.2016, období vynuceného omezení prací od 1.10.2015 do 31.10.2015 a období od 16.11.2015 do 6.12.2015, ve kterém byly provedeny dílčí dodatečné práce na záporovém pažení SO 03-202.2, dle přílohy č.1) a stanovuje se na nejpozději do 31.7.2016.
2. Časový průběh a předpoklady postupu prací podle jednotlivých etap jsou podrobněji graficky zobrazeny v Harmonogramu, jenž tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
 3. Termíny realizace díla sjednané tímto Dodatkem vychází z předpokladu, že od dne 5.3.2016 bude možné práce na staveništi Stavby plánované v roce 2016 realizovat. V případě, že v důsledku nepříznivých klimatických podmínek pro realizaci plánovaných prací ve smyslu Technických podmínek Stavby nebo v důsledku absence souhlasů anebo povolení příslušných správních orgánů případně správce stavby/objednatele nebude možné zahájení prací předpokládaných k realizaci podle postupu prací na začátek stavební sezony 2016 (zejména zřízení DIO pro režim dopravy 2+2 v PJP) k 5.3.2016 a tyto budou zahájeny později, posouvají se termíny realizace a prodlužují lhůty realizace popsané v čl. I odst. 1 o dobu, po kterou nebylo možné práce na staveništi Stavby z důvodu v tomto odstavci uvedených realizovat.
 4. Zhotovitel nebude požadovat po Objednateli (tzn. vzdává se nároku) dodatečné náklady vyvolané nutností koordinace prací na Stavbě s opravou havarijního stavu mostu ev.č. D1-035 při zahájení prací na staveništi v období března 2016, tzn. zejm. náklady vyplývající pro zhotovitele ze ztížení podmínek pro realizaci DIO etapy výstavby 3 oproti předpokladům zadávací dokumentace Stavby (zejm. dočasných mobilních svodidel).

II.

1. Veškeré ostatní podmínky stanovené ve Smlouvě o dílo nezměněné tímto Dodatkem včetně jeho příloh nejsou tímto Dodatkem dotčeny a zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v 8 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 výtisky obdrží Objednatel a 6 Zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

Přílohy:

1. Etapový harmonogram výstavby

Za Objednatele:

Za Zhotovitele :

Datum: - 1 -03- 2016

Datum:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Metrostav, a.s.,


SWIETELSKY stavební s.r.o.

HOCHTIEF CZ a. s.

24 -02- 2016

Příloha č.1 - Etapový harmonogram výstavby D1 modernizace - úsek 03, exit 29 Hvězdovice - exit 34 Ostředek (předpokládající naplnění předpokladů uvedených v čl. 3 odst. I Dodatku č.2 Souhrnu smluvních dohod číslo objednatele 02PT-001997)

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Poznámky
1	D1-03 Hvězdovice - Ostředek	763 dny	30.4. 15	31.5. 17	
2	Předání staveniště	0 dny	30.4. 15	30.4. 15	
3	Odstranění DIO D1-035.1 PJP (ŘSD)	0 dny	12.5. 15	12.5. 15	
4	Povolení MD-ČR realizovat DIO E0.1	0 dny	20.5. 15	20.5. 15	
5	Etapa 0.1	20 dny	20.5. 15	6.6. 15	Provizorní úpravy a opravy, provizorní rozšíření - 1.část
6	Odstranění DIO D1-035.2 LJP (ŘSD)	0 dny	8.6. 15	8.6. 15	
7	Etapa 2.1	26 dny	9.6. 15	6.7. 15	1. část SDP ZÚ - SO 202, provizorní rozšíření - 2.část
8	Etapa 1	7 dny	30.6. 15	6.7. 15	SO 221.1 (demoice nadjezdu MUK Ostředek)
9	Etapa 2.2	69 dny	7.7. 15	13.9. 15	SDP ZÚ-KÚ
10	Etapa 0.2	17 dny	14.9. 15	30.9. 15	Provizorní úpravy a opravy, provizorní rozšíření - 3. část
11	Vynucené omezení prací	31 dny	1.10. 15	31.10. 15	Nemožnost zahájení Etapy 3
12	Zimní technologická přestávka	152 dny	1.11. 15	31.3. 16	
13	SO 221.2	323 dny	14.7. 15	31.5. 16	Nadjezd MUK Ostředek (realizace v průběhu VOP[11]+ZTP[12])
14	SO 130	75 dny	18.3. 16	31.5. 16	Přeložka silnice II/110 (realizace v průběhu ZTP[12])
15	SO 202.2 Světlo záporů + příprava kotev	21 dny	16.11. 15	6.12. 15	Díliž dodatečné práce na záporovém pažení SO 03-202.2 (realizace v průběhu ZTP [12])
16	Etapa 3	132 dny	5.3. 16	14.7. 16	Modernizace LJP (směr Praha), 105(ZD)+18(ZBV8,9)+9(zahájení D1-035)=132 dní (část realizace v průběhu ZTP [12])
17	Etapa 4	95 dny	15.7. 16	17.10. 16	Modernizace PJP (směr Brno)
18	Etapa 5	14 dny	18.10. 16	31.10. 16	Dokončovací práce SDP (po zprovoznění D1)
19	Zimní technologická přestávka	151 dny	1.11. 16	31.3. 17	
20	Dokončovací práce	61 dny	1.4. 17	31.5. 17	Dokončovací práce (po zprovoznění D1)

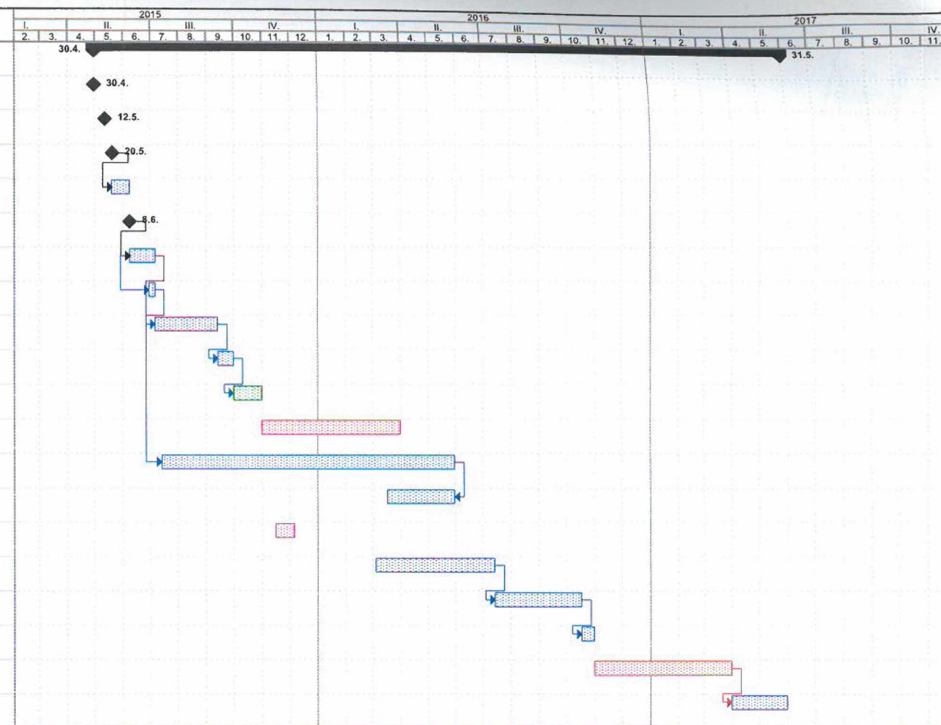

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4, IČO: 659 93 390, DIČ: CZ65993390, zastoupené

na straně jedné (dále jen „**ŘSD ČR**“ nebo „**Objednatel**“ anebo „**Smluvní strana**“)

a

Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČO: 24204005, za niž jedná

a

SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 480 35 599, za niž jedná

a

HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 466 78 468, za niž jedná

na straně druhé (společně dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“)

uzavřely tuto

DOHODU O VYPOŘÁDÁNÍ A NAROVNÁNÍ

dle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „**Dohoda**“).

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany uzavřely níže definovanou Smlouvu, jejíž součástí je níže specifikovaný Závazek odkoupení, dle kterého měl Zhotovitel za podmínek Závazku odkoupení odkoupit od ŘSD ČR níže specifikované Vyzískané materiály;
- (B) vznikl mezi Smluvními stranami spor o interpretaci obsahu Závazku odkoupení;
- (C) Smluvní strany mají zájem vypořádat neshody a spory vyplývající a/nebo související

se Závazkem odkoupení a narovnat vzájemné vztahy (práva a povinnosti);

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. DEFINICE.

1.1. Definice.

Pro účely této Dohody se následujícími pojmy rozumí:

- 1.1.1. „Smlouva“ smlouva o dílo označená jako „Souhrn smluvních dohod“ ze dne 28. 4. 2015, č. 02PT-001997, uzavřená mezi Objednatelém a Zhotovitelem, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce nazvané „D1 modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice – EXIT 34 Ostředek“;
- 1.1.2. „Závazek odkoupení“ závazek k odkoupení vytěženého materiálu ze dne 14. 4. 2015, který je nedílnou součástí Smlouvy jako formulář 4.4.5 – prohlášení uchazeče v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce nazvané „D1 modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice – EXIT 34 Ostředek“;
- 1.1.3. „Vyzískané materiály“ vytěžené materiály specifikované v Závazku odkoupení;
- 1.1.4. „Cena“ cena za Vyzískané materiály, specifikovaná v Závazku odkoupení, kterou by měl uhradit Objednateli Zhotovitel způsobem a za podmínek „Závazku odkoupení“.

1.2. Interpretace.

Jednotlivá ustanovení této Dohody, včetně jednotlivých definic, budou vykládána (interpretována) podle úmyslu Smluvních stran a podle účelu této Dohody. Není-li možné postupovat podle předchozí věty nebo vznikne-li spor o význam (interpretaci), zavazují se Smluvní strany postupovat obdobně jako v ustanovení 4.4. Dohody.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY.

2.1. Účel Dohody.

Účelem Dohody je vypořádání a narovnání vztahů Smluvních stran plynoucích a/nebo souvisejících se Závazkem odkoupení a předejít sporům souvisejícím s těmito vztahy.

2.2. Předmět Dohody.

Předmětem Dohody je vypořádání a narovnání sporných či, pochybných práv a povinností, vzniklých na základě a/nebo v souvislosti se Závazkem odkoupení, které plynou přímo či nepřímo, právně či fakticky z následujících sporných tvrzení Smluvních stran:

- 2.2.1 ŘSD ČR tvrdí, že v rámci Závazku odkoupení je Cena stanovena jako neúplná a je k ní nutné přičíst částku odpovídající příslušné sazbě DPH a zároveň ŘSD ČR tvrdí, že všechny přebytečné věci vznikající při realizaci Díla lze bez dalšího

považovat za Vyzískané materiály ve smyslu Závazku odkoupení;

2.2.2 Zhotovitel tvrdí, že v rámci Závazku odkoupení je Cena stanovena jako úplná a není k ní již možné přičíst částku odpovídající příslušné sazbě DPH a zároveň Zhotovitel tvrdí, že ne všechny přebytečné věci vznikající při realizaci Díla lze bez dalšího považovat za Vyzískané materiály ve smyslu Závazku odkoupení;

(společně dále jen „Sporné záležitosti“).

3. VYPOŘÁDÁNÍ A NAROVNÁNÍ.

3.1. Dohoda o řešení Sporných záležitostí.

Smluvní strany se dohodly, že touto Dohodou s konečnou platností vypořádávají a narovnávají Sporné záležitosti způsobem uvedeným v této Dohodě.

3.2. Vypořádání a narovnání.

Veškerá vzájemná, sporná, pochybná a jiná práva a povinnosti Smluvních stran a skutečnosti vyplývající a/nebo související, přímo či nepřímo, právně či fakticky, se Spornými záležitostmi **zanikají a nahrazují se závazky** Smluvních stran upravenými v čl. 3.3 Dohody, a to ke dni účinnosti Dohody.

3.3. Způsob vypořádání a narovnání (nová práva a povinnosti Smluvních stran).

Smluvní strany konstatují a dohodly se na tomto způsobu vypořádání a narovnání Sporných záležitostí, tj. na těchto nových právech a povinnostech: v rámci narovnání (vypořádání) **veškerých** majetkových vztahů vyplývajících či souvisejících se Závazkem odkoupení se Zhotovitel zavazuje zaplatit ŘSD ČR za Vyzískané materiály částku ve výši 6.838.283,99 Kč vč. DPH (5.984.260,22 Kč částka bez DPH, 854.023,77 Kč DPH), a to na základě daňového dokladu, vystaveného ze strany ŘSD ČR po účinnosti této Dohody v souladu s tímto bodem Dohody do 30 dnů od doručení takového daňového dokladu, ve prospěch bankovního účtu ŘSD ČR č.

Materiál		
Materiál - ocel		
Materiál - ostatní		
Cena celkem	5.984.260,22 Kč	6.838.283,99 Kč

3.4. Ochrana účelu, neuplatnění dalších nároků.

Smluvní strany se tímto vzájemně zavazují jednat v souladu s účelem Dohody, kterým je především konečné a úplné vyřešení Sporných záležitostí narovnáním, jak je ujednáno v čl. 3.3 této Dohody, bez jakýchkoli dalších nároků kterékoliv ze smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si bezodkladně vzájemně veškerou součinnost

nutnou či vhodnou pro dosažení účelu Dohody, kterou lze po nich rozumně požadovat. Smluvní strany se dále zavazují zdržet se uplatňování jakýchkoli nároků plynoucích z/v souvislosti se Spornými záležitostmi a zavazují se dále nepostupovat žádné takové nároky třetím osobám a nečinit jakékoli jiné kroky, které by byly či mohly být v rozporu s účelem Dohody. Smluvní strany prohlašují, že takové nároky nepostoupily jiné osobě před uzavřením Dohody.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

4.1. Platnost, účinnost.

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Stejnopisy a přílohy.

Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každý účastník této Dohody obdrží jeden (1) stejnopis.

4.3. Dodatky.

Tato Dohoda může být změněna nebo doplněna pouze formou písemných dodatků podepsaných Smluvními stranami.

4.4. Salvátorská klauzule.

Nevyplývá-li z této Dohody jinak, je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této Dohody. Smluvní strany se zavazují nahradit do čtrnácti (14) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným hospodářským a právním smyslem pro dosažení účelu této Dohody uvedeným v čl. 3.4 této Dohody, případně pro dosažení účelu této Dohody uzavřít novou dohodu.

4.5. Rozhodné právo a řešení sporů.

Tato Dohoda, jakož i práva a povinnosti z ní plynoucí a otázky výslovně neupravené a spory vzniklé z Dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí výhradně českým právem. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory smírnou cestou.

4.6. Jedinečnost Dohody.

Tato Dohoda je jedinečným uspořádáním vzájemných vztahů Smluvních stran vycházející ze specifických okolností konkrétního případu a není možné ji vztáhnout na jiné případy v rámci vzájemných vztahů Smluvních stran, nebo jiných vztahů mezi ŘSD

ČR a jinými zhotoviteli v rámci oboru dopravního stavitelství. Zhotovitel bere na vědomí, že postup ŘSD ČR při vypořádání Sporných záležitostí nelze analogicky použít v rámci jiných smluvních vztahů s ŘSD ČR, neboť se jedná o zcela specifický případ řešení Sporných záležitostí, a Smluvní strany se zavazují, že nebudou postup upravený v Dohodě uplatňovat při vypořádání jiných vzájemných smluvních vztahů, které ke dni podpisu tohoto Dodatku již vznikly nebo po jeho podpisu teprve vzniknou.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti a dále, že vzájemné plnění (kompenzace) dle této Dohody není v hrubém nepoměru.

Přílohy:

1. Specifikace Vyzískaných materiálů

V Praze dne:**17-12-2020**.....

Ředitelství silnic a dálnic ČR:

Metrostav Infrastructure a.s.

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

HOCHTIEF CZ a. s.

e SSD	Jednotková cena	Datum / SO / Stanění	Ze zjišťovacích protokolů	Vytříděné množství	Cena za období 10,11,12/2016 1/2017	Cena celkem od počátku	Poznámka
							7 240 954,86 Kč
Za TDI:			Za Zhotovitele stavby				1) Pro možnost ocenění skládkovného nebo odprodeje jednotlivých vybouraných materiálů bylo stanoveno vyjádření objemu takto: zemina (i nevhodná) bude uvedena v m3
