

Č. smlouvy objednatele: SML 001/2021

Č. smlouvy zhotovitele:

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: **městská část Praha-Suchdol**
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: 247747560/0300
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. Petr Hejl, starosta městské části
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
MgA. Jiřka Navrátilová, referent investic a veřejného prostoru
Telefon: +420 222 361 434
Mobil: +420 774 101 996
E-mail: j.navratilova@praha-suchdol.cz

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: **Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.**,
zkratka EKIS, spol. s r.o.
Sídlo: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9
Zastoupený: Ing. M. S. [redacted] a E. S. [redacted]
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, č.vl..2362
IČ: 186 26 084
DIČ: CZ18626084
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. M. S. [redacted], Ing. Jiřka P. [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. M. S. [redacted], Ing. Jiřka P. [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Stavbyvedoucí (hlavní): Ing. M. S. [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

2 Informativní údaje

- 2.1 Název stavby „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“
- 2.2 Místo stavby: Městská část Praha-Suchdol, Katastrální území Suchdol, parcelní čísla: 2222, 2223, 2224, 2217/2, 2309/1, 2309/2
- 2.3 Popis stavby: Jedná se o novostavbu hřbitova s objektem zázemí, vodovodní přípojku, kanalizační přípojku, vznik nového parkoviště, nových areálových komunikací, rekonstrukci stávající komunikace a o úpravy vegetace a opravu ohradní zdi okolo stávající kaple sv. Václava. Jedná se o trvalou stavbu -veřejné pohřebiště s přílehlou zahradou v okolí kaple svatého Václava včetně objektu zázemí, parkoviště a komunikací.

3 Předmět plnění

3.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k úplnému provedení 1. a 2. etapy stavby „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“ (dále rovněž „předmět plnění“ či „dílo“). Předmětem plnění je kompletní provedení prací v rozsahu a kvalitě zejména podle této smlouvy, zadávací dokumentace tvořící **přílohu č. 1** a dle projektové dokumentace s názvem „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“, srpen 2020, zpracovatel OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o., IČO: 08575495, se sídlem U Pernštejnských 1380/6, 140 00 Praha 4 tvořící **přílohu č. 2** této smlouvy.

Předmět plnění musí být proveden v souladu s platnými normami a právními předpisy tzv. „na klíč“ tak, aby předmět plnění bylo možné bez jakýchkoliv dodatečných úprav či prací užívat ke sjednanému účelu, a současně aby byl na předmět plnění vydán kolaudační souhlas nebo jiné potřebné rozhodnutí či opatření státních orgánů nezbytné k užívání díla.

Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem zadávací dokumentace, projektové dokumentace a výkazem výměr podrobně seznámil, prozkoumal je s odbornou péčí i po technické stránce a shledal, že tyto jsou řádné a srozumitelné, a že dokumentace je totožná s dokumentací, kterou obdržel pro vypracování nabídky, která tvoří **přílohu č. 4** této smlouvy, a tvoří dostatečné podklady pro provedení díla dle sjednaných parametrů a dostatečně specifikuje veškeré práce nutné pro zhotovení předmětu plnění.

Jednotlivé položky tvořící předmět díla a jejich ocenění zahrnují práce, výkony a plnění, které jsou dle zavedené odborné praxe jejich samozřejmou a nezbytnou součástí a jsou nezbytné k jejich řádnému provedení, k řádnému užívání díla ke sjednanému účelu a k vydání kolaudačního souhlasu nebo jakékoliv jiného opatření státních orgánů nezbytného k užívání díla. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil, prohlédl a prozkoumal:

- stávající stavbu, staveniště a jeho okolí, přístup na jednotlivá staveniště;
- zadávací dokumentaci k dílu vč. výkazu výměr;
- obstaral si veškeré informace o rizicích a jiných okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění díla.

3.2 Součástí předmětu plnění je také především:

- Zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla.
- Zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě. Provedení napojení i cena energií musí být zahrnuta v celkové ceně sjednané dle čl. 4 této smlouvy.
- Oddělení prostoru staveniště.
- Součástí předmětu plnění je rovněž vyhotovení potřebné dílenské dokumentace nutné pro provedení stavby.
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- Zajištění koordinace přípravy a realizace stavby.
- Účast na pravidelných kontrolních dnech stavby.
- Veškeré práce a dodávky přípravné, pomocné, dokončovací, či jinak související s řádnou a úplnou realizací díla.
- Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle rozhodnutí o povolení stavby, ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a stavbou dotčených částí stavby, péče o nepředanou stavbu a její části, jejich ošetřování, pojištění atd.
- Zajištění a předání prohlášení o shodě, dokladů o likvidaci, odvozu a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění, dokladů o úspěšném výsledku provedených zkoušek, revize umožňující užívání stavby nebo jejích částí, zkušebních protokolů, atestů a jiných dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a dalších dokladů nutných k vydání kolaudačního souhlasu ve 2 (dvojím) vyhotovení v papírové podobě. Prohlášení o shodě, atesty a podobné obecné doklady budou v 1 (jednom) vyhotovení papírově, revize a protokoly budou ve 3 (třech) vyhotoveních papírově.
- Spolupůsobení při přípravě díla k předání, včetně bezodkladného odstranění veškerých vad z přejímek.
- Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, nad rámec dohodnutých ploch ve vlastnictví městské části, které zadavatel poskytne ve sjednaném rozsahu bezúplatně.
- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu životního prostředí, osob a majetku.

- Odvoz, uložení, předání oprávněné osobě zeminy, vybouraných hmot a stavební suti v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Náklady na dopravu a předání odpadu oprávněné osobě jsou zahrnuty v ceně za dílo. Naložení s odpady bude doloženo příslušnými doklady.
 - Provedení přejímky stavby.
 - Uvedení všech povrchů dotčených stavbou dotčených realizací stavby do původního stavu.
 - Stavbu je nutné provádět takovým způsobem, aby nebyly dotčeny jiné budovy či pozemky kromě předaného staveniště.
 - Staveniště je nutné řádně označit a oddělit od ostatních pozemků.
 - Zhotovitel bere na vědomí, že současně se mohou provádět v okolí další stavební a opravářské práce.
 - Rovněž musí být zamezeno přístupu cizích osob na staveniště.
- 3.3** Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění podmínek vymezených ve veřejnoprávním povolení díla.
- 3.4** Předmět díla zahrnuje také výsadbu nových stromů, keřů, trvalkových záhonů, drobných terénních úprav a osetí trávníků včetně nezbytné bezprostředně navazující kompletní péče o zeleň po dobu minimálně do předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Rozsah péče musí zajistit předání rostlin a trávníků v řádném stavu, zejména závlivku, hnojivo, náhradu uhynulých rostlin, řez a podobně.
- 3.5** Objednatel se zavazuje předmět smlouvy zhotovený v souladu s touto smlouvou od zhotovitele převzít a zaplatit za něj níže dohodnutou cenu.
- 3.6** Objednatel požaduje minimálně dodržení všech požadovaných technických a kvalitativních parametrů uvedených v zadávací a projektové dokumentaci.

4 Cena za dílo

- 4.1** Smluvní strany se dohodly na celkové ceně ve výši:

Cena bez DPH	15 987 488,54 Kč
Cena s DPH 21%	19 344 861,13 Kč

- 4.2** Cena je dána cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která byla zpracována před uzavřením smlouvy a která tvoří **přílohu č. 4** této smlouvy. Cena dle odst. 4.1 platí pro kompletní provedení díla dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje, že nedojde k jejímu překročení.
- 4.3** Cena uvedená v odst. 4.1 zahrnuje náklady na veškeré práce, činnosti a materiál nezbytný k provedení stavby v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci, zadávací dokumentaci a v této smlouvě a k plnění všech povinností vyplývajících z této smlouvy ze strany zhotovitele. Za plnění dle této smlouvy není objednatel povinen uhradit zhotoviteli vyšší částku, než shora uvedenou, ledaže se strany v souladu s touto smlouvou dohodnou jinak.
- 4.4** Cena uvedená v odstavci 4.1 je cenou konečnou za předmět plnění. Lze jí zvýšit pouze písemnou dohodou (dodatkem smlouvy) mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu díla nad rámec této smlouvy. Za takovou změnu se nepovažuje provedení prací a činností (včetně nákladů na materiál a věci) neuvedených v položkách nabídky zhotovitele v **příloze 4** této smlouvy, které však jsou dle zavedené odborné praxe jejich samozřejmou a nezbytnou součástí a jsou nezbytné k jejich řádnému provedení a splnění předmětu díla definovaném v čl. 3 této smlouvy.
- 4.5** Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla písemně navrhopvat změny v rozsahu díla nad rámec předmětu této smlouvy a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Objednatel je také oprávněn předmět smlouvy jednostranně zúžit. Oznámení o záměru zúžení předmětu smlouvy činí objednatel písemným oznámením do stavebního deníku. Pokud by navrhované zúžení znemožnilo splnit předmět zúžením nedotčené části díla, je zhotovitel oprávněn písemně takové zúžení odmítnout. V opačném případě je povinen zúžení akceptovat.
- 4.6** Pro ocenění změn díla se využijí jednotkové ceny stavebních prací podle Nabídky zhotovitele (**příloha 4** této smlouvy), v případě jejich neexistence se využijí aktuální jednotkové ceny stavebních prací dle URS. Jednotkové ceny prací uvedené v nabídce jsou platné minimálně do 31.12.2022. V případě, že určité stavební práce uvedené v Nabídce nebudou realizovány nebo budou realizovány pouze zčásti, dojde ke snížení ceny díla uvedené v čl. 4.1 o částku, která je uvedena v Nabídce u položek, jež nebude zhotovitel provádět.

- 4.7** V případě, že bude předmět díla ze strany objednatele podle čl. 4.5 této smlouvy změněn (rozšířen nebo zúžen), každá taková změna bude evidována prostřednictvím změnového listu. Zhotovitel je povinen předložit objednateli podklady a návrh změnového listu k projednání bezodkladně poté, co se o změně dozví a s dostatečnou časovou rezervou k projednání. Na změnovém listu bude zaznamenáno, kdo a z jakého důvodu a kdy změnu požaduje, jaký má změna dopad do provedení stavby po stránce technické ve formě změny projektové dokumentace, ekonomické ve formě položkového rozpočtu a jaký vliv má na termín dokončení. Tyto skutečnosti mohou být zaznamenány na přílohách změnového listu. Každý změnový list musí být odsouhlasen zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem objednatele. Odsouhlasený a zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem objednatele podepsaný změnový list bude tvořit přílohu k příslušnému dodatku této smlouvy. Tento dodatek musí obsahovat zejména stručný popis změny díla, cenu a způsob její úhrady. Zhotovitel nesmí započít realizaci změn na díle před podpisem odpovídajícího dodatku této smlouvy. Odsouhlasený a zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem objednatele podepsaný změnový list tvoří přílohu k příslušnému dodatku této smlouvy.
- 4.8** Cena zahrnuje veškeré práce, materiály a věci nutné pro zhotovení díla, zejména pak:
- všechny materiálové a jiné vedlejší náklady, příslušenství a stavební pomocné materiály, které jsou nutné k použitelnému provedení zadaných celkových prací,
 - veškeré mzdové a vedlejší mzdové náklady, daně, náklady na dozor, odměny, odlučné, jízdné a jiné vedlejší požitky a výdaje,
 - veškeré náklady na zajištění zvláštního užívání komunikací, chodníků a veřejných ploch, úhrady vyměřených poplatků za média nutných k provedení díla (elektrická energie, voda, plyn, teplo),
 - náklady na vykládku, skladování a rozdělení všech na stavbu předaných dodávek k zabudování,
 - provedení veškerých podmínek, opatření, úprav a prací stanovených v projektové dokumentaci, zadávacích podmínkách a v této smlouvě,
 - náklady na uzavření koordinačních a jiných pro zhotovení díla nezbytných smluv se správci a vlastníky dotčené či jinak související technické infrastruktury, jejichž uzavření zhotovitel zajistí, jakož i platby či jiná plnění z takových smluv vyplývající,
 - náklady na stavební přípomoc,
 - zajištění objektu proti zatečení při dešti,
 - náklady na uvedení stavbou dotčených povrchů, ploch a zařízení do původního stavu,
 - náklady na pojištění, bankovní záruky,
 - průběžný i závěrečný úklid včetně přístupových cest,
 - vyklizení staveniště a dokončovací práce včetně odvozu veškerého stavebního odpadu a materiálu,
 - zvýšení mezd a cen materiálů objednatel nehradí,
 - náklady na odstranění vad a nedodělků,
- 4.9** Veškeré vedlejší rozpočtové náklady (VRN) jsou zahrnuty v nabídkovém rozpočtu a tedy v ceně díla.
- 4.10** Odvod daně z přidané hodnoty bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti.

5 Platební podmínky

- 5.1** Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy.
- 5.2** Zhotovitel předá objednateli nejpozději k 20. dni v příslušném kalendářním měsíci podklad pro fakturaci – přehled provedených prací a dodávek a jejich ocenění za uplynulý měsíc, tedy přehled o dodávkách a montážích zabudovaných a prováděných na stavbě (dále jen „přehled prací“). Z přehledu prací bude dále zřejmé, jaká část díla byla již fakturována v předchozích obdobích a jakou část zbývá fakturovat. Přehled prací bude zaslán objednateli i v elektronické podobě.
- 5.3** Objednatel nebo pracovník objednatelem pověřeného technického dozoru stavby se do 5 pracovních dnů od předání vyjádří k předanému přehledu prací a k přehledu opravenému na základě případných připomínek se objednatel vyjádří do 2 pracovních dnů od předání opraveného přehledu prací. Po odsouhlasení provedených prací vystaví zhotovitel daňový doklad-fakturu za příslušné období. Faktura bude doručena objednateli nejpozději do 6. kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce.
- 5.4** Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů – faktur a konečné faktury, jejichž přílohou bude vždy odsouhlasený přehled prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Odsouhlasená cena v přehledu prací bude fakturována bez DPH. Na každé faktuře bude uvedena celková cena dle přehledu prací bez DPH a příslušná sazba DPH.

- 5.5 Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od jejich doručení na adresu pro doručování objednatel dle této smlouvy.
- 5.6 Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí (s uvedenými vadami a nedodělkami, nebránícími řádnému užívání objektu, a které budou zřejmé již při předání díla), potvrzený oprávněným zástupcem objednatel a dále na konečné faktuře bude uvedeno:
- celková cena díla bez DPH
 - přehled průběžně fakturovaných částek,
 - zbyvající část ceny díla k fakturaci,
- 5.7 Částka fakturovaná v konečné faktuře za jednotlivé etapy nesmí být nižší než 10 % celkové ceny díla a bude vystavena po výsadbě a osetí a po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.

6 Doba plnění

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje dílo na svůj náklad a na své nebezpečí řádně zhotovit a předat objednateli **nejpozději do 12 kalendářních měsíců od předání a převzetí staveniště** s tím, že
- termín předání staveniště do 20 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatel, předpokládaný termín předání staveniště květen 2021, nejpozději však do 31.12.2021,
 - veškerá zeleň (stromy, keře, travnaté plochy) bude předána až při předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků,
 - v případě nepříznivých klimatických podmínek po skončení stavebních prací je zhotovitel oprávněn provést výsadbu a osetí až v nejbližším klimaticky vhodném období po dohodě s objednatel,
 - stavbu provede zhotovitel v souladu se závaznými požadavky, lhůtami a milníky dle bodu 6.2. a podle podrobného týdenního harmonogramu **odsouhlaseného** objednatel, **Příloha č. 6 Smlouvy**.
- 6.2 Závazné milníky a lhůty výstavby
- a) Předání a převzetí dokončeného díla do 12 měsíců od předání staveniště
 - b) Vyklizení staveniště do 7 dnů po předání díla dle bodu a)
- 6.3 Termín dokončení díla uvedený v bodě 6.1 a jednotlivé milníky uvedené v bodech 6.2 se mohou posunout výhradně v případě, že řádnému zhotovení stavby ve smluveném termínu brání provozní požadavky školy nebo extrémní a při podpisu smlouvy nepředvídatelné povětrnostní, provozní a další zcela mimořádné a nepředvídatelné vlivy, které brání v dodržení technologického postupu použitých materiálů nebo by ohrožovaly pracovníky na zdraví či životě a to pouze o dobu, kterou takové extrémní vlivy trvají. Tyto překážky musí být neprodleně oznámeny a projednány s objednatel a zaznamenány ve stavebním deníku, obojí každý takový den, kdy překážky trvají, a to pod sankcí ztráty prodloužení termínu dokončení.
- 6.4 Skutečnosti uvedené v odstavci 6.3 musí být zapsány ve stavebním deníku a potvrzeny za objednatel osobou oprávněnou jednat ve věcech plnění dodávky a převzetí prací.

7 Kontrola prací před zakrytím

- 7.1 Konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, podléhají této kontrole ve smyslu ust. § 2626 občanského zákoníku. Jedná se zejména o kontrolu těsnosti rozvodů, kotvicích a nosných prvků apod. Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku a zároveň písemně či e-mailovou zprávou vyzve objednatel nebo jeho zástupce ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací v průběhu výstavby ve lhůtě alespoň 3 pracovní dny před datem provedení kontroly. Souhlas či odůvodněný nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel nebo jeho zástupce neprodleně, nejpozději však do druhého pracovního dne po kontrole zakrývaných částí díla, a to formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
- 7.2 Nedostaví-li se objednatel nebo zástupce k oznámené kontrole, ač byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla. V případě, že se objednatel nezúčastní kontroly, je zhotovitel povinen před zakrytím provést zkoušky. Pokud objednatel požaduje pozdější odhalení těchto konstrukcí a prací z důvodu kontroly a prokáže se, že konstrukce a/nebo práce byly provedeny vadně nebo v rozporu s projektovou dokumentací nebo příslušnými předpisy, hradí náklady zhotovitel. V opačném případě jdou náklady spojené s dodatečnou kontrolou na vrub objednatel.

8 Kontroly v průběhu výstavby

- 8.1 Zhotovitel povede, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., řádně stavební deník, jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště a bude zapisovat do tohoto deníku veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace.
- 8.2 Objednatel nebo jím určený zástupce, TDS a AD jsou je oprávněni kontrolovat provádění díla v každé fázi jeho zhotovování a kdykoli den.
- 8.3 Bez ohledu na uvedené budou konány kontrolní dny minimálně jednou za 7 (sedm) dnů, které budou svolávány objednatelem nebo technickým dozorem stavby za účasti obou smluvních stran. Účast zhotovitele je povinná. Stavební dozor bude vykonávat osoba (případně osoby), jejichž jména objednatel sdělí před zahájením stavby.

9 Spolupůsobení objednatele

- 9.1 Objednatel předá zhotoviteli před zahájením plnění závazků, které vyplývají z této smlouvy staveniště, o předání staveniště se vyhotoví zápis, který potvrdí oprávnění zástupci smluvních stran. Staveništěm se rozumí prostor určený k provedení díla vymezený v projektu včetně zařízení staveniště. Plnění tohoto bodu je možné i po částech.
- 9.2 Objednatel předá zhotoviteli prostory pro zařízení staveniště, odběrné místo vody a el. proudu před zahájením stavby. Poplatky a platby za spotřebovanou el. energii, vodné, stočné a případně za pronájem prostor jdou na náklady zhotovitele. Měření zajistí zhotovitel.
- 9.3 Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušné doklady opravňující objednatele k provedení stavby včetně příslušných vyjádření dotčených úřadů a organizací.

10 Povinnosti zhotovitele

- 10.1 Před vstupem na pozemky, které budou dotčeny stavbou, oznámí zhotovitel uživatelům pozemků, příp. jejich správcům nebo majitelům, termíny vstupů na tyto pozemky a sepiše s nimi zápis, ve kterém budou uvedena parcelní čísla stavbou dotčených pozemků, rozsahy dočasných záborů pozemků.
- 10.2 Zhotovitel bude při realizaci stavby respektovat všechny podmínky vyplývající ze stavebního povolení.
- 10.3 Realizace stavby o sobotách, nedělích a ostatních dnech pracovního klidu podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu bude možná s podmínkou, že nebudou zatíženy hlukem a prachem okolní objekty.
- 10.4 Zhotovitel v maximální míře omezí prašnost a hlučnost při provádění prací.
- 10.5 Poplatky za výkopová povolení a rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací včetně poplatků za ukládání odpadů ze stavby hradí zhotovitel.
- 10.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit odstranění (odvoz a skladování) stavebního odpadu a sutí, a to dle platných předpisů o nakládání s odpady. Doklady o způsobu naložení s odpadem předloží zhotovitel při závěrečné převímce. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi a je povinen průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé stavební činností jeho a jeho subdodavatelů. Totéž se týká i znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem jeho činností a dalších povinností v souladu s **přílohou č. 5** této smlouvy.
- 10.7 Zhotovitel je povinen na staveništi a při provádění prací respektovat požadavky k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví, dané zejména
 - zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších změn (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.),
 - zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších změn,
 - nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
 - nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
- 10.8 Zhotovitel je povinen postupovat dle požadavků a pokynů koordinátora BOZP určeného objednatelem a v souladu s plánem zajištění plynulosti stavby a povinností v oblasti BOZP, PO a OŽP obsažených v **příloze č. 5** této smlouvy.

- 10.9** Součástí dodávky je provedení předepsaných zkoušek, revizí a předání podkladů dle příslušných norem a předpisů souvisejících s realizací tohoto díla.
- 10.10** Zhotovitel přizve v 3 (tři) denním předstihu a prokazatelným způsobem zápisem ve stavebním deníku a současně písemně či e-mailem objednatele ke kontrole zakrývaných částí stavby a případně k dalším činnostem, které si objednatel nebo budoucí provozovatel vyhradí ve stavebním deníku.
- 10.11** Zhotovitel povede o realizaci díla stavební deník, do kterého bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, viz též odst. 8.1 této smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku. K zápisům zhotovitele nebo objednatele se smluvní strany zavazují vyjádřit rovněž zápisem do deníku a to do 3 (tři) pracovních dnů od prokazatelného seznámení se s obsahem. Zhotovitel je povinen mít stavební deník k dispozici na stavbě.
- 10.12** Zhotovitel se zavazuje, že v termínu dle čl. 6. vyklidí staveniště a v řádném stavu jej předá objednateli.
- 10.13** Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele s výjimkou subdodavatelů uvedených v nabídce podané v rámci výběrového řízení. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 10.14** Zhotovitel se zavazuje před použitím předložit ke schválení objednateli vzorky všech materiálů, které zůstanou viditelné konečným uživatelům. Na díle budou použity výlučně takto odsouhlasené materiály. Objednatel se k předloženým vzorkům vyjádří do 1 (jednoho) týdne od předložení. Objednatel je oprávněn upřesnit barevné provedení jednotlivých částí díla minimálně 10 dnů po předání staveniště.
- 10.15** V případě, že je v projektové dokumentaci odkazováno na konkrétní značku výrobku, je možné místo něj použít výrobek jiné značky. Výrobek musí mít stejné, případně lepší vlastnosti a parametry než ten, na který odkazuje dokumentace.
- 10.16** Změna hlavního stavbyvedoucího je přípustná pouze po předchozím souhlasu objednatele za předpokladu, že nový hlavní stavbyvedoucí bude splňovat veškeré požadavky člena týmu uvedeného v nabídce (viz veřejná zakázka). Objednatel bude akceptovat změnu hlavního stavbyvedoucího pouze z objektivních důvodů, kterými zejména není zapojení hlavního stavbyvedoucího do jiného projektu plněného vybraným dodavatelem souběžně s veřejnou zakázkou.
- 10.17** Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
- 10.18** Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy:
- plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
 - řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.
 - kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů a dokladů o plnění řádného a včasného plnění finančních závazků vůči těmto poddodavatelům.
- 10.19** Zhotovitel se zavazuje, že umožní exkurze vč. výkladu na stavbě díla žákům základních škol s cílem podpořit zájem o studium/práci v technických oborech, maximální možný počet je omezen na dvě exkurze za dobu trvání díla v domluvených termínech, počet žáků max. 15. Exkurze budou pořádány v případě zájmu objednatele, za dodržení všech bezpečnostních podmínek daných předmětem smlouvy a po dohodě obou smluvních stran.
- 10.20** Zhotovitel se zavazuje, že:
- bude provádět dílo takovým způsobem, aby provoz bylo okolí ovlivněno co nejméně,
 - plocha zabraná stavbou musí být ohrazena, prostory staveniště musí být odděleny s ohledem na bezpečnost osob,
 - během prací a zejména vždy při ukončení prací na stavbě zabezpečí objekty proti přístupu cizích osob

- 10.21** Zhotovitel je povinen zajistit, že všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří jsou cizinci a budou provádět jakoukoliv činnost na díle, mají povolení k pobytu na území České republiky a povolení k zaměstnání pro místo provádění prací (popř. zelenou nebo modrou kartu), je-li to právními předpisy vyžadováno. Objednatel má právo vyžádat si předložení kopií příslušných dokladů kdykoliv v průběhu realizace díla, a to až do doby předání a převzetí díla (popř. do doby ukončení prací na odstraňování vad díla) a zhotovitel je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět.
- 10.22** Zhotovitel se zavazuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ani nepověří provedením díla subdodavatele, který takové jednání umožňuje.
- 10.23** Zhotovitel je povinen u všech technologických zařízení a výrobků bez výjimky minimálně dodržet všechny požadované konkrétní technické a kvalitativní parametry uvedené v zadávací a projektové dokumentaci nebo vymezené formou odkazu na standard nějakého výrobku ve výkresové dokumentaci, technické zprávě či ve výkazu výměr.

11 Předání díla

- 11.1** Dílo je provedeno, je-li dokončeno a protokolárně předáno a převzato objednatelem. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit dohodnutému účelu. Zhotovitel se zavazuje před předáním díla objednateli dílo vyklidit. Dílo nesmí při předání obsahovat vady či nedodělky bránící řádnému užívání díla (funkčně i esteticky) ani větší počet drobných vad, jež ve svém souhrnu brání řádnému užívání díla ani takové vady či nedodělky, které by užívání díla podstatným způsobem omezovaly. Bude-li dílo takové vady či nedodělky obsahovat, není objednatel povinen dílo převzít, a to až do okamžiku odstranění takových vad.
- 11.2** Zhotovitel se zavazuje po provedení díla vyzvat objednatele nebo jeho zástupce písemně, a to nejméně 5 (pět) pracovních dnů přede dnem konání, k uskutečnění předání a převzetí díla. Výzva bude provedena zápisem ve stavebním deníku a současně písemným oznámením doručeným objednateli s určením konkrétního dne a hodiny.
- 11.3** V případě, že se v rámci přejímacího řízení zjistí, že předmět díla je způsobilý předání, sepiší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla. Smluvní strany se zavazují tento protokol převzít.
- 11.4** K přejímce připraví zhotovitel kompletní dokumentaci skutečného provedení podle platných předpisů a příslušných norem. Zejména budou připraveny atesty na materiály použité při realizaci díla, doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy, stavební deníky, doklady o převzetí stavbou dotčených zařízení, doklady o převzetí stavbou dotčených pozemků, návody a záruční podmínky výrobců instalovaných komponentů, provozních souborů, technologického a Všeobecné zásady a pravidla užívání staveb (nebo jejich částí) dodaných zhotovitelem.
- 11.5** Zhotovitel před zahájením řízení o odevzdání a převzetí stavby předá originály zejména následujících dokladů:
- dokumentaci skutečného provedení a v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks ve formátu pdf a v editovatelném formátu (dwg, doc, xls),
 - výchozí nebo periodické revizní zprávy elektroinstalace, hromosvodů,
 - prohlášení o shodě, požární atesty a další doklady od zabudovaných materiálů a výrobků,
 - návody, záruční listy zabudovaných zařízení a systému,
 - doklad o likvidaci stavebního odpadu,
 - případně další doklady, požadované k řádné kolaudaci stavby bez výhrad.
- 11.6** V případě zjištění vad a nedodělků nebránících řádnému užívání a kolaudačnímu souhlasu v rámci přejímacího řízení se obě smluvní strany zavazují sepsat protokol o zjištěných vadách a nedodělcích s tím, že objednatel je oprávněn tyto vady a nedodělky do protokolu o zjištěných vadách a nedodělcích uvést. Obě smluvní strany se zavazují stanovit v protokolu o zjištěných vadách a nedodělcích termín a způsob odstranění vad a nedodělků díla a tento protokol převzít s tím, že maximální lhůta pro odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení je 7 (sedm) dnů.
- 11.7** Po sepsání předávacího protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu odst. 11.3. se objednatel zavazuje bez prodlení dílo převzít a toto převzetí stvrdit podpisem protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.8** Po odstranění vad a nedodělků díla, které byly uvedeny v protokolu o zjištěných vadách a nedodělcích ve smyslu odst. 11.6, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu sepsat protokol o odstranění vad a nedodělků nebránících řádnému užívání.
- 11.9** Dílo bude předáno jako celek nebo po funkčních částech umožňujících užívání díla.

12 Vlastnictví díla a nebezpečí škody

12.1 Veškerý materiál zajišťovaný zhotovitelem je ve vlastnictví zhotovitele do okamžiku jeho zabudování, kdy se stane nedílnou součástí stavby. V tom okamžiku přechází vlastnické právo na objednatele. Nebezpečí škody na stavbě, stejně tak i nebezpečí škody (ztráty) na všech dokončených částech stavby a veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla, přechází na objednatele okamžikem převzetí díla, které nastává okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků bránících řádnému užívání oběma smluvními stranami. Zhotovitel však nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, nebo činností jeho subdodavatelů, pracovníkům objednatele nebo na majetku objednatele při odstraňování vad a nedodělků, které byly konstatovány v protokolu o předání a převzetí díla, v zápise o kolaudaci díla anebo reklamované v záruční době. Stejně tak zhotovitel odpovídá za všechny škody, vzniklé v důsledku provádění díla nebo při odstraňování vad třetím, na stavbě nezáčastněným, osobám.

13 Kvalita prací a záruka za dílo

- 13.1** Zhotovitel se zavazuje provést v souladu s touto smlouvou předmětné dílo řádně a v termínu touto smlouvou určeném.
- 13.2** Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá jím dodaná zařízení a materiály budou nové, řádné kvality a dosud nepoužité.
- 13.3** Zhotovitel se zavazuje provést dílo odborně v kvalitě odpovídající této smlouvě, projektu stavby, závazným právním a technickým předpisům a normám.
- 13.4** Zhotovitel poskytuje záruku na předmět díla, a to:
- 24 měsíců u technologických částí díla, které musejí být vyjmenovány v předávacím protokolu,
 - 60 měsíců u ostatních částí díla
- 13.5** Záruční doba počíná běžet ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla nebo jeho části.
- 13.6** Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce i v případě, že část nebo části díla bude provedena jako subdodávka třetí osobou.
- 13.7** Za řádné ohlášení reklamace vady zjištěné v záruční době se považuje doručení písemné reklamace na adresu zhotovitele. V případě havarijních situací a vad vyžadujících neprodlený zásah zhotovitele bude zhotovitel informován telefonicky a elektronickou poštou s tím, že reklamace bude následně neprodleně prokazatelným způsobem oznámena i písemně na adresu zhotovitele. Po obdržení reklamace je zhotovitel povinen do 72 hod dostavit se na místo a posoudit se zástupcem objednatele oprávněnost reklamace závady a navrhnout způsob odstranění závady. Vlastní práce na odstranění vady zahájí zhotovitel v pracovní dny do 5 kalendářních dnů od ohlášení, pokud to umožní klimatické podmínky nebo se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárií a hrozících škod nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně po nahlášení.
- 13.8** Reklamované vady se zavazuje zhotovitel odstranit ve sjednaných termínech, které nesmí zásadně překročit lhůtu 10 dnů (v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší). Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele.
- 13.9** V případě, že objednatel uplatní v záruční době požadavek na odstranění vady na díle v záruční době, prodlužuje se od doby nahlášení vady záruční doba na předmět reklamace o časové období, které potřeboval zhotovitel na odstranění vady.

14 Smluvní pokuty

- 14.1** Smluvní strany se dohodly na níže uvedených smluvních pokutách:
- 14.1.1** V případě nedodržení smluvených termínů dokončení a předání celého díla dle bodu 6.1 zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 14.1.2** V případě nepřevzetí staveniště přes opakovanou výzvu objednatele, v případě nezhájení prací do 10 kal. Dnů od předání staveniště zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.
- 14.1.3** Při nepředání výsadby a osetí dle smluvených termínů lhůt a milníků dle odst. 6.2. písm. c), zhotovitel zaplatí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 14.1.4** Při prodlení s odstraňováním vad a nedodělků a závad v záruční době zaplatí zhotovitel objednateli 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ a započatý den prodlení. O uplatněných závadách bude vždy sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem, ve kterém bude uveden termín jejich odstranění.

- 14.1.5 V případě porušení povinnosti stanovené čl. 9.18, 9.19, 9.21 a 9.22 této smlouvy zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ.
- 14.1.6 V případě nedodržení povinnosti týkajících se pojištění stanovených v čl. v čl. 15 této smlouvy zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den, kdy takové pojištění nebude sjednáno či nebude platné a účinné.
- 14.2 Při prodlení s placením faktury objednatel zaplatí smluvní úrok z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 14.3 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného vyrozumění o porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou a o její výši.
- 14.4 Jakékoliv splatné i nesplacené pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli včetně smluvních pokut je objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplacené pohledávky zhotovitele.
- 14.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která vznikne porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou.
- 14.6 V případě souběhu více smluvních pokut budou uplatněny souběžně.

15 Odstoupení od smlouvy

- 15.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto jednotlivých případech:
- zhotovitel nepřevezme staveniště do 30 dnů po opakované výzvě
 - zhotovitel nezačíná stavební práce
 - objednatel neobdrží dostatečné finanční prostředky např. v souvislosti s důsledky Covid 19
 - zhotovitel nepředloží bankovní záruky nejpozději při převzetí staveniště
 - prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla nebo s plněním jednotlivých částí díla oproti termínům uvedenými čl. 6 nebo v podrobném harmonogramu delší než 15 dnů,
 - zhotovitel přes opakované písemné upozornění brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části,
 - jestliže bylo rozhodnuto o úpadku zhotovitele,
 - zhotovitel opakovaně závažným způsobem poruší ostatní smluvní povinnosti vyplývající z této smlouvy, a i přes písemné upozornění objednatele porušení těchto smluvních povinností neodstraní,
 - dílo je prováděno způsobem, který odporuje této smlouvě, případně z postupu při provádění díla je zřejmé, že dílo nebude dokončeno řádně nebo včas,
 - z ostatních důvodů stanovených zákonem.
- 15.2 Zhotovitel je oprávněn realizaci díla přerušit, pokud již po dobu nejméně 15 dní objednatel neplní své závazky dle této smlouvy, ačkoliv byl k plnění opakovaně vyzván, zejména v případě nehrzení oprávněných peněžitých pohledávek po době splatnosti. Lhůty a termíny závazné pro zhotovitele se prodlužují z důvodu prodlení objednatele pouze v případě, že dojde z toho důvodu k přerušování prací a zhotovitel takovou skutečnost též den zaznamená ve stavebním deníku.
- 15.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžitě plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou dodatečně vyzván a svou povinnost nesplnil ani v dodatečně stanovené lhůtě v trvání nejméně 15 dnů.
- 15.4 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají doručením písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.
- 15.5 V případě prodlení s plněním jakékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy (především ukázeli se, že dílní plnění zhotovitele nebyla vykonána řádně, včas a v požadovaném rozsahu) je objednatel oprávněn až do doby řádného splnění povinnosti zhotovitelem pozastavit jakoukoliv platbu zhotoviteli, byť by již byla splatná. Objednatel není v těchto případech v prodlení s plněním svých závazků. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.
- 15.6 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

16 Pojištění

- 16.1** Zhotovitel je povinen při předání staveniště objednateli předložit originál uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě a objednateli a pojištění stavebních a montážních výkonů, přičemž výše pojistné částky činí minimálně 15.000.000,- Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní povahy (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků, zatečením do objektu apod.). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu od předání staveniště do doby odstranění vad a nedodělků příslušné etapy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.
- 16.2** Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. Spoluúčast zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce je maximálně 5 %. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit.
- 16.3** Zavínil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení čl. 15 odst. 15.1 a odst. 15.2 této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.
- 16.4** Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni subdodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetími osobami v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou subdodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné subdodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění subdodavatelů.

17 Bankovní záruky

- 17.1** Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději při předání staveniště předá objednateli originál bankovní záruky za řádné provedení, dokončení, plnění záručních podmínek a kvalitu díla minimálně ve výši 500 000,- Kč. Tato bankovní záruka bude uvolněna objednatelem na žádost zhotovitele nejpozději do dvou týdnů po skončení záruční doby.
- 17.2** Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v níže uvedených případech. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
- 17.3** Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele až do výše dle přísl. čl. 16.1 a to v případě, že zhotovitel neplní závazky v souvislosti s řádným prováděním díla dle této smlouvy. V záruční listině budou uvedeny identifikační údaje objednatele, tj. jeho název, identifikační číslo a sídlo.
- 17.4** Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení zejména těchto povinností ze strany zhotovitele:
- zhotovitel neplní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy o dílo, nebo
 - zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jakýkoliv jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle této smlouvy o dílo povinen, nebo
 - zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu,
 - neplní záruční podmínky
- 17.5** Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající zejména z porušení kterékoli z povinností zhotovitele dle předchozího odstavce.
- 17.6** Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání, uzavřená do doby odstranění vad a nedodělků. Postup předložení bankovní záruky, text bankovní záruky a vystavující banka musí být předem odsouhlaseny objednatelem.
- 17.7** Banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti nejpozději ke dni předání této záruky.

- 17.8 Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „banka“). V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- 17.9 Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti podle této smlouvy.
- 17.10 Veškeré náklady na vystavení pojistných smluv a bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

18 Závěrečná ujednání

- 18.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 18.2 Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze oboustranně potvrzeným písemným dodatkem.
- 18.3 Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 18.4 Obě smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na důkaz souhlasu s jejím obsahem a svými podpisy stvrzují, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 18.5 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.
- 18.6 Seznam příloh, tvořících nedílnou součást této smlouvy:
- 1) Zadávací dokumentace - bez příloh (na CD)
 - 2) Projektová dokumentace, výkaz výměr (na CD)
 - 3) Povolení stavby (na CD)
 - 4) Kompletní nabídka zhotovitele, včetně všech příloh v el. podobě (na CD)
 - 5) Zajištění plynulosti stavby a povinností v oblasti BOZP, PO, OŽP
 - 6) Podrobný odsouhlasený harmonogram postupu prací

V Praze dne
-7. 04. 2021


Podpis:



Objednatel: městská část Praha-Suchbát
Ing. Petr Hejl, starosta městské části

V Praze dne
8. 4. 2021


Podpis:



Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

Přílohy na CD

- 1_Zadavaci dokumentace.pdf
- 2_PD - kompletní prováděcí dokumentace
- 3_Povolení stavby.pdf
- 3_200720-SP Hřbitov.pdf
- 3_2020-126078-SP hřbitov.pdf
- 4_Nabidka.pdf

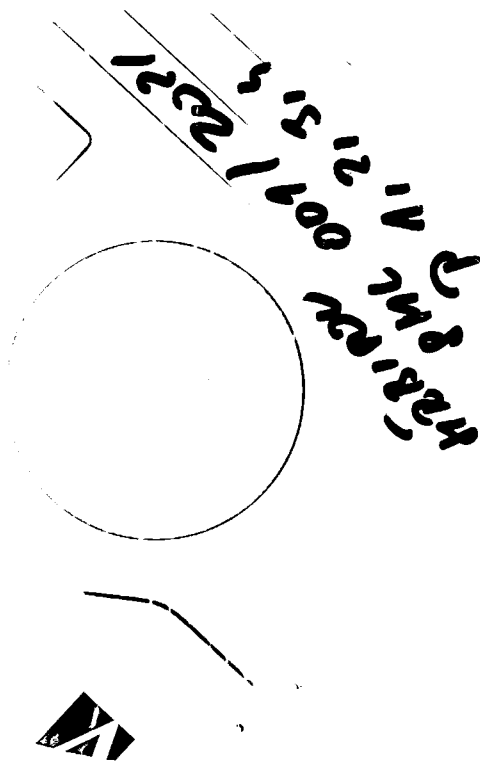

Zajištění plynulosti stavby a povinností v oblasti BOZP, PO, OŽP

1. Bezpečnost a ochrana zdraví

Zástupce zhotovitele byl seznámen s místními podmínkami a s riziky, která se na stavbě vyskytují a s přístupovými komunikacemi, s kterými seznámí své pracovníky včetně všech pracovníků subdodavatelů (dále jen pracovníci zhotovitele). Dále byl poučen o povinnosti dodržovat bezpečnostní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany. Vedoucí zaměstnanec zhotovitele provede před zahájením stavebních prací prokazatelné seznámení s místními podmínkami, riziky na stavbě a bezpečnostními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany svých podřízených pracovníků, kteří budou na výše uvedeném pracovišti pracovat a zajistí, aby byli vždy vybaveni odpovídajícími pracovními ochrannými pomůckami v souladu s Vyhl. č. 495/2001 Sb. Doklad o provedeném seznámení pracovníků předloží vedoucí zaměstnanec zhotovitele do pěti dnů objednateli. Zhotovitel se zavazuje i k plnění povinností „...vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti...“ dle § 101 odst 3) zákoníku práce v platném znění (Z č. 262/2006 Sb.)

Začátek cesty pracovníků zhotovitele na pracoviště ve smyslu Zákoníku práce začíná vstupem na staveniště (popř. vstupem do objektu zařízení staveniště). Při vzniku pracovního úrazu pracovníka zhotovitele se postupuje podle Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kopii záznamu o pracovním úrazu předá zhotovitel do 2 dnů od sepsání objednateli.

2. Požární ochrana

Zástupce zhotovitele byl seznámen s umístěním hasicích přístrojů a hydrantů a s hlavními uzávěry energií a se specifickými riziky objektu. Zhotovitel byl upozorněn, že svařování se smí provádět pouze na základě Příkazu ke svařování a po splnění všech nutných opatření. Při zajišťování požární ochrany na staveništi bude zhotovitel postupovat ve smyslu ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a dalších navazujících legislativních požadavků v oblasti požární ochrany.

3. Koordinace

Zástupce zhotovitele byl seznámen s tím, že ve smyslu Zákoníku práce v platném znění musí koordinovat svoji pracovní činnost s ostatními zhotoviteli a dalšími fyzickými osobami na stavbě pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Vedoucí pracovníci se budou vzájemně informovat o všech skutečnostech, které by při provádění prací mohly vést k ohrožení zdraví zaměstnanců jiných organizací a o opatřeních provedených k zajištění bezpečnosti. Účastníci dohody si vzájemně předávají písemné seznamy možných rizik, která vzniknou při jejich pracovní činnosti, a při kterých může dojít k ohrožení bezpečnosti zaměstnanců jiných zaměstnavatelů. Při vzájemném souběhu prací, nebo při provádění prací v těsné blízkosti jsou vedoucí pracovníci povinni se před zahájením prací dohodnout na koordinovaném provádění prací tak, aby se vyloučila možnost vzájemného ohrožení bezpečnosti a zdraví. Při změně podmínek nebo místa práce, které by svým charakterem nebo umístěním mohly vést k ohrožení pracovníků jiných dodavatelů, jsou vedoucí pracovníci této organizace povinni informovat neprodleně vedoucí pracovníky dotčené organizace o vzniklých skutečnostech. V návaznosti na vzniklé změny budou zhotovitelem doplňovány seznamy rizik a navrhována opatření k jejich odstranění.

Zhotovitel zajistí, že všechny fyzické osoby se budou na stavbě vždy pohybovat nebo zdržovat s nasazenou přílbou a s oblečenou výstražnou vestou.

4. Zhotovitel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu realizace stavby.

Zhotovitel stavby je dále povinen zejména :

- a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil
- b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance (dále jen "**Jiná osoba**"), je povinna poskytnout zhotoviteli stavby a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby. Jiná osoba informuje zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele.

Jiná osoba

a) je povinna:

1. dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a přihlížet k podnětům koordinátora,

2. používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem,

b) nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena.

Povinnosti Jiné osoby se vztahují i na pracovníky zhotovitele, kteří osobně na staveništi pracují. Za dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP), všemi osobami, které se pohybují v prostoru Pracoviště po celou dobu od zahájení díla do jeho předání Objednateli odpovídá Zhotovitel. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel zejména dodržování předpisů BOZP, PO a OŽP a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením objednateli, nebo třetím osobám.

5. Objednatel pověřené osoby jsou: zástupce objednatele, technický dozor investora, koordinátor BOZP. Tyto osoby jsou oprávněny provádět kontroly dodržování předpisů, nařizovat testy na alkohol a jiné návykové látky a být osobně přítomny u jejich provádění. Tyto osoby jsou oprávněny dát Zhotoviteli písemný příkaz (zápisem do stavebního deníku) k odstranění zjištěných závad a nedostatků (tj. nehody s legislativními požadavky) včetně stanovení přiměřených lhůt na jejich odstranění. Pokud závady a nedostatky nebudou ve stanovené lhůtě zhotovitelem odstraněny, jsou tyto osoby oprávněny rozhodnout o přerušení prací na Díle do doby jejich odstranění. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na odškodnění. V případě, že Zhotovitel poruší předpisy (porušení nebo nesplnění legislativního požadavku – závada - vztahující se na provedení díla) BOZP, PO, OŽP, nebo provozní řád stavby, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši dle následujícího sazebníku:

Sazebník pokut

Seznam možných porušení zákonných povinností v oblasti BOZP a PO

Pokud dodavatel způsobí přímé ohrožení zdraví a životů zaměstnanců/fyzických osob na stavbě nebo v okolí stavby/staveniště (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace, práce ve výškách bez zajištění proti pádu apod.) a pokud je možno závadu odstranit bez zastavení prací ihned nebo ve stanoveném termínu. 5.000,- Kč

Pokud bylo nutno pověřenou osobou objednatele zastavit práce z důvodu přímého ohrožení zdraví a životů zaměstnanců/fyzických osob na stavbě nebo v okolí stavby/staveniště (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace, práce ve výškách bez zajištění proti pádu apod.) nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.) 25.000,- Kč

Za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP, PO a OŽP zaměstnancem nebo jím objednanou fyzickou osobou Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochr. prostředků apod.) 2.500,- Kč

Za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost práce počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění 10.000,- Kč

Prokazatelné neposkytnutí součinnosti koordinátorovi BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (zápis ve stavebním deníku, bez e-komunikace delší jak 4 dny) 5.000,- Kč

Prohřešky proti pořádku na stavbě a OŽP

Nepoužívání toalet zhotovitele nebo toalet určených objednatelem	10.000,-Kč
Přechovávání alkoholu	5.000,-Kč
Pozitivní dechové zkoušky	10.000,-Kč
Kouření na staveništi	1.000,-Kč
Pálení odpadu a znečišťování ovzduší	5.000,-Kč
Znečišťování staveniště	1.000,-Kč
Poškození venkovních ploch	5.000,-Kč
Poškození vnitřních prostor	5.000,-Kč
Poškození či ucpání kanalizace	5.000,-Kč

