


Moduly ZBV, ČERPÁNÍ, FAKTURY

Moduly ZBV, Čerpání, Faktury **ZBV** **ČERPÁNÍ** **FAKTURY** obsahují nástroje pro tvorbu zjišťovacích protokolů, dodatků, faktur a funkce pro import čerpání z Aspe®10. Moduly ZBV, Čerpání, Faktury jsou přístupné pouze po výběru stavby, která je realizovaná – prováděná. Změna stavby na čerpanou se provádí v modulu Aspe. Je třeba v levém panelu zvolit stavbu, která se bude převádět na realizovanou. Poté v menu AKCE zvolit **Změna fáze stavby**, vybrat **Prováděná** a kliknout na tlačítko **změnit** (lze také využít kontextovou nabídku pravým kliknutím myši na stavbu). Aktuální stavba bude převedena na realizovanou - přístupnou pro moduly ZBV, Čerpání, Faktury. Původní varianta bude zálohována pod aktuální variantu.

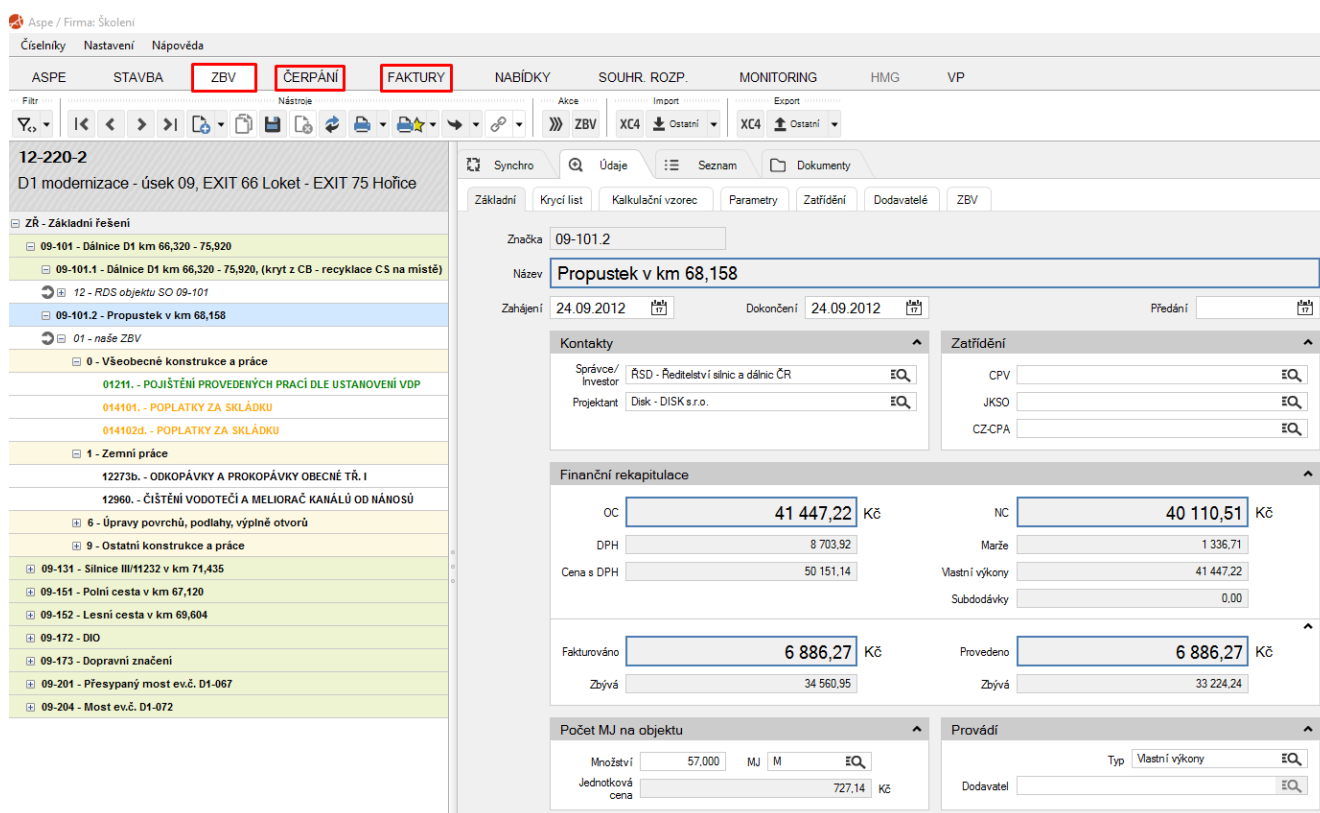

Tvorba Změny během výstavby

V Aspe® 10 je tvorba změny během výstavby umístěna do dvou míst. V prvním případě se dají změny zakládat v modulu Stavba, nebo ve druhém případě je uživateli umožněno zakládat změny v modulu ZBV **ZBV**. V Aspe® 10 je možné vytvořit tři typy změn a to **Návrh**, **Interní** a **Investorský**.

Návrh: je zapracován stavbyvedoucím a je zapisováno množství, se kterým se na stavbě předpokládá, že se bude provádět ve změně oproti původní dokumentaci. Změna množství ani ceny se na položce rozpočtu neprojeví.

Interní: je zapracován stavbyvedoucím na základě skutečně provedené změny výměry položky rozpočtu. Výše hodnoty udává množství, které se ve skutečnosti změnilo, bylo provedeno. Změna množství ani ceny se na položce rozpočtu neprojeví.

Investorský: je zapracován dodavatelem stavby na základě skutečně provedené změny výměry položky rozpočtu a odsouhlasení investorem. Výše hodnoty udává množství, které se ve skutečnosti změnilo, bylo provedeno, odsouhlaseno. Změna množství i ceny se projeví nejen na konkrétní položce, ale samozřejmě i na OC celého rozpočtu.

Změna ke stávající položce rozpočtu

Abyste mohli provést změnu množství položky, je třeba splnit několik podmínek. V objektu, ve kterém je konkrétní položka, musí být ZBV. Dále si v levém formuláři (ve stromové struktuře) zvolte příslušnou položku rozpočtu, kterou chcete změnit.

Aspe / Firma: Školení

Číselníky Nastavení Nápověda

ASPE STAVBA ZBV ČERPÁNÍ FAKTURY

Filtr Nástroje

12-220-2
D1 modernizace - úsek 09, EXIT 66 Loket - EXIT 75 Hořice

☐ ZŘ - Základní řešení

- ☐ 09-101 - Dálnice D1 km 66,320 - 75,920
- ☐ 09-131 - Silnice III/11232 v km 71,435
- ☐ 09-151 - Polní cesta v km 67,120
- ☐ 09-151 - Polní cesta v km 67,120

☑ 13 - RDS

- ☐ 0 - Všeobecné konstrukce a práce
- ☐ 1 - Zemní práce
- ☐ 4 - Vodovodné konstrukce
- ☐ 5 - Komunikace
- ☐ 8 - Potrubí
- ☐ 9 - Ostatní konstrukce a práce

91771. - OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH

919112. - ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

931311. - TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2

93530. - ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ

936502. - DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK

Poté musíte zadat rozdíl množství u stávající položky na záložce **Výpočet množství**. Hodnotu množství zadáte do řádku příslušného ZBV. Nebo kliknete do pole množství u příslušného ZBV a pak kliknete do výkazu výměr jako vzorec s výpočtem.

Výpočet množství Dod. režim Atributy Realizace Poznámka

přímo zadané

Typ	Množství	Fakt.	Prov.	Zpús.
▶ Aktuální		10 930,00	10 930,000	
▶ Původní		10 530,00	10 530,000	☑
▶ Inv 12 - RDS obje		400,000	400,000	☑

dle výkazu výměr : 10530,0=10 530,000 [A]m

Celkem: 10 530,000 [A]

Čerpání položek rozpočtu

V modulu ČERPÁNÍ je čerpání položek rozpočtu. Před samotným čerpáním máte možnost nastavit typ tvorby zjišťovacích protokolů, ve kterém se bude čerpat. Jakmile založíte zjišťovací protokol,

možnost změny typu tvorby je nepřístupná. Změnu typu čerpaného období můžete provést v modulech Aspe, Stavba, ZBV, Čerpání, Faktury v záložce parametry varianty > čerpání > Odděleně položky dle SoD a ZBV // Všechny položky. Zobrazené položky ve stromu se mohou lišit barvou písma, což značí stav čerpání v konkrétním zjišťovacím protokolu. Červené jsou položky přečerpané.

<input type="checkbox"/> ZP (23.09.2016)
<input type="checkbox"/> 0 - Všeobecné konstrukce a práce
01211. - POJIŠTĚNÍ PROVEDENÝCH PRACÍ DLE USTANOVENÍ VDP
014101. - POPLATKY ZA SKLÁDKU
014102d. - POPLATKY ZA SKLÁDKU
<input type="checkbox"/> 1 - Zemní práce
12273b. - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
12960. - ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ

Pokud je pravý panel zobrazen jako synchronizovaný strom, je možné zadat k požadované položce čerpání do polí Množství provedeno za období a Množství fakturováno za období.



Základní

Značka 01211 Pořadové číslo 12 MJ Kč

Název POJIŠTĚNÍ PROVEDENÝCH PRACÍ DLE USTANOVENÍ VDP

Popis

Aktuál. množství 1,000000 Čerpáno celkem 0,473600 Zbývá 0,526400

Změněno v ZBV

Množství	1,000	JOC	10 000,00	JNC	10 000,00
		OC	10 000,00	NC	10 000,00

Fakturováno

Množství	Cena
0,473600	4 736,00
Celkem	0,473600 4 736,00
Zbývá	0,526400 5 264,00

Provedeno

Množství	Cena
0,473600	4 736,00
Celkem	0,473600 0,00
Zbývá	0,526400 5 264,00

Technická specifikace

zahrnuje veškeré poplatky za pojištění související s výstavbou


Výkaz výměr

Rozpis dodavatele

Typ dodavat	Provádí/Dodavatel	Fakturováno	JNC	Provedeno
v.v.	[D] Dodavatel	0,473600	9100,00	0,473600
*				

Fakturace

Tvorba faktur se v programu Aspe® 10 provádí v modulu **Faktury**. Novou fakturu založíte kliknutím pravého tlačítka myši na založené variantě stavby.

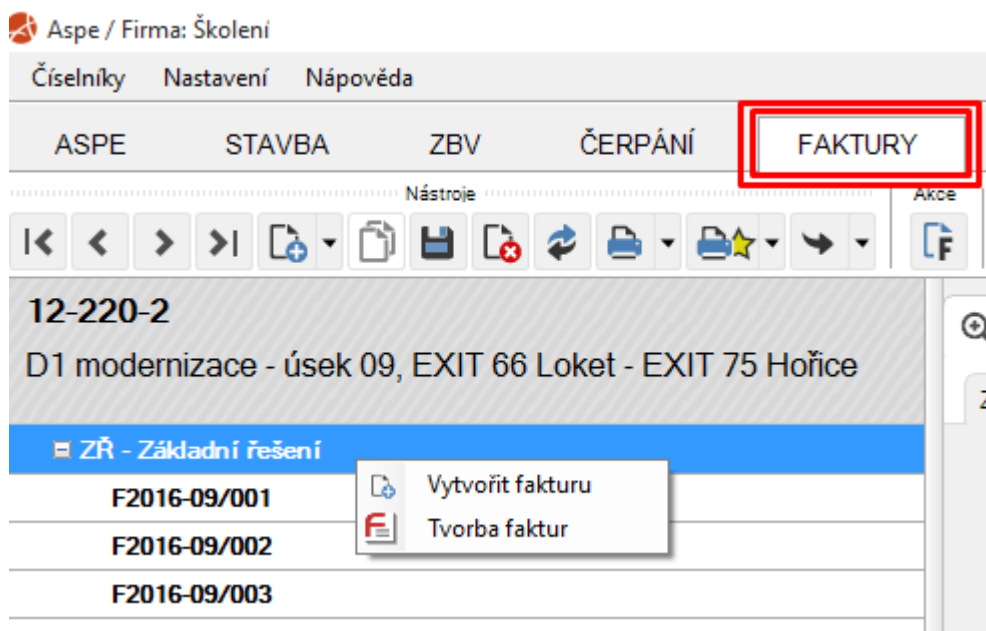

V kontextovém menu si pak můžeme vybrat ze dvou variant tvorby faktur (Vytvořit fakturu nebo Tvorba faktur). Některá pole na formuláři základních údajů faktury jsou přístupná podle toho, jakým způsobem byla faktura vytvořena (Vytvořit fakturu nebo Tvorba faktur).

Údaje
Seznam
Dokumenty

Základní
Položky
Subdodavatelé
Rozpis

Číslo FA
 Daň. doklad
 Zadání
 Typ FA
 Daň. období
 Režim přenosu DPH

Období
 Pořadové číslo
 Fakturační období ISPROFIN
 CZ-CPA
 Správce/Investor

Způsobilá
 Vystaveno
 Splatnost
 Zdaň. plnění
 Odesláno
 Uhrazeno

Finanční rekapitulace faktury

	Základ daně 15 %	Základ daně 21 %	
Základ daně	6 454,12	0,00	6 454,12
Valorizace <input type="text" value="0,000"/> %	0,00		
Čerpáno včetně valorizace	6 454,12	0,00	6 454,12
Sleva <input type="text" value="0,000"/> %	0,00		
Čerpáno po slevě	6 454,12	0,00	6 454,12
DPH	0,00	1 355,37	7 809,49
Pozastávka s DPH <input type="text" value="0,000"/> %			0,00
Zadržné s DPH <input type="text" value="0,000"/> %			0,00
Mezisoučet			7 809,49
Splátka ze zálohy <input type="text" value="0,00"/> %	0,00	DPH <input type="text" value="0,00"/> %	0,00
<input type="button" value="Záloha"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Nezaokrouhlovat DPH	<input type="checkbox"/> Výpočet slevy bez valorizace	Celkem k úhradě vč. DPH 7 809,49

Rozpis

	- interní	- externí	Vlastní výkony	SR
Subdodávky	0,00	0,00	0,00	1 355,37

Smlouvy

Smlouva obj Smlouva dod

Bankovní spojení

 BÚ - /
 VS KS SS
 IBAN
 BIC/SWIFT

Text na fakturu SŽDC

 Zadejte text...

Podpisy

Za zhotovitele <input type="text" value="Jaroslav Zavadil"/>	Za objednatele <input type="text" value="Jan Klouček"/>	Správce FA 7.7 <input type="text"/>
Funkce <input type="text" value="vedoucí výstavby"/>	Funkce <input type="text" value="vedoucí TDS modernizace D1"/>	Kde <input type="text" value="Hořice"/>

IBR Consulting, s.r.o. ■ Sídlo: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 ■ IČO: 25023446 DIČ: CZ25023446


Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. ■ č. účtu: 78-6158480267/0100 ■ Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 235748 ■ tel.: +420 731 683 848 ■ e-mail: info@aspe.cz ■ www.aspe.cz ■ www.ibrconsulting.cz ■ Hotline Aspe®: +420 603 807 181

strana 7 / 9

Přenos dat

Mezi základními komunikačními prostředky Aspe® 10 jsou přenosy dat. Tyto přenosy jsou kompatibilní mezi verzí Aspe® 7, Aspe® 8, Aspe® 9 a Aspe® 10. Při komunikaci lze přenést data mezi počítači v rámci dodavatelských firem exportem, importem faktur, ZBV a zjišťovacích protokolů.

Veškeré přenosy dat ze staveb a nabídek se nacházejí v modulech ZBV, Čerpání a Faktury pod ikonou **Akce**.



Přenosy dat:

- **Export faktur:** umožňuje přenášet faktury stavby z Aspe® 10
 - **faktur:** Export faktur do formátu Aspe® 8, Aspe® 9 nebo Aspe® 10
 - **NDS:** Export faktur do formátu NDS
 - **XDC:** Export faktur do formátu XDC
 - **Helios:** Export faktur do formátu Helios
- **Import faktur:** umožňuje importovat faktury stavby do Aspe® 10
 - **faktur:** Import faktur z formátu Aspe® 8, Aspe® 9 nebo Aspe® 10
 - **NDS:** Import faktur z formátu NDS
 - **v. 7:** Import faktur z formátu Aspe® 7
 - **XDC:** Export faktur z formátu XDC
- **Export zjišťovacích protokolů:** umožňuje přenos zjišťovacích protokolů stavby z Aspe® 10
 - **Export zjišťovacích protokolů:** Export zjišťovacích protokolů do formátu Aspe® 8, Aspe® 9 nebo Aspe® 10
 - **XC4:** Export zjišťovacích protokolů do formátu XC4
 - **NDS:** Export zjišťovacích protokolů do formátu NDS
 - **XDC:** Export zjišťovacích protokolů do formátu XDC
 - **Export zjišťovacích protokolů do verze 7:** Export zjišťovacích protokolů do formátu Aspe® 7

- **Import zjišťovacích protokolů:** umožňuje přenos zjišťovacích protokolů stavby do Aspe® 10
 - **Import zjišťovacích protokolů:** Import zjišťovacích protokolů z formátu Aspe® 8, Aspe® 9 nebo Aspe® 10
 - **XC4:** Import zjišťovacích protokolů z formátu XC4
 - **NDS:** Import zjišťovacích protokolů z formátu NDS
 - **XDC:** Import zjišťovacích protokolů z formátu XDC
 - **Import zjišťovacích protokolů do verze 7:** Import zjišťovacích protokolů z formátu Aspe® 7
- **Export ZBV:** umožňuje přenos ZBV stavby z Aspe® 10
 - **Aspe:** Export ZBV do formátu Aspe® 8, Aspe® 9 nebo Aspe® 10
 - **XC4:** Export ZBV do formátu XC4
 - **NDS:** Export ZBV do formátu NDS
 - **XDC:** Export ZBV do formátu XDC
 - **Ostatní:** Export ZBV do ostatních formátů
- **Import ZBV:** umožňuje přenos ZBV stavby do Aspe® 10
 - **Aspe:** Import ZBV z formátu Aspe® 8, Aspe® 9 nebo Aspe® 10
 - **XC4:** Import ZBV z formátu XC4
 - **NDS:** Import ZBV z formátu NDS
 - **XDC:** Import ZBV z formátu XDC
 - **Ostatní:** Import ZBV z ostatních formátů
